
ENSASE ENSAYOS Y ASESORIAS DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA Nit. 3.371.227-7	NOMBRE DEL DOCUMENTO :	ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS	
	CODIGO REVISION :		REV 0
	FECHA DE ACTUALIZACION - PAGINADO	3-ene.-24	PAG 1 DE 1
	NTC - 174	ENSAYO No.	50
		Fecha:	25/01/2024

Proyecto	CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MPIO DE PUERTO NARE
Contrato	
Constructor	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Interventor	
Material	GRUESO
Fuente	CANTERA RIO MAGDALENA
Localización	PUERTO NARE
Fecha toma muestra	25-ene-24
Descripción	GRAVA GRIS

P1 = *7820* g **P2=** *7817* g

Tamiz Pulg	Tamiz mm	Masa Retenida g	Porcentaje Retenido (%)	Porcentaje Ret. Acum.	Porcentaje Pasa (%)	Especificacion diseño superior	Especificacion diseño inferior
2"	50	0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
1 1/2"	37,5	0	0,0	0,0	100,0	100,0	95,0
1"	25	0	0,0	0,0	100,0	78,0	52,0
3/4"	19	1604	20,5	20,5	79,5	70,0	35,0
1/2"	12,5	4016	51,4	71,9	28,1	40,0	15,0
3/8"	9,5	1472	18,8	90,7	9,3	30,0	10,0
No. 4	4,75	710	9,1	99,8	0,2	5,0	0,0
No. 200	0,1	6	0,1	99,8	0,2		
Fondo		3	0,0	99,9			
Total		7811	99,9				

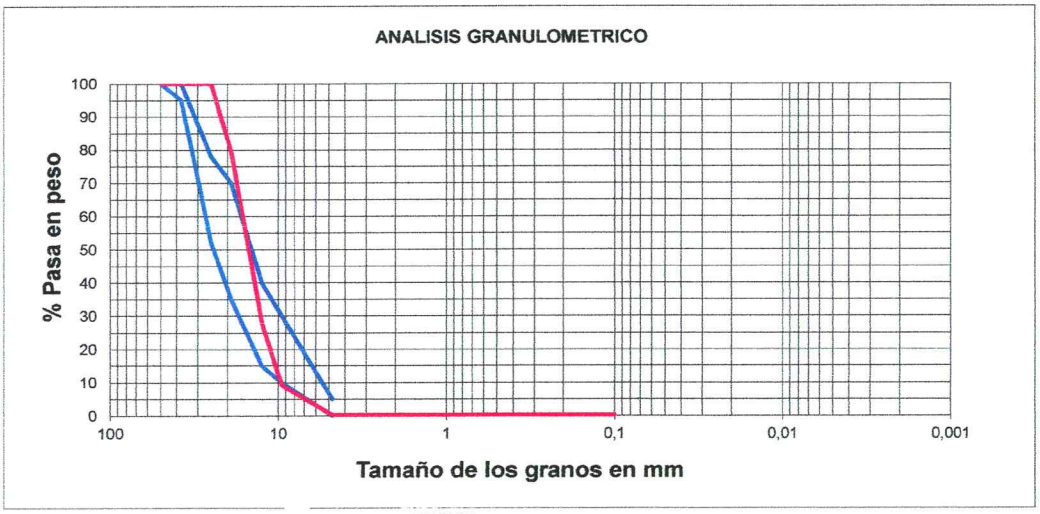


Observaciones :

LABORATORISTA

ENSASE ENSAYOS Y ASESORIAS Nit 3.371.227-7

ELABORO	REVISO
FABIO JARAMILLO	FABIO JARAMILLO
LABORATORIO	LABORATORISTA




DIRECCIÓN: CALLE 38 No. 53 - 17 BELLO - ANTIOQUIA TEL. 612 49 99 - 570 38 57
CEL. 312 287 84 64 E-mail: ensaseauxiliar@hotmail.com

ANEXO 7. Ensayo de cilindros

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE REISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA



Cliente: INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Obra: Construcción de vivienda nueva urbana en el Municipio de Puerto Nare
Dirección: Calle 62 # 47-78
Teléfonos: 315 418 64 78
N.I.T.#: 900.386.501-1
Dirección de la Obra: Municipio de Puerto Nare

Características:
Agregado Fino: Cantera Rio Magdalena
Agregado Grueso: Cantera Rio Magdalena
Cemento: Argos
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 1 de febrero de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días:

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm^2)	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Ast (cm)	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 21 y 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Diseño de mezclas de concreto para una	25-01-24	1-02-24	7	15.2	13125	181	30.5	5520		2.377	76800	191	267
2	Resistencia de 210 kg/cm2, para el	25-01-24	1-02-24	7	15.2	13263	181	30.5	5520		2.402	70500	176	252
3	Diseño se utilizó triturado ¾" y arena	25-01-24	1-02-24	7	15.2	13288	181	30.5	5520		2.407	74200	185	261
4	procedentes de cantera Rio Magdalena	25-01-24	1-02-24	7	15.2	13274	181	30.5	5520		2.404	68300	170	246
	En combinación con cemento Argos													

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7


REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE REISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA



Cliente: INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Obra: Construcción de vivienda nueva urbana en el Municipio de Puerto Nare
Dirección: Calle 62 # 47-78
Teléfonos: 315 418 64 78
N.I.T.#: 900.386.501-1
Dirección de la Obra: Municipio de Puerto Nare

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 1 de marzo de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días:

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm^2)	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resis. Esperada Mpa	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 21 y 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Casa 1 Jhon Aimer Zapata Giraldo	31-01-24	7-02-24	7	15.2	13255	181	30.5	5520	21	2.401	53400	133	211
2	Viga de fundación	31-01-24	14-02-24	14	15.2	13162	181	30.5	5520	21	2.384	68900	171	214
3	Viga de fundación	31-01-24	28-02-24	28	15.2	13405	181	30.5	5520	21	2.428	89700		223
4	Casa 4 Mirian del Socorro Salazar Girald	31-01-24	7-02-24	7	15.2	13075	181	30.5	5520	21	2.368	55200	137	215
5	Viga de fundación	31-01-24	14-02-24	14	15.2	13122	181	30.5	5520	21	2.377	70200	175	218
6	Viga de fundación	31-01-24	28-02-24	28	15.2	13204	181	30.5	5520	21	2.392	91900		229

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7


REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE REISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA



Cliente: INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Obra: Construcción de vivienda nueva urbana en el Municipio de Puerto Nare
Dirección: Calle 62 # 47-78
Teléfonos: 315 418 64 78
N.I.T.#: 900.386.501-1
Dirección de la Obra: Municipio de Puerto Nare

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 22 de marzo de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días:

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm^2)	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resis. Esperada Mpa	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 21 y 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Casa 2 Manuel José Vargas Mayo	17-02-24	24-02-24	7	15.2	13164	181	30.5	5520	21	2.384	54200	135	213
2	Columnas	17-02-24	31-02-24	14	15.2	12850	181	30.5	5520	21	2.327	69300	172	215
3	Columnas	17-02-24	16-02-24	28	15.2	12764	181	30.5	5520	21	2.312	89500		223
4	Casa 1 Jhon Aimer Zapata Giraldo	23-02-24	1-03-24	7	15.2	13051	181	30.5	5520	21	2.364	54800	136	214
5	Vigas aéreas	23-02-24	6-03-24	14	15.2	13285	181	30.5	5520	21	2.406	70500	175	219
6	Vigas aéreas	23-02-24	20-03-24	28	15.2	13127	181	30.5	5520	21	2.378	89300		222
7	Casa 3 Francisco Antonio Franco Zapat	23-02-24	1-03-24	7	15.2	13052	181	30.5	5520	21	2.364	53900	134	212
8	Vigas aéreas	23-02-24	6-03-24	14	15.2	13256	181	30.5	5520	21	2.401	68900	171	214
9	Vigas aéreas	23-02-24	20-03-24	28	15.2	12968	181	30.5	5520	21	2.349	90400		225
10	Casa 5 Carlos Adolfo Velásquez	23-02-24	1-03-24	7	15.2	12867	181	30.5	5520	21	2.330	54300	135	213
11	Vigas aéreas	23-02-24	6-03-24	14	15.2	12970	181	30.5	5520	21	2.349	69100	172	215
12	Vigas aéreas	23-02-24	20-03-24	28	15.2	12647	181	30.5	5520	21	2.291	88500		220

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7


REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE REISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA



Cliente: INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Obra: Construcción de vivienda nueva urbana en el Municipio de Puerto Nare
Dirección: Calle 62 # 47-78
Teléfonos: 315 418 64 78
N.I.T.#: 900.386.501-1
Dirección de la Obra: Municipio de Puerto Nare

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 11 de abril de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días:

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm^2)	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resis. Esperada Mpa	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 21 y 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Casa 4 Miriam del Socorro Salazar Giraldo	11-03-24	18-03-24	7	15.2	13164	181	30.5	5520	21	2.384	54700	136	214
2	Losa de piso	11-03-24	25-03-24	14	15.2	12762	181	30.5	5520	21	2.311	70400	175	219
3	Losa de piso	11-03-24	8-04-24	28	15.2	12545	181	30.5	5520	21	2.272	88300		220

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7


REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE REISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA



Cliente: INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Obra: Construcción de vivienda nueva urbana en el Municipio de Puerto Nare
Dirección: Calle 62 # 47-78
Teléfonos: 315 418 64 78
N.I.T.#: 900.386.501-1
Dirección de la Obra: Municipio de Puerto Nare

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 20 de abril de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días:

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm^2)	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resis. Esperada Mpa	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 21 y 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Casa 7 Jackeline Berrio Cosme	22-03-24	29-03-24	7	15.2	13100	181	30.5	5520	21	2.373	54300	135	213
2	Viga de fundación	22-03-24	5-04-24	14	15.2	13260	181	30.5	5520	21	2.402	70500	175	219
3	Viga de fundación	22-03-24	19-04-24	28	15.2	13021	181	30.5	5520	21	2.358	90400		225

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7


REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE REISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA



Cliente: INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Obra: Construcción de vivienda nueva urbana en el Municipio de Puerto Nare
Dirección: Calle 62 # 47-78
Teléfonos: 315 418 64 78
N.I.T.#: 900.386.501-1
Dirección de la Obra: Municipio de Puerto Nare

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 9 de mayo de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días:

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm^2)	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resis. Esperada Mpa	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 21 y 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Casa 6 Bohamet Chacon Ruiz	8-04-24	15-04-24	7	15.2	13124	181	30.5	5520	21	2.377	53800	134	211
2	Columnas	8-04-24	22-04-24	14	15.2	13055	181	30.5	5520	21	2.365	68900	171	214
3	Columnas	8-04-24	6-05-24	28	15.2	13169	181	30.5	5520	21	2.385	88600		220
4	Casa 8 Andrea del Carmen Vargas Amaya	8-04-24	15-04-24	7	15.2	13075	181	30.5	5520	21	2.368	55100	137	214
5	Columnas	8-04-24	22-04-24	14	15.2	12693	181	30.5	5520	21	2.299	72400	180	225
6	Columnas	8-04-24	6-05-24	28	15.2	12546	181	30.5	5520	21	2.272	92500		230

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7


REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE REISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA



Cliente: INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Obra: Construcción de vivienda nueva urbana en el Municipio de Puerto Nare
Dirección: Calle 62 # 47-78
Teléfonos: 315 418 64 78
N.I.T.#: 900.386.501-1
Dirección de la Obra: Municipio de Puerto Nare

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 14 de mayo de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días:

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm^2)	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resis. Esperada Mpa	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 21 y 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Casa 9 Carlos Mario Hincapié Parra	12-04-24	19-04-24	7	15.2	12758	181	30.5	5520	21	2.492	56300	140	217
2	Vigas aéreas	12-04-24	26-04-24	14	15.2	12840	181	30.5	5520	21	2.326	71800	178	223
3	Vigas aéreas	12-04-24	10-05-24	28	15.2	13325	181	30.5	5520	21	2.413	93700		233

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7


REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE REISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA



Cliente: INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Obra: Construcción de vivienda nueva urbana en el Municipio de Puerto Nare
Dirección: Calle 62 # 47-78
Teléfonos: 315 418 64 78
N.I.T.#: 900.386.501-1
Dirección de la Obra: Municipio de Puerto Nare

Características:
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento:
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 25 de mayo de 2024
Contacto:
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días:

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm^2)	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resis. Esperada Mpa	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 21 y 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Casa 7 Jackeline Berrio Cosme	24-04-24	1-05-24	7	15.2	13350	181	30.5	5520	21	2.418	58700	146	223
2	Losa de piso	24-04-24	8-05-24	14	15.2	13416	181	30.5	5520	21	2.430	72600	180	226
3	Losa de piso	24-04-24	22-05-24	28	15.2	13124	181	30.5	5520	21	2.377	92500		230
4	Casa 10 Ana María Flórez Henao	24-04-24	1-05-24	7	15.2	13396	181	30.5	5520	21	2.427	60100	149	226
5	Losa de piso	24-04-24	8-05-24	14	15.2	13161	181	30.5	5520	21	2.384	74600	185	232
6	Losa de piso	24-04-24	22-05-24	28	15.2	13289	181	30.5	5520	21	2.407	96300		239

ENSAYADO POR:
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ANEXO 8. Pólizas

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: t1JLQhA/PGfXdwYLkbD0qw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100043978	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22221150	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	11/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INGENERIA CIVIL SERVICOS Y SUMINISTROS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.386.501-1
DIRECCIÓN	CR 83 A 33 B 59 BRR LA CASTELLANA	**TELÉFONO**	3154186478
ASEGURADO	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.105.497-0
DIRECCIÓN	CALLE 31 N 30 08	**TELÉFONO**	8610672
BENEFICIARIO	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.105.497-0
DIRECCIÓN	CALLE 31 N 30 08	**TELÉFONO**	8610672

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

NOTA: SE TIENE COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL AL MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON NIT 890981000-8 Y AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON NIT 8909002860-0.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IP-051-2023 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE.

SE TIENE COMO ASEGURADO / BENEFICIACIO ADICIONAL AL MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON NIT 890981000-8.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 11/09/2024	111.710.174,40	318.297,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 11/05/2024	335.130.523,20	503.155,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 11/05/2027	167.565.261,60	2.262.361,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/05/2024	24:00 Horas Del 11/05/2029	223.420.348,80	4.470.855,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 837.826.308,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DAYRO JOSE GONZALEZ MANTILLA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	7.554.668,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	7.554.668,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	1.436.337,00
TOTAL A PAGAR	$	8.996.005,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100043978** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **INGENERIA CIVIL SERVICOS Y SUMINISTROS SAS** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE / EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE** , expedida por la Compañía en **26/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **26** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22221150
Fecha de Facturación	26/12/2023
Fecha Límite de Pago	25/01/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INGENERIA CIVIL SERVICOS Y SUMINISTROS SAS
CR 83 A 33 B 59 BRR LA CASTELLANA	900386501
Intermediario	DAYRO JOSE GONZALEZ MANTILLA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. [illegible] 25/01/2024 [illegible] esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	22221150
Fecha de Facturación	26/12/2023
Fecha Límite de Pago	25/01/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INGENERIA CIVIL SERVICOS Y SUMINISTROS SAS
CR 83 A 33 B 59 BRR LA CASTELLANA	900386501
Intermediario	DAYRO JOSE GONZALEZ MANTILLA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000222211 50(3900)000008996005(96)20240125

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022221150(3900)000008996005(96)20240125

VIGILADO

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: AEBIOA1KMFECjo+fW3sL1A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100011553	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22221152	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	11/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INGENERIA CIVIL SERVICOS Y SUMINISTROS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.386.501-1
DIRECCIÓN	CR 83 A 33 B 59 BRR LA CASTELLANA	TELÉFONO	3154186478
ASEGURADO	INGENERIA CIVIL SERVICOS Y SUMINISTROS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.386.501-1
DIRECCIÓN	CR 83 A 33 B 59 BRR LA CASTELLANA	TELÉFONO	3154186478
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

NOTA: SE TIENE COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL AL MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON NIT 890981000-8 Y AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON NIT 8909002860-0.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.IP-051-2023 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	174.000.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00	326.548,00
PATRONAL	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$	348.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DAYRO JOSE GONZALEZ MANTILLA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	326.548,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	326.548,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	62.994,00
TOTAL A PAGAR	$	394.542,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

V

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100011553	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22221152	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/12/2023	24:00 Horas Del	11/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE TIENE COMO ASEGURADO / BENEFICIACIO ADICIONAL AL MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON NIT 890981000-8 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INGENERIA CIVIL SERVICOS Y SUMINISTROS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No. 22221152

Fecha de Facturación	26/12/2023	Fecha Límite de Pago	25/01/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INGENERIA CIVIL SERVICOS Y SUMINISTROS SAS	
CR 83 A 33 B 59 BRR LA CASTELLANA		900386501
Intermediario	DAYRO JOSE GONZALEZ MANTILLA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. [illegible] 25/01/2024 [illegible] esta (articulo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 22221152

Fecha de Facturación	26/12/2023	Fecha Limite de Pago	25/01/2024

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INGENERIA CIVIL SERVICOS Y SUMINISTROS SAS	
CR 83 A 33 B 59 BRR LA CASTELLANA		900386501
Intermediario	DAYRO JOSE GONZALEZ MANTILLA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000222211152(3900)000000394542(96)20240125

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900222211152(3900)000000394542(96)20240125

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ANEXO 9. Contrato

CONTRATO DE OBRA PUBLICA IP-051-2023

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
NIT	800.105.497-0
CONTRATISTA	INGENISS SAS
NIT	900386501-1
OBJETO	"CONSTRUCION DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".
VALOR:	MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.117.101.744).
PLAZO	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Entre los suscritos a saber: De una parte VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN mayor de edad y vecina de Rionegro, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.036.929.143, quien actúa en calidad de Gerente y representante Legal de la Empresa Autónoma de Guatapé, entidad derecho público con NIT 800105497-0, tal y como consta en el Decreto de nombramiento Nº080 de 09 de agosto de 2021, facultado para adquirir obligaciones y ejercer derechos en nombre de la Empresa tal como se prescribe en los Estatutos de la misma y que para los efectos del presente acto se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE" y, de la otra parte, INGENISS SAS, con NIT 900386501-1, cuyo representante legal es FERNANDO JAVIER RODRÍGUEZ PINEDA identificado con cedula No 98.503.761, quien para estos efectos se denominará "EL CONTRATISTA", hemos convenido celebrar el presente contrato de obra pública, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE al realizar la "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE', Las actividades y especificaciones técnicas para desarrollar en el presente contrato son las anexas en los estudios y documentos previos y hacen parte integral del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas en los pliegos de condiciones, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte integral del presente contrato:

BLIGACIONES GENERALES:

1. El CONTRATISTA a entregar las obras cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el estudio previo, contrato, propuesta, y demás documentos que hace parte integral del contrato, acompañados de los respectivos manuales de operación y/o funcionamiento y garantías comerciales cuando a ello haya lugar, previa verificación por parte del interventor (si aplica) del contrato de los respectivos manifiestos de aduana cuando de bienes extranjeros se trate.
2. la Constitución de las pólizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el contrato y hacer entrega de ellas de manera.
3. Exigir la Ampliación del plazo y/o monto de las garantías cuando se requiera debido a la prórroga, adición o modificación del contrato.
4. Destinar los recursos aportados exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente contrato.
5. Informar al Supervisor del Contrato, el avance de las diferentes etapas de los procesos de selección.
6. Presentar informes mensuales sobre el avance del objeto del contrato.
7. Entregar informes y facturas para el cobro de manera oportuna para efectuar los trámites correspondientes.
8. Cumplir con el aporte a seguridad social y parafiscal que correspondan según la normatividad vigente.
9. Aprobar los procedimientos constructivos propuestos y ejecutados por el constructor.
10. Prevenir y vigilar sobre deficiencias en la mano de obra, procedimientos y materiales.
11. Verificación, seguimiento e informes de avance de obra, con base a la programación y control al flujo de caja.
12. Velar por la mejor calidad de la obra y sus procesos.
13. Mantener registros fotográficos y documentos de todas sus actividades.
14. Conservar de manera independiente centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos jurídicos, contables que se generen en desarrollo del contrato sujetándose en lo pertinente a las normas vigentes aplicables.
15. Presentar informe final técnico y financiero de ejecución y demás documentos requeridos para la liquidación.
16. Convenir las obras adicionales y extras que se requieran, definiendo los precios que deban pagarse por las mismas, lo cual se someterá a la aceptación final del Municipio.
17. Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el vencimiento de los contratos de obras y de interventoría; lo anterior con previa justificación de los hechos y quedando a juicio del Municipio la determinación final.
18. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, especificaciones y controles.
19. Adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad para ejecutar el contrato, de acuerdo con lo estipulado por el gobierno nacional.
20. Legalizar el contrato en los tiempos requeridos.
21. Velar por la mejor calidad de la obra y sus procesos.
22. Mantener registros fotográficos y documentos de todas sus actividades.
23. Disponer el recurso humano profesional logístico y técnico necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades .
24. Realizar el pago oportuno de los proveedores de bienes y servicios contratados en la ejecución del presente contrato

25. Cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial, señalización y movimiento de maquinaria.
26. Participar en reuniones de seguimiento o acompañamiento concertado por el supervisor designado.
27. Tener capacidad operativa básica para ejecutar el contrato con celeridad y organización, garantizando una sede de trabajo para el equipo de personas.
28. Mantener indemne al Municipio y a la EAG de cualquier reclamacion que resultare del incumplimiento de obligaciones contractuales o que este relacionado con el objeto del contrato.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA AUTONOMA: En virtud del presente contrato LA AUTONOMA se obliga a:

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del objeto contractual.
2. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.
3. Verificar los documentos para la legalización del contrato.
4. Efectuar la supervisión del contrato.

CLAUSULA CUARTA. INTERVENTORÍA. O SUPERVISION. La supervisión del contrato estará a cargo de la Gerencia o quien esta delegue, quien deberá Supervisar y controlar la acción del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, socioambientales, legales, jurídicas, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad.

Actividades de la Supervisión:

- Realizar el control y seguimiento al objeto contractual.
- Elaborar las actas de pago e informes de supervisión.
- Revisar cuidadosamente los detalles a contratar.
- Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el objeto contractual.
- Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo la adecuada ejecución del contrato.
- Informar a la secretaria general del incumplimiento en la ejecución del objeto del presente contrato.
- Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecución del contrato y realizar los informes se supervisión parcial y final.
- Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente
-

CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato se estima para los efectos fiscales en la suma MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.117.101.744), la forma de pago será de la siguiente manera: Un Pago anticipado del

30% del valor total del contrato con la entrega de la relación de inversiones mensuales y el cronograma de actividades del contrato debidamente avalado por la interventoría.

El 70% restante se girará mediante actas parciales de avance de obra previa presentación de la respectiva acta de avance, acompañado del informe de desarrollo de las obras el cual debe contener el registro fotográfico y deberá llevar el registro a satisfacción de la interventoría

CLAUSULA SEXTA. PRESTACIONES SOCIALES. Todas las prestaciones sociales que correspondan al personal que emplee en la ejecución del proyecto, serán pagadas por EL CONTRATISTA, quien responderá ante EL CONTRATANTE por los perjuicios que le ocasione el incumplimiento de esta obligación. El CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna clase de prestaciones sociales, por cuanto no es trabajador dependiente al servicio del CONTRATANTE y por lo que el presente contrato no genera vínculo laboral.

CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de Cuatro meses (04) meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

CLAUSULA OCTAVA. AMPLIACIÓN DEL PLAZO. EL CONTRATANTE podrá conceder la ampliación del plazo para la entrega del producto contratado, cuándo por circunstancias ajenas al CONTRATISTA y fuera del control del mismo así lo justifique la Interventoría.

CLAUSULA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO. Por ninguna causa EL CONTRATANTE aceptará la cesión del presente contrato por EL CONTRATISTA, ni en todo ni en parte, pero no se considerarán dentro de esta situación aquellos subcontratos que sea necesario otorgar por parte del CONTRATISTA, para la total ejecución de lo pactado.

CLAUSULA DECIMA. SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE podrá suspender o declarar terminado el presente contrato por causas justificadas que a su juicio hagan necesaria tal suspensión o terminación al CONTRATISTA en cualquier momento, en cuyo caso éste renuncia expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal causa, pero tendrá derecho a que se liquiden y paguen los servicios correspondientes a las actividades ejecutadas conforme al contrato, hasta el momento de la suspensión o terminación.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL. Por causa de mora, ya sea en la iniciación o en la entrega del producto contratado, EL CONTRATISTA pagará al contratante el 5% del valor total del contrato, por cada día que pase del plazo fijado o de la fecha de vencimiento de las prórrogas a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA GARANTÍAS. EL CONTRATISTA para el presente contrato se exigirán garantías que amp EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE con NIT 800.105.497-0, MUNICIPIO DE PUERTO NARE con Nit 890981000-8, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses mas	Diez por ciento (10%) del valor del contrato
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	Por el plazo del contrato	Por el 100% del valor del pago anticipado
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	El plazo del contrato y tres (3) años mas	Quince por ciento (15%) del valor del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Plazo del contrato y cinco (5) años más a partir de la entrega y recibo a satisfacción de las obras.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
Responsabilidad Civil Extracontractual	El plazo del contrato	Trescientos (300) SMMLV .

El tipo de garantía, su valor, y vigencia se establece según lo requerido. No obstante, éstas deberán cumplir con las exigencias mínimas que se determinan en el artículo 41 del Manual de contratación de la EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. -Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el CONTRATANTE, podrá declarar la caducidad del presente contrato y ordenar la liquidación en el estado que se encuentre, por Resolución motivada y sin necesidad de requerimientos previos hechos al CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Contrato. Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento, igualmente será causal de caducidad las conductas contempladas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. - CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a la Empresa Autónoma de los reclamos, demandas, acciones legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionadas por el contratista, subcontratista o proveedores durante la ejecución del objeto contratado de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - MULTAS. - En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento, a El CONTRATANTE, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor de lo dejado de cumplir, sin que éstas excedan del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas las efectuará el INTERVENTOR.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - Bajo la gravedad del juramento EL CONTRATISTA declara que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el Artículo 8o. de la Ley 80 de 1993, para la celebración del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. - EL CONTRATISTA no será responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones por cualquier demora en la entrega de los servicios al CONTRATANTE si se presentare durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control.

DECIMO OCTAVA: Registro y apropiaciones presupuestales. EL CONTRATANTE pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal del sistema general de regalías número 00423 del 4 de diciembre de 2023.

CLAUSULA DECIMO NOVENA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - Se liquidará el contrato por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes al término de ejecución del contrato debiéndose observar lo dispuesto en articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA VIGESIMA. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes contratantes expedición del registro presupuestal a cargo del CONTRATANTE, las respectivas garantías aprobadas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto Nare, Antioquia.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE FIRMA
El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente.

Proyecto: Sara Giraldo Marín	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda

ANEXO 10. Acta de inicio

ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
MODALIDAD DE CONTRATACION	INVITACION PRIVADA		
Contrato número:	051	de	2023
Objeto del contrato: "CONSTRUCION DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".			
Supervisor:	DANIELA GUARIN CARDONA		
Contratista:	INGENISS SAS		
Valor del contrato:	MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.117.101.744).		
Duración del contrato:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		

Fecha:	25	de	ENERO	de	2024

CONSIDERANDO:
Que entre LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE y INGENISS SAS, con NIT 900386501-1, cuyo representante legal es FERNANDO JAVIER RODRÍGUEZ PINEDA identificado con cedula No 98.503.761, se celebró el contrato IP 051 de 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE" por un valor de MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.117.101.744), Que el registro presupuestal es el 524 del veinticinco(25) de enero de 2024, el contrato fue suscrito por las partes el veinticinco (25) de enero de 2024, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el interventor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato IP 051 de 2023, el día veinticinco (25) de enero de 2024.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE FIRMA
El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente.

Proyecto: Juliana Marulanda	Revisó: Alejandra Giraldo	Aprobó: Alejandra Giraldo

ANEXO 11. Seguridad social y parafiscales



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 38.288.340
ZAPATA MENESES
APELLIDOS
GLORIA DULFAY
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1977
HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

10-OCT-1996 HONDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0116800-00210179-F-0038288340-20100122 0020217952A 1 1650604514

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 3 3 F 0 F 5 D E 8 5 D 0 A 5 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA DULFAY ZAPATA MENESES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38288340 de HONDA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 151512-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



151512-T

GLORIA DULFAY
ZAPATA MENESES
C.C. 38288340
RESOLUCION INSCRIPCION 204 **FECHA 01/07/2010**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO **162039**

FIRMA DEL TITULAR

76472

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

LORIA DULFAY ZAPATA MENESES

CONTADORA PUBLICA

TP No 151512 -T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

NIT 900386501-1

Yo, **GLORIA DULFAY ZAPATA MENESES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.288.340, y con Tarjeta Profesional No. 151512-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de **INGENIERIA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S** identificada con NIT. **900386501-1**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Puerto Nare (ANT.), a los 27 días del mes de junio del 2024.

GLORIA DULFAY ZAPATA MENESES

C.C. 38.288.340 de Honda (Tol)

MOVIL 3232867901

CR 6 Nro. 51-44 Héctor Duque

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N° 30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	736996118	9469319778	E	2024/02/02	2024/06/28	BANCOLOMBIA	147	$771,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGENISS (5 Afiliados)						$2,215,920	$354,700			$2,215,920	$88,800			$2,215,920	$88,800			$2,215,920	$154,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (5 Afiliados)						**$2,215,920**	**$354,700**			**$2,215,920**	**$88,800**			**$2,215,920**	**$88,800**			**$2,215,920**	**$154,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						**$2,215,920**	**$354,700**			**$2,215,920**	**$88,800**			**$2,215,920**	**$88,800**			**$2,215,920**	**$154,400**		**$0**	**$0**
1	CC	1036134191	JARAMILLO HENAO ANGIE PAOLA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF04	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
2	CC	1036134812	MONDRAGON OSORIO MANUELA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS010	6	$260,000	$10,400	CCF04	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
3	CC	91432977	PERALTA QUINTANA ROBINSON	25-14	6	$466,320	$74,700	EPS037	6	$466,320	$18,700	CCF04	6	$466,320	$18,700	14-11	6	$466,320	$32,500	6	$0	$0
4	CC	21849881	QUINTERO HENAO BIBIANA FARLEY	230301	6	$533,600	$85,400	EPS037	6	$533,600	$21,400	CCF04	6	$533,600	$21,400	14-11	6	$533,600	$37,200	6	$0	$0
5	CC	71798422	URIBE BARCENAS JUAN ANDRES	231001	6	$696,000	$111,400	EPS010	6	$696,000	$27,900	CCF04	6	$696,000	$27,900	14-11	6	$696,000	$48,500	6	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$2,215,920**	**$354,700**			**$2,215,920**	**$88,800**			**$2,215,920**	**$88,800**			**$2,215,920**	**$154,400**		**$0**	**$0**

2024/06/28 02:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N° 30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	736996118	9469319778	E	2024/02/02	2024/06/28	BANCOLOMBIA	147	$771,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$354,700	$44,000	$0	$398,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$111,400	$13,800	$0	$125,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$74,700	$9,300	$0	$84,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$168,600	$20,900	$0	$189,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$154,400	$19,100	$0	$173,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$154,400	$19,100	$0	$173,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$88,800	$11,000	$0	$99,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$88,800	$11,000	$0	$99,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$88,800	$11,100	$0	$99,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$38,300	$4,800	$0	$43,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$50,500	$6,300	$0	$56,800
TOTAL				5	$686,700	$85,200	$0	$771,900

2024/06/28 02:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N°30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	736996118	9469319896	E	2024/03/04	2024/03/02	BANCOLOMBIA	0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGENISS (5 Afiliados)						$11,079,600	$1,772,800			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$771,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (5 Afiliados)						**$11,079,600**	**$1,772,800**			**$11,079,600**	**$443,300**			**$11,079,600**	**$443,300**			**$11,079,600**	**$771,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						**$11,079,600**	**$1,772,800**			**$11,079,600**	**$443,300**			**$11,079,600**	**$443,300**			**$11,079,600**	**$771,300**		**$0**	**$0**
1	CC	1036134191	JARAMILLO HENAO ANGIE PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1036134812	MONDRAGON OSORIO MANUELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	91432977	PERALTA QUINTANA ROBINSON	25-14	30	$2,331,600	$373,100	EPS037	30	$2,331,600	$93,300	CCF04	30	$2,331,600	$93,300	14-11	30	$2,331,600	$162,300	30	$0	$0
4	CC	21849881	QUINTERO HENAO BIBIANA FARLEY	230301	30	$2,668,000	$426,900	EPS037	30	$2,668,000	$106,800	CCF04	30	$2,668,000	$106,800	14-11	30	$2,668,000	$185,700	30	$0	$0
5	CC	71798422	URIBE BARCENAS JUAN ANDRES	231001	30	$3,480,000	$556,800	EPS010	30	$3,480,000	$139,200	CCF04	30	$3,480,000	$139,200	14-11	30	$3,480,000	$242,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$11,079,600**	**$1,772,800**			**$11,079,600**	**$443,300**			**$11,079,600**	**$443,300**			**$11,079,600**	**$771,300**		**$0**	**$0**

2024/06/28 03:32 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N°30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	736996118	9469319896	E	2024/03/04	2024/03/02	BANCOLOMBIA	0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,772,800	$0	$0	$1,772,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$556,800	$0	$0	$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$373,100	$0	$0	$373,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$842,900	$0	$0	$842,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$771,300	$0	$0	$771,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$771,300	$0	$0	$771,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$443,300	$0	$0	$443,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$443,300	$0	$0	$443,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$443,300	$0	$0	$443,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$191,200	$0	$0	$191,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$252,100	$0	$0	$252,100
TOTAL				5	$3,430,700	$0	$0	$3,430,700

2024/06/28 03:32 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N°30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	736996118	9469319943	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGENISS (5 Afiliados)						$11,079,600	$1,772,800			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$771,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (5 Afiliados)						$11,079,600	$1,772,800			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$771,300		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						$11,079,600	$1,772,800			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$771,300		$0	$0
1	CC	1036134191	JARAMILLO HENAO ANGIE PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1036134812	MONDRAGON OSORIO MANUELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	91432977	PERALTA QUINTANA ROBINSON	25-14	30	$2,331,600	$373,100	EPS037	30	$2,331,600	$93,300	CCF04	30	$2,331,600	$93,300	14-11	30	$2,331,600	$162,300	30	$0	$0
4	CC	21849881	QUINTERO HENAO BIBIANA FARLEY	230301	30	$2,668,000	$426,900	EPS037	30	$2,668,000	$106,800	CCF04	30	$2,668,000	$106,800	14-11	30	$2,668,000	$185,700	30	$0	$0
5	CC	71798422	URIBE BARCENAS JUAN ANDRES	231001	30	$3,480,000	$556,800	EPS010	30	$3,480,000	$139,200	CCF04	30	$3,480,000	$139,200	14-11	30	$3,480,000	$242,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$11,079,600	$1,772,800			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$443,300			$11,079,600	$771,300		$0	$0

2024/06/28 03:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N°30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	736996118	9469319943	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,772,800	$0	$0	$1,772,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$556,800	$0	$0	$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$373,100	$0	$0	$373,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$842,900	$0	$0	$842,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$771,300	$0	$0	$771,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$771,300	$0	$0	$771,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$443,300	$0	$0	$443,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$443,300	$0	$0	$443,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$443,300	$0	$0	$443,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$191,200	$0	$0	$191,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$252,100	$0	$0	$252,100
TOTAL				5	$3,430,700	$0	$0	$3,430,700

2024/06/28 03:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N° 30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	436839835	9462627847	E	2024/02/02	2024/02/05	BANCOLOMBIA	3	$9,797,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGENISS (3 Afiliados)						$7,700,000	$1,232,000			$7,700,000	$308,000			$7,700,000	$308,000			$7,700,000	$536,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (3 Afiliados)						**$7,700,000**	**$1,232,000**			**$7,700,000**	**$308,000**			**$7,700,000**	**$308,000**			**$7,700,000**	**$536,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						**$7,700,000**	**$1,232,000**			**$7,700,000**	**$308,000**			**$7,700,000**	**$308,000**			**$7,700,000**	**$536,000**		**$0**	**$0**
1	CC	91136034	AGUDELO RIAÑO JORGE ORLANDO	230301	22	$2,200,000	$352,000	EPS037	22	$2,200,000	$88,000	CCF04	22	$2,200,000	$88,000	14-11	22	$2,200,000	$153,200	22	$0	$0
2	CC	1007511967	CAMACHO MARIN DAYANA MELISA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
3	CC	98505041	DURANGO ZORA SERGIO AMAURY	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FERNANDO (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Centro de Trabajo: FERNANDO (1 Afiliados)						**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$15,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$15,700**		**$0**	**$0**
4	CC	98503761	RODRIGUEZ PINEDA FERNANDO JAVIER	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO PUERTO NARE (12 Afiliados)						$17,706,000	$2,833,000			$17,706,000	$708,300			$17,706,000	$708,300			$17,706,000	$1,232,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PROYECTO PUERTO NARE (12 Afiliados)						**$17,706,000**	**$2,833,000**			**$17,706,000**	**$708,300**			**$17,706,000**	**$708,300**			**$17,706,000**	**$1,232,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)						**$17,706,000**	**$2,833,000**			**$17,706,000**	**$708,300**			**$17,706,000**	**$708,300**			**$17,706,000**	**$1,232,700**		**$0**	**$0**
5	CC	71481028	AMAYA AGUDELO JOSE MANUEL	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
6	CC	1001444064	BARRERA GARIBELLO GUILLERMO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	10189913	BUSTOS MORALES JOSE GABRIEL	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS040	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
8	CC	1036221477	GARCIA GOMEZ JHON ALEXANDER	230301	9	$390,000	$62,400	EPS040	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
9	CC	1001526193	GARCIA VILLEGAS JOHN ALEXANDER	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS040	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
10	CC	1001443473	GONZALEZ MAYA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	1036222804	GONZALEZ COLORADO JOHN JAIRO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
12	CC	1007610740	GONZALEZ GARCIA LUIS JAVIER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	1036134098	MORALES ZAPATA MARIA CRISTINA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
14	CC	1001443193	OROSCO GARCIA LEONARDO	231001	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF04	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
15	CC	1024526620	ORTEGA DORADO PAOLA ANDREA	230301	30	$1,456,000	$233,000	EPS037	30	$1,456,000	$58,300	CCF04	30	$1,456,000	$58,300	14-11	30	$1,456,000	$101,400	30	$0	$0
16	CC	77029042	PERALTA GUERRA JUAN DE DIOS	231001	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO SIERRA (9 Afiliados)						$3,773,334	$603,800			$3,773,334	$151,000			$3,773,334	$151,000			$3,773,334	$263,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PROYECTO SIERRA (9 Afiliados)						**$3,773,334**	**$603,800**			**$3,773,334**	**$151,000**			**$3,773,334**	**$151,000**			**$3,773,334**	**$263,100**		**$0**	**$0**

2024/03/04 11:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)						$3,773,334	$603,800			$3,773,334	$151,000			$3,773,334	$151,000			$3,773,334	$263,100		$0	$0
17	CC	21854633	AMAYA TOBON LADY INDIRA	230301	9	$900,000	$144,000	EPS040	9	$900,000	$36,000	CCF04	9	$900,000	$36,000	14-11	9	$900,000	$62,700	9	$0	$0
18	CC	1007396801	DUSAN AGUDELO YOVER ALEXANDER	230301	9	$390,000	$62,400	EPS040	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
19	CC	1039704961	GARCIA GONZALEZ KEVIN ANDRES	25-14	9	$390,000	$62,400	EPS040	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
20	CC	98504384	GARCIA GARCIA WILSON ALBEIRO	230201	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF04	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
21	CC	1007511871	JARAMILLO PIEDRAHITA DANIEL SANTIAGO	230201	9	$390,000	$62,400	EPS040	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
22	CC	21940072	LONDOÑO LINA PATRICIA	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$3,500	CCF04	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
23	CC	70167489	MOLINA JIMENEZ JEFERSON ALEXANDER	230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
24	CC	1036134335	RENGIFO LOAIZA DIEGO ANDRES	230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
25	CC	12135748	SOTO PENAGOS JOSE WALTER	230301	9	$750,000	$120,000	EPS037	9	$750,000	$30,000	CCF04	9	$750,000	$30,000	14-11	9	$750,000	$52,200	9	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**					$32,179,334	$5,148,800			$32,179,334	$1,287,300			$32,179,334	$1,287,300			$32,179,334	$2,047,500		$0	$0

2024/03/04 11:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N° 30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	436839835	9462627847	E	2024/02/02	2024/02/05	BANCOLOMBIA	3	$9,797,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$5,148,800	$14,100	$0	$5,162,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$249,600	$700	$0	$250,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$462,400	$1,300	$0	$463,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,152,500	$11,300	$0	$4,163,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$284,300	$800	$0	$285,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,047,500	$5,600	$0	$2,053,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$2,047,500	$5,600	$0	$2,053,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,287,300	$3,500	$0	$1,290,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	25	$1,287,300	$3,500	$0	$1,290,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$1,287,300	$3,800	$0	$1,291,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$3,500	$100	$0	$3,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$272,000	$800	$0	$272,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$585,400	$1,600	$0	$587,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$400	$0	$120,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$254,400	$700	$0	$255,100
TOTAL				25	$9,770,900	$27.000	$0	$9,797,900

2024/03/04 11:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N° 30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	549243824	9465238881	E	2024/03/04	2024/04/02	BANCOLOMBIA	29	$13,233,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGENISS (3 Afiliados)						$8,500,000	$1,360,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$591,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (3 Afiliados)						**$8,500,000**	**$1,360,000**			**$8,500,000**	**$340,000**			**$8,500,000**	**$340,000**			**$8,500,000**	**$591,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						**$8,500,000**	**$1,360,000**			**$8,500,000**	**$340,000**			**$8,500,000**	**$340,000**			**$8,500,000**	**$591,600**		**$0**	**$0**
1	CC	91136034	AGUDELO RIAÑO JORGE ORLANDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
2	CC	1007511967	CAMACHO MARIN DAYANA MELISA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
3	CC	98505041	DURANGO ZORA SERGIO AMAURY	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FERNANDO (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Centro de Trabajo: FERNANDO (1 Afiliados)						**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$15,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$15,700**		**$0**	**$0**
4	CC	98503761	RODRIGUEZ PINEDA FERNANDO JAVIER	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO PUERTO NARE (11 Afiliados)						$16,012,668	$2,562,200			$16,012,668	$640,700			$16,012,668	$640,700			$16,012,668	$1,114,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PROYECTO PUERTO NARE (11 Afiliados)						**$16,012,668**	**$2,562,200**			**$16,012,668**	**$640,700**			**$16,012,668**	**$640,700**			**$16,012,668**	**$1,114,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)						**$16,012,668**	**$2,562,200**			**$16,012,668**	**$640,700**			**$16,012,668**	**$640,700**			**$16,012,668**	**$1,114,800**		**$0**	**$0**
5	CC	71481028	AMAYA AGUDELO JOSE MANUEL	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
6	CC	1001444064	BARRERA GARIBELLO GUILLERMO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	10189913	BUSTOS MORALES JOSE GABRIEL	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS040	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
8	CC	1036221477	GARCIA GOMEZ JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1001526193	GARCIA VILLEGAS JOHN ALEXANDER	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS040	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
10	CC	1001443473	GONZALEZ MAYA ANDRES FELIPE	230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF04	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
11	CC	1036222804	GONZALEZ COLORADO JOHN JAIRO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
12	CC	1007610740	GONZALEZ GARCIA LUIS JAVIER	230201	10	$433,334	$69,400	EPS010	10	$433,334	$17,400	CCF04	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
13	CC	1036134098	MORALES ZAPATA MARIA CRISTINA	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS037	15	$1,000,000	$40,000	CCF04	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	$69,600	15	$0	$0
14	CC	1024526620	ORTEGA DORADO PAOLA ANDREA	230301	30	$1,456,000	$233,000	EPS037	30	$1,456,000	$58,300	CCF04	30	$1,456,000	$58,300	14-11	30	$1,456,000	$101,400	30	$0	$0
15	CC	77029042	PERALTA GUERRA JUAN DE DIOS	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO SIERRA (10 Afiliados)						$14,816,667	$2,370,700			$14,816,667	$592,700			$14,816,667	$592,700			$14,816,667	$1,031,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PROYECTO SIERRA (10 Afiliados)						**$14,816,667**	**$2,370,700**			**$14,816,667**	**$592,700**			**$14,816,667**	**$592,700**			**$14,816,667**	**$1,031,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)						**$14,816,667**	**$2,370,700**			**$14,816,667**	**$592,700**			**$14,816,667**	**$592,700**			**$14,816,667**	**$1,031,400**		**$0**	**$0**

2024/06/24 11:23 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
16	CC	21854633	AMAYA TOBON LADY INDIRA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS040	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
17	CC	1007396801	DUSAN AGUDELO YOVER ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	1039704961	GARCIA GONZALEZ KEVIN ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	98504384	GARCIA GARCIA WILSON ALBEIRO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	1007511871	JARAMILLO PIEDRAHITA DANIEL SANTIAGO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
21	CC	21940072	LONDOÑO LINA PATRICIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
22	CC	70167489	MOLINA JIMENEZ JEFERSON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
23	CC	1036134335	RENGIFO LOAIZA DIEGO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
24	CC	12135748	SOTO PENAGOS JOSE WALTER	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
25	CC	98502916	VILLAMIL VELEZ RENSO DE JESUS	230301	5	$216,667	$34,700	EPS040	5	$216,667	$8,700	CCF04	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**					**$42,329,335**	**$6,772,900**			**$42,329,335**	**$1,693,400**			**$42,329,335**	**$1,693,400**			**$42,329,335**	**$2,753,500**		**$0**	**$0**

2024/06/24 11:23 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N° 30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	549243824	9465238881	E	2024/03/04	2024/04/02	BANCOLOMBIA	29	$13,233,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$6,772,900	$168,100	$0	$6,941,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$5,200	$0	$213,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$608,000	$15,100	$0	$623,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$5,471,500	$135,700	$0	$5,607,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$485,400	$12,100	$0	$497,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,753,500	$68,300	$0	$2,821,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$2,753,500	$68,300	$0	$2,821,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,693,400	$42,000	$0	$1,735,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	25	$1,693,400	$42,000	$0	$1,735,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$1,693,400	$42,200	$0	$1,735,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$237,400	$5,900	$0	$243,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$739,300	$18,400	$0	$757,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$3,000	$0	$123,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$492,700	$12,300	$0	$505,000
TOTAL				25	$12,913,200	$320,600	$0	$13,233,800

2024/06/24 11:23 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N° 30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	594670075	9466097074	E	2024/04/02	2024/04/24	BANCOLOMBIA	22	$12,384,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: S/OBRA (1 Afiliados)						$1,773,334	$283,800			$1,773,334	$71,000			$1,773,334	$71,000			$1,773,334	$123,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (1 Afiliados)						**$1,773,334**	**$283,800**			**$1,773,334**	**$71,000**			**$1,773,334**	**$71,000**			**$1,773,334**	**$123,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						**$1,773,334**	**$283,800**			**$1,773,334**	**$71,000**			**$1,773,334**	**$71,000**			**$1,773,334**	**$123,500**		**$0**	**$0**
1	CC	1035870917	ROJAS BERNAL LAURA VANESSA	230201	19	$1,773,334	$283,800	EPS037	19	$1,773,334	$71,000	CCF04	19	$1,773,334	$71,000	14-11	19	$1,773,334	$123,500	19	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGENISS (2 Afiliados)						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$382,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (2 Afiliados)						**$5,500,000**	**$880,000**			**$5,500,000**	**$220,000**			**$5,500,000**	**$220,000**			**$5,500,000**	**$382,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						**$5,500,000**	**$880,000**			**$5,500,000**	**$220,000**			**$5,500,000**	**$220,000**			**$5,500,000**	**$382,800**		**$0**	**$0**
2	CC	1007511967	CAMACHO MARIN DAYANA MELISA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
3	CC	98505041	DURANGO ZORA SERGIO AMAURY	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FERNANDO (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Centro de Trabajo: FERNANDO (1 Afiliados)						**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$15,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$15,700**		**$0**	**$0**
4	CC	98503761	RODRIGUEZ PINEDA FERNANDO JAVIER	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO PUERTO NARE (8 Afiliados)						$13,756,000	$2,201,000			$13,756,000	$550,300			$13,756,000	$550,300			$13,756,000	$957,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PROYECTO PUERTO NARE (8 Afiliados)						**$13,756,000**	**$2,201,000**			**$13,756,000**	**$550,300**			**$13,756,000**	**$550,300**			**$13,756,000**	**$957,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)						**$13,756,000**	**$2,201,000**			**$13,756,000**	**$550,300**			**$13,756,000**	**$550,300**			**$13,756,000**	**$957,600**		**$0**	**$0**
5	CC	71481028	AMAYA AGUDELO JOSE MANUEL	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
6	CC	1001444064	BARRERA GARIBELLO GUILLERMO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	10189913	BUSTOS MORALES JOSE GABRIEL	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS040	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
8	CC	1036221477	GARCIA GOMEZ JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1001526193	GARCIA VILLEGAS JOHN ALEXANDER	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS040	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
10	CC	1036222804	GONZALEZ COLORADO JOHN JAIRO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
11	CC	1024526620	ORTEGA DORADO PAOLA ANDREA	230301	30	$1,456,000	$233,000	EPS037	30	$1,456,000	$58,300	CCF04	30	$1,456,000	$58,300	14-11	30	$1,456,000	$101,400	30	$0	$0
12	CC	77029042	PERALTA GUERRA JUAN DE DIOS	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO SIERRA (11 Afiliados)						$15,856,667	$2,537,100			$15,856,667	$634,300			$15,856,667	$634,300			$15,856,667	$1,103,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PROYECTO SIERRA (11 Afiliados)						**$15,856,667**	**$2,537,100**			**$15,856,667**	**$634,300**			**$15,856,667**	**$634,300**			**$15,856,667**	**$1,103,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)						**$15,856,667**	**$2,537,100**			**$15,856,667**	**$634,300**			**$15,856,667**	**$634,300**			**$15,856,667**	**$1,103,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
13	CC	21854633	AMAYA TOBON LADY INDIRA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS040	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
14	CC	1007396801	DUSAN AGUDELO YOVER ALEXANDER	230301	17	$736,667	$117,900	EPS040	17	$736,667	$29,500	CCF04	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
15	CC	1039704961	GARCIA GONZALEZ KEVIN ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	98504384	GARCIA GARCIA WILSON ALBEIRO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	1007511871	JARAMILLO PIEDRAHITA DANIEL SANTIAGO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	21940072	LONDOÑO LINA PATRICIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	70167489	MOLINA JIMENEZ JEFERSON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	98504459	PARRA PEÑA EDINSON	230201	12	$520,000	$83,200	EPS040	12	$520,000	$20,800	CCF04	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
21	CC	1036134335	RENGIFO LOAIZA DIEGO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
22	CC	12135748	SOTO PENAGOS JOSE WALTER	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
23	CC	98502916	VILLAMIL VELEZ RENSO DE JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(23)**					$39,886,001	$6,381,900			$39,886,001	$1,595,600			$39,886,001	$1,595,600			$39,886,001	$2,583,400		$0	$0

2024/06/24 11:22 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900386501	1	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLECTORES	KR 80B N° 30A-45	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5898981	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	594670075	9466097074	E	2024/04/02	2024/04/24	BANCOLOMBIA	22	$12,384,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$6,381,900	$119,400	$0	$6,501,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$3,900	$0	$211,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$608,000	$11,400	$0	$619,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,782,900	$89,400	$0	$4,872,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$783,000	$14,700	$0	$797,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,583,400	$48,300	$0	$2,631,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$2,583,400	$48,300	$0	$2,631,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,595,600	$29,900	$0	$1,625,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	23	$1,595,600	$29,900	$0	$1,625,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$1,595,600	$30,100	$0	$1,625,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$1,000	$0	$53,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$220,000	$4,200	$0	$224,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$1,000	$0	$53,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$617,300	$11,600	$0	$628,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$2,300	$0	$122,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	$534,300	$10,000	$0	$544,300
TOTAL				23	$12,156,500	$227,700	$0	$12,384,200

2024/06/24 11:22 AM

ANEXO 12. Soportes de administración

CUENTA DE COBRO No.001

INGENISS S.A.S
NIT 900.386.501-1

DEBE A:

MATILDE DEL ROSARIO MUÑOZ
NIT 42.878.502-7

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000)

POR CONCEPTO DE:

PAPELERÍA

Puerto Nare, 23 de febrero de 2024

MATILDE DEL ROSARIO MUÑOZ
CC. 42.878.502

CUENTA DE COBRO No.002

INGENISS S.A.S
NIT 900.386.501-1

DEBE A:

MATILDE DEL ROSARIO MUÑOZ
NIT 42.878.502-7

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000)

POR CONCEPTO DE:

PAPELERÍA

Puerto Nare, 26 de marzo de 2024

MATILDE DEL ROSARIO MUÑOZ
CC. 42.878.502

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

8. Consecutivo: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14114129541

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 42878502 - 7

6. DV

12. Dirección seccional

13. Impuestos de Medida: 11

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de Contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 2 Cédula de ciudadanía

26. Número de Identificación: 42878502

27. Fecha expedición: 19810820

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: 05 Antioquia

30. Ciudad/Municipio: Envigado 266

31. Primer apellido: MUÑOZ

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre: MATILDE

34. Otros nombres: DEL ROSARIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Antioquia 05

40. Ciudad/Municipio: Medellín 001

41. Dirección: CL 48 D 102 B 36 AP 202

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 4067929

45. Teléfono 2: 3014444413

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5529	20090713					9210	

Responsabilidades

53. Código: 12

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 10

61. Fecha: 20090930

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del declarante: Matilde Muñoz

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada: Ricardo M

954. Nombre: MONTOYA CORREA RICARDO ALBERTO

955. Cargo: Facilitador IV

Powered by CamScanner

REF: CUENTA DE COBRO No.001 IP-051-2023 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE"

INGENISS S.A.S
NIT 900.386.501-1

DEBE A:

CARLOS GUILLERMO MARTINEZ GRANADA
NIT 98.465.821-2

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CIEN MIL PESOS ($1.100.000)

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2024

Puerto Nare, 23 de febrero de 2024

CARLOS GUILLERMO MARTINEZ GRANADA
CC. 98.465.821-2

REF: CUENTA DE COBRO No.002 IP-051-2023 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE"

INGENISS S.A.S
NIT 900.386.501-1

DEBE A:

CARLOS GUILLERMO MARTINEZ GRANADA
NIT 98.465.821-2

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CIEN MIL PESOS ($1.100.000)

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024

Puerto Nare, 22 de marzo de 2024

CARLOS GUILLERMO MARTINEZ GRANADA
CC. 98.465.821-2

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14494302904

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 8 4 6 5 8 2 1	2	Impuestos de Medellín: 1 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida: 2	Cédula de ciudadanía: 1 3	9 8 4 6 5 8 2 1	1 9 8 8 1 0 0 3

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Valparaíso 8 5 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	GRANADA	CARLOS	GUILLERMO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
PUBLIUNIVERSAL	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 53 53 74 OF 301

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
etikos@une.net.co		2 5 1 4 5 8 0	3 1 1 3 0 7 9 5 9 6

CLASIFICACION

Actividad económica:

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 1	2 0 0 0 0 9 2 7	4 6 6 3	2 0 0 9 0 1 0 1	1 3 1 3	5 6 2 1	1 4 1 8	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	1	1	2	2	4	2																			

42- Impto. renta y compl. régimen ordinar
11- Ventas régimen común
2[illegible] Obligado a cumplir deberes formales a
5[illegible] Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 1 2 1 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

994. Nombre: MARTINEZ GRANADA CARLOS GUILLERMO
995. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 13-12-2018 09:51:02AM

Puerto Nare, 23 de febrero de 2024

CUENTA DE COBRO N°001

INGENISS S.A.S.
NIT: 900386501-1

DEBE A:

JORGE HUMBERTO CRUZ TORRES
NIT: 98514384-6

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($230.000)

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO

JORGE HUMBERTO CRUZ TORRES
C.C. 98.514.384

Puerto Nare, 26 de marzo de 2024

CUENTA DE COBRO N°002

INGENISS S.A.S.
NIT: 900386501-1

DEBE A:

JORGE HUMBERTO CRUZ TORRES
NIT: 98514384-6

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($230.000)

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO

JORGE HUMBERTO CRUZ TORRES
C.C. 98.514.384

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

7 Concepto 0 2 Actualización

4 Número de formulario 142826799

5 Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 8 5 1 4 3 8 4 - 6

8 DV 12 Dirección seccional

14 Autor electrónico

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente
Persona natural o sucesión ilíquida

25 Tipo de documento
2 Cédula de ciudadanía

26 Número de identificación
1 3 9 8 5 1 4 3 8 4

Fecha expedición
1 9 1 0 2 0 0 4

Lugar de expedición
COLOMBIA

28 País

29 Departamento
1 6 9 Antioquia

30 Ciudad/Municipio
0 5 Itagüí

31 Primer apellido
CRUZ

32 Segundo apellido
TORRES

33 Primer nombre
JORGE

34 Otros nombres
HUMBERTO

35 Sexo

UBICACION

36 País
COLOMBIA

39 Departamento
1 6 9 Antioquia

40 Ciudad/Municipio
0 5 Medellín

41 Dirección principal
CR 45 1 59 AP 205 TO 4

42 Correo electrónico
juancitovere2@hotmail.com

43 Código postal

44 Teléfono 1
2 2 8 2 5 5 8

45 Teléfono 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal
46 Código 47 Fecha inicio actividad
4 9 2 1 2 0 1 1 0 2 0 1

Actividad secundaria
48 Código 49 Fecha inicio actividad
4 9 2 2 2 0 1 1 0 2 0 1

Otras actividades
50 Código 1 2
4 9 2 3

Ocupación
51 Código
1 3 1 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
52 Código 1 2 2 2

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
53 Código
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores
28 Forma 29 Tipo
Servicios 1 2 3
31 Mes
32 Año

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

56 Anexos SI NO X

60 No. de Folios 0

61 Fecha 2 0 1 4

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y se entenderá suministrada bajo la gravedad del juramento, quedando sometidas a las sanciones establecidas en el artículo 15 del Decreto 1460 de noviembre de 2013

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

964 Nombre CRUZ TORRES JORGE HUMBERTO

965 Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha gestión documento

CUENTA DE COBRO N°1

INGENISS S.A.S
NIT: 900.386.501-1

DEBE A:

YOVANI GARCÍA AGUIRRE
NIT: 1.017.132.701-4

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($280.000)

POR CONCEPTO DE:

TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR TOTAL
1	DEL 25 DE ENERO AL 25 FEBRERO DE 2024	1	$280.000
TOTAL			**$280.000**

Dado en Puerto Nare a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2024

YOVANI GARCÍA AGUIRRE
C.C. 1.017.132.701

CUENTA DE COBRO N°2

INGENISS S.A.S
NIT: 900.386.501-1

DEBE A:

YOVANI GARCÍA AGUIRRE
NIT: 1.017.132.701-4

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($280.000)

POR CONCEPTO DE:

TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR TOTAL
1	DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2024	1	$280.000
TOTAL			**$280.000**

Dado en Puerto Nare a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2024

YOVANI GARCÍA AGUIRRE
C.C. 1.017.132.701

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4 Numero de formulario 14260494911

(415)7707212489984(8020) 000001426049491 1

5 Numero de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 7 1 3 2 7 0 1 — 4

6 DV

12 Dirección seccional

14 Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesion iliquida

25 Tipo de documento: 2 Cédula de ciudadanía

26 Número de Identificación: 1 3 1 0 1 7 1 3 2 7 0 1

27 Fecha expedición: 2 0 0 4 0 7 1 6

Lugar de expedicion: 28 País: COLOMBIA

29 Departamento: 1 6 9 Antioquia

30 Ciudad/Municipio: 0 5 Medellin 0 0 1

31 Primer apellido: GARCIA

32 Segundo apellido: AGUIRRE

33 Primer nombre: YOVANNY

34 Otros nombres

Razón Social

36 Nombre comercial

37 Sigla

UBICACION

38 País: COLOMBIA

39 Departamento: 1 6 9 Antioquia

40 Ciudad/Municipio: 0 5 Medellin 0 0 1

41 Dirección: CR 34 CL 86 B 18

42 Correo electrónico: garcia_yovanny@hotmail.com

43 Apartado aereo

44 Teléfono 1: 2 1 3 0 5 3 7

45 Teléfono 2: 3 1 7 4 4 1 2 2 6 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46 Código: 8 2 9 9

47 Fecha inicio actividad: 2 0 0 7 0 7 3 0

Actividad secundaria

48 Código: 5 2 2 4

49 Fecha inicio actividad: 2 0 0 7 0 7 3 0

Otras actividades

50 Código: 1 2

Ocupación

51 Código: 1 4 1 8

52 Número establecimientos

Responsabilidades

53 Código: 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios zduaneros

54 Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55 Forma 56 Tipo

Servicio 1 2 3

57 Modo

58 CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI X NO

60. No. de Folios 2

61 Fecha 2 0 1 3 1 0 0 1

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderá exactamente a la realidad por lo anterior cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984 Nombre FERNANDEZ SOTERO LIKZA JOHANA

985 Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 01-10-2013 09:58 01AM

ANEXO 13. Informe No1 HSE

INFORME No1 – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA

PERIODO DE INFORME:

25 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

INGENISS

Ingeniería Civil Servicios y Suministros

INGENISS S.A.S
NIT 900.386.501-1

"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".

CONTRATANTE: EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ.

NIT: 800.105.497-0

CONTRATISTA: " INGENIERÍA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS."

NIT: 900.386.501-1

INTERVENTORIA: YIRAUDIS TATIANA BUITRAGO RICO

CC.: 63.500.592

SUPERVISOR: DANIELA GUARÍN CARDONA.

CC: 1.020.441.899

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
3. RELACIÓN DE FRENTES DE OBRA ACTIVOS 6
4. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 6
5. COMPONENTE GENERAL 7
5.1 CAPACITACIONES 8
5.1.2 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 9
5.1.3 REGISTRO DE CAPACITACIÓN 11
5.2 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 11
5.3 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 13
5.4 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (PGIO) 13
5.5 CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 13
5.6 GESTIÓN SOCIAL: BUZÓN DE SUGERENCIAS(PQRS), VOLANTES INFORMATIVOS 15
5.7 BUZÓN DE SUGERENCIA 15
5.8 SUSTANCIAS QUÍMICAS 16
5.9 PROYECTO INTEGRAL DEL CUIDADO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA. 16
5.10 ORDEN Y ALMACENAMIENTO DE CERÁMICA, TEJA Y ARENA. 17
5.11 ORDEN Y ASEO EN LA OBRA 18
6. PLAN DE EMERGENCIAS 20
7. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 21
8. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN 22
9. ANEXOS 24

Ilustración 1. Pausa activa. 9
Ilustración 2. Pausa activa 9
Ilustración 4.Pausa activa 9
Ilustración 5. Pausa activa 9
Ilustración 6. Registro de asistencia. 10
Ilustración 7. Pausa activa. 10
Ilustración 8. Capacitación SST 10
Ilustración 9. Registro de asistencia 10
Ilustración 10. Pausa activa. 10
Ilustración 11. Pausa activa 10
Ilustración 12. Entrega de elementos de protección personal 11
Ilustración 13. Entrega de elementos de protección personal 11
Ilustración 14. Entrega de elementos de protección personal 12
Ilustración 15. Entrega de elementos de protección personal 12
Ilustración 16. Entrega de elementos de protección personal. 12
Ilustración 17. Entrega de elementos de protección personal. 12
Ilustración 18. Entrega de elementos de protección personal 12
Ilustración 19. Entrega de elementos de protección personal 12
Ilustración 20. Punto ecológico. 14
Ilustración 21. Punto ecológico reciclaje. 14
Ilustración 22. Kit control antiderrames 14
Ilustración 23. Volantes informativos 15
Ilustración 24. Volantes informativos 15
Ilustración 25. Buzón de sugerencias 15
Ilustración 26. Adecuación del baño. 17
Ilustración 27. Cuidado y mantenimiento del baño 17
Ilustración 28. Concientización ambienta 17
Ilustración 29. Concientización cuidado del medio ambiente 17
Ilustración 30. Cemento almacenado 18
Ilustración 31. Encerramiento con cinta 18
Ilustración 32. Cinta de señalización 18
Ilustración 33. Material almacenado 18
Ilustración 34. Brigada de aseo y limpieza 19
Ilustración 35. Brigada de aseo y limpieza 19
Ilustración 36. Brigada de orden y aseo 19
Ilustración 37. Brigada de orden y aseo 19
Ilustración 38. Brigada de orden y aseo 19
Ilustración 39. Brigada de orden y aseo 19
Ilustración 40. Camilla de emergencia 20

Ilustración 41. Botiquín primeros auxilios. 20
Ilustración 42. Extintor 20
Ilustración 43. Instrumentos de emergencia 20
Ilustración 44. Cartelera informativa 21
Ilustración 45. Cartelera informativa 21
Ilustración 46.chaleco reflectivo 21
Ilustración 47. Señalización y adecuación de baño 21
Ilustración 48. Paleta PARE Y SIGA. 22
Ilustración 49. Paleta PARE Y SIGA. 22
Ilustración 50. Cerramiento tela sarán y señalización. 22
Ilustración 51. Cerramiento tela sarán. 22
Ilustración 52. Señales reglamentarias. 23
Ilustración 53. Cerramiento tela sarán. 23
Ilustración 54. Señalización. 23
Ilustración 55. Cerramiento en tela sarán. 23

1. INTRODUCCIÓN

Inicialmente, este informe es presentado por **INGENIERÍA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS,** en el cual se han desarrollado diferentes funciones que han permitido comprender el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo durante el periodo del 25 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024, con el contrato de obra IP-051-2023 de lo cual su objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".**

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1. Descripción general del contrato

Firma contratante:	Empresa Autónoma de Guatapé
Nit:	800.105.497-0
Representante legal:	Daniela Guarín Cardona
CC:	1.020.441.899
Firma contratista:	Ingeniería civil, servicios y suministros
Nit:	900.386.501-1
Representante legal:	Fernando Javier Rodríguez Pineda
Nit:	98.503.761
Firma interventoría:	SERTAP S.A.S
Nit:	800.251.640-2
Supervisor:	Yiraudis Tatiana Buitrago Rico
No de cedula:	63.500.592
Valor del contrato:	MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.117.101.744).
Plazo de contrato:	Cuatro (4) meses y quince (15) días desde la suscripción del acta de inicio
Fecha de inicio:	25 de enero de 2024
Fecha de terminación No1:	9 de junio de 2024

3. RELACIÓN DE VIVIENDAS DE OBRA ACTIVAS

En la tabla 2, encuentra la información general sobre las viviendas activas de obra que se encuentran en el presente periodo:

Se lleva a cabo la realización de 13 viviendas, hay 8 terminadas y faltan 5 por acueducto y alcantarillado, el porcentaje de avance es de 54,70.

Tabla 2. Relación de viviendas activas

ÍTEM	EJECUCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS EJECUTADAS	VIVIENDAS PENDIENTES	CONTRATISTA	CONTRTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE
1	13 VIVIENDAS	8	5	Ingeniss	Empresa Autónoma de Guatapé	54,70

Pendiente por ejecutar 5 viviendas por acueducto y alcantarillado.

4. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Durante el periodo en mención se realiza el pago al sistema de seguridad de todo el personal activo.

LISTADO DE PERSONAL INGENISS S.A.S.								
ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	INGRESO	RETIRO
1	ROBINSON PERALTA QUINTANA	91.432.977	DIRECTOR DE OBRA	NUEVA E.P.S.	COLPENSIONES	SURA	25/01/2024	
2	JUAN ANDRES URIBE BARCENAS	71.798.422	RESIDENTE DE OBRA	SURA	COLFONDOS	SURA	25/01/2024	
3	ANGIE PAOLA JARAMILLO HENAO	1.036.134.191	RESIDENTE SOCIAL	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
4	BIBIANA FARLEY QUINTERO HENAO	21.849.881	TECNOLOGO SST	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
5	MANUELA MONDRAGÓN OSORIO	1.036.134.812	SECRETARIA	EPS SURA	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
6	KEVIN ANDRES GARCÍA GONZALEZ	1.039.704.961	VIGILANTE	SAVIA SALUD	COLPENSIONES	SURA	25/01/2024	
7	JOSE MANUEL AMAYA AGUDELO	71.481.028	OFICIAL	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
8	GUILLERMO ANDRES BARRERA GARIBELLO	1.001.444.064	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
9	JOSE GABRIEL BUSTOS MORALES	10.189.913	OFICIAL	SAVIA SALUD	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
10	JHON ALEXANDER GARCIA GOMEZ	1.036.221.477	AYUDANTE	SAVIA SALUD	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
11	JOHN ALEXANDER GARCIA VILLEGAS	1.001.526.193	OFICIAL	SAVIA SALUD	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
12	ANDRES FELIPE GONZALEZ MAYA	1.001.443.473	AYUDANTE	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
13	JOHN JAIRO GONZALEZ COLORADO	1.036.222.804	OFICIAL	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	SURA	25/01/2024	
14	LUIS JAVIER GONZALEZ GARCIA	1.007.610.740	AYUDANTE	EPS SURA	PROTECCIÓN	SURA	25/01/2024	
15	LEONARDO OROSCO GARCIA	1.001.443.193	AYUDANTE	NUEVA E.P.S.	COLFONDOS	SURA	25/01/2024	
16	JUAN DE DIOS PERALTA GUERRRA	77.029.042	OFICIAL	NUEVA E.P.S.	COLFONDOS	SURA	25/01/2024	

5. COMPONENTE GENERAL

El presente trabajo ha sido diseñado por **INGENIERÍA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS,** el cual describe las diversas actividades de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas durante el periodo de 25 de enero de 2024 a 31 de marzo de 2024, para el contrato de obra IP-051-2023, cuyo objetivo es **"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".** Para esto se realizaron diferentes funciones las cuales permitieron garantizar la Seguridad y Salud en el trabajo, lo que permite reducir los incidentes, riesgos, enfermedades y demás condiciones inseguras que se puedan presentar dentro o fuera del ambiente laboral, logrando así, prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además, se garantizó la protección y promoción de la salud de los empleados, estas se describen a continuación:

- Capacitaciones
- Pausas activas
- Entrega de elementos de protección personal
- Capacitación y asesoría en la implementación del mantenimiento de equipos, máquinas y herramientas
- Programa de Inspecciones de seguridad
- Plan de Gestión Integral de la Obra (PGIO)
- Clasificación y disposición de residuos sólidos
- Proyecto de manejo integral de materiales de construcción y manejo de fuentes de emisiones atmosféricas
- Manejo de sustancias químicas
- Proyecto integral del manejo, cuidado y conservación del agua.
- Orden y acopio de materiales
- Plan de emergencias
- Orden y aseo
- Importancia del COPASST
- Manejo, control y extinción de incendios.
- Capacitación en Seguridad frente al riesgo electrónico.
- Señalizaciones y paleta pare y siga
- Cerramiento y señalización

5.1 CAPACITACIONES

La capacitación en las empresas es fundamental para fortalecer la relación entre la organización y sus empleados. Al ofrecer actividades de capacitación, se establece un vínculo que facilita la comunicación y promueve una cultura de prevención de riesgos laborales. Esto no solo mejora las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sino que también contribuye al bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

La capacitación proporciona información y amplía el conocimiento sobre temas relevantes, como la seguridad y la salud ocupacional, permitiendo que los empleados estén bien informados y actualizados sobre la normativa vigente en materia de SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo). Esto garantiza un cumplimiento adecuado de las regulaciones y promueve un entorno laboral más seguro y saludable para todos

Tabla 3. Registro de capacitaciones

N°	Fecha	Tema	Duración	Expositor
1	30 de enero de 2024	Informar sobre el programa de seguridad y salud en el trabajo	15 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
2	01 de febrero de 2024	Plan de contingencias en Salud Ocupacional	10 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
3	06 de febrero de 2024	Salud y riesgos laborales	10 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
4	08 de febrero de 2024	Ejecución y control de medidas correctoras en prevención de riesgos laborales	10 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
5	13 de febrero de 2024	Auditoría de Seguridad y salud en el trabajo	15 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
6	15 de febrero de 2024	Investigación de accidentes de trabajo	15 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
7	20 de febrero de 2024	Evaluación y planificación de riesgos laborales	10 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
8	22 de febrero de 2024	Gestión del proceso de Seguridad Basado en el Comportamiento y su adecuación.	15 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
9	27 de febrero de 2024	Evaluar el cumplimiento de requisitos de SST y establecer el plan de mejora a que haya lugar	10 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
10	29 de febrero de 2024	Identificación de la legislación nacional vigente de acuerdo con los peligros identificados.	15 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
11	05 de marzo de 2024	Inspecciones de seguridad	10 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao

12	07 de marzo de 2024	Capacitar al personal de la entidad en temas de SST, de acuerdo con los peligros y riesgos expuestos.	15 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
13	12 marzo de 2024	Cumplir y ejecutar plan de trabajo SST	10 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
14	14 de marzo de 2024	Capacitación de brigadas de evacuación y rescate	10 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
15	19 de marzo de 2024	Primeros auxilios	15 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
16	21 de marzo 2024	Salud mental y emocional	15 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao
17	26 de marzo 2024	Rutas y planes de evacuación	15 minutos	Bibiana Farley Quintero Henao

5.1.2 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Estas capacitaciones se han realizado entre martes y viernes durante el periodo en mención y se adjunta su respectivo registro fotográfico.

Tabla 4. Evidencias fotográficas Institución Educativa Rural La Sierra Y Rural la Unión

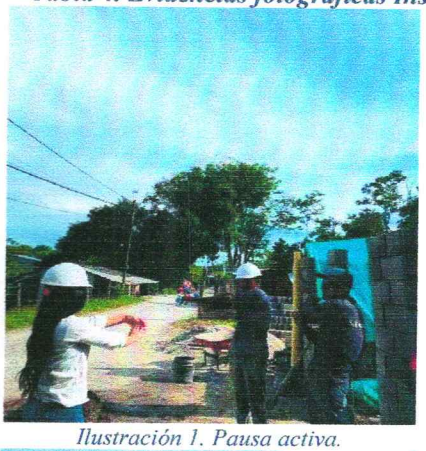


Ilustración 1. Pausa activa.



Ilustración 2. Pausa activa

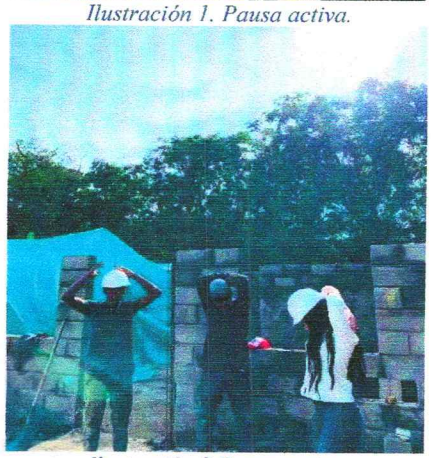


Ilustración 3.Pausa activa



Ilustración 4. Pausa activa

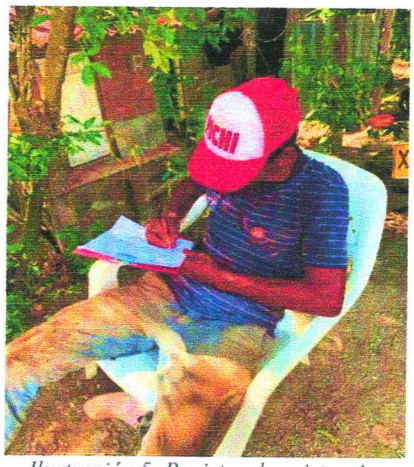


Ilustración 5. Registro de asistencia.



Ilustración 6. Pausa activa.

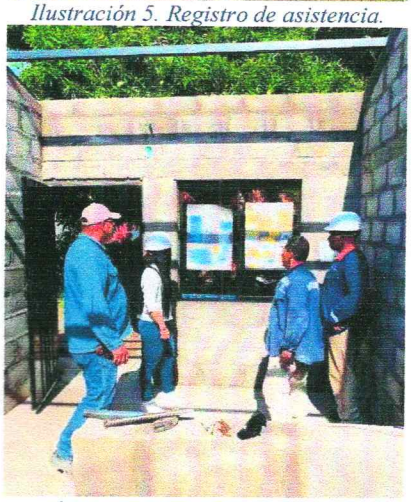


Ilustración 7. Capacitación SST

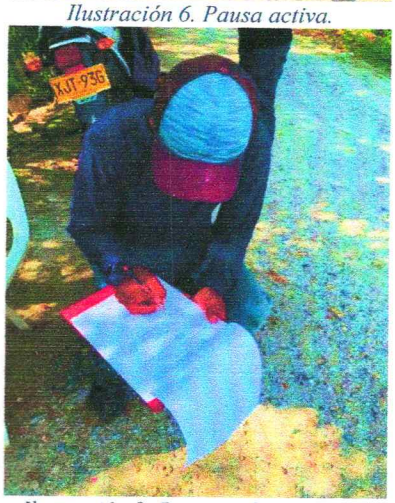


Ilustración 8. Registro de asistencia

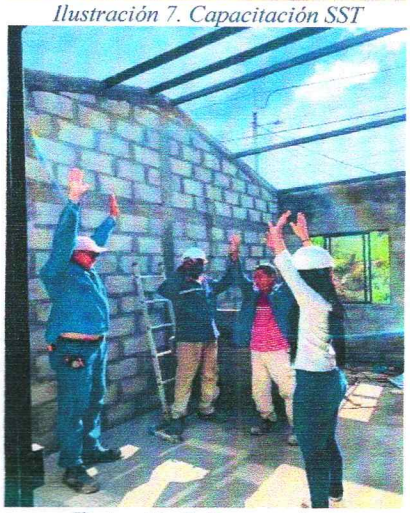


Ilustración 9. Pausa activa.

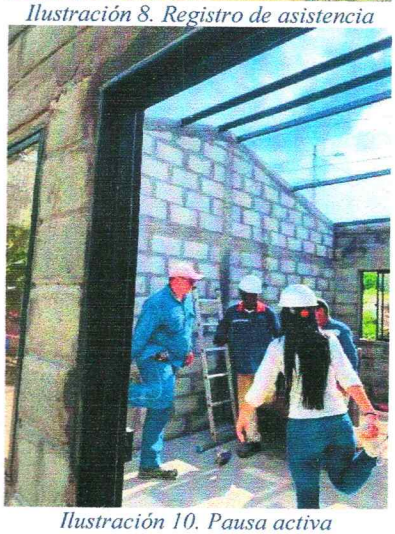


Ilustración 10. Pausa activa

5.1.3 REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Se adjunta evidencia en el "anexo 1 registro de capacitación" con los formatos diligenciados por los colaboradores con respecto a las actividades presentadas

Anexo 1. Registros de capacitación .

5.2 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Es fundamental que, en cualquier entorno laboral, especialmente en obras civiles donde pueden existir diversos riesgos, se implementen políticas de seguridad efectivas. Los elementos de protección personal juegan un papel crucial en la protección de los trabajadores contra diferentes tipos de riesgos, como los químicos, físicos y ergonómicos que pueden encontrarse en el ambiente laboral.

Algunos de los elementos de protección personal comunes incluyen gafas protectoras para resguardar los ojos de partículas o líquidos peligrosos, mascarillas respiratorias para proteger contra inhalación de contaminantes, caretas para protección facial, guantes para proteger las manos de sustancias corrosivas o abrasivas, y cascos para proteger la cabeza de golpes o caídas de objetos.

Es esencial que cada trabajador esté familiarizado con el uso adecuado de estos elementos de protección personal y que los utilicen correctamente en todo momento. Para , la empresa debe proporcionar capacitación y supervisión adecuadas para garantizar que se cumplan los protocolos de seguridad.

El objetivo principal de estos elementos fue garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, lo que permitió contribuir así un ambiente laboral más seguro y se pudo reducir los riesgos de accidentes y lesiones graves.



Ilustración 11. Entrega de elementos de protección personal

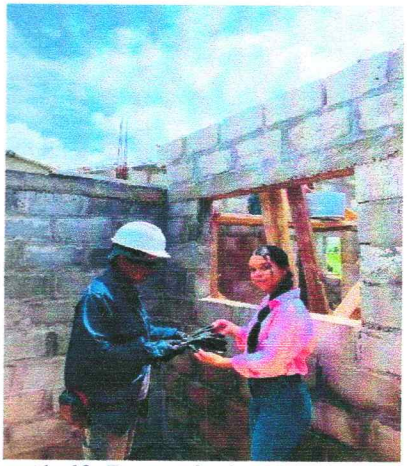


Ilustración 12. Entrega de elementos de protección personal



Ilustración 13. Entrega de elementos de protección personal

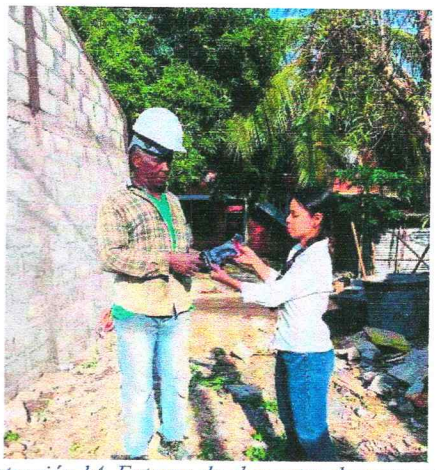


Ilustración 14. Entrega de elementos de protección personal

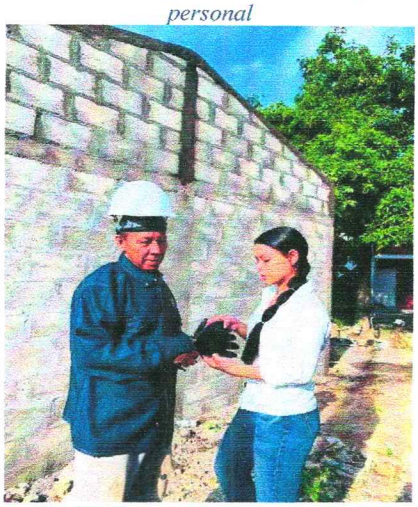


Ilustración 15. Entrega de elementos de protección personal.

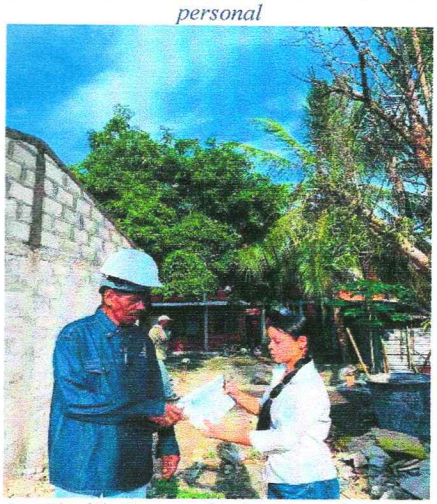


Ilustración 16. Entrega de elementos de protección personal.

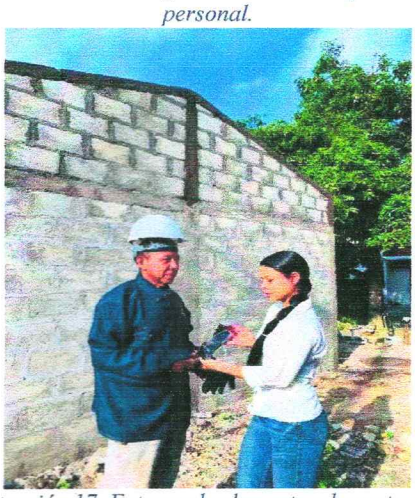


Ilustración 17. Entrega de elementos de protección personal

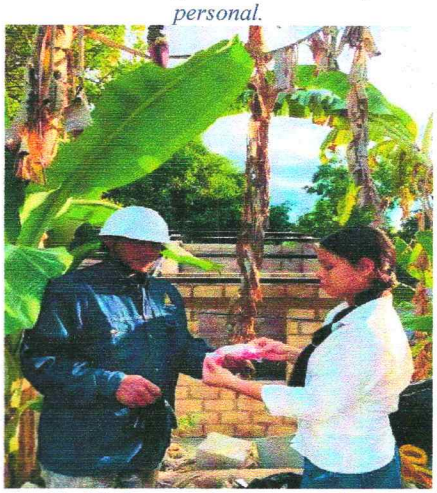


Ilustración 18. Entrega de elementos de protección personal

Anexo 2. Registro de entrega de EPP

5.3 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Es una fase en la cual se ejecuta un análisis detallado de las condiciones de trabajo con el fin de detectar los riesgos existentes que surgen a partir de las condiciones inseguras, ya que es un proceso sistemático para identificar, evaluar y controlar los riesgos que surgen en el lugar de trabajo. La evaluación de riesgos laborales implica la identificación de peligros potenciales, la evaluación de la probabilidad y gravedad de los riesgos asociados, y la implementación de medidas para mitigar o eliminar estos riesgos. Es fundamental para garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos los trabajadores

Anexo 3. Inspecciones de seguridad

5.4 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (PGIO)

Este plan es fundamental para garantizar que los residuos generados durante proyectos de construcción sean manejados de manera adecuada y responsable, minimizando su impacto ambiental y cumpliendo con los requisitos legales en materia de seguridad y salud ocupacional.

El PGIO, se basa en normativas vigentes y tiene en cuenta aspectos ambientales, de calidad, seguridad y salud en el trabajo. Al identificar los aspectos e impactos ambientales asociados con la generación y gestión de residuos de construcción, se pueden implementar medidas para reducir el riesgo de accidentes, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores y la comunidad en general.

El PGIO es una herramienta crucial para la gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y al cumplimiento de las normativas en seguridad y salud ocupacional.

5.5 CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

La clasificación y disposición adecuada de los residuos, es fundamental para reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad. Al categorizar los residuos en líquidos, gaseosos y sólidos según su estado físico, se facilita su gestión y tratamiento.

Los residuos sólidos urbanos, que son aquellos generados en entornos urbanos, representan una parte significativa de los desechos producidos en la sociedad. Para manejarlos de manera efectiva, se requiere implementar sistemas integrales que abarquen desde la recolección hasta la disposición final.

La colocación de cestas en diferentes puntos ecológicos es una medida importante para facilitar la disposición adecuada de los residuos sólidos. Esto puede ayudar a fomentar prácticas de separación en la fuente y facilitar el reciclaje y la reutilización de materiales.

Además, es esencial promover la educación ambiental entre la población para concienciar sobre la importancia de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos y sus efectos en el medio ambiente. La reducción en el uso de materiales desechables, la reutilización de productos y el fomento del reciclaje son acciones clave para minimizar el impacto negativo de los residuos sólidos en nuestro entorno.



Ilustración 19. Punto ecológico.



Ilustración 20. Punto ecológico reciclaje.

Así mismo, se cuenta con el equipo de control de derrames el cual incluye una serie de herramientas esenciales para hacer frente a situaciones de emergencia relacionadas con materiales o sustancias químicas derramadas. Este kit está compuesto por una variedad de elementos como pala, cordones, paños absorbentes, bolsas rojas, guantes de nitrilo Solvex, protección respiratoria media máscara, traje Tyvek, monogafas y cinta de demarcación. Cada uno de estos elementos desempeña un papel crucial en la contención y limpieza de derrames, así como en la protección del personal y el medio ambiente contra posibles riesgos. Es fundamental que el personal esté entrenado en el uso adecuado de este equipo y que se sigan estrictamente los procedimientos de seguridad establecidos.



Ilustración 21. Kit control antiderrames

5.6 GESTIÓN SOCIAL: BUZÓN DE SUGERENCIAS(PQRS), VOLANTES INFORMATIVOS



Ilustración 22. Volantes informativos



Ilustración 23. Volantes informativos

5.7 BUZÓN DE SUGERENCIA

Es importante contar con la opción de un buzón de sugerencia ya que esto fomenta la participación y la colaboración en la mejora continua de procesos, productos o servicios y mejora la comunicación, ayuda a establecer un canal directo de comunicación entre la organización y sus stakeholders, lo que facilita la transmisión de información relevante y la retroalimentación constructiva.

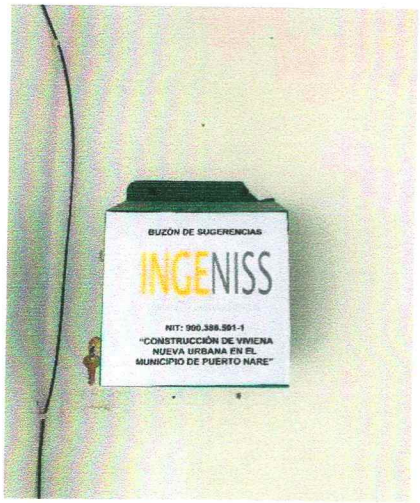


Ilustración 24. Buzón de sugerencias

5.7.1 ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS

INDICADOR		NÚMERO	BREVE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN
Número de derechos de petición atendidos o respondidos				
Número de PQRSD recibidas	Indicador macro			
Número de PQRSD contestadas				
PQRSD remitidas por personería				
PQRSD remitidas por veeduría				
PQRSD remitidas por la ESP				
PQRSD remitidas en el buzón				

Hasta la fecha no se ha recibido ninguna PQRSD

5.8 SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se dividen en sustancias puras elementos o compuestos y mezclas, estas corresponden a residuos provenientes de productos químicos tales como envases de insumos utilizados, aceites, pinturas, lubricantes, solventes, cementos, entre otros. Se clasificarán como material peligroso o de manejo especial, cualquier tipo de residuo impregnado con estas sustancias.
Para manipular estas sustancias se realiza un protocolo que permite reducir los posibles riesgos.
a) Implementación del sistema SGA (Sistema global armonizado)
b) Hojas de seguridad actualizadas de cada una de las sustancias químicas y las personas que utilizan ya se encuentran familiarizados con estos elementos.
c) Capacitación del programa de sustancias químicas a los trabajadores.

Anexo 4 . Ficha técnica de sustancias químicas

5.9 PROYECTO INTEGRAL DEL CUIDADO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA.

El proyecto integral de cuidado, manejo y conservación del agua se enfoca en la ejecución de actividades destinadas a respaldar el cuidado del medio ambiente y la protección de las fuentes hídricas. Su objetivo principal es mitigar la escasez de agua potable en nuestro territorio.



Ilustración 25. Adecuación del baño.



Ilustración 26. Cuidado y mantenimiento del baño

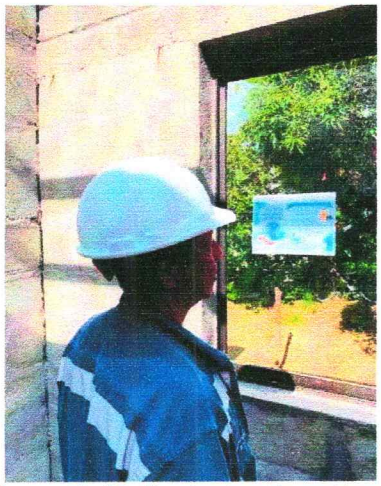


Ilustración 27. Concientización ambienta

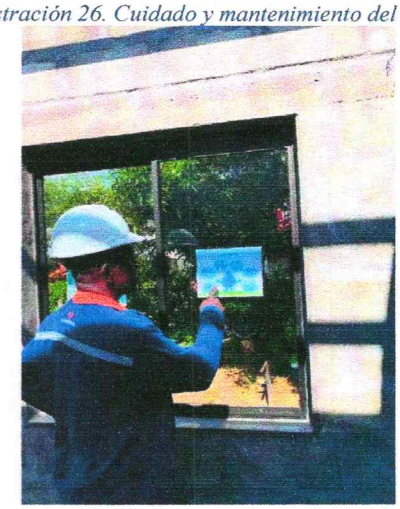


Ilustración 28. Concientización cuidado del medio ambiente

5.10 ORDEN Y ALMACENAMIENTO DE CEMENTO, ADOBE Y ARENA.

El almacenamiento de materiales de manera organizada y cuidadosa es fundamental para tener un conocimiento preciso sobre la disponibilidad y la ubicación de las mercancías en un proyecto. Esta práctica facilita la búsqueda de productos y optimiza la gestión de la carga y descarga de mercancías, lo que conlleva a una mayor rapidez, precisión y eficiencia en las operaciones. Además, una adecuada organización en el almacenaje contribuye a mejorar la productividad del proyecto al minimizar los tiempos muertos y maximizar la utilización de los recursos disponibles.



Ilustración 29. Cemento almacenado



Ilustración 30. Encerramiento con cinta



Ilustración 31. Cinta de señalización

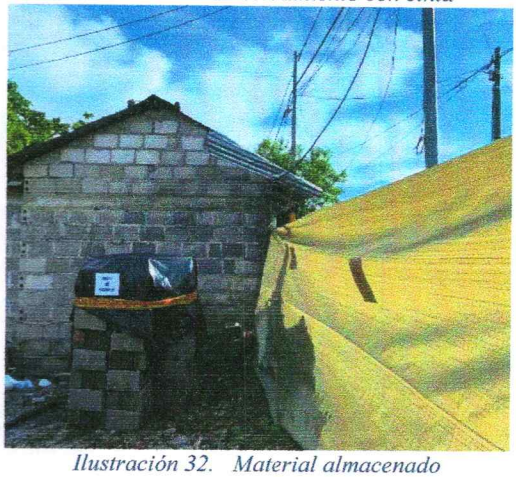


Ilustración 32. Material almacenado

5.11 ORDEN Y ASEO EN LA OBRA

El sistema de orden y limpieza accede un mejor rendimiento de producción debido al ordenamiento y control de riesgos, permitiendo tener un excelente ambiente laboral generando un espacio libre y seguro que logra cuidar el bienestar de todos los colaboradores, el estado de calidad de los productos y la seguridad de todo el personal de la obra, así mismo, se evita diferentes tipos de enfermedades y se tiene un control sobre todas las herramientas e instrumentos en su respectivo lugar, estas jornadas se realizan diariamente.

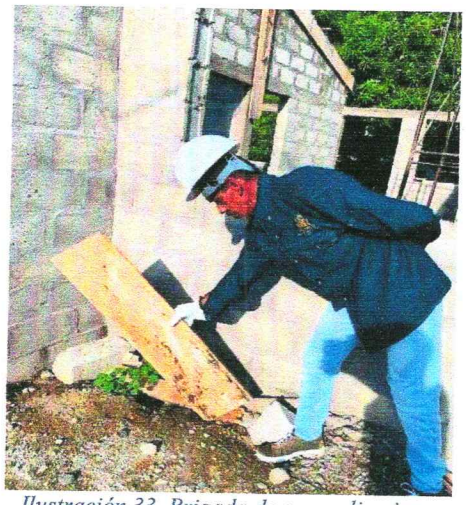


Ilustración 33. Brigada de aseo y limpieza.



Ilustración 34. Brigada de aseo y limpieza.



Ilustración 35. Brigada de orden y aseo



Ilustración 36. Brigada de orden y aseo



Ilustración 37. Brigada de orden y aseo

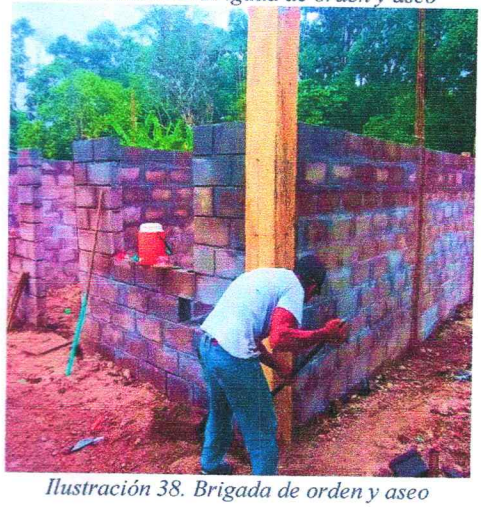


Ilustración 38. Brigada de orden y aseo

6. PLAN DE EMERGENCIAS

El plan de emergencia es la agrupación de instrumentos, estrategias, metas y políticas que permiten prevenir y proteger a los colaboradores y demás personal en general ante la presencia de incidentes, aquí se establecen los lineamientos que se deben acatar frente a una amenaza o desastre y así poder planear, actuar de manera concisa frente a estas, así mimo, poder continuar con sus respectivas actividades de la mejor manera, para esto se han ubicado los elementos de emergencia dentro de la ejecución de la obra.



Ilustración 39. Camilla de emergencia



Ilustración 40. Botiquín primeros auxilios.



Ilustración 41. Extintor



Ilustración 42. Instrumentos de emergencia

7. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Es necesario contar con la implementación de dispositivos y señalizaciones de control dentro de la obra, ya que es fundamental para garantizar la seguridad tanto del personal laboral como de la comunidad que circula alrededor del área de trabajo. Estos dispositivos y señalizaciones tienen varios propósitos importantes cómo, identificación de peligros, control del tráfico y desplazamiento, prevención de accidentes, organización del espacio, etc.



Ilustración 43. Cartelera informativa



Ilustración 44. Cartelera informativa



Ilustración 45.chaleco reflectivo



Ilustración 46. Señalización y adecuación de baño

8. CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

Estas tienen como objetivo informar y advertir a la comunidad y personal en general sobre las precauciones y medidas de seguridad necesarias para reducir y controlar los riesgos que se puedan presentar en la zona de trabajo. Estas señales y herramientas no solo sirven para advertir sobre posibles peligros y rutas de evacuación, sino que también ayudan a establecer un plan de emergencia y proporcionan información sobre la ubicación de equipos de protección y los procedimientos de primeros auxilios. Su objetivo principal es garantizar la integridad de todos los involucrados en la obra y reducir al mínimo los posibles incidentes que puedan surgir durante su desarrollo.

Se utilizan materiales como lona verde, cinta de señalización y plástico polietileno grueso para crear señales de precaución, señales de pare y siga, así como otras herramientas que contribuyen al correcto funcionamiento y seguridad durante la ejecución de la obra.

Tabla 5. Cerramiento tela sarán Institución Educativa Rural La Sierra, I.E Rural la Unión.

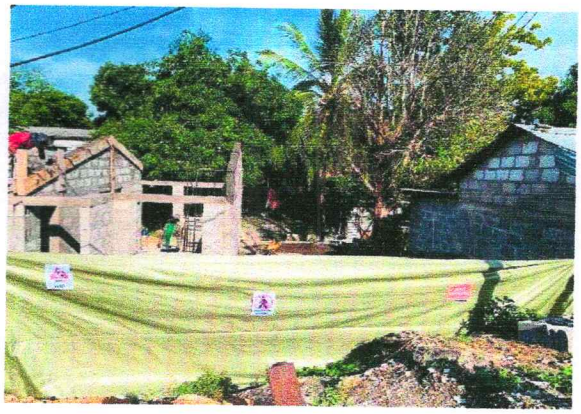


Ilustración 47. Paleta PARE Y SIGA.

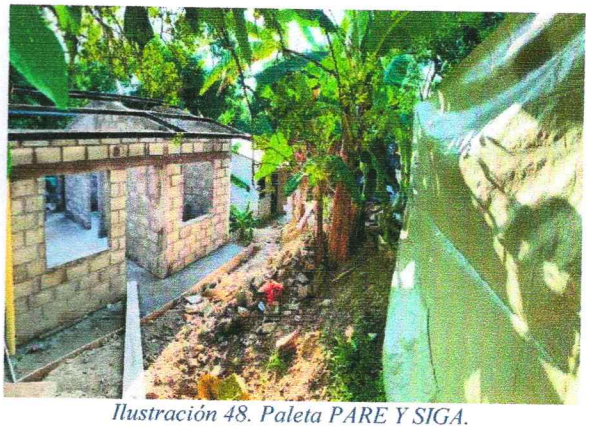


Ilustración 48. Paleta PARE Y SIGA.



Ilustración 49. Cerramiento tela sarán y señalización.



Ilustración 50. Cerramiento tela sarán.



Ilustración 51. Señales reglamentarias.



Ilustración 52. Cerramiento tela sarán.

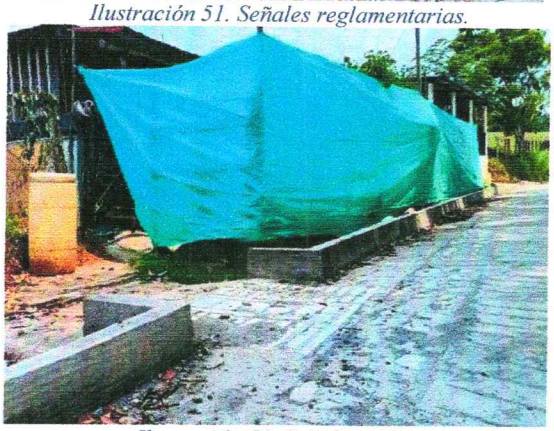


Ilustración 53. Señalización.



Ilustración 54. Cerramiento en tela sarán.

Números telefónicos de instituciones en caso de emergencia

INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO
Dirección Nacional Bomberos	3206671956	cuerpodebomberosptonare@hotmail.com
Hospital Octavio Olivares	6045905935	hoogerencia@gmail.com
Policía nacional	48347334	registro.general@policia.es

Cordialmente.

Bibiana Farley Quintero Henao
Tecnóloga HSE

9. ANEXOS

Anexo 1. Registros de capacitación

Anexo 2. Registro de entrega de elementos de protección personal

Anexo 3. Inspecciones de seguridad

Anexo 4. Ficha técnica de sustancias químicas

ANEXO 1. REGISTROS DE CAPACITACIONES

INGENISS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-101
		Versión: 001
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 08/06/2023
		Página 1 de 1

Ciudad: Puerto Nare (Ant.)	Fecha: 30 - 01 - 2024	Duración: 15 minutos

Inducción	☐	Capacitación / Curso/ taller	☒	Otros	☐
Reinducción	☐	Divulgación	☐		
Entrenamiento	☐	Charlas	☐		

Tema: Programa de seguridad y salud en el trabajo
Expositor: Bibiana Jarley Quintero Herao

LISTADO DE ASISTENTES

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Olando Agudelo	91136034	Residente	
2	[illegible]	98502.604	oficial	
3	marino Idrobo	76-000-010	obrero	
4	[illegible]	98502[illegible]	oficial	
5	[illegible]	71 18624[illegible]	Oficial	
6	Javier Uribe U	1128273449	O	Javier
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

INGENISS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-101
		Versión: 001
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 08/06/2023
		Página 1 de 1

Ciudad: Puerto Nare (Ant.)	Fecha: 01-02-2024	Duración: 10 minutos

Inducción	☐	Capacitación / Curso/ taller	☒	Otros	☐
Reinducción	☐	Divulgación	☐		
Entrenamiento	☐	Charlas	☐		

Tema: Plan de Contingencias de salud ocupacional
Expositor: Bibiana Farley Quintero Henao

LISTADO DE ASISTENTES

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Orlando Agudelo	91136034	Residente	
2	Jaime Ramacho	98502.604	Oficial	
3	[illegible]	76.000.040	o bueno	
4	[illegible]	98502754	Axuliante	
5	[illegible]	7118620	Oficial	
6	Javier Uribe U	1128273449	O	Javier
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

INGENISS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-101
		Versión: 001
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 08/06/2023
		Página 1 de 1

Ciudad: Puerto Nare (Ant.)	Fecha: 06-02-2024	Duración: 10 minutos

Inducción	☐	Capacitación / Curso/ taller	☒	Otros	☐
Reinducción	☐	Divulgación	☐		
Entrenamiento	☐	Charlas	☐		

Tema: Salud y riesgos laborales
Expositor: Bibiana Farley Quintero Hengo

LISTADO DE ASISTENTES

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Orlando Agudelo	91136034	Residente	
2	Laureano Camacho	98.502.604	oficial	
3	Mauricio Isaza	76.000.010	Obrero	
4	Yarmin Montes	98.502.754	ayudante	
5	Jhon Barrios	71180200	Oficia	
6	Javier Uribe U	1128273449	O	Javier
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
