ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: IED. LICEO NACIONAL AGUSTÍN NIETO C.
DIRECCIÓN	: KR 19 D # 11 - 17
LOCALIDAD	: LOS MÁRTIRES
FECHA DE ENTREGA	: 29 DE DICIEMBRE DE 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. – CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de Ingeniero Apoyo a la Supervisión.

POR LA INTERVENTORÍA. – JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta directora de Interventoría.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCÍA PÉREZ, en su calidad de representante legal de CONSORCIO MC2023.

POR LA INSTITUCIÓN. – JAIRO ORLANDO RODRÍGUEZ RAVELO, en su calidad de rector de la institución IED. AGUSTÍN NIETO CABALLERO.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la ATENCIÓN DE EMERGENCIA en el Frente I.E.D. LICEO NACIONAL AGUSTÍN NIETO CABALLERO ubicado en la Localidad los Mártires de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número KR 19 D # 11 - 17 que comprende:

ESPACIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
TANQUE 2000L BALCÓN SEGUNDO PISO – COMEDOR	SE INICIA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO, (BALCÓN SEGUNDO PISO – COMEDOR) SE PROCEDE A CIMBRAR UBICACIÓN DE LA BASE PARA EL TANQUE DE 2.000 L, A CONTINUACIÓN SE REALIZA CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO DE PLACA COMO BASE PARA EL TANQUE, SE CONFORMA RED HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SE INICIA LLENADO DE TANQUE, SE COMPRUEBA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE INSPECCIONA QUE TODAS LAS CONEXIONES, FIJACIONES, SISTEMA DE CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO, FLOTADOR, REGISTROS Y VÁLVULAS SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] NO [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [X] NO [ ] N/A [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [ ] NO [ ] N/A [X]

4.- Descripción de los equipos entregados

N/A

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil??

SI [X] NO [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] NO [ ] N/A [X]

IV. OBSERVACIONES GENERALES


- DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO EL TANQUE INSTALADO ÚNICAMENTE SE INSTALA PARA COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES MÍNIMAS DE RESERVA DE ALMACENAMIENTO DEL COMEDOR, NO PARA OTRAS ZONAS DE SERVICIOS, LABORATORIOS O BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN.

Escaneado con CamScanner

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

V. REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES	DESPUÉS
BALCÓN SEGUNDO PISO - COMEDOR	BALCÓN SEGUNDO PISO - COMEDOR

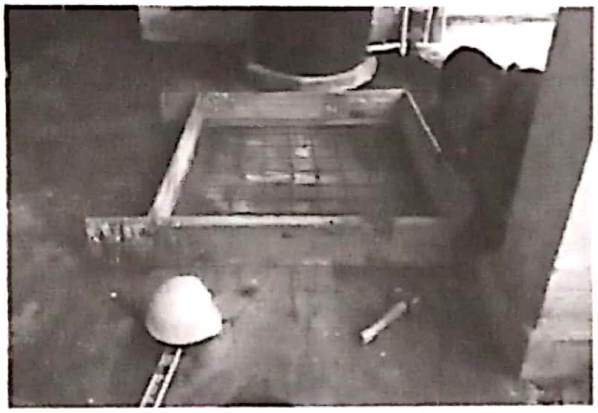




DESPUÉS



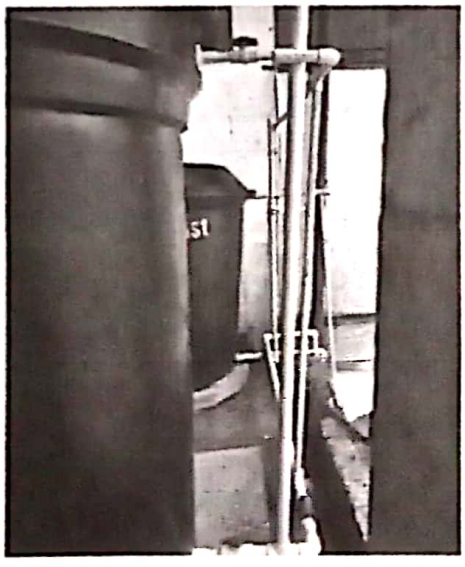

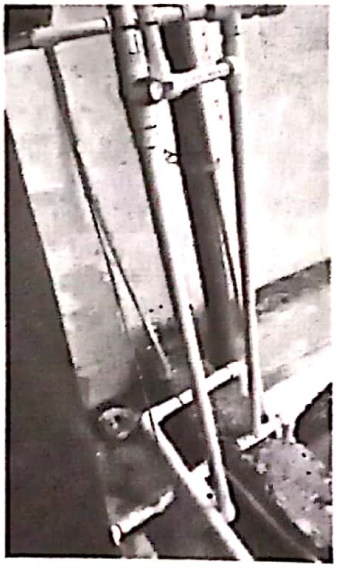

4

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

VI. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (29) días del mes de DICIEMBRE del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
ING. AUGUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO MC 2023

INTERVENTORÍA
ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO KALPA & ARA SED

SUPERVISIÓN
ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISIÓN SED

INSTITUCIÓN
JAIRO ORLANDO RODRÍGUEZ RAVELO
RECTOR – IED. LICEO NACIONAL AGUSTÍN NIETO

Escaneado con CamScanner
