**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

# ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | : CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908 |
| **CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL** | : IED AULAS COLOMBIANAS SEDE A |
| **DIRECCIÓN** | : CARRERA 11 ESTE No.1ª-85 |
| **LOCALIDAD** | : 03 – SANTA FE |
| **FECHA DE ENTREGA** | : 23 DE JUNIO DE 2024 |

## I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

**POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.** – CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de Ingeniero Apoyo a la Supervisión.

**POR LA INTERVENTORÍA.** – JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta directora de Interventoría.

**POR EL CONTRATISTA**. AUGUSTO GARCÍA PÉREZ, en su calidad de representante legal de CONSORCIO MC2023.

**POR EL I.E.D.**

## II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la ATENCIÓN DE EMERGENCIA en el Frente IED AULAS COLOMBIANAS SEDE A ubicado en la Localidad de SANTA FE de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número CARRERA 11 ESTE No.1ª-85, que comprende:

**COMPONENTE DE EMERGENCIAS** DE MANERA PRIORITARIA EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LOS BLOQUES A Y B, ADECUACIÓN ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CONEXIÓN RED DE AGUA COCINA COMPENSAR).

| SECTOR | ESPACIO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 3ER. PISO (BLOQUE B) | AULA 301 Y 302 | 330.67 Kg | REFUERZO ESTRUCTURA METÁLICA |
| EXTERIOR | FACHADAS | 9.47 m2 | MACHÓN EN LADRILLO ESTRUCTURAL (INCLUYE CONCRETO FLUIDO Y ACERO) |
| EXTERIOR | FACHADAS | 30.40 m | BAJANTES TUBERÍA PVC-S 4" |



Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

# ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

| SECTOR | ESPACIO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| BLOQUE A | CUBIERTA | 1.00 UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO |
| BLOQUE B: 1ER. Y 3ER. PISO | AULA 301 Y JORNADA EXTENDIDA | 3.23 m2 | CARPINTERÍA METÁLICA: VENTANAS |
| BLOQUE A Y B | CUBIERTA | 73.35 m | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA |
| BLOQUE B | CUBIERTA Y CUARTO DE BAJAS | 120.18 m2. | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC |
| BLOQUE A | CUBIERTA (VIGA CANAL) | 44.87 m2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA |

## III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

**SI** [x] **NO** [ ] **NA** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

**SI** [x] **NO** [ ] **NA** [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

**SI** [x] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

| |
|---|
| N.A. |



Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

# ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

**SI** [x] **NO** [ ]


6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

**SI** [ ] **NO.** [ ] **N.A.** [x]

## IV. OBSERVACIONES GENERALES

| |
|---|
| N.A. |

## V. REGISTRO FOTOGRAFICO

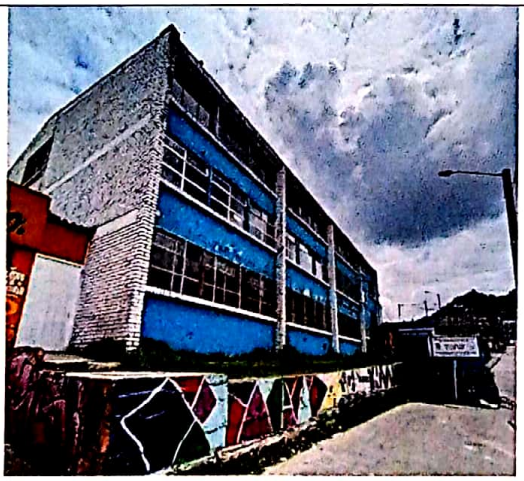
| ANTES | DESPUES |
|---|---|
|  |  |




Escaneado con CamScanner


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

# ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

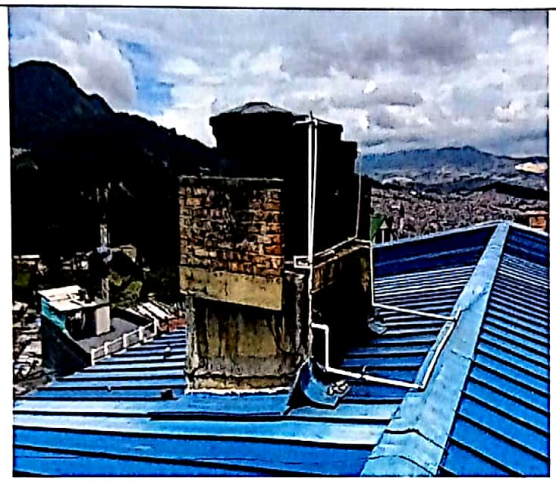



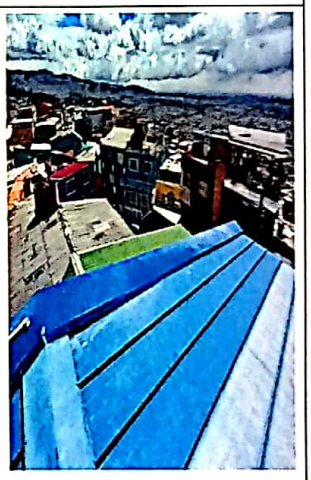

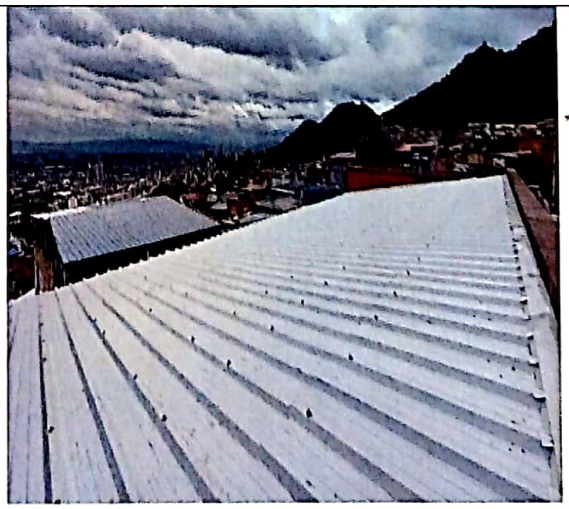



Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

# ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA



## VI. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los vientres (23) días del mes de JUNIO del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

p.p. ING. Franklin Posada

CONTRATISTA
**ING. JOSE AUGUSTO GARCIA**
DIRECTOR DE OBRA

pp. Johana Chamorro.

INTERVENTORÍA
**ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Leonardo Contador

SUPERVISIÓN
**ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR**
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED

INSTITUCIÓN Rector.



Escaneado con CamScanner
