ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	3	DESCRIPCIÓN ITEM	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	Unidad de Medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Espesor			
1	Retiro de otras zonas(demolcion de pañete, raspado)						2		2		
	Pared baños bloque salones piso 1	1,74		1,80			1	0,06	0,19		
	Pared baños bloque salones piso 1	2,00		1,80			1	0,06	0,22		
	Pared baños bloque salones piso 1	7,30		1,80			1	0,06	0,79		
	Pared baños bloque salones piso 1	1,66		1,80			1	0,06	0,18		
	Pared baños bloque salones piso 1	0,60		1,80			1	0,06	0,06		
	Pared baños bloque salones piso 1	2,03		1,80			4	0,06	0,88		
	Mocheta division de cabinas	0,30		1,80			1	0,06	0,03		
	Demolicion enchape	1,00		6,80			1	0,06	0,41		
	Demolicion enchape	0,70		0,70			2	0,06	0,06		
	baño discapacitado	1,74		1,80			1	0,06	0,19		
	baño discapacitado	1,17		1,80			1	0,06	0,13		
	baño discapacitado	0,48		1,80			1	0,06	0,05		
	Pared baños bloque salones piso 2	1,36		1,80			1	0,06	0,15		
	Pared baños bloque salones piso 2	1,77		1,80			1	0,06	0,19		
	Pared baños bloque salones piso 2	7,30		1,80			1	0,06	0,79		
	Pared baños bloque salones piso 2	1,53		1,80			1	0,06	0,17		
	Pared baños bloque salones piso 2	1,30		1,80			1	0,06	0,14		
	Mocheta division de cabinas	3,22		1,80			1	0,06	0,35		
	Demolicion enchape	0,70		0,70			2	0,06	0,06		
	Demolicion de poseta	0,50		0,30			2	0,15	0,05		
	Demolicion base lavamanos	0,80		0,80			2	0,15	0,19		
	Demolicion de poseta	0,50		0,35			2	0,15	0,05		
	Demolicion base lavamanos	0,80		0,80			3	0,15	0,29		
	Demolicion de modulos Aula maxima-mamposteria	2,20		2,70			1	0,15	0,89		
	Demolicion de viga cerramiento	15,50		0,30			2	0,30	2,79		
	Demolicion de lavamanos	2,85		0,30			1	0,15	0,13		
	Demolicion de anden costado izquierdo restaurante	13,40		0,40			1	0,12	0,64		
	Demolicion viga cerramiento	15,50		0,30			1	0,25	1,16		
	Demolicion viga cerramiento	12,00		0,30			1	0,25	0,90		
	Demolicion viga cerramiento	31,50		0,24			1	0,25	1,89		
								TOTAL	16,00		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 5293000 / atencional ciudadano 018000969595 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

VEICCON

ITEM 3 RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL ACTA PARCIAL DE OBRA No.1


ALCALDÍA DE MANIZALES


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

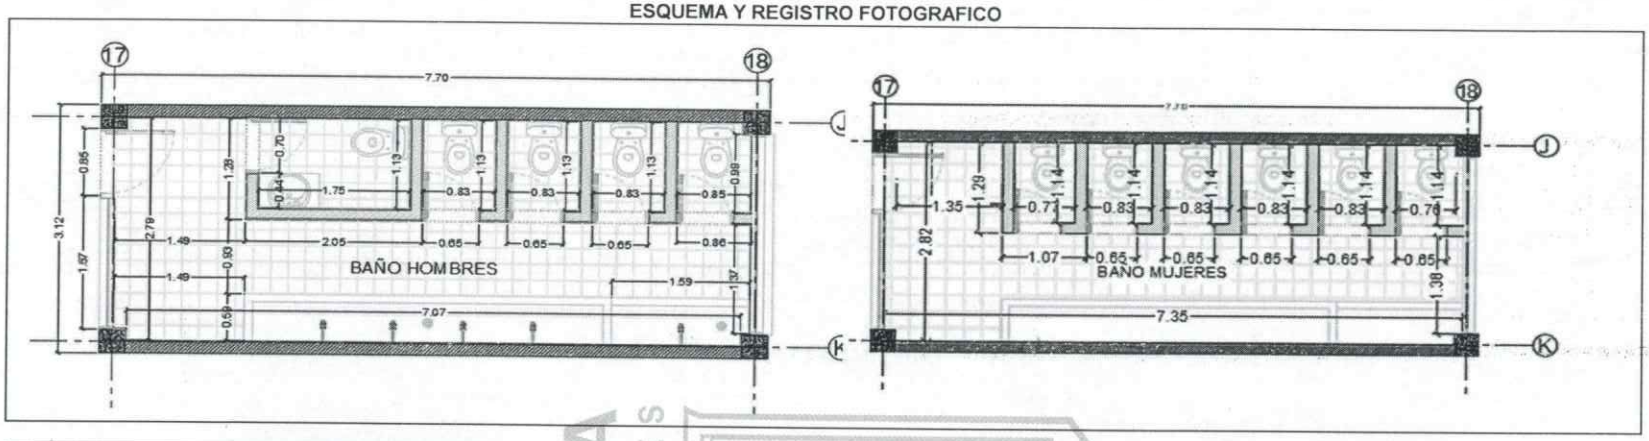





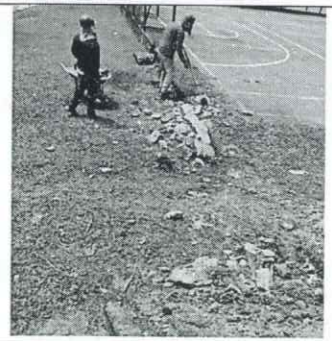

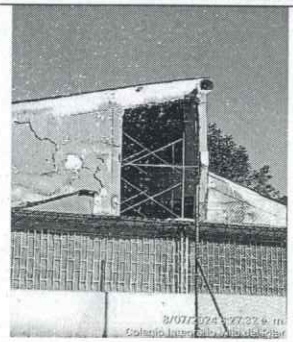

ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	7	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	Unidad de Medida	UND


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Punto sanitario orinal baños piso 2						4		4		
	Punto desague lavamanos baños piso 2						4		4		
	Punto desague lavamanos baños piso 1						6		6		
	Punto desague poseta segundo piso						1		1		
								TOTAL	15,00		


FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

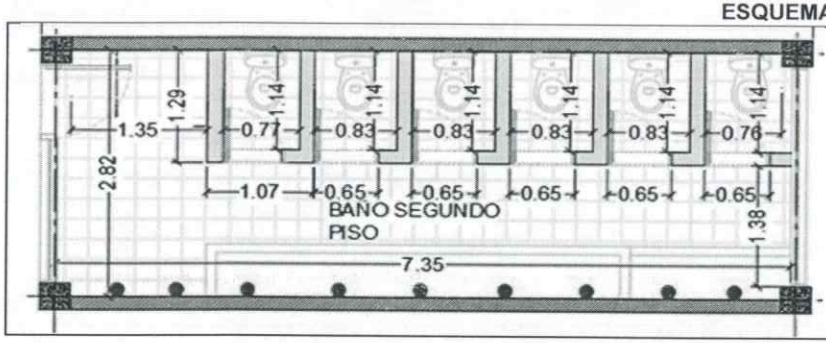

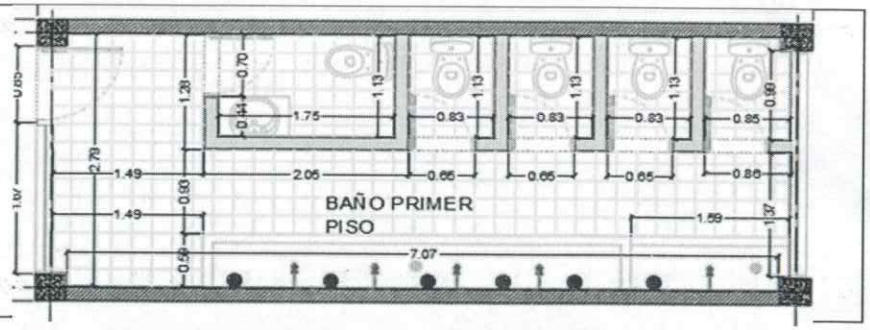



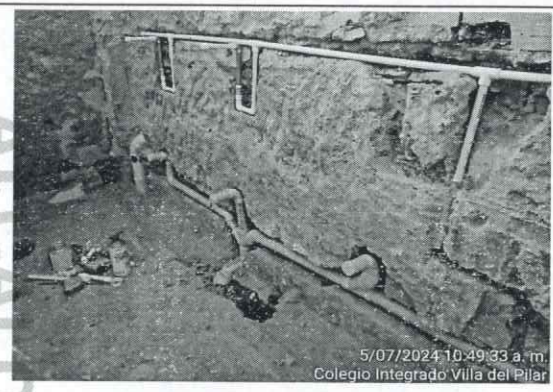





USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	8	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Punto desague baños segundo piso						1		1		
	Punto desague baños primer piso						1		1		
								TOTAL	2,00		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

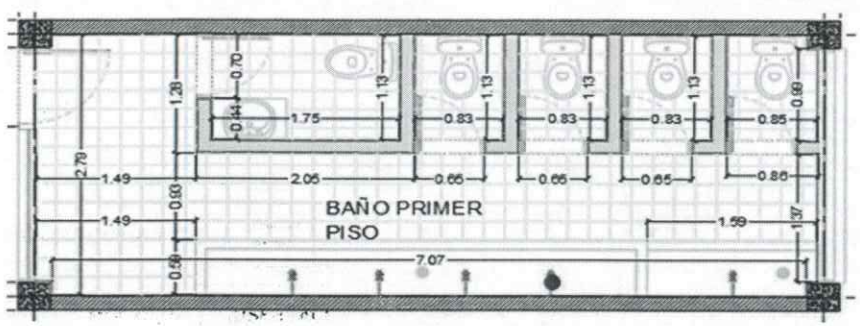

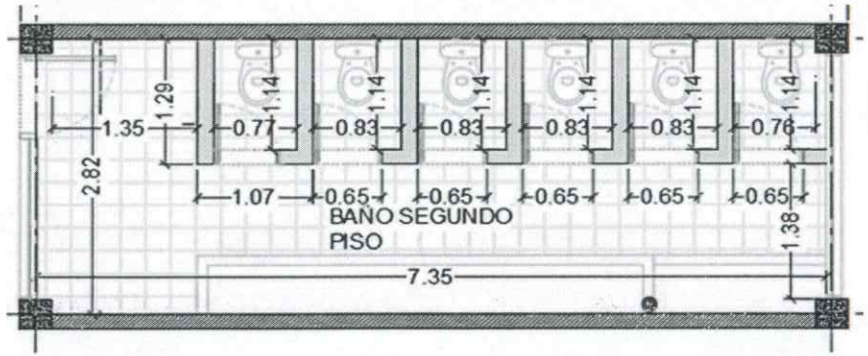





USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	9	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Desague de piso Dos						1		1		
	Desague poseta lavatraperos piso uno						1		1		
	Desague de piso uno						2		2		
								TOTAL	4,00		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


VEICCON Ingeniería con responsabilidad


ITEM 9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)

ACTA PARCIAL DE OOBRA No.1

ALCALDÍA DE MANIZALES


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

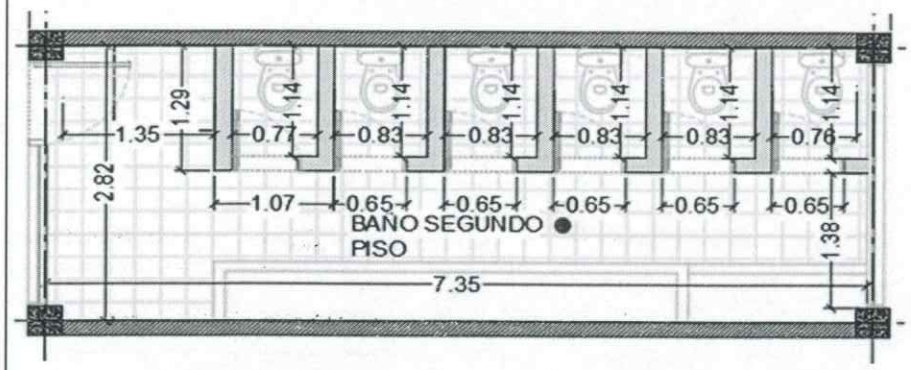

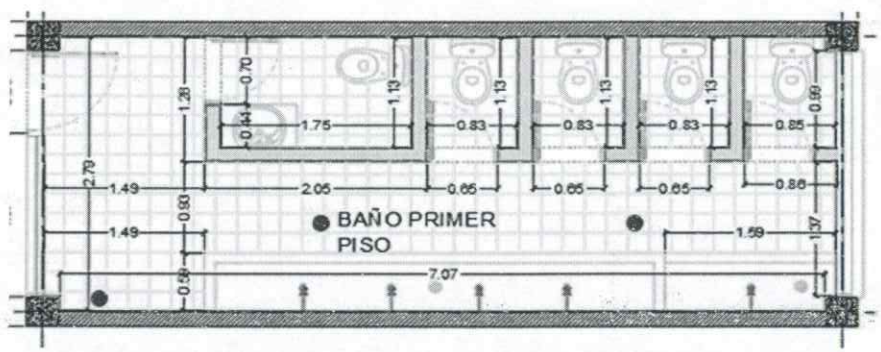





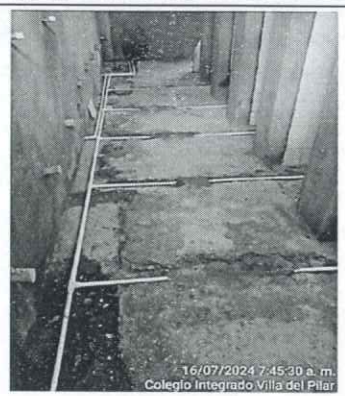



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	10	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (Incluye accesorios deconexión unión y yee).	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Baños piso dos						1		1		
10								TOTAL	1,00		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

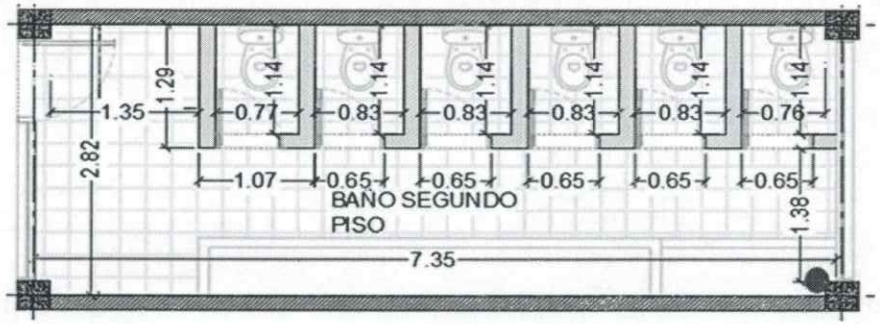

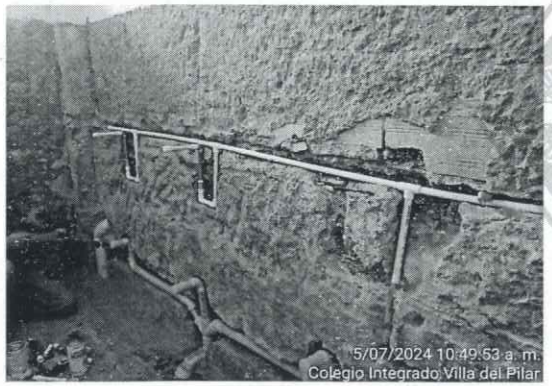



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	12	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Tuberia PVC-S 2" RED SANITARIA Baño piso 2		7,10				1		**7,10**		
	Tuberia PVC-S 2" RED SANITARIA Baño Piso uno		3,50				1		**3,50**		
12								**TOTAL**	**10,60**		


FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

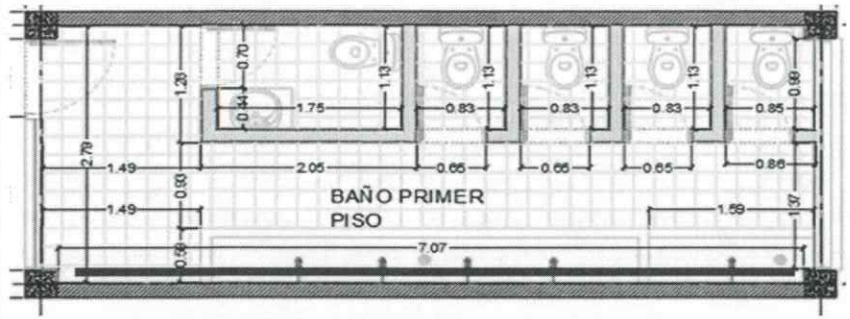

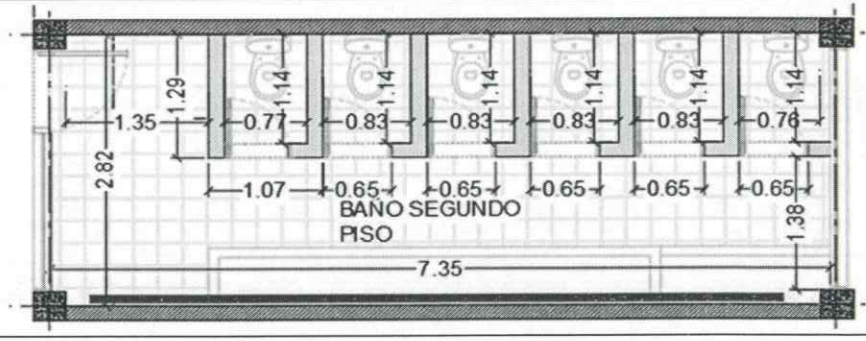

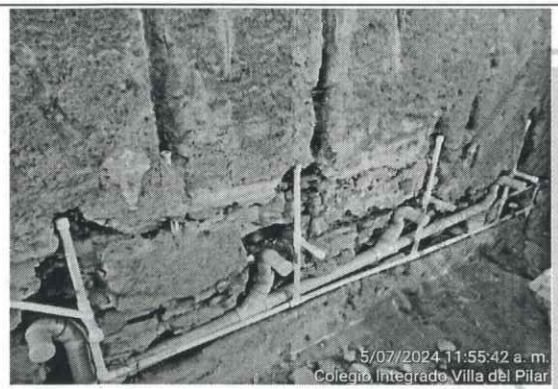


FOTO 1

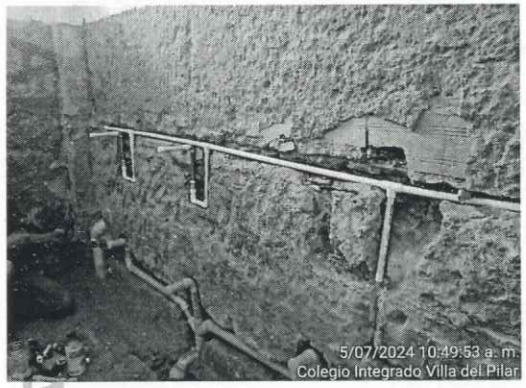


FOTO 2





USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	18	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33*23*9 cm.	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Muros de fachada aula multiple	2,20		2,70			1		5,94		
12								TOTAL	5,94		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

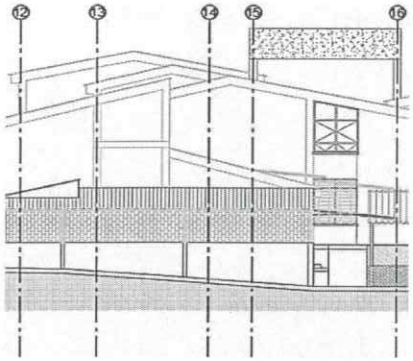



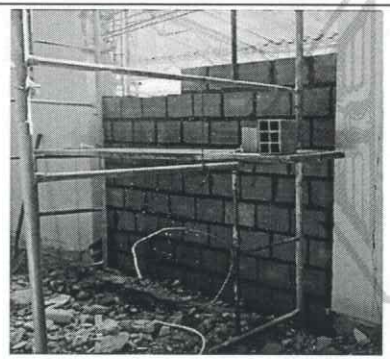



ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	21	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Punto suministro orinal baños piso 2						4		4		
	Punto suministro lavamanos baños piso 2						4		4		
	Punto suministro lavamanos baños piso 1						6		6		
	Punto suministro sanitarios baños segundo piso						6		6		
	Punto suministro sanitarios baños primer piso						5		5		
	Poseta lavatraperos piso dos						1		1		
	Poseta lavatraperos piso uno						1		1		
								TOTAL	27,00		


FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

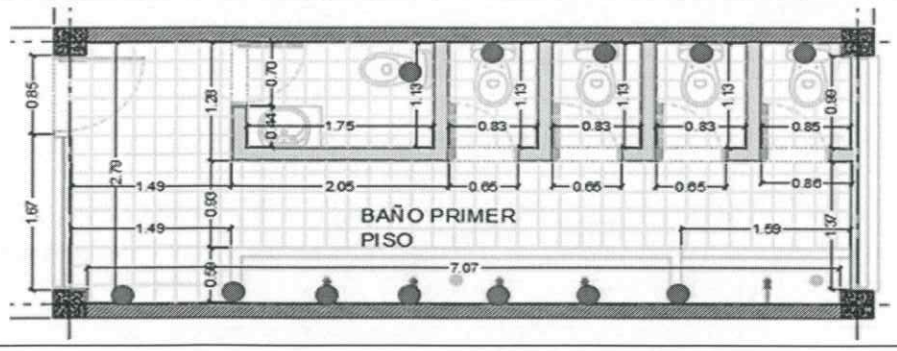

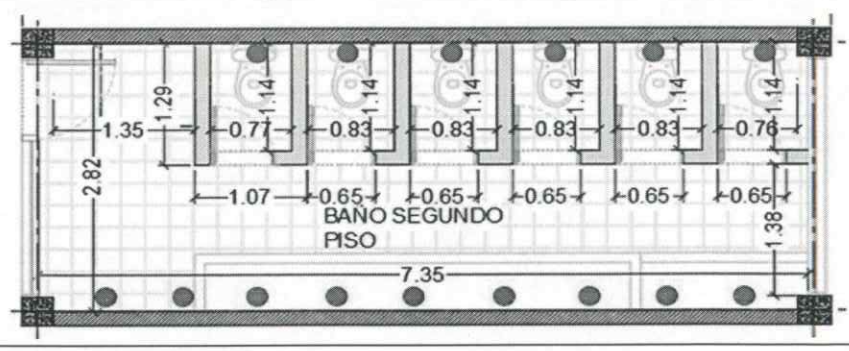









ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	23	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Suministro a sanitarios piso uno		6,75				1		**6,75**		
	Suministro a lavamanos piso uno		2,90				1		**2,90**		
	Suministro a sanitarios piso Dos		7,04				1		**7,04**		
	Suministro a lavamanos piso Dos		1,50				1		**1,50**		
	Suministro Orinales piso Dos		2,70				1		**2,70**		
								TOTAL	**20,89**		


FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

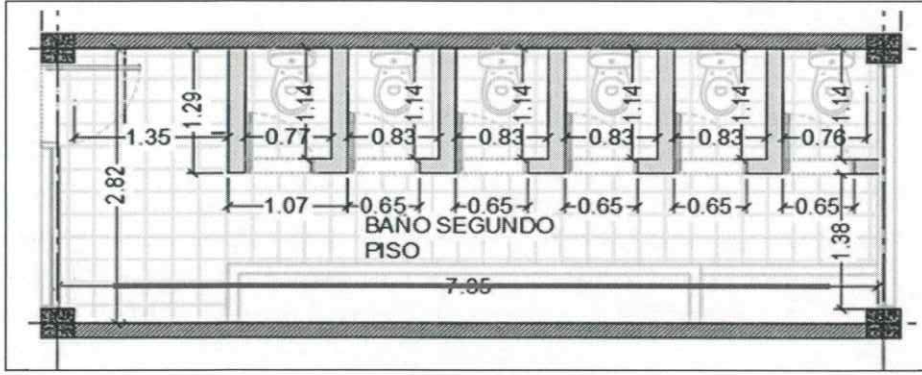

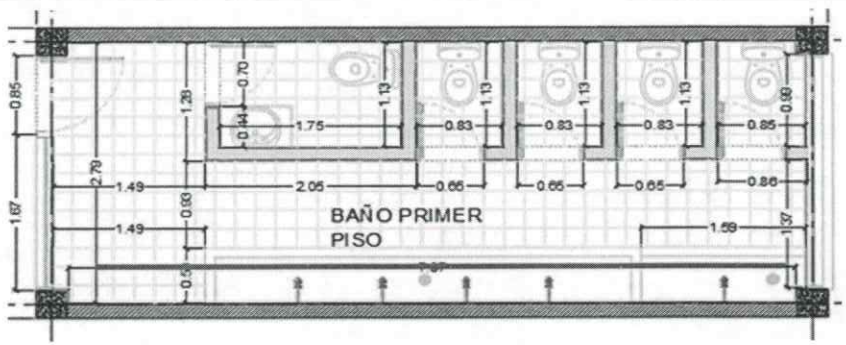

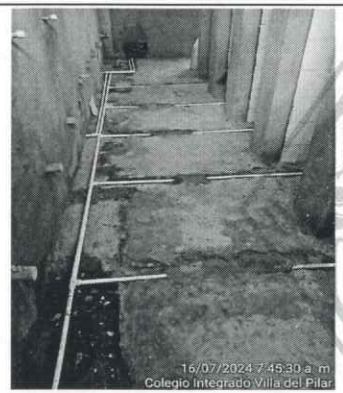



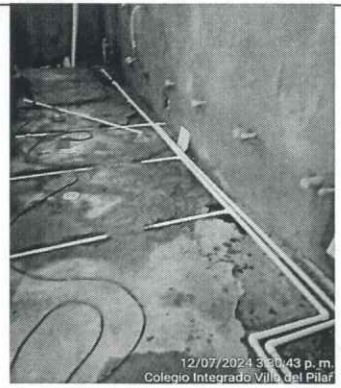



ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	26	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M.	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Revoques guardaescoba		2,30				1		**2,30**		
	Revoques guardaescoba		2,72				1		**2,72**		
	Revoques guardaescoba		4,38				1		**4,38**		
	Revoques guardaescoba		4,30				1		**4,30**		
	Revoques guardaescoba		2,00				1		**2,00**		
	Revoques guardaescoba		2,05				1		**2,05**		
	Revoques guardaescoba		0,43				1		**0,43**		
	Revoques guardaescoba		0,90				1		**0,90**		
	Revoques guardaescoba		0,33				1		**0,33**		
	Revoques guardaescoba		1,50				1		**1,50**		
	Revoques guardaescoba		4,30				1		**4,30**		
	Revoques guardaescoba		1,55				1		**1,55**		
	Revoques guardaescoba		1,00				1		**1,00**		
	Revoques guardaescoba		1,00				1		**1,00**		
	Revoques guardaescoba		5,63				1		**5,63**		
	Revoques guardaescoba		3,12				1		**3,12**		
	Revoques guardaescoba		4,00				1		**4,00**		
	Revoques guardaescoba		4,00				1		**4,00**		
	Revoques guardaescoba		6,00				1		**6,00**		
	Revoques		2,00				1		**2,00**		
	Revoques		2,90				1		**2,90**		
	Revoques		2,00				1		**2,00**		
	Revoques		1,00				1		**1,00**		
	Revoques		2,90				1		**2,90**		
	Revoques		2,80				1		**2,80**		
	Revoques		1,70				1		**1,70**		
	Revoques		3,00				1		**3,00**		
	Revoques		3,00				1		**3,00**		
	Revoques		1,70				1		**1,70**		
	Revoques		1,00				1		**1,00**		
	Revoques		3,00				1		**3,00**		

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	Revoques guardaescoba		1,00				1		**1,00**		
	Revoques guardaescoba		2,66				1		**2,66**		
	Revoques guardaescoba		1,00				1		**1,00**		
	Revoques guardaescoba		1,00				1		**1,00**		
	Revoques		1,60				1		**1,60**		
								TOTAL	**85,77**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

Comuniquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

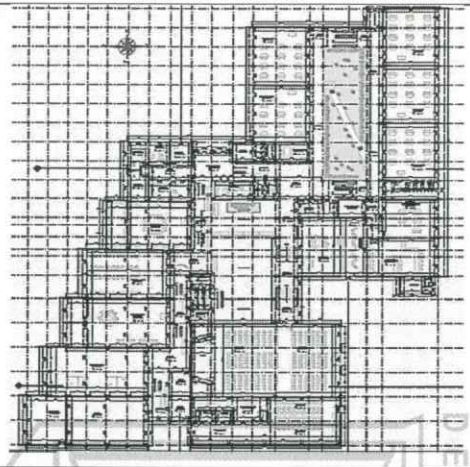







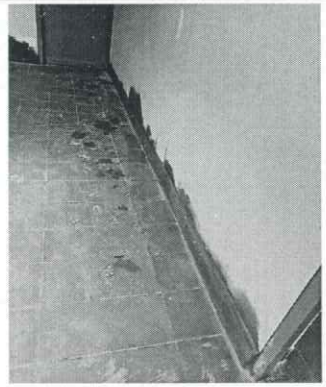

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	27	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Revoques fachada patios central		1,70				1		**1,70**		
	Revoques fachada patios central		2,70				1		**2,70**		
	Revoques fachada patios central		2,95				1		**2,95**		
	Revoques fachada patios central		1,70				2		**3,40**		
	Revoques fachada patios central		2,70				2		**5,40**		
	Revoques fachada patios central		2,70				3		**8,10**		
	Revoques fachada patios central		1,00				1		**1,00**		
	Revoques fachada patios central		1,00				2		**2,00**		
	Revoques fachada patios central		1,00				1		**1,00**		
	Revoques fachada patios central		2,00				4		**8,00**		
	Revoques fachada patios central		1,75				2		**3,50**		
	Revoques fachada patios central		2,65				1		**2,65**		
	Revoques fachada patios central		3,00				2		**6,00**		
	Revoques fachada patios central		2,00				1		**2,00**		
								TOTAL	**50,40**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

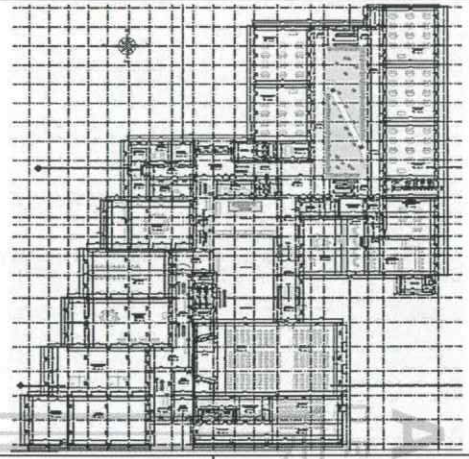



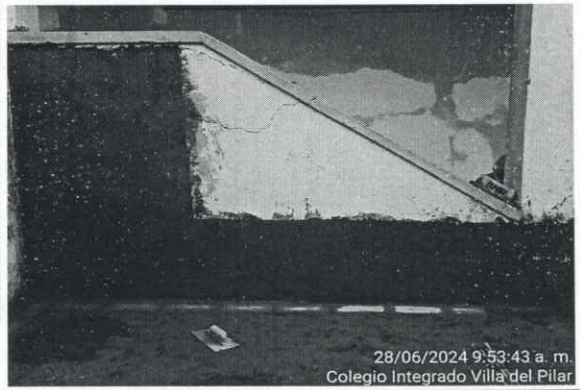

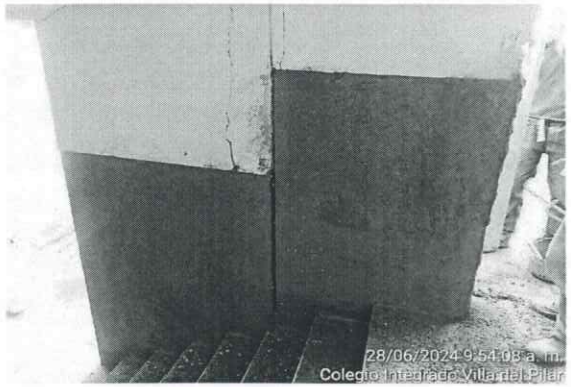



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	28	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO COLUMNAS Y VIGAS AEREAS UNA (1) CARA 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Revoques columnas bloque salones						22		**22,00**		
	Revoques vigas patio central						32		**32,00**		
								TOTAL	**54,00**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

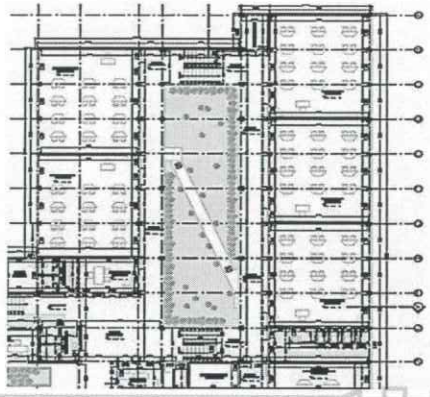





ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	30	DESCRIPCIÓN ITEM	RECORRIDO DE CUBIERTA	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	cubierta general, 51. 6%						950		**950,00**		
								TOTAL	**950,00**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

Comuniquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

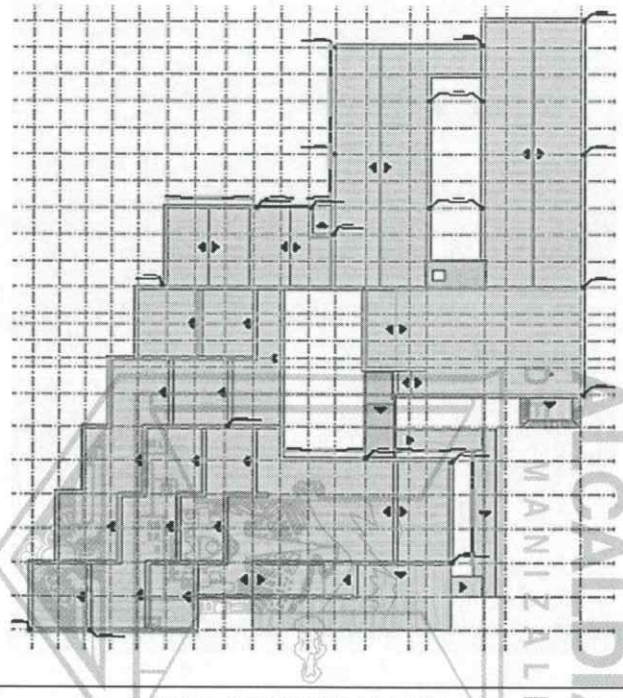

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

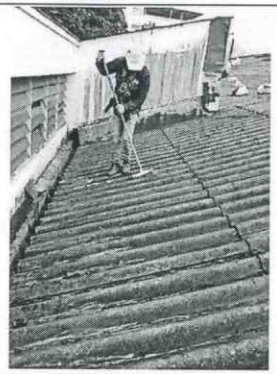







USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	50	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	Salón 1 Primer piso Bloque salones	7,50		2,55			2		38,25		
	Salón 1 Primer piso Bloque salones	7,50		2,45			1		18,38		
	Salón 1 Primer piso Bloque salones	8,70		0,95			1		8,27		
	Columna	0,76		1,70			3		3,88		
	Techo	7,40	8,70				0		-		
	SUBTOTAL SALON 1								**68,77**		
	SUBTOTAL SALONES 1,2 Y3						3		**206,30**		
	Salón 4 segundo piso Bloque salones	7,50		2,55			2		38,25		
	Salón 4 segundo piso Bloque salones	7,50		2,45			1		18,38		
	Salón 4 segundo piso Bloque salones		8,70	0,95			1		8,27		
	Salón 4 segundo piso Bloque salones	0,80	8,70				1		6,96		
	Salón 4 segundo piso Bloque salones	0,70	8,70				1		6,09		
	Cuchilla	7,55	1,60				1		6,04		
	SUBTOTAL SALON 4								83,98		
	SUBTOTAL SALONES 4,5,y 6						3		**251,94**		
	Salón 7								93,06		
	Cuchilla	7,55	1,60				1		6,04		
	SUBTOTAL SALON 7								99,10		
	SUBTOTAL SALON 7,8 Y 9						3		**297,30**		
	Salón 11		11,60	2,55			1		29,58		
	Salón 11	5,60		3,40			1		19,04		
	Salón 11	1,90		3,40			1		6,46		
	Salón 11		7,40	3,60			1		26,64		
	Salón 11	2,40		3,60			1		8,64		
	SUBTOTAL salon 11								**90,36**		
	Salón 12	9,59		2,55			1		24,45		
	Descuento ventana	2,65	0,43				3		- 3,42		

ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	Descuento puerta	1,20		2,04			-1		- 2,45		
	Salón 12	9,89		2,55			1		25,22		
	Descuento ventana	2,65		1,68			-3		- 13,36		
	Salón 12	7,28		2,55			2		37,13		
	Techo placa	7,55	8,85				0		-		
	SUBTOTALsalon 12								**67,58**		
	SUBTOTAL salones 12y 13						2		**135,16**		
	TOTAL SALONES								**981,06**		
	Pasillo primer piso	2,55	26,50				1		67,58		
	Descuento puertas	1,20		2,05			-3		- 7,38		
	Descuento ventanas		2,68	0,42			-9		- 10,13		
	SUBTOTAL pasillo								**50,06**		
	Muro biblioteca		3,50	2,50			1		8,75		
	Centro de electricidad		3,50	2,50			1		8,75		
	Centro de electricidad		1,60	2,50			1		4,00		
	SUBTOTAL								**21,50**		
	Descuento puertas	1,20		2,05			-1		- 2,46		
	Descuento puertas	0,90		2,05			-1		- 1,85		
	Descuento puertas	0,80		2,05			-1		- 1,64		
	SUBTOTAL								**- 5,95**		
	SUBTOTAL								**15,56**		
	Pasillo profesores		20,75	2,57			1		53,33		
	Descuento puertas	1,21		2,07			-3		- 7,51		
	Descuento ventanas		2,70	0,45			-7		- 8,51		

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
