USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	pared lateral	3,40		2,54			1		8,64		
	columnas	1,22		2,57			2		6,27		
	columnas	0,90		1,57			3		4,24		
	SUBTOTAL								**56,45**		
	Pasillo baño profesores		7,60	2,54			1		19,30		
	Descuento puerta	0,92		2,04			-1		- 1,88		
	Descuento ventana	1,14		1,14			-1		- 1,30		
	Descuento ventana	1,20		0,45			-1		- 0,54		
	pared trofeos	3,87		2,84			1		10,99		
	SUBTOTAL								**26,58**		
	Pasillo salones 7,8 y 9		26,57	3,45			1		91,67		
	Descuento puerta	1,21		2,07			-3		- 7,51		
	Descuento ventana		2,69	0,45			-9		- 10,89		
	pared lateral fondo salon 7	3,48		2,96			1		10,30		
	antepecho escalera	1,56		0,73			1		1,14		
	Antepecho pasillo 7,8 y 9		26,30	0,85			1		22,36		
	Columnas	1,07		1,73			2		3,70		
	Columnas	0,90		1,73			3		4,67		
	Viga canal	20,90		0,54			1		11,29		
	Viga canal	20,90		0,67			1		14,00		
	Viga techo	1,50		1,19			2		3,57		
	SUBTOTAL								**144,28**		
	Pasillo 4,5,y 6						2		**288,57**		
	Columnas 1 piso y 2 piso		1,40	2,55			20		**71,40**		
	Columnas costado derecho baños		1,40	2,55			4		**14,28**		
	Cafeteria de los profesores		11,60	1,00			1		11,60		
	Cafeteria de los profesores		3,00	3,80			2		22,80		
	Cafeteria de los profesores		5,45	3,40			2		37,06		
	Cafeteria de los profesores		11,60	3,80			1		44,08		
	SUBTOTAL								**115,54**		
								TOTAL	**1548,10**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

BLQOUE DE SALONES PISO UNO Y OFICINAS

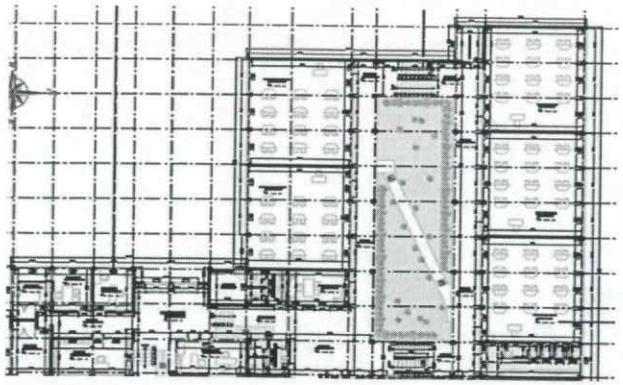


BLQOUE DE SALONES PISO DOS

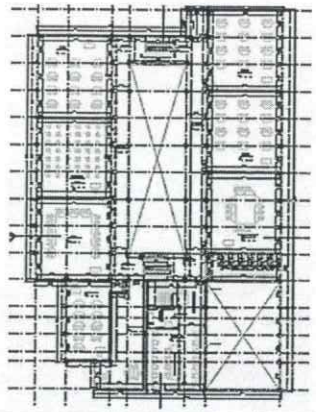






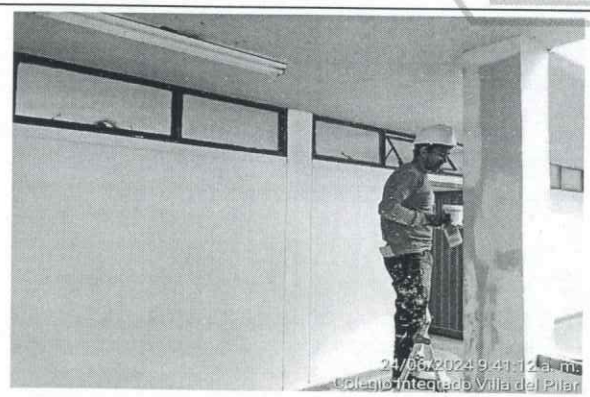




ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

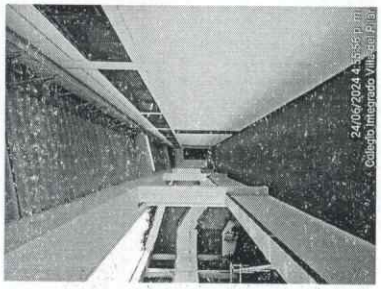

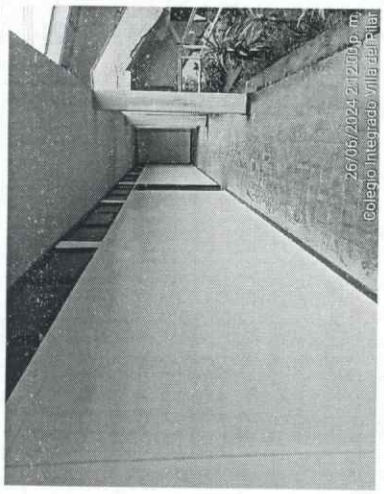

ALCALDIA
DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	56	DESCRIPCIÓN ITEM	ASEO GENERAL	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Aseo salones								500,00		
	Aseo pasillos										
	Aseo cafeteria profesores										
								TOTAL	500,00		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

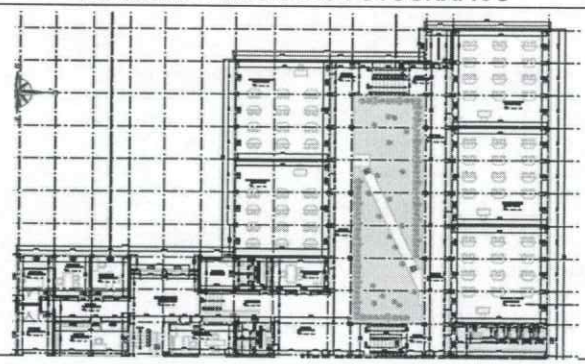





ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	57	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2"	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	registro lavamanos 1 y 2 piso de 1/2"						2		2,00		
	registro orinal 2 piso de 1/2"						1		1,00		
	registro sanitaria 1y 2 piso de 1/2"						2		2,00		
								TOTAL	5,00		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

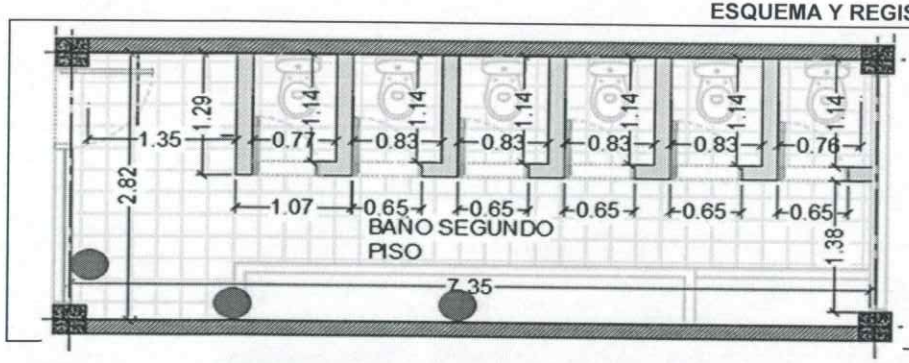


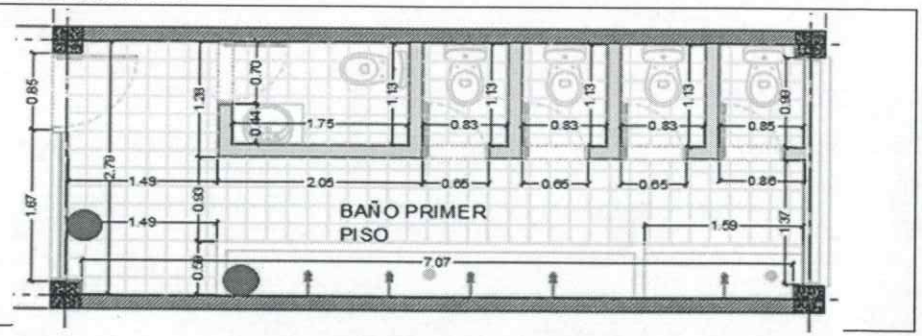

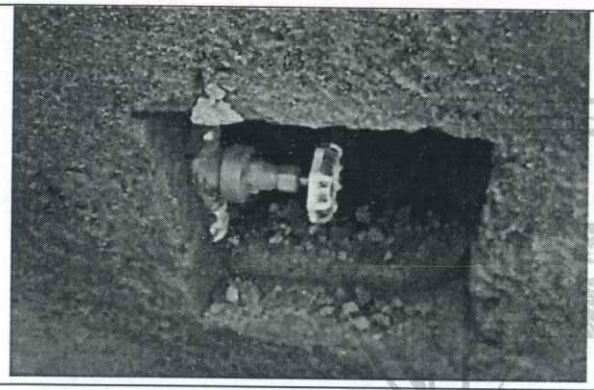



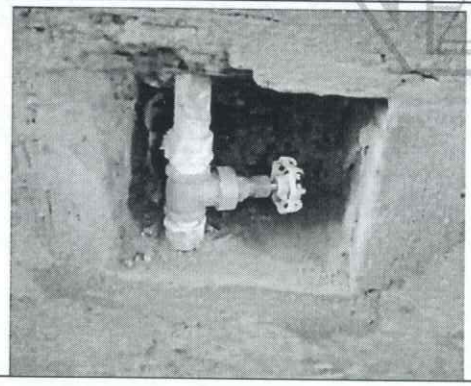

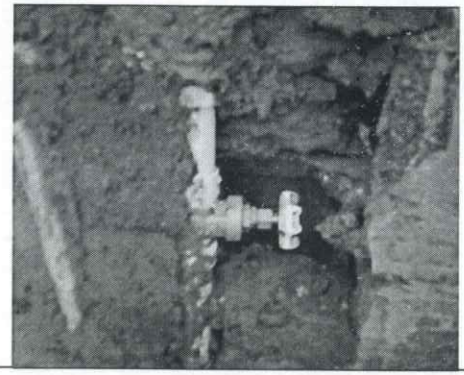

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	58	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	cerramiento nivel 1		15,50	5			1		**83,70**		
	cerramiento nivel 2		12,00	3,70			1		**44,40**		
	Cerramiento nivel 2 costado gradas		30,40	3,70			0		-		
								TOTAL	**128,10**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



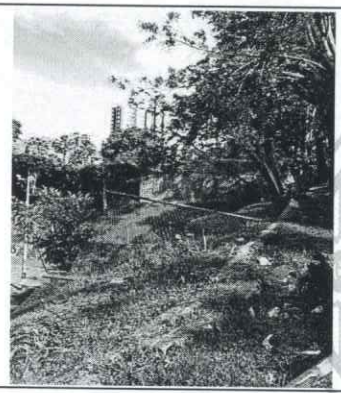







USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	59	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Desmonte de aparatos sanitarios piso uno						5		5,00		
	Desmonte de aparatos sanitarios piso dos						6		6,00		
								TOTAL	11,00		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

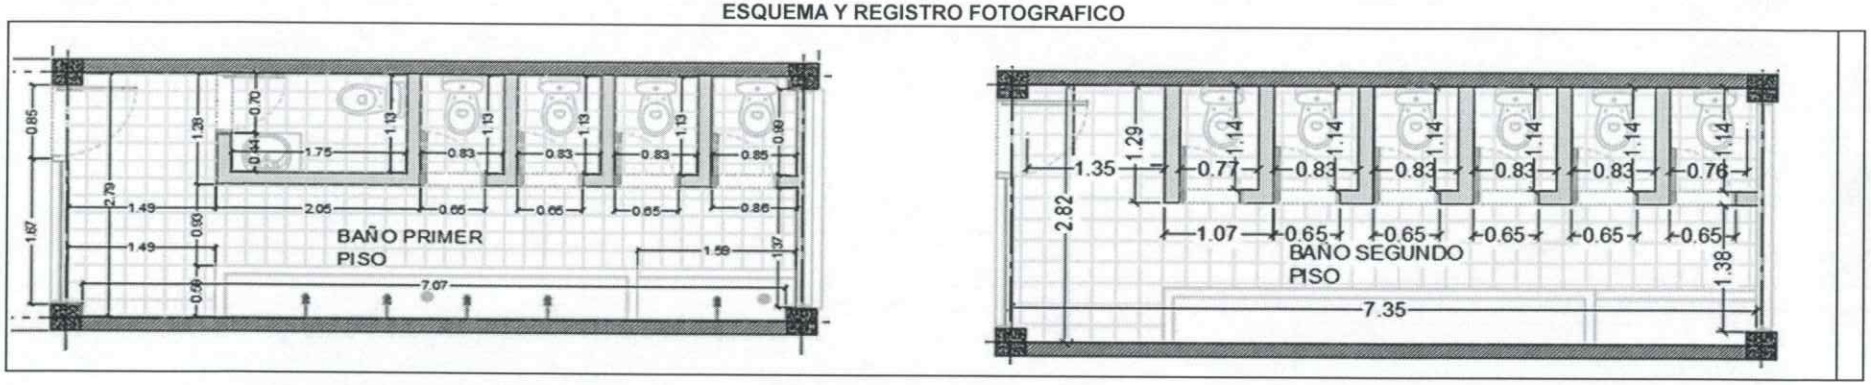





ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	62	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Piso Aula multiple	11,00	9,00				1		**99,00**		
	Piso Aula multiple	11,00	7,50				1		**82,50**		
	Piso baños Bloque salones	2,80	7,35				0		-		
								TOTAL	**181,50**		


FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

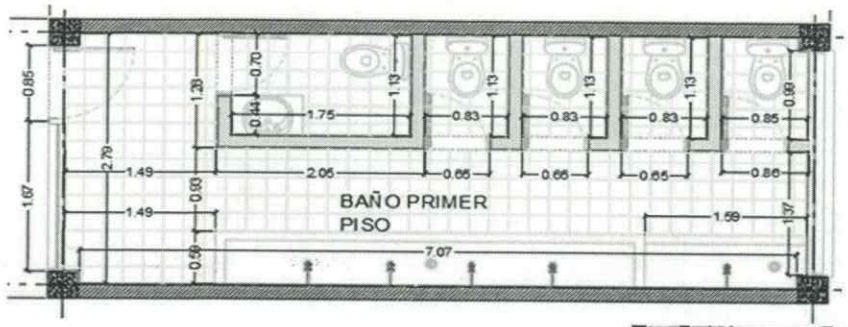

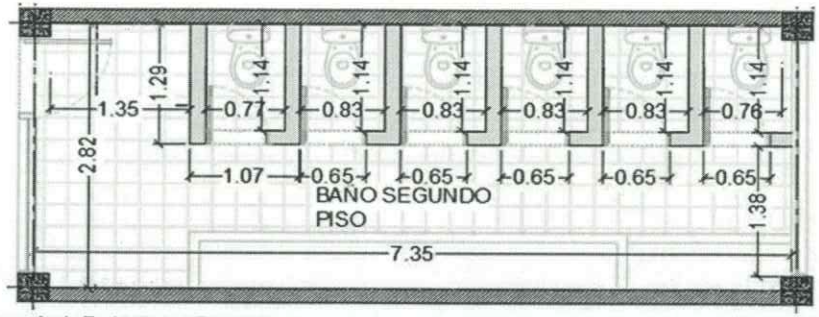


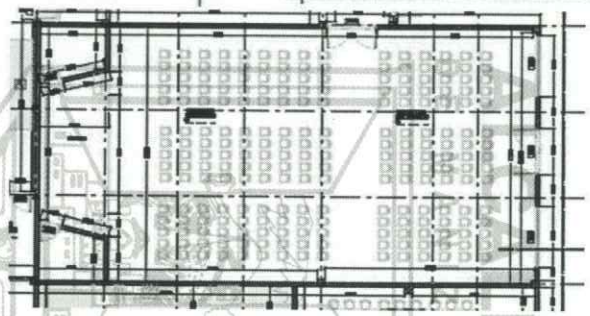





USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES





ALCALDIA
DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	63	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Pared baños bloque salones piso 1	1,74		2			1		**3,13**		
	Pared baños bloque salones piso 1	2,00		1,80			1		**3,60**		
	Pared baños bloque salones piso 1	7,30		1,80			1		**13,14**		
	Pared baños bloque salones piso 1	1,66		1,80			1		**2,99**		
	Pared baños bloque salones piso 1	0,60		1,80			1		**1,08**		
	Pared baños bloque salones piso 1	2,03		1,80			1		**3,65**		
	Mocheta division de cabinas	0,30		1,80			4		**2,16**		
	baño discapacitados	1,74		1,80			2		**6,26**		
	baño discapacitados	1,17		1,80			1		**2,11**		
	baño discapacitados	0,48		1,80			1		**0,86**		
	Pared baños bloque salones piso 2	1,36		1,80			1		**2,45**		
	Pared baños bloque salones piso 2	1,77		1,80			1		**3,19**		
	Pared baños bloque salones piso 2	7,30		1,80			1		**13,14**		
	Pared baños bloque salones piso 2	1,53		1,80			1		**2,75**		
	Pared baños bloque salones piso 2	1,30		1,80			1		**2,34**		
	Mocheta division de cabinas	3,22		1,80			1		**5,80**		
	Demolicion de cabinas	1,30		1,80			0		-		
	Demolicion de cabinas	5,80		1,80			0		-		
	Demolicion de cabinas	1,00		6,80			0		-		

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	Demolicion de cabinas	0,70		0,70			0		-		
	Demolicion de enchpe de laboratorio	0,46		10,60			1		4,88		
	Demolicion de enchpe de laboratorio	0,46		6,47			1		2,98		
	Pared de Baños Profesores hombres	3,00		2,08			0		-		
	Mocheta division de cabinas	0,80		1,80			0		-		
	Division de cabinas	1,24		1,80			0		-		
								TOTAL	76,50		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


Comuniquese con la Alcaldia de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co


ALCALDIA DE MANIZALES


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

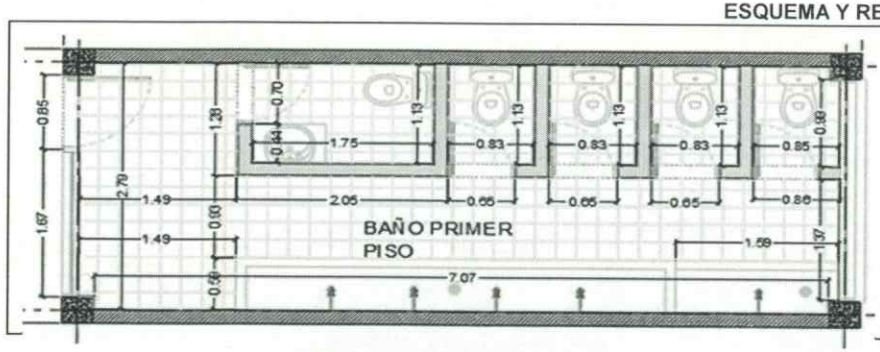

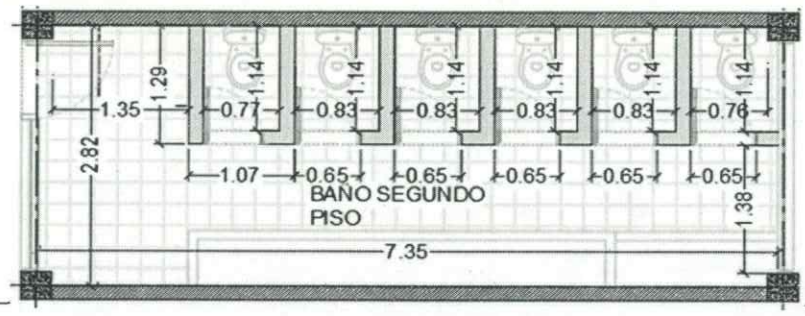

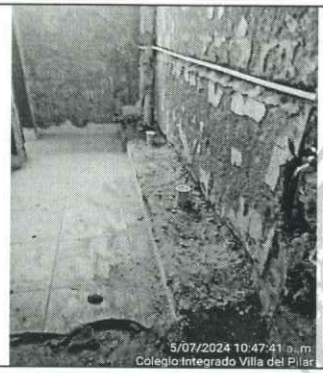



ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	64	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERÍA	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Demolicion de poseta	0,50		0,35			2	0,15	**0,05**		
	Demolicion base lavamanos	0,80		0,80			2	0,15	**0,19**		
	Demolicion de poseta	0,50		0,35			2	0,15	**0,05**		
	Demolicion base lavamanos	0,80		0,80			2	0,15	**0,19**		
	Demolicion de modulos Aula maxima-fachada	2,20		2,70			3	0,15	**2,67**		
	Demolicion de lavamanos	2,85		0,30			2	0,15	**0,26**		
	Demolicion de vigas aula maxima	0,25		0,25			2	2,20	**0,28**		
	Demolicion de dobelas aula maxima	0,10		0,10			21	2,70	**0,57**		
	Demolicion de meson placa arriba	0,78		8,50			1	0,09	**0,56**		
	Demolicion de meson placa abajo	0,78		8,50			1	0,11	**0,73**		
	Demolicion de meson muros	0,78		0,67			6	0,15	**0,47**		
	Demolicion de meson placa arriba	0,62		6,47			1	0,08	**0,32**		
	Demolicion de meson placa abajo	0,62		6,47			1	0,10	**0,40**		
	Demolicion de meson muros	0,62		0,68			4	0,14	**0,24**		
								TOTAL	**6,98**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

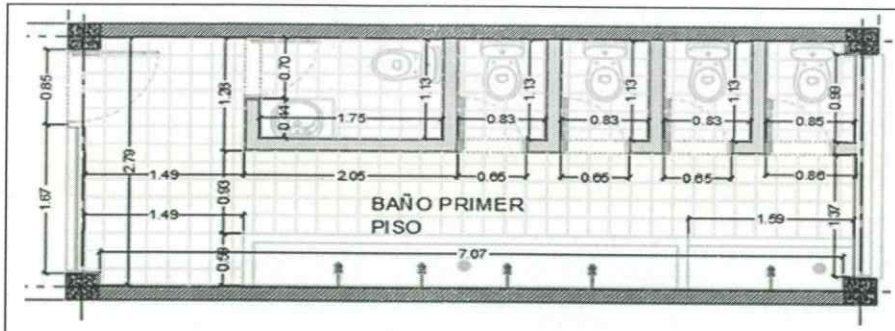

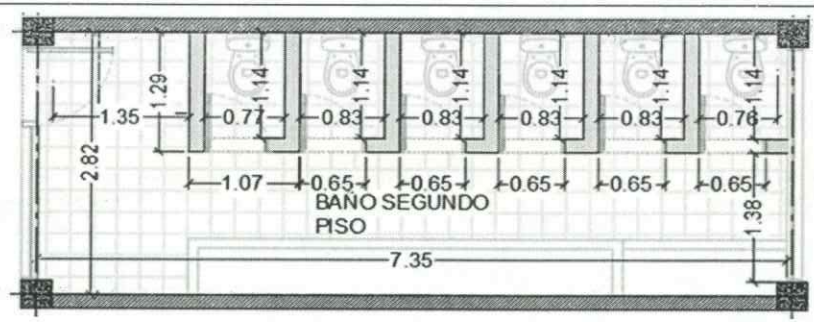







ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES





ALCALDIA
DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	65	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Demolicion de anden costado izquierdo restaurante	13,40		0,40			1	0,12	**0,64**		
	Demolicion viga cerramiento	15,50		0,30			1	0,30	**1,40**		
	Demolicion viga cerramiento	31,50		0,30			0	0,20	-		
	Demolicion de sardinel cerramiento	47,00		0,20			0	0,20	-		
								TOTAL	2,04		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


VEICCON

ITEM 65 DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

ALCALDÍA DE MANIZALES


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO



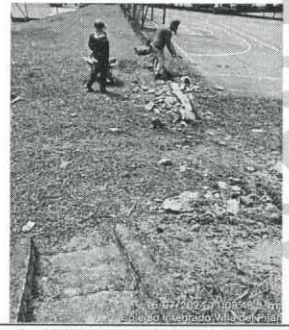





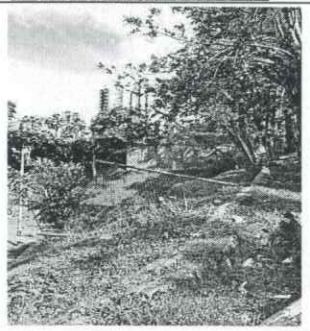

ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	67	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION ORINAL CORRIDO HASTA h=0.10 m. .	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Orinal piso 1 y piso 2		2,10				2		4,20		
								TOTAL	4,20		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4


Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

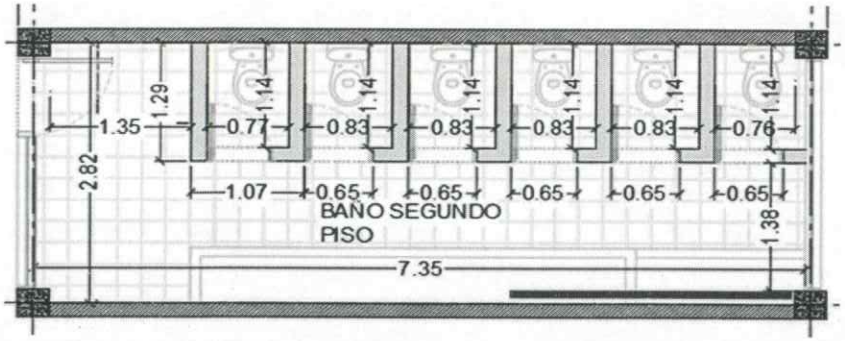

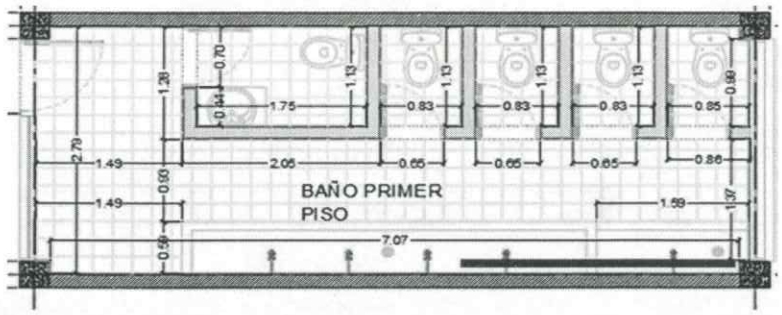

ESPACIO PARA PLANO





ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	68	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Demolicion placa de contrapiso aula multiple	10,85	8,70				1		94,40		
								TOTAL	94,40		

FIRMA
NOMBRE: ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 75031453


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

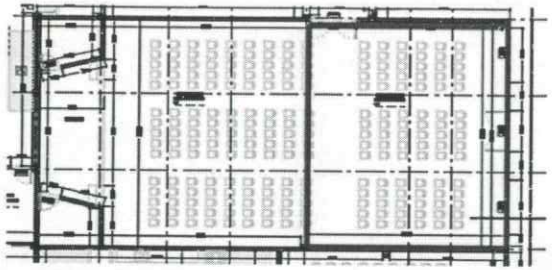









USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	69	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Revoques patio	1,60		0,95			1		**1,52**		
	Revoques patio	2,08		0,53			1		**1,10**		
	Revoques patio	2,40		0,90			1		**2,16**		
	Revoques patio	1,95		0,92			1		**1,79**		
	Revoques patio	1,40		0,90			1		**1,26**		
	Revoques salon	2,97		1,25			1		**3,71**		
	Revoques patio	1,33		0,95			1		**1,26**		
	Revoques patio	1,39		1,25			1		**1,74**		
	Revoques patio	1,85		1,00			0		-		
	Revoques interior	0,30	109,3				1		**32,78**		
	Revoque liso altura mayor a 3m	0,30	35,63				0		-		
	Revoque vigas y columnas	0,40	54,00				0		-		
	Demolicion de mortero aula maxima	10,85	16,70				0		-		
	Demolicion de mortero baños piso uno y dos	2,80	7,35				0		-		
								TOTAL	**47,33**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

VEICCON

ITEM 69 DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO













USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	73	DESCRIPCIÓN ITEM	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Limpieza de vigacanal		30,00				3		**90,00**		
	Limpieza de vigacanal		10,00				18		**180,00**		
	Limpieza de vigacanal		12,00				0		-		
	Limpieza de vigacanal		15,00				0		-		
								TOTAL	**270,00**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: 900811229-4

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

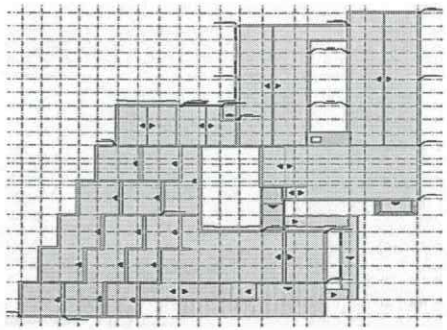









ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	18/07/2024
PREACTA N°	ACTA PARCIAL DE OBRA No.01
CONTRATO N°	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA

N° ITEM	74	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Area cubierta en general	0,93	1,83				15		**25,53**		
	Area cubierta en general	0,93	1,22				25		**28,37**		
								TOTAL	**53,89**		

FIRMA
NOMBRE: **ARQ.ORLANDO MARIN MEJIA**
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: **75031453**


FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
CONTRATISTA VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
CC/NIT: **900811229-4**

Comuniquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co


USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

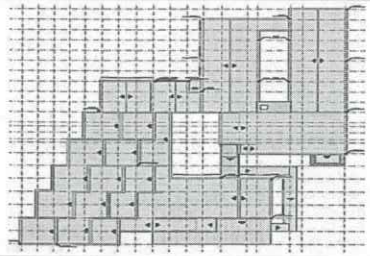



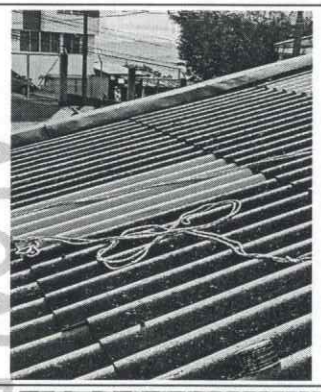



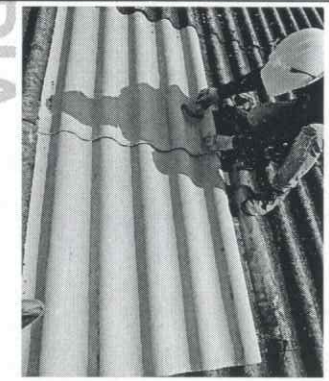

ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
