INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA

INFORME MENSUAL ABRIL DE 2024

CONTRATO No. 2718 DE 2023

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9***".***

ADMINISTRADOR VIAL:
CONSORCIO JORES – CIDEC – 012

SUPERVISOR:
LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

A. Actividades permanentes:

1. Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de estudiar, diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.

   - ✓ Vía 2003A, Depresión el Vergel – Florencia, El supervisor del contrato exige al contratista del puente Los Lagos PR63+0280, realizar la reparación de las juntas elastoméricas (entrada y salida), debido a que el impacto de las llantas de los carros la tienen deterioradas. En el informe trimestral se consignan los puentes que tienen problemas con las juntas.
   - ✓ Vía 6503 Florencia – Puerto Rico, está administración realiza un listado de los sitios críticos algunos de los cuales se están interviniendo con el contrato 991 de 2021 mediante el oficio JORES-CIDEC-012-188I de fecha 23 de abril de 2024.

2. Informar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su Paisajismo, preservación del medio ambiente y a la contaminación visual.

   Vía 2003A

   - ✓ Mediante el contrato No. 1816 de 2020, se solicitó a la interventoría ordenar la reparación del pavimento en el sector de los accesos a los cuatro túneles, a la fecha no se ha realizado esta labor, más sin embargo la cooperativa del sector realizo bacheo con asfalto natural. Así mismo en el presente periodo realizó la limpieza y lavado de los captafaros de los cuatro (4) túneles.

   Vía 6503

   - ✓ En el sector del PR25+0000, zona aledaña al viaducto La Paz y en el sector PR32+0600 al PR32+0750 ambas márgenes, se realizó siembra de árboles el día 05 de diciembre de 2023, la cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad realizo mantenimiento a las plantas sembradas y las mantuvo humectadas.
   - ✓ Se realizó mantenimiento de la arborización en el sector PR50+0000 al PR60+0800, cargo de la cooperativa de trabajo asociado La Central.
   - ✓ La cooperativa La amistad realiza un trincho para canalizar las agua de la quebrada en el PR34+0480, esto permite redireccionar las aguas, e impedir que la quebrada interrumpa el paso de vehículos porque la quebrada dañaba el camino cada vez que llovía.

3. Evaluar, controlar y hacerle seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su administración vial (supervisión).

- ✓ Contrato No. 2996 de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado La Paz – Cooppaz. Las actividades realizadas corresponden a rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas, remoción de derrumbes, poda y corte de árboles, mantenimiento de señales verticales, mantenimiento de puentes, parcheo con asfalto natural y atención inmediata de emergencias. Este contrato termino el 24 de abril de 2004.

- ✓ Contrato No. 3063 de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad. Las actividades realizadas corresponden a rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas, remoción de derrumbes, poda y corte de árboles, mantenimiento de señales verticales, mantenimiento de puentes, parcheo con asfalto natural y atención inmediata de emergencias. Este contrato termino el 24 de abril de 2004.
  .

- ✓ Contrato No. 3039 de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado La Central. Las actividades realizadas corresponden a rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas, remoción de derrumbes, poda y corte de árboles, mantenimiento de señales verticales, mantenimiento de puentes, parcheo con asfalto natural y atención inmediata de emergencias. Este contrato termino el 24 de abril de 2004.
  .

4. Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, y requerir al Contratista de obra reponer los postes de referencia (Señales SI-04) que hagan falta en la vía a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación periódicas para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos anteriores y cuya garantía de estabilidad vigente, según relación de contratos entregada por INVIAS.
   - ✓ En la vía 6503 se deben reponer alguna SI-04 que han sido vandalizadas, se solicitara al contratista del sector realizar dicha reposición.
   - ✓ En la vía 2003A se han dañado algunos postes en el sector donde se realiza la rehabilitación vial PR73+0000 al PR83+0090.

5. Actualizar los costos de insumos, salarios, tarifas generales de equipos, y los demás que pudieran requerirse, empleados en la proyección de los Análisis de Precios Unitarios – APU de referencia del INVIAS, y suministrar la información requerida para los diferentes sistemas de administración de carreteras y/o proyección de valores de referencia y/o presupuestos que utilice o implemente el INVIAS.

   - ✓ El 15 de noviembre de 2023, esta administración realizó la actualización de información en la plataforma INVICOSTOS para la actualización de los precios de referencia del Invias segundo semestre del año 2023.

6. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria y verificar el estado de su mantenimiento rutinario y periódico.


    ✓ Las cooperativas de trabajo asociado realizan el mantenimiento rutinario (lavado de la estructura del puente y estribos), el administrador vial realiza la verificación y constata las necesidades las cuales son actualizadas en el informe trimestral, en la vía 6503 se realizó inspección de los puentes: Puente Roto, Puente Guayas. En la vía 2003A, se realiza inspección del puente Los lagos, Puente Cerro Negro, El dormilón, el Zanjón.

7. Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial correspondiente, así como participar en las evaluaciones de la gestión y de los programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la Administración Vial, en diferentes sitios del país.


    ✓ Se asiste a las reuniones de coordinación y capacitación convocadas por el supervisor y se asiste virtualmente a la capacitación de Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (LIVV) son 10 módulos y el día 17 de abril se asiste a la capacitación SUKUBUN.

8. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red Nacional de carreteras a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS.

    ✓ Se realiza inspección con criterio visual de la vía, la cual es actualizada en el informe trimestral.

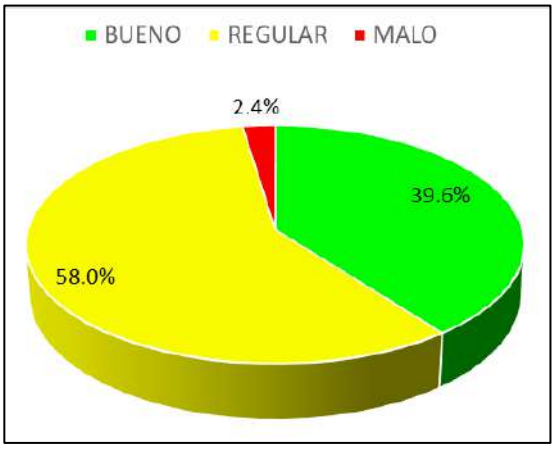

VIA 2003A

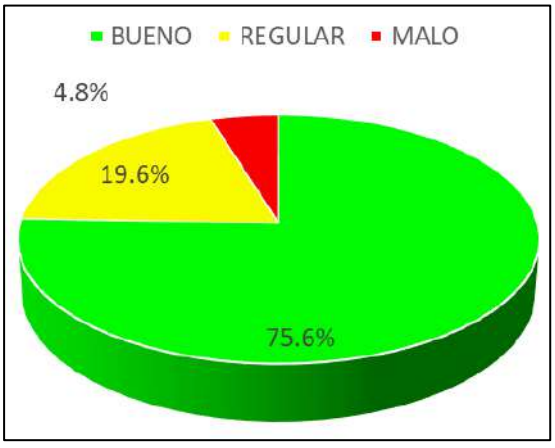

VIA 6503

9. Apoyar la validación de alertas emitidas por los dispositivos ITS, y reportarlas a los Directores Territoriales correspondientes.

a. Reportar siniestros a la tecnología, equipos, dispositivos ITS y demás infraestructura relacionada, instalada en la vía.
b. Apoyar la atención a incidentes reportados desde el CCO.

- ✓ Vía 6503
  PR19+0150 margen derecha 1.526595N 75.480506W MONTAÑITA

- ✓ Vía 2003A
  PR55+0800 margen derecha 1.708345N 75.724300W FLORENCIA
  PR82+0500 margen izquierda. 1.647895N 75.611616W FLORENCIA

Se presento informe sobre inspección de estos dispositivos JORES-CIDEC-012-198-I del 25 de abril de 2024.

10. Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria.

- ✓ El día 26 de marzo de 2024 en el vivero Santo Domingo de la universidad de La Amazonia, se realizó la capacitación en el tema “Restauración y conectividad sistema agro forestales” dictada por el doctor Diego Ferney Caicedo, funcionario del Instituto Amazónico De Investigaciones Científicas – SINCHI.

11. Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles.

- ✓ Vía 2003A PR77+0060, En el presente mes se realizó la construcción de la tapa de una caja de inspección de un descole de cuneta canalizado.
- ✓ Vía 2003A PR59+0040 se instalaron 2 señales SR30(30) y dos señal tipo SI con la leyenda SITIO INESTABLE.
- ✓ El día 04 de abril se retiró una sección de 2mts de la junta de salida del puente El Dormilón, y se instalo asfalto natural. Para prevenir un incidente.
- ✓ En la vía 6503 PR34+048 se realizó la construcción de un trincho en madera para canalizar la quebrada que cada vez que llovía depositaba material de arrastre hasta la mitad de la calzada.

12. Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de embellecimiento y ornato.
    - ✓ Se trabaja especialmente en el mantenimiento de la glorieta intersección de la vía nacional 2003A y la troncal del Hacha, en este sitio se retiró los

hierros que iban a servir de soporte para una columna la cual pretendía soportar un aviso de contaminación visual.
- ✓ En la vía 6503 se trabajó en el embellecimiento y mantenimiento de los pasos nacionales de los municipios de El Paujil, El Doncello y Puerto rico.

B. Actividades de información y control:

1. Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad, llevar un inventario de la señalización existente y de las necesidades de obras de señalización y de seguridad vial.

- ✓ Se trabaja continuamente en la actualización de las necesidades de los puentes en cuanto a la señalización, la cual se encuentra en el cuadro No. 10 del informe Trimestral - necesidades de los puentes.
- ✓ En el presente mes se realizó inventario del estado de las juntas de los puentes en la vía 6503.

2. Recopilar, digitar y reportar mensualmente la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial.

- ✓ En el presente mes se reportaron los accidentes ocurridos en el mes de marzo de 2024 (6 accidentes), con sus respectivos soportes, informe presentado el día 30 de abril de 2024, oficio No. JORES-CIDEC-012-205I y 206I.

3. Proporcionar al INVIAS datos y la información para el cálculo del valor del patrimonio de las vías a cargo.

- ✓ La recolección de estos datos y el informe respectivo será realizada en el momento que lo solicite el INVIAS.

4. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de la CARRETERA y sus fajas de retiro, y gestionar acciones en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes que brinden servicios a los usuarios de las carreteras.

- ✓ El administrador vial trabaja de la mano con las cooperativas de trabajo asociado para hacer el registro de los sitios donde se presentan invasiones y tomar las medidas que sean necesarias para evitar dichos hechos. Informes JORES-CIDEC-012-157I, 158I, 168I, 169I, 180I, 183I, 189I, 193I, 197I, 204I.

5. Supervisar la elaboración de los conteos manuales y/o automatizados (DISPOSITIVOS ITS) de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga.

   ✓ Esta actividad aún no se ha realizado en las vías a cargo.


C. Actividades específicas:

1. Llevar a efecto la toma de información y/o modificaciones y/o ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS.


   ✓ Pendiente de las instrucciones por parte del invias para realizar las actividades respectivas.

2. Evaluar semestralmente con criterio técnico el estado de la red vial a cargo con la metodología suministrada por el INVIAS.

   En el presente mes se actualizó la información correspondiente a señalización vertical y horizontal, estado de los Puentes, Pontones y obras de arte, se presentó el informe respectivo con fecha 30 de marzo de 2024 oficio No. JORES-CIDEC-012-145I.

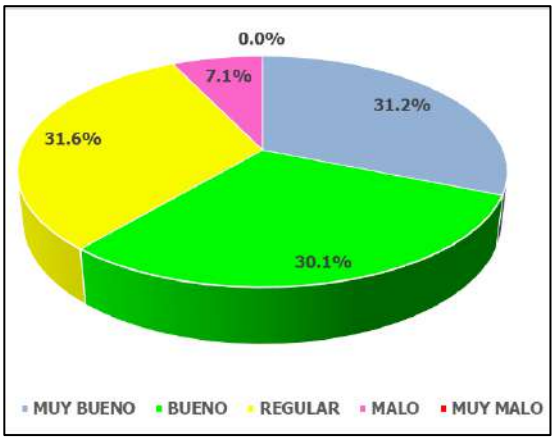

VIA 2003A

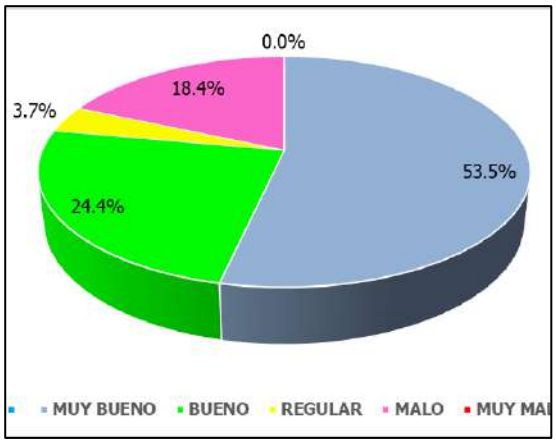

VIA 6503

3. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo.

   ✓ Actividad a realizar cuando el INVIAS lo solicite

4. Colaborar y participar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red nacional de carreteras y

mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES del INVIAS.

- ✓ Hasta la fecha solo se está haciendo el ingreso de la accidentalidad, estamos a la espera de instrucciones para el ingreso de información adicional en aplicativo HERMES, en el presente mes se asistió a la capacitación virtual de la aplicación SIGP, SUKUBUN, ARGIS SURVEY 123, la cual empezamos a aplicar con algunos problemas de acceso en especial en el aplicativo SIGP.

5. Establecer la necesidad de efectuar estudios y diseños tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo.

- ✓ Mediante el contrato de obra No. 991 de 2021, se está atendiendo sitios críticos por inestabilidad de taludes, el PR52+0800 en construcción muro de contención sobre pilotes el avance en el presente mes fue del 5% un maestro y dos obreros en promedio es el personal de la obra, PR32+800 construcción de variante por colapso del Puente las delicias, la variante fue habilitada el día 12 de enero de 2024, la variante está funcionando con algunos problemas en los accesos, PR42+0600 construcción de Boxculvert avance en el mes del 0%, estos trabajos están abandonados desde el mes el 16 de diciembre de 2023, se presentó informe especifico el día 23 de abril de 2024 mediante el oficio JORES-CIDEC-012-188I.
- ✓ Mediante el contrato 1816 de 2020, se está atendiendo sitios críticos por inestabilidad de taludes, en el PR42+0800 hay paso alterno por variante, el contratista retomo actividades para la estabilización de este talud, en el PR54+0100 se continua con la instalación del manto permanente y pernos de fijación, en el PR80+0100 se realiza mantenimiento a la vía mediante adición de fresado.

6. Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial – HERMES.

- ✓ Se trabaja en la toma de información vial para alimentar el aplicativo, a la fecha solo se está realizando el ingreso de los accidentes de tránsito, cuando el aplicativo falla se reporta la falla en los informes de accidentalidad.

7. Recolectar, digitar y reportar la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras a su cargo, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de soluciones como pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS.

- ✓ Durante el presente mes no se reporta atropellamiento de fauna
- ✓ Se recibió la capacitación respectiva a la cual asistió el ingeniero residente y el ingeniero auxiliar de esta administración vial.

8. Evaluación y Diagnóstico Superficial y Estructural del Pavimento.

- ✓ No se realiza esta actividad en el presente periodo.

9. Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS

- ✓ Contrato 1816 de 2020 - Contratista: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA – CAQUETÁ
  Se realiza Seguimiento a las actividades realizadas por el contrato en la vía 2003A, se presentan informes semanales.
- ✓ Contrato No. 991 del 2021. CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
  Se realiza Seguimiento a las actividades realizadas por el contrato en la vía 6503, se presentan informes semanales.

Sin otro particular,

RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA
Ingeniero residente GRUPO AMV1

C.C. / ARCHIVO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	2	mayo	2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

CONTRATO DE OBRA No.: 2718 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO JORES-CIDEC-012

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA	76.314.126	ING. RESIDENTE	$ 5.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO JORES-CIDEC-012	$ 5.800.000	$ 403.700	IV	SANITAS	9466486248	$ 232.000	COLPENSIONES	9466486248	$ 986.000	$ 232.000			
2	JHON JAIRO BERNAL RENDON	7.560.107	ING. AUXILIAR	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.000.000	$ 278.400	IV	NUEVA E.P.S.	9466486248	$ 160.000	COLPENSIONES	9466486248	$ 640.000	$ 160.000			
3	CARLOS ALBERTO VILLEGAS	16.665.637	CONDUCTOR	$ 1.413.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.413.600	$ 98.400	IV	NUEVA E.P.S.	9466486248	$ 56.600	COLPENSIONES	9466486248	$ 226.200	$ 56.600			
4	MARLENY STERLING HURTATIS	1.015.997.764	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.356.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.356.000	$ 94.400	IV	NUEVA E.P.S.	9466486248	$ 54.300	COLPENSIONES	9466486248	$ 217.000	$ 54.300			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 12.569.600**																																							

El Interventor adjunta la certificación de fecha **2/05/2024** a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA
Residente de Interventoría (GRUPO AMV 1)
Matrícula No. : 19202-67664 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 mayo 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

CONTRATO INTERVENTORÍA No. N/A **INTERVENTORÍA:** N/A

CONTRATO DE OBRA No. 2718 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO JORES-CIDEC-012

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
VEHICULO DE PLACA JBT 895, modelo 2017, platón	CAMIONETA RENAULT - DUSTER OROCH, MODELO 2017. CILINDRAJE 1998	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VEHICULO DE PLACA MTN 599, modelo 2013	CAMIONETA HYUNDAY - TUCSON IX35 GL, MODELO 2013. CILINDRAJE 1995	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
DRON	DJI MINI 3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
GPS de precisión submétrica	Trimble TC150	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA
Residente de Interventoría (GRUPO AMV 1)
Matrícula No. : 19202-67664 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 2 mayo 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2718 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO JORES-CIDEC-012

INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N/A **INTERVENTOR:** N/A

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	20	24	22	21	24	24	20	21	24	24	24	24	24	24	24	24	12	24	24	20	24	20	18	20	24	24	15	16	24	24		**657**
Lluvias moderadas	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	4	0	4	6	4	0	0	5	4	0	0		**46**
Lluvias intensas	0	0	2	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0		**17**
Total horas	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**		**720**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA
Residente de Interventoría (GRUPO AMV 1)
Matrícula No. : 19202-67664 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **CONTROL ESTADO DE SALUD FRENTE A PANDEMIA POR COVID-19**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

FECHA: 2 (Día) mayo (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION VIAL Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

MES DEL INFORME: ABRIL DE 2024 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2718 DE 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

INTERVENTOR: **CONSORCIO JORES-CIDEC-012** **SECTORES:** DEPRESION EL VERGEL - FLORENCIA, PR41+0742 - PR83+0537
FLORENCIA - PUERTO RICO PR00+0000 - PR96+0763

NOMBRE	CARGO	ABRIL DE 2024																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA	ING. RESIDENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JHON JAIRO BERNAL RENDON	ING. AUXILIAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MARLENY STERLING HURTATIS	AUX. ADMINISTRATIVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CARLOS ALBERTO VILLEGAS	CONDUCTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ANDRÉS FELIPE BEDOYA CAPERA	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
DANILO CHILATRA GARATEJO	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
DEIRO GÓMEZ MEDINA	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
DIANA HOYOS	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
DIEGO PINZON MORA	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
EDIMES CORRALES ARIAS	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
EDIRSON PINEDA	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
GABRIEL PLAZA MARTÍNEZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ISMAEL CAPERA QUIÑONES	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JORGE ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JOSÉ ARNOLDO CABRERA FLOREZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JUAN BAUTISTA MENDOZA ALBIS	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
LUIS EDUARDO SÁNCHEZ NARVÁEZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
PEDRO NEL TORREZ DÍAZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
TIRSO CÓRDOBA ROJAS	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ARGEMIRO NARVÁEZ SILVESTRE	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
CESAR ANDRES RODRIGUEZ CALDERON	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
FAVIO PIRAVAN VALENCIA	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
HERNANDO DE JESÚS REYES GAVIRIA	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ALVEIRO CICERY SOTTO	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JAIME RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JOSÉ IGNACIO PIMENTEL LLANOS	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JUAN CARLOS LEGUISAMO PAMPLONA	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
OSCAR ORTIZ PEREZ	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
LUIS ANTONIO PEÑA ALBAN	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
DIRLEY RIVAS GARZÓN	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
HÉCTOR JULIO SOTTO CALDERÓN	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
HERNANDO MOTTA GÓMEZ	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JHON ELKIN ALIRIO ACOSTA BUENO	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JOSE EVARISTO RAMOS ROJAS	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JESÚS MARÍA MONTOYA VINASCO	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
RUSBEL NIETO GÓMEZ	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
UBERNEY OSPINA OSSA	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
WILMER CHATEZ BAUTISTA	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
WILMER PIRAVAN VALENCIA	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
YEISON LIZCANO LEE	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

X = SIN NOVEDAD
A= EN AISLAMIENTO PREVENTIVO
C= CASO CONFIRMADO
R= RECUPERADO
H= HOSPITALIZADO
F= FALLECIDO

Firma

Nombre: **RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA**
Residente de Interventoría (GRUPO AMV 1)
Matrícula No.: 19202-67664 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE ABRIL DE 2024**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	2	mayo	2024
			Día	Mes	Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 1



FOTO No. 2



COMENTARIOS: Vía 6503 PR59+0700, Cooperativa de trabajo asociado La Central, rocería y desmonte manual.

FOTO No. 3



FOTO No. 4



COMENTARIOS: Vía 6503 PR96+0523, Cooperativa de trabajo asociado La Central, programación de limpieza de lecho de río Guayas.

FOTO No. 5



FOTO No. 6



COMENTARIOS: Vía 6503 PR91+0970, Cooperativa de trabajo asociado La Central, trabajo de reparcheo.

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE ABRIL DE 2024**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	2	mayo	2024
			Día	Mes	Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 7



FOTO No. 8



COMENTARIOS: Vía 6503 PR25+0540, Cooperativa de trabajo asociado La Amistad, limpieza de cunetas.

FOTO No. 9



FOTO No. 10



COMENTARIOS: Vía 6503 PR34+0480, Cooperativa de trabajo asociado La Amistad, construcción de trincho para canalización de quebrada.

FOTO No. 11



FOTO No. 12



COMENTARIOS: Vía 6503 PR41+0120, parceo con asfalto natural. Cooperativa la Amistad.

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE ABRIL DE 2024**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	2	mayo	2024
			Día	Mes	Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 13



FOTO No. 14



COMENTARIOS: Vía 2003A PR62+0040 y PR68+0880, Cooperativa de trabajo asociado La Paz, atención de emergencias, retiro de derrumbe con apoyo del contratista de mantenimiento periodico.

FOTO No. 15



FOTO No. 16



COMENTARIOS: Vía 2003A, PR54+0270 mantenimiento rutinario del puente El Dormilón, se reemplaza la junta de dilatación por asfaltita como medida de mitigación, cooperativa La Paz.

FOTO No. 17



FOTO No. 18



COMENTARIOS: Vía 2003A PR72+0620 limpieza manual de cunetas, Cooperativa La Paz.

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE ABRIL DE 2024**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	2	mayo	2024
			Día	Mes	Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 19



FOTO No. 20



COMENTARIOS: Vía 2003A, PR42+0800 Estabilización de talud, terraceos, contrato No. 1816 de 2020 por el CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETA.

FOTO No. 21



FOTO No. 22



COMENTARIOS: Vía 2003A, PR62+0040 y PR62+0800, atención inmediata de emergencias, contrato No. 1816 de 2020, CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETA.

FOTO No. 23



FOTO No. 24



COMENTARIOS: Vía 2003A, PR82+0450. instalacion de la segunda de tres capas de Pavimento MDC-19, contrato de obra No. 1816 de 2020 por el CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETA.

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE ABRIL DE 2024**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	2	mayo	2024
			Día	Mes	Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 25



FOTO No. 26



COMENTARIOS: Vía 6503 PR38+0283 Puente las Delicias, Sitio crítico, paso provisional por batea, contrato No. 991 de 2021 por el CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FOTO No. 27



FOTO No. 28



COMENTARIOS: Vía 6503 PR42+0600, obra suspendida desde el 16 de diciembre de 2023, Sitio crítico, construcción de boxculvert, hay paso provisional por variante, contrato No. 991 de 2021 por el CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y

FOTO No. 29



FOTO No. 30



COMENTARIOS: Vía 6503 PR52+0800, las obras avanzan muy lentamente, se funde la ultima pantalla del Muro sobre pilotes, hay paso por un carril, contrato No. 991 de 2021 por el CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE ABRIL DE 2024**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	2	mayo	2024
			Día	Mes	Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 31



FOTO No. 32



COMENTARIOS: Vía 6503 PR19+0150 inspeccion de dispositivos ITS.

FOTO No. 33



FOTO No. 34



COMENTARIOS: Vía 2003A PR48+0220, limpieza de tuneles y de la señalizacion (captafaros).

FOTO No. 35



FOTO No. 36



COMENTARIOS: Vía 2003A, PR53+0150 margen derecha y PR79+0080 margen izquierda. Invasiones a las fajas de vía.
