INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA

INFORME MENSUAL OCTUBRE DE 2023

CONTRATO No. 2718 DE 2023

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9***".***

ADMINISTRADOR VIAL:
CONSORCIO JORES – CIDEC – 012

SUPERVISOR:
LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

A. Actividades permanentes:

1. Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de estudiar, diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.

   - ✓ El día 20 de octubre de 2023 se radico el oficio JORES-CIDEC-012-0331 en el que se informa sobre la inspección realizada al sector PR30+0273 al PR30+0302 de la vía 6503 (Florencia - Puerto Rico), margen derecha. Se presenta un informe con presupuesto actualizado para la construcción de un muro de contención de 35ml tipo H3 de altura 3mts, se hace la recomendación para que este sitio sea atendido con recursos del contrato 991 de 2021. Costo estimado $95.937.985
   - ✓ En recorrido diario de 05 de octubre de 2023 se visita el PR69+0100, Puente La Granada, la solución para mitigar la inestabilidad seria la construcción de 20m3 de gaviones y la solución definitiva es la construcción de aletas en concreto reforzado de L=20,0mts cada una y altura 8mts.

2. Informar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su Paisajismo, preservación del medio ambiente y a la contaminación visual.

   Vía 2003A

   - ✓ La Cooperativa de Trabajo Asociado La Paz – Cooppaz
     Realizó Limpieza de túneles, Recolección de basuras, Poda y corte de árboles en todo el sector a cargo.

   - ✓ Mediante el contrato No. 1816 de 2020, se está continúa realizando la reparación de las losas de acceso entrada y salida de los túneles 1 y 4, se terminó la intervención en el túnel 2.

   Vía 2503

   - ✓ Limpieza de puentes y barandas de los puentes Viaducto la Paz, La Doncello, Oteguaza, con el fin de mejor el paso peatonal y brindar seguridad a los transeúntes. Estas actividades se realizaron con la cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad.

   - ✓ Limpieza de cunetas y bermas por los pasos nacionales El doncello y Puerto Rico con la Cooperativa de Trabajo Asociado La Central.

3. Evaluar, controlar y hacerle seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su administración vial (supervisión).

   - ✓ Contrato No. 2996 de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado La Paz – Cooppaz.
     En el cuadro detallado del acta de la cooperativa se muestra lo ejecutado en el presente mes, entre las actividades realizadas en el sector se destacan La rocería, parcheo con asfáltita, limpieza de calzada, limpieza de cunetas, limpieza de obras de arte, limpieza de encoles y descoles, poda de y corte de árboles, mantenimiento de puentes, limpieza de túneles, cambio de calcomanías de 38 señales verticales.

   - ✓ Contrato No. 3063 de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad.
     En el cuadro detallado del acta de la cooperativa se muestra lo ejecutado en el presente mes, entre las actividades realizadas en el sector se destacan La rocería, bacheo, limpieza de calzada, limpieza de cunetas, limpieza de obras de arte, limpieza de encoles y descoles, poda y corte de árboles, mantenimiento de puentes, limpieza de señalización vertical y cambio de calcomanías de 12 señales verticales.

   - ✓ Contrato No. 3039 de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado La Central.
     En el cuadro detallado del acta de la cooperativa se muestra lo ejecutado en el presente mes, entre las actividades realizadas en el sector se destacan La rocería, bacheo, limpieza de calzada, limpieza de cunetas, limpieza de obras de arte, limpieza de encoles y descoles, poda y corte de árboles, mantenimiento de puentes, protección de taludes con bolsasuelos.

4. Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, y requerir al Contratista de obra reponer los postes de referencia (Señales SI-04) que hagan falta en la vía a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación periódicas para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos anteriores y cuya garantía de estabilidad vigente, según relación de contratos entregada por INVIAS.
   - ✓ Se realizó el inventario y estado de los postes de referencia de las dos vías a cargo en la que se observa la necesidad de reemplazar o reponer algunos postes de referencia, los insumos serian suministrados por el AMV y la formaleta la Dirección Territorial.

5. Actualizar los costos de insumos, salarios, tarifas generales de equipos, y los demás que pudieran requerirse, empleados en la proyección de los Análisis de Precios Unitarios – APU de referencia del INVIAS, y suministrar la información requerida para los diferentes sistemas de administración de carreteras y/o

proyección de valores de referencia y/o presupuestos que utilice o implemente el INVIAS.

- ✓ Esta administración recibió la capacitación de actualización de APU´S, se está trabajando en las cotizaciones y el ingreso de precios de los diferentes insumos en la plataforma del Invias, el invias concedió plazo hasta el 15 de noviembre de 2023.

6. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria y verificar el estado de su mantenimiento rutinario y periódico.


   - ✓ Las cooperativas de trabajo asociado realizan el mantenimiento rutinario (lavado de la estructura del puente y estribos y se hace la inspección visual cada vez que pasan haciendo el mantenimiento vial, el administrador vial realiza la verificación y constata las necesidades las cuales son actualizadas en el informe trimestral, en la vía 6503 se realizó inspección de los puentes Guayas, La Granada, Montecristo, La Doncello y el Viaducto La Paz. En la vía 2003ª, se realiza inspección al puente Las Brisas, y puente el Hacha.

7. Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial correspondiente, así como participar en las evaluaciones de la gestión y de los programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la Administración Vial, en diferentes sitios del país.


   - ✓ El día 13 de octubre de 2013, si asistió a la primera reunión de administradores viales en la que participo el director encargado de la Dirección Territorial Caquetá, ing. José Ricardo Burbano, ing. Supervisor Luis Guillermo Fajardo Oliveros, y los residentes y Auxiliares de las administraciones viales 1, 2 y 3

8. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red Nacional de carreteras a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS.

   - ✓ Se realiza inspección con criterio visual de la vía, la cual es actualizada en el informe trimestral.

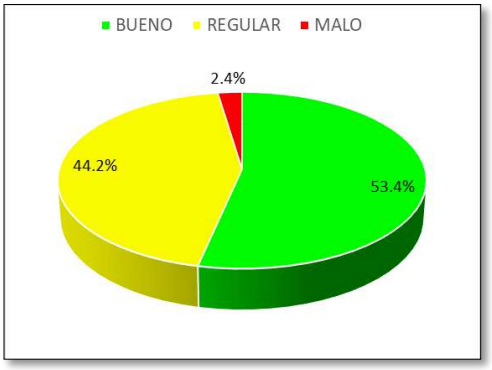

VIA 2003A

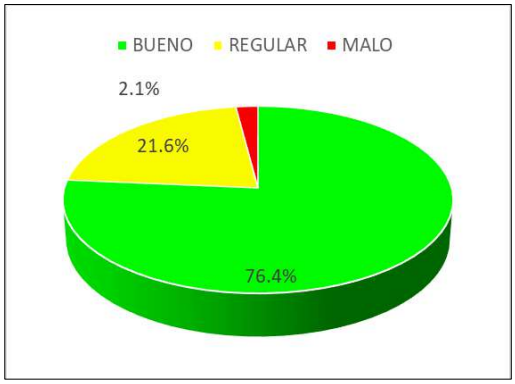

VIA 6503

9. Apoyar la validación de alertas emitidas por los dispositivos ITS, y reportarlas a los Directores Territoriales correspondientes.

    a. Reportar siniestros a la tecnología, equipos, dispositivos ITS y demás infraestructura relacionada, instalada en la vía.
    b. Apoyar la atención a incidentes reportados desde el CCO.

        ✓ En la vía 6503 está instalado en el PR19+0150
        ✓ En la vía 2003A están ubicados en el PR55+0900 y PR83+0380

10. Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria.

    ✓ En el presente mes no se realizó capacitación

11. Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles.

    ✓ En el presente mes esta administración vial realizó la actividad de cambio de calcomanías de 50 tableros de señales verticales tipo SR y SP, de las cuales 12 und se ubicaron en la vía 6503, actividad realizada por la cooperativa La Amistad y 38 und en la vía 2003A trabajo realizado por la cooperativa La Paz, la cooperativa de trabajo la Central realizo la protección del terraplén de acceso al puente el Salado PR83+812.

12. Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de embellecimiento y ornato.

B. Actividades de información y control:

1. Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad, llevar un inventario de la señalización existente y de las necesidades de obras de señalización y de seguridad vial.

    - ✓ Se trabaja continuamente en la actualización de las necesidades de los puentes en cuanto a la señalización, la cual se encuentra en el cuadro No. 10 del informe Trimestral - necesidades de los puentes.
    - ✓ En el presente periodo se realizo la restauración de 50 señales verticales (cambio de la calcomanía), 12und en la vía 6503 y 38und en la vía 2003A

2. Recopilar, digitar y reportar mensualmente la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial.

    - ✓ En el presente mes se reportaron los accidente ocurridos en el mes de septiembre de 2023, con sus respectivos soportes, informe presentado el día 23 de octubre de 2023 mediante oficio JORES-CIDEC-012-034-I.

3. Proporcionar al INVIAS datos y la información para el cálculo del valor del patrimonio de las vías a cargo.

    - ✓ La recolección de estos datos y el informe respectivo será realizado en el momento que lo solicite el INVIAS.

4. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de la CARRETERA y sus fajas de retiro, y gestionar acciones en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes que brinden servicios a los usuarios de las carreteras.

    - ✓ El administrador vial trabaja de la mano con las cooperativas de trabajo asociado para hacer el registro de los sitios donde se presentan invasiones y tomar las medidas que sean necesarias para evitar dichos hechos.
    - ✓ En el presente mes se presentan dos ocupaciones a la zona de vía, las cuales son reportadas al instituto nacional de vías y se notifica a la Personería y la secretaria Municipal de Florencia el día 19 de octubre de 2023 mediante los oficios JORES-CIDEC-012-027-I, JORES-CIDEC-012-028-I, JORES-CIDEC-012-029-I y JORES-CIDEC-012-030-I, invasiones en la vía 6503 PR10+0945 Y PR13+0310.

5. Supervisar la elaboración de los conteos manuales y/o automatizados (DISPOSITIVOS ITS) de tránsito, revisar la información de campo que se

enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga.

- ✓ Esta actividad aún no se ha realizado en las vías a cargo.


C. Actividades específicas:

1. Llevar a efecto la toma de información y/o modificaciones y/o ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS.


   - ✓ Pendiente de las instrucciones por parte del invias para realizar las actividades respectivas.

2. Evaluar semestralmente con criterio técnico el estado de la red vial a cargo con la metodología suministrada por el INVIAS.

   Se esta trabajando en la actualización de la información para estimar el estado de la red con criterio técnico, informe que deberá ser presentado el 15 de noviembre de 2023.

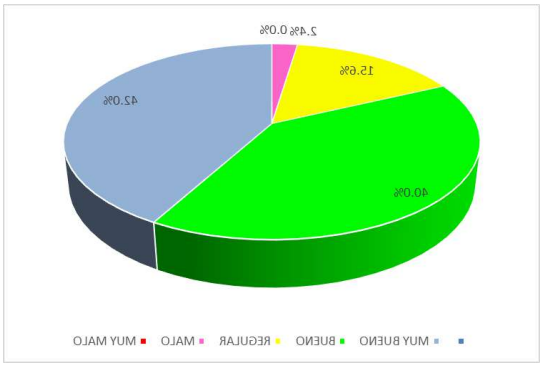

VIA 2003A

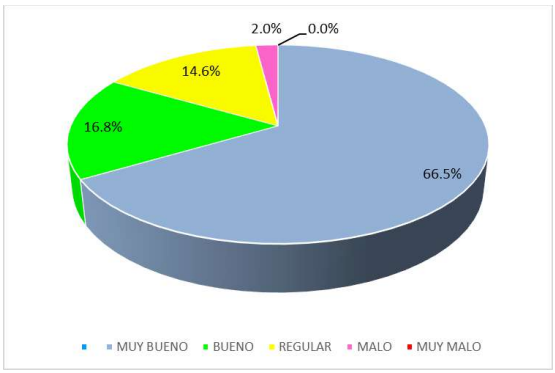

VIA 6503

3. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo.

   - ✓ Actividad a realizar cuando el INVIAS lo solicite

4. Colaborar y participar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red nacional de carreteras y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES del INVIAS.

- ✓ Hasta la fecha solo se está haciendo el ingreso de la accidentalidad, estamos a la espera de instrucciones para el ingreso de información adicional en aplicativo HERMES

5. Establecer la necesidad de efectuar estudios y diseños tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo.

   - ✓ Mediante el contrato de obra No. 1816 de 2020, se está atendiendo sitios críticos por inestabilidad de taludes, el PR52+0800 en construcción muro de contención sobre pilotes el avance en el presente mes fue del 0%, PR32+800 construcción de variante por colapso del Puente las delicias, el avance es del 70%, PR42+0600 construcción de Boxculvert avance del 30%.
   - ✓ Mediante el contrato 1816 de 2020, se está atendiendo sitios críticos por inestabilidad de taludes, en el PR42+0800 hay paso alterno por variante, en el PR54+0100 se continua con la instalación del manto permanente y pernos de fijación.

6. Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial – HERMES.

   - ✓ Se trabaja en la toma de información vial para alimentar el aplicativo, a la fecha solo se está realizando el ingreso de los accidentes de tránsito.

7. Recolectar, digitar y reportar la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras a su cargo, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de soluciones como pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS.

   - ✓ Durante el presente mes no se reporta atropellamiento de fauna

8. Evaluación y Diagnóstico Superficial y Estructural del Pavimento.

   No se realiza esta actividad en el presente periodo.

9. Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS

   - ✓ Contrato 1816 de 2020 - Contratista: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA – CAQUETÁ
     Se realiza Seguimiento a las actividades realizadas por el contrato en la vía 2003A, se presentan informes semanales.

- ✓ Contrato No. 991 del 2021. CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
  Se realiza Seguimiento a las actividades realizadas por el contrato en la vía 6503, se presentan informes semanales.

Sin otro particular,

RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA
Ingeniero residente GRUPO AMV1

C.C. / ARCHIVO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	1	noviembre	2023
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

CONTRATO DE OBRA No.: 2718 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO JORES-CIDEC-012

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA	76.314.126	ING. RESIDENTE	$ 5.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO JORES-CIDEC-012	$ 5.800.000	$ 403.700	IV	SANITAS	9458379316	$ 232.000	COLPENSIONES	9458379316	$ 986.000	$ -			
2	JHON JAIRO BERNAL RENDON	7.560.107	ING. AUXILIAR	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.000.000	$ 278.400	IV	NUEVA E.P.S.	9458379316	$ 160.000	COLPENSIONES	9458379316	$ 640.000	$ 194.200			
3	CARLOS ALBERTO VILLEGAS	16.665.637	CONDUCTOR	$ 1.413.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.413.600	$ 98.400	IV	NUEVA E.P.S.	9458379316	$ 56.600	COLPENSIONES	9458379316	$ 226.200	$ 74.300			
4	MARLENY STERLING HURTATIS	1.015.997.764	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.356.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.356.000	$ 94.400	IV	NUEVA E.P.S.	9458379316	$ 54.300	COLPENSIONES	9458379316	$ 217.000	$ 62.800			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 12.569.600**																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha **1/11/2023** a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA
Residente de Interventoría (GRUPO AMV 1)
Matrícula No. : 19202-67664 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 1 noviembre 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

CONTRATO INTERVENTORÍA No. N/A **INTERVENTORÍA:** N/A

CONTRATO DE OBRA No. 2718 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO JORES-CIDEC-012

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO DE PLACA JBT 895, modelo 2017, platón	CAMIONETA RENAULT - DUSTER OROCH, MODELO 2017. CILINDRAJE 1998	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO DE PLACA MTN 599, modelo 2013	CAMIONETA HYUNDAY - TUCSON IX35 GL, MODELO 2013. CILINDRAJE 1995	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DRON	DJI MINI 3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GPS de precisión submétrica	Trimble TC150	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA
Residente de Interventoría (GRUPO AMV 1)
Matrícula No. : 19202-67664 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 1 noviembre 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2718 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO JORES-CIDEC-012

INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N/A **INTERVENTOR:** N/A

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	20	16	24	24	24	20	24	24	24	20	24	24	20	24	24	24	24	18	24	24	24	24	19	**709**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	**11**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	**24**
Total horas	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA
Residente de Interventoría (GRUPO AMV 1)
Matrícula No. : 19202-67664 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL ESTADO DE SALUD FRENTE A PANDEMIA POR COVID-19	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	1	noviembre	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION VIAL Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

MES DEL INFORME: OCTUBRE DE 2023 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2684 DE 2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

INTERVENTOR: **CONSORCIO JORES-CIDEC-012** **SECTORES:** DEPRESION EL VERGEL - FLORENCIA, PR41+0742 - PR83+0537
FLORENCIA - PUERTO RICO PR00+0000 - PR96+0763

NOMBRE	CARGO	OCTUBRE DE 2023																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA	ING. RESIDENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JHON JAIRO BERNAL RENDON	ING. AUXILIAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARLENY STERLING HURTATIS	AUX. ADMINISTRATIVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS ALBERTO VILLEGAS	CONDUCTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANDRÉS FELIPE BEDOYA CAPERA	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DANILO CHILATRA GARATEJO	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DEIRO GÓMEZ MEDINA	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIANA HOYOS	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIEGO PINZON MORA	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EDIMES CORRALES ARIAS	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EDIRSON PINEDA	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GABRIEL PLAZA MARTÍNEZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ISMAEL CAPERA QUIÑONES	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JORGE ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JOSÉ ARNOLDO CABRERA FLOREZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JUAN BAUTISTA MENDOZA ALBIS	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS EDUARDO SÁNCHEZ NARVÁEZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PEDRO NEL TORREZ DÍAZ	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TIRSO CÓRDOBA ROJAS	COOPEERATIVA LA PAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARGEMIRO NARVÁEZ SILVESTRE	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CESAR ANDRES RODRIGUEZ CALDERON	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FAVIO PIRAVAN VALENCIA	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HERNANDO DE JESÚS REYES GAVIRIA	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVEIRO CICERY SOTTO	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JAIME RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JOSÉ IGNACIO PIMENTEL LLANOS	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JUAN CARLOS LEGUISAMO PAMPLONA	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OSCAR ORTIZ PEREZ	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS ANTONIO PEÑA ALBAN	COOPERATIVA LA AMISTAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIRLEY RIVAS GARZÓN	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HÉCTOR JULIO SOTTO CALDERÓN	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HERNANDO MOTTA GÓMEZ	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JHON ELKIN ALIRIO ACOSTA BUENO	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JOSE EVARISTO RAMOS ROJAS	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JESÚS MARÍA MONTOYA VINASCO	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUSBEL NIETO GÓMEZ	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UBERNEY OSPINA OSSA	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WILMER CHATEZ BAUTISTA	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WILMER PIRAVAN VALENCIA	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YEISON LIZCANO LEE	COOPERATIVA LA CENTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = SIN NOVEDAD
A= EN AISLAMIENTO PREVENTIVO
C= CASO CONFIRMADO
R= RECUPERADO
H= HOSPITALIZADO
F= FALLECIDO

Firma

Nombre: **RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA**
Residente de Interventoría (GRUPO AMV 1)
Matrícula No.: 19202-67664 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE OCTUBRE DE 2023**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	1 Día	noviembre Mes	2023 Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 1



FOTO No. 2



COMENTARIOS: Vía 6503 - Cooperativa de trabajo asociado La Central, limpieza y mantenimiento de postes de referencia.

FOTO No. 3



FOTO No. 4



COMENTARIOS: Vía 6503 - Cooperativa de trabajo asociado La Central, Roceria y poda y corte de arboles.

FOTO No. 5



FOTO No. 6



COMENTARIOS: Vía 6503, Cooperativa de trabajo asociado La Amistad, trabajos de mantenimiento rutinario de puentes (lavado) y atencion de emergencias por caida de arboles.

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE OCTUBRE DE 2023**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	1 Día	noviembre Mes	2023 Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 7



FOTO No. 8



COMENTARIOS: Vía 6503, Cooperativa de trabajo asociado La Amistad, trabajos de mantenimiento rutinario roceria y reubicación de señal informativa.

FOTO No. 9



FOTO No. 10



COMENTARIOS: Cooperativa de trabajo asociado Cooppaz, atención inmediata de emergencias y trabajos de reparcheo con asfaltita.

FOTO No. 11



FOTO No. 12



COMENTARIOS: Cooperativa de trabajo asociado Cooppaz, limpieza manual de cunetas y cambio de calcomanias de algunas señales verticales.

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE OCTUBRE DE 2023**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	1 Día	noviembre Mes	2023 Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 13



REPARACION LOSAS ACCESO DE SALIDA TUNEL 2

FOTO No. 14



CONSTRUCCION DE FIILTROS LONGITUDINALES SECTOR PR80+0940 AL PR81+0500

COMENTARIOS: Vía 2003A Seguimiento a actividades realizadas mediante el contrato No. 1816 de 2020 por el CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETA.

FOTO No. 15



PR73+0000 AL PR73+400 PAVIMENTO ASFALTICO CONSTRUIDO EN DOS CAPAS

FOTO No. 16



REHABILITACION VIAL DEL PR80+0940 AL PR81+0500

COMENTARIOS: Vía 2003A Seguimiento a actividades realizadas mediante el contrato No. 1816 DE 2020 por el CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETA

FOTO No. 17



PR 42+0600 CONSTRUCCION DE BOXCULVER

FOTO No. 18



PR52+0800 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE PILOTES

COMENTARIOS: Vía 6503 Seguimiento a actividades realizadas mediante el contrato No. 991 de 2021 por el CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO JORES-CIDEC-012 NIT: 901736006-1	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA** **REG. FOTOGRÁFICO MES DE OCTUBRE DE 2023**	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	1		
		FECHA:	1 Día	noviembre Mes	2023 Año

CONTRATO No. : 2718 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9"

FOTO No. 19



PR38+0283 CONSTRUCCION VARIANTE PASO POR EL RIO (BATEA)

FOTO No. 20



PR38+0283 CONSTRUCCION VARIANTE PASO POR EL RIO (BATEA)

COMENTARIOS: Vía 6503 Seguimiento a actividades realizadas mediante el contrato No. 991 de 2021 por el CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FOTO No. 21



PR96+0523 INSPECCION PUENTE GUAYAS

FOTO No. 22



PR69+0100 INSPECCION PUENTE LA GRANADA

COMENTARIOS: Vía 6503 Actividades de inspeccion de puentes.

FOTO No. 23



REEMPLAZO DE CALCOMANIA DE SEÑAL VERTICAL

FOTO No. 24



INSTALACION DE TABLERO DE SEÑAL VERTICAL, DESPUES DE REMPLAZO DE CALCOMANIA

COMENTARIOS: Vía 6503 Actividades de mantenimiento de la señalización vial
