Para una mezcla MDC-10 se trabaja con el siguiente módulo.

MÓDULO CONCRETO ASFALTICO

DATOS

γ =	2,310	Densidad (gr/cm3)
γ =	144,21	Densidad (lb/pie3)
SF =	0,634	Fracción de arena (material acum No. 40 - tamiz No. 200)
Pen =	63	Penetración del asfalto a 25 ºC.
Mr=	191135,6727	Módulo Elastico, PSI
Mr=	13438,17	Módulo Elastico, kg/cm2

- BASE GRANULAR

Se trabaja con un base granular BG-38 tipo B, según especificación INVIAS 2022 de CBR mínimo del 80%; según especificación INVIAS Art. 330.

- SUB BASE GRANULAR

Se trabaja con un sub base granular SBG-50 tipo B, según especificación INVIAS 2022 con CBR mínimo de 30%; según especificación INVIAS Art. 320.

2.8 DETERMINACIÓN DE ESPESORES

Al definir las variables de entrada se pasa al cálculo del número estructural, el método AASHTO ha implementado la siguiente fórmula de diseño:

FORMULA PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES

$$LogW_{18} = Zr \times So + 9.36 \times Log(SN+1) - 0.2 + \left(\frac{Log\left(\frac{\Delta PSI}{(4.2-1.5)}\right)}{0.40 + \left(\frac{1.094}{(SN+1)^{5.19}}\right)} \right) + 2.32 \times LogMr - 8.07$$

Donde;
W_{18} = ESAL`S
Zr = Desviación estándar normal
So = Error estándar combinado
SN = Número estructural
Mr = Módulo resiliente efectivo
ΔPSI = Pérdida de Serviciabilidad

El número estructural, "SN", es un número abstracto que expresa la resistencia estructural requerida del pavimento para una combinación de soporte del suelo "MR", tránsito total expresado en ejes equivalentes, índice de servicio final y medio

ambiente. El "SN" requerido debe convertirse en espesores de rodadura, base y subbase mediante el uso de coeficientes apropiados que representen la resistencia de los materiales de construcción.

Los coeficientes de capa están basados en el módulo de elasticidad y han sido determinados mediante el análisis de esfuerzos y deformaciones unitarias en sistemas de pavimento multicapa. La solución de la anterior ecuación, representa el valor medio del tránsito que puede ser soportado por unas condiciones determinadas, es decir, existe una probabilidad del 50% de que el tránsito verdadero al momento de alcanzar el índice de servicio final sea mayor o menor que el predicho.

Por lo que, para evitar deterioros tempranos se ha implementado un factor de confiabilidad en el proceso de diseño. El cual, para ser utilizado apropiadamente, los valores que se ingresen a la ecuación de diseño deben ser promedios sin ningún ajuste.

2.9 DISEÑO ESTRUCTURAL

Una vez establecidas las variables de entrada, el diseño se realiza mediante un sistema denominado "Diseño por Análisis de Capas". El procedimiento para la determinación de los espesores se puede resumir en los siguientes pasos:

- Determinación del número estructural requerido, SN. Las variables de entrada son: Tránsito estimado, "W18"; Confiabilidad, "R", la cual asume que todos los valores de entrada son promedios; Desviación estándar total, "S0"; Módulo de Resiliencia de la subrasante, "MR" y pérdida del índice de servicio de diseño, "ΔPSI".

SUB- RASANTE

DATOS

$$LogW18 = Zr*So+9.36*Log(SN+1)-0.2+\frac{Log(\Delta PSI/(4.2-1.5))}{0.40+(1.094/(SN+1)^{5.19})} + 2.32*LogMr-8.07$$

R	80	Confiabilidad,%
zr	-0,841	Desviación Estándar Normal
So	0,45	Error Estándar Combinado
Δ psi	2,4	Diferencia de índices de Servicio
CBR	4,64	%
MR	6960	PSI
w18	1,37E+05	EJES 8.2 TON

Log w18	Ecuación	SN	SN real
5,136324	5,13607429	2,32986976	**2,33**

- Determinar el número estructural requerido sobre la capa de base, "SN1", con los mismos valores de entrada de diseño, pero sustituyendo el valor del Módulo de Resiliencia de la subrasante, "MR", por el valor del módulo de la base.

BASE

DATOS

$$LogW18 = Zr*So+9.36*Log(SN+1)-0.2+\frac{Log(\Delta\ PSI/(4.2-1.5))}{0.40+(1.094/(SN+1)^{5.19})} + 2.32*LogMr-8.07$$

zr	-0,841	Desviación Estándar Normal
So	0,45	Error Estándar Combinado
Δ psi	2,4	Diferencia de índices de Servicio
CBR	80	%
MR	28787,64722	PSI
w18	1,37E+05	EJES 8.2 TON

Log w18	Ecuación	SN	SN real
5,136324	5,136023663	1,33249266	***1,3***

- Determinar el número estructural re- querido sobre la capa de subbase, "SN2", con los mismos valores de entrada de diseño, pero substituyendo el valor del Módulo de Resiliencia de la subrasante, "MR", por el valor del módulo de la subbase.

SUB-BASE

DATOS

$$LogW18 = Zr*So+9.36*Log(SN+1)-0.2+\frac{Log(\Delta\ PSI/(4.2-1.5))}{0.40+(1.094/(SN+1)^{5.19})} + 2.32*LogMr-8.07$$

zr	-0,841	Desviación Estándar Normal
So	0,45	Error Estándar Combinado
Δ psi	2,4	Diferencia de índices de Servicio
CBR	30	%
MR	14749,82336	PSI
w18	1,37E+05	EJES 8.2 TON

Log w18	Ecuación	SN	SN real
5,136324	5,136014881	1,75619598	***1,8***

- Con base en la fórmula de concepto matemático de número estructural, "SN", como la sumatoria del producto de los espesores de las capas, "Di", por los coeficientes de capa, "ai", y los coeficientes de drenaje, "mi", en caso de trabajar con capas granulares no tratadas. Para la obtención de los coeficientes de capa "a1", "a2" y "a3" deberán utilizarse las gráficas contenidas en la Guía AASHTO.

$$SN = a_1D_1 + a_2D_2 + a_3D_3m_3$$

	ING. ROBINSON MARROQUÍN PÉREZ Ing. Civil, Especialista en Ingeniería de Pavimentos	CÓDIGO: FT- IN- 01	
		VERSIÓN:1	FECHA 14-09-2012
		PÁGINA 13 DE 20	
	DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ESTADO: NO CONTROLADO	

El coeficiente a1r y a1a corresponde al aporte estructural de la capa en MDC-10 y MDC-19 respectivamente y se calcula con la siguiente gráfica.

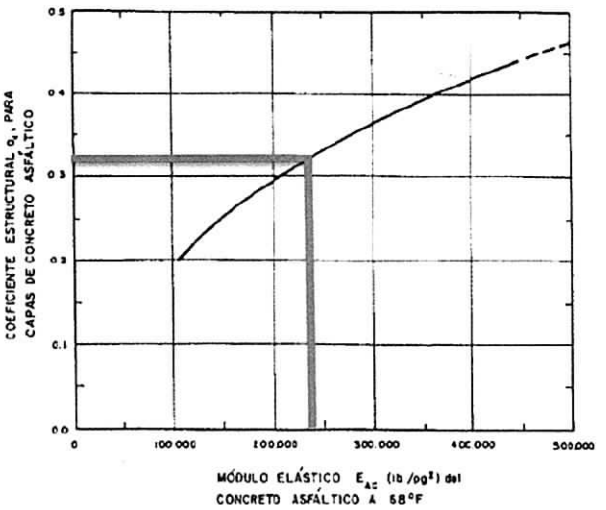


Gráfico para determinar el coeficiente estructural (a1) de la mezcla asfáltica.
Fuente: AASHTO Guide for designing of pavement Structures 1993

Para la obtención del coeficiente estructural de la base granular a2, se emplea la figura mostrada a continuación.

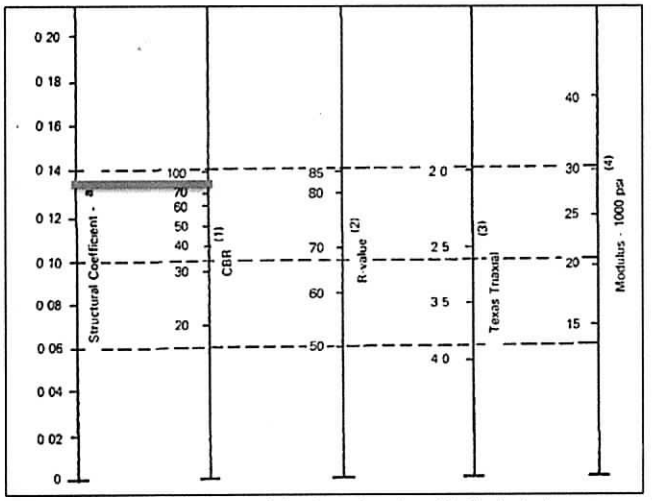


Gráfico para determinar el coeficiente estructural (a2) de la base granular.
Fuente: AASHTO Guide for designing of pavement structures 1993.

Para la obtención del coeficiente estructural de la Subbase granular a3, se emplea la figura mostrada a continuación:


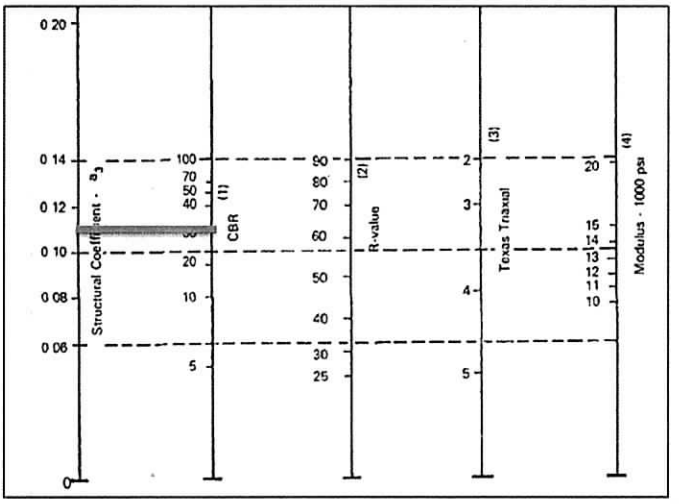


Figura 3. Gráfico para determinar el coeficiente estructural (a3) de la Subbase granular
Fuente: AASHTO Guide for designing of pavement structures 1993.

COEFICIENTES Y NUMEROS ESTRUCTURALES		
DATOS:		
a1r=	0,299	Coeficiente estructural
a1a=	0,329	Coeficiente estructural
a2=	0,132	Coeficiente estructural
a3=	0,110	Coeficiente estructural
SN1=	1,340	Número Estructural
SN2=	1,760	Número Estructural
SN3=	2,330	Número Estructural
mi=	1,000	Coeficiente de Drenaje
mi=	1,000	Coeficiente de Drenaje

La sumatoria de SN1* + SN2* + SN3* debe ser igual o mayor que el "SN" requerido por las condiciones de diseño iniciales. Si esto se verifica se reportan los espesores obtenidos y el proceso de diseño concluye para las condiciones establecidas. A continuación, se presenta el resultado de los espesores requeridos:

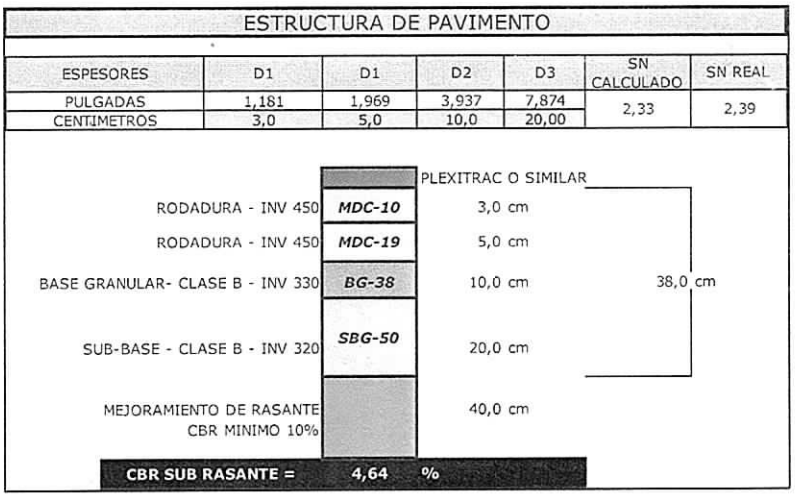

Debido a que se trabaja con bases granulares sin tratar el método de diseño establece espesores mínimos de las capas de base y capas asfálticas, las cuales se aplicaron en el presente diseño, pues estos son en función de tránsito y utilizando la siguiente tabla:

TABLA N°. 20 ESPESORES MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR EL MÉTODO AASHTO

Número de ESAL´s	Capas Asfálticas	Base Granular
Menos de 50,000	3.0 cm	10 cm
50,000 - 150,000	5.0 cm	10 cm
150,000 - 500,000	6.5 cm	10 cm
500,000 – 2,000,000	7.5 cm	15 cm
2,000,000 – 7,000,000	9.0 cm	15 cm
Más de 7,000,000	10.0 cm	15 cm

Fuente: Guía para diseño de Estructuras de Pavimentos, AASHTO, 1.993.

Es de aclarar que todo diseño de pavimentos trae implícitamente una serie de mantenimientos tanto periódico como rutinario para el correcto funcionamiento de la estructura.

Entre el mantenimiento rutinario se entienden todas las actividades encaminadas a mantener la vida útil del pavimento, constituyendo una práctica preventiva y comprende actividades como limpieza de drenajes (cunetas, alcantarillas, pozos de inspección y sumideros), limpieza de obras adyacentes, rocería y limpieza de señales verticales y corona.

Para el diseño se tuvieron en cuenta parámetros de calidad de los materiales que se deberán cumplir para el correcto funcionamiento de las capas estructurales de pavimento, como es el módulo de la mezcla asfáltica, el CBR de 80% de la base granular y el CBR de 30% de la sub base granular.

3. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones en este caso es cumplir con las condiciones de calidad de los materiales a utilizar y seguir adecuadamente el proceso constructivo para este tipo de actividades, teniendo en cuenta los factores climáticos y etapas del proceso, además de los siguientes parámetros:

- Se recomienda realizar la caracterización de los materiales a emplear en la ejecución de cada una de las capas de la estructura de pavimento con el fin de realizar ajustes al diseño en el caso de presentar variaciones en las características fisicoquímicas de los mismos.

- Se debe garantizar un sistema de drenaje clasificado entre bueno y regular, esto es que se debe garantizar que el porcentaje de exposición de la estructura de pavimento a niveles de humedad próximos a la saturación este entre el 1 y el 5%, para esto se debe garantizar un bombeo transversal y longitudinal que evacue rápidamente las aguas y que no contravenga con los criterios de diseño geométricos seguro, de la misma forma para evitar la saturación de las capas inferiores.

- Debido a las características de la rasante, donde predominan ARCILLAS DE BAJA PLASTICIDAD, se recomienda el uso de un geotextil de separación para evitar la contaminación de las capas granulares por migración de suelos finos dentro del suelo granular, disminuyendo su capacidad de drenaje y la intrusión del suelo granular dentro del suelo fino, disminuyendo su capacidad portante (resistencia).

- Si se encuentran fallos del tipo pérdida de soporte de la sub rasante a causa de materiales con características físicas diferentes a las determinadas en el estudio de suelos, es necesario retirar este material y remplazarlo por capas de material granular para evitar que se puedan reflejar en las nuevas capas de pavimento.

- Se debe caracterizar el relleno existente para determinar su valor de CBR, si este es mayor a 10% y no está contaminado se podrá usar como capa de mejoramiento de rasante.

4. CONCLUSIONES


Después del análisis realizado se llegó a las siguientes conclusiones:

- Se trabajó conociendo los datos de las capas del suelo existente, determinadas mediante apiques, el cual determinó la existencia de arenas limosas, con condiciones aceptables para el soporte de la estructura de pavimento.

- En la alternativa de diseño, los materiales que hacen parte de la estructura de pavimento deberán cumplir con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto nacional de Vías 2022 y los parámetros de características físicas expuestas en el diseño. En el presente diseño se tuvieron en cuenta parámetros de calidad de los materiales que se deberán cumplir para el correcto funcionamiento de las capas estructurales de pavimento, como es el módulo de la mezcla asfáltica, el CBR de 80% de la base granular y el CBR de 30% de la sub base granular.

- La alternativa de estructura propuesta para los parámetros establecidos por las necesidades del proyecto es:

Propuesta de estructura de pavimento pista de Atletismo

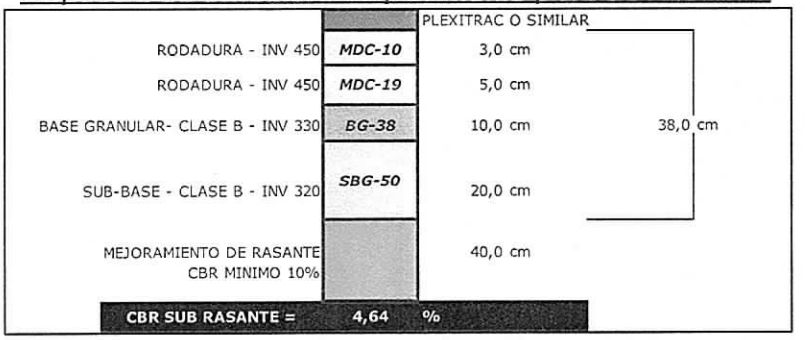

Estructura de pavimento para una confiabilidad del 80%

- Se debe adoptar los diferentes lineamientos dados para la práctica del atletismo en sus diferentes modalidades, en cuanto a especificaciones, procedimientos constructivos y acabado final de la superficie de rodadura, teniendo en cuenta que se debe aplicar un recubrimiento sintético en cumplimiento de las homologaciones internacionales.

5. ACLARACIONES

La alternativa de diseño que hace parte del presente informe está fundamentada en los resultados puntuales de los diferentes ensayos de laboratorio y en los estudios realizados tanto para la exploración del subsuelo como para la proyección del uso.

Teniendo en cuenta que en el presente diseño se establecen los espesores mínimos de capa de las estructuras de pavimento, es importante aclarar que en el diseño geométrico y las recomendaciones hídricas e hidrológicas de la zona pueden indicar que se requiera la inclusión de una capa adicional de afirmado o terraplén con el objetivo de cumplir con el diseño geométrico o evitar zonas inundables, estos espesores aportan un numero estructural adicional que garantiza un mayor tiempo de vida útil.

Si durante la construcción se encuentran condiciones del subsuelo o de uso diferente a las consideradas en el presente diseño, se deberá informar al Ingeniero encargado para estudiar las modificaciones o adiciones que sean necesarias.

El presente diseño es únicamente aplicable a la ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA LA PISTA DE ATLETISMO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", su reproducción parcial o total no está autorizada y es válido solo en medio físico original.

ROBINSON MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil, Esp. Ingeniería de Pavimentos
M.P. No. 25202-090337 CND

6. BIBLIOGRAFÍA

1. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, "Normas de ensayo de materiales para carreteras", Bogotá D.C., 2013.

2. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, "Especificaciones generales de construcción de carreteras", Bogotá D.C., 2022.


3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, "método AASHTO 93", San Juan, 1998.

4. MONTEJO, Alfonso, "Ingeniería de Pavimentos para Carreteras". Santafé de Bogotá, 2001.

5. SANCHEZ SABOGAL, Fernando, "Pavimentos asfalticos de Carreteras – Guía práctica para los estudios y diseños, Bogotá, 2016.

6. ARENAS LOZANO, Hugo León, "Tecnología del Cemento asfáltico, Popayán, 2000, segunda edición.



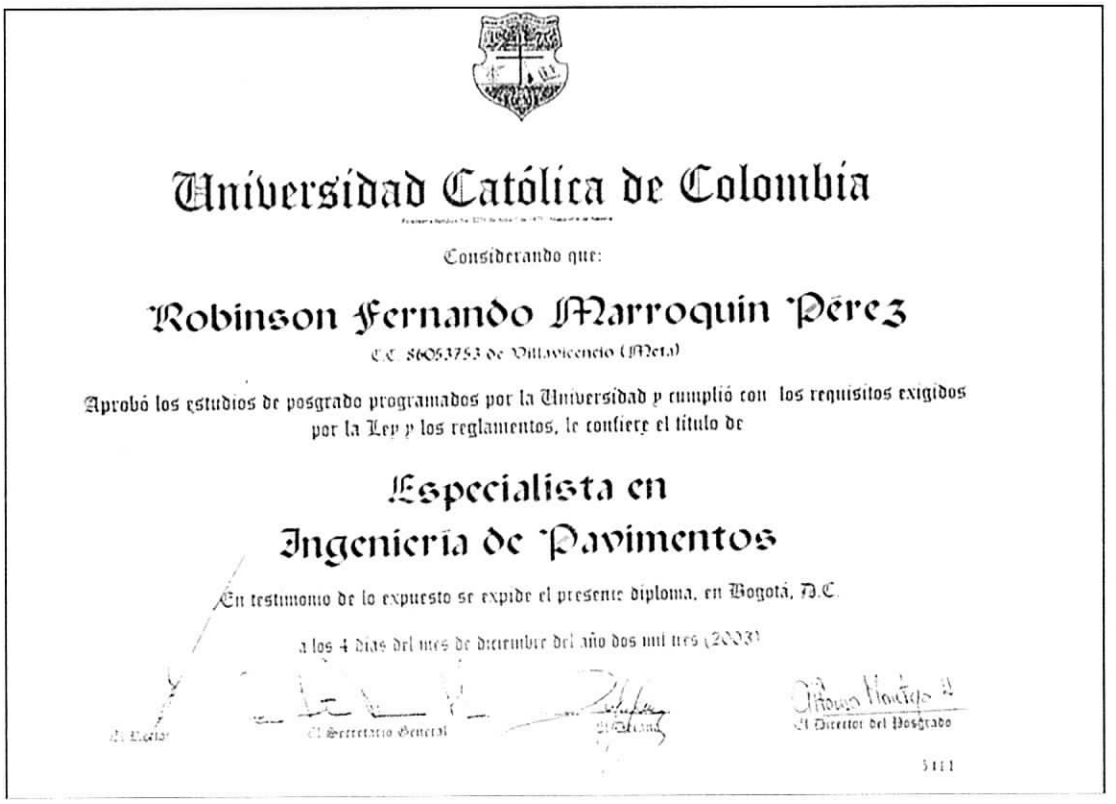

Universidad Católica de Colombia

Considerando que:

Robinson Fernando Marroquin Perez

C.C. 86053753 de Villavicencio (Meta)

Aprobó los estudios de posgrado programados por la Universidad y cumplió con los requisitos exigidos por la Ley y los reglamentos, le confiere el título de

Especialista en
Ingeniería de Pavimentos

En testimonio de lo expuesto se expide el presente diploma, en Bogotá, D.C.

a los 4 días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003)

El Rector — El Secretario General — El Director del Posgrado

5111

Cll 7 sur # 34-79, Mult 1 Casa 1, Balcones de Gratamira
Celular: 320 802 95 92
Villavicencio – Meta.
roms7750@hotmail.com

4792

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01

ESTADO DEL TIEMPO

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

4793

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Código:F006
Versión: 1

PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

Fecha:25/05/2023

PERIODO: JULIO 2023

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONVENCIONES

TS: Tiempo Seco LLV: Llovizna LL: Lluvia

LLF: Lluvia Fuerte

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HORA	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
07:00 a 07:30	TS		TS	LLF	LL	LLV	TS	TS		TS	TS	LLV	TS	LL	TS		TS	LL	LL	TS	LL	LL		LL	TS	TS	LL	LLV	LLV		TS
07:30 a 08:00	TS		TS	LLF	LL	LLV	TS	LLV		LL	TS	LLV	TS	LL	TS		TS	LL	LL	TS	LL	LL		LL	TS	TS	LL	LLV	LLV		TS
08:00 a 08:30	LL		TS	LLF	LL	LLV	LLV	LLV		LL	TS	TS	TS	LL	TS		TS	TS	LL	TS	TS	TS		LLV	TS	TS	LL	TS	LLV		TS
08:30 a 09:00	LL		TS	LLF	LL	LLV	LLV	TS		LL	LLV	TS	TS	LL	TS		TS	TS	LL	TS	TS	TS		LLV	TS	TS	LL	TS	TS		TS
09:00 a 09:30	TS		TS	LL	LL	TS	LL	TS		TS	LLV	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS
09:30 a 10:00	TS		TS	LL	LL	TS	LL	LL		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS
10:00 a 10:30	TS		TS	LL	LL	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS	LL	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS
10:30 a 11:00	TS		TS	LL	LL	TS	TS	TS		LLV	TS	TS	LL	TS	TS		TS	LL	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	LL	TS	TS		TS
11:00 a 11:30	TS		TS	LL	LL	TS	TS	TS		LLV	TS	LL	LL	TS	TS		LL	LL	TS	TS	LL	LLV		TS	TS	TS	LL	TS	TS		LL
11:30 a 12:00	TS		TS	LL	LL	TS	TS	TS		LLV	TS	LL	TS	TS	TS		LL	TS	TS	TS	LL	LLV		TS	TS	TS	LL	TS	TS		LL
12:00 a 12:30	TS		TS	LL	LL	TS	LLV	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	LL	LLV		TS	TS	TS	TS	LL	TS		TS
12:30 a 01:00	TS		TS	TS	LL	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	LL	LLV		TS	TS	TS	TS	LL	TS		TS
01:00 a 01:30	TS		TS	TS	LL	TS	LLV	TS		TS	LLV	TS	TS	LL	TS		TS	TS	LL	TS	LL	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS
01:30 a 02:00	TS		TS	TS	LL	TS	LL	TS		TS	LLV	TS	TS	LL	TS		TS	TS	LL	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS		TS
02:00 a 02:30				TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	LL			TS	TS	TS		TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS
02:30 a 03:00				TS	TS	TS	TS			LL	TS	TS	TS	LL			TS	TS	TS		TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS
03:00 a 03:30				TS	TS	TS	TS			LL	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS		TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS
03:30 a 04:00				TS	TS	TS	TS			LLV	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS		TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS
04:00 a 04:30				TS	TS	TS	LLV			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS		TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS
04:30 a 05:00				TS	TS	TS	LLV			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS		TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO EN LA NOCHE QUE AFECTAN LA OBRA

FECHA	OBSERVACIONES
3/07/2023	LLUVIA EN LA NOCHE
4/07/2023	LLUVIA EN LA NOCHE
5/07/2023	LLUVIA EN LA MADRUGADA
7/07/2023	LLUVIA EN LA NOCHE
10/07/2023	LLUEVE EN LA NOCHE
12/07/2023	LLUEVE EN LA NOCHE
13/07/2023	LLUEVE EN LA MADRUGADA
18/07/2023	LLUEVE EN L NOCHE
21/07/2023	LLUEVE EN LA MADRUGADA
25/07/2023	LLUEVE EN LA NOCHE
26/07/2023	LLUEVE EN LA NOCHE
27/07/2023	LLUEVE EN LA NOCHE
30/07/2023	LLUEVE EN LA MADRUGADA

Vo.Bo.

ING. YEISON E GOMEZ G
Director de obra
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Elaboró:

ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
Residente de obra
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Observaciones:

4794

INFORME DE ANTICIPO

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

4795

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

CONTRATO N°	106 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500094-2022005500022-2022005500024

INFORME N°	1	PERIODO INFORME:	1 de julio de 2023	a	31 de julio de 2023

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. BPIN 2022005500094
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500022
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. BPIN 2022005500024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NIT:	901682871-2
CORREO ELECTRONICO:	Contabilidadedeportivos@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	interescenariosc@gmail.com
SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FLOWER EMILIO PEÑA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	

VIGENCIA INICIAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Dias	0
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de mayo de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VIGENCIA ACTUAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Dias	0
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de mayo de 2024				

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2022005500094	10.220.557.418,00	0,00	$ 10.220.557.418,00
2	2022005500022	8.805.724.533,00	0,00	$ 8.805.724.533,00
3	2022005500024	31.845.658.891,00	0,00	$ 31.845.658.891,00
	VALOR ACTUAL DEL PROYECTO			$ 50.871.940.842,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO 1:	$ 14.498.503.139,60		
FECHA PAGO ANTICIPO	29 de junio de 2023	No. COMPROBANTE:	01976-01975-01974-01973-01972
FIDUCIA (SI APLICA):	ALIANZA FIDUCIARIA		
BANCO:	BANCOLOMBIA - FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS		
CUENTA DE AHORROS :	4000006842		

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	ORDEN DE GIRO 1 - 374033	7 de julio de 2023	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS	$ 3.206.552.830,72	2	ANTICIPO CONTRATO No 1
2	ORDEN DE GIRO 2 - 382769	31 de julio de 2023	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS	$ 289.205.761,34	2	PAGO CORTE No 1 CIMENTACION
	TOTAL					$ 3.495.758.592,06

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada.

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
	Mano de obra	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58	$ -	$ 579.940.125,58
	Materiales y subcontratos de obra	$ 12.323.727.666,66	$ -	$ 12.323.727.666,66	$ 3.495.758.592,06	$ 8.827.969.076,60
	Transporte	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 1.449.850.313,96	$ -	$ 1.449.850.313,96

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-43
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DE OBRA	Versión. 02

4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 144.985.031,40	$ -	$ 144.985.031,40	$ -	$	144.985.031,40
5	FONSET 5%	$ 763.079.113,00		$ 763.079.113,00		$	-
TOTALES		$ 15.261.582.252,60	$ -	$ 15.261.582.252,60	$ 3.495.756.592,06	$	11.002.744.547,54

Nota: Se anexa copia de Tarjeta Profesional y vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores que intervienen en el presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 31 de julio de 2023

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 276207-T

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 175215-T

rera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
1469 - 6701465
tactenos@idermeta.gov.co
vicencio - Meta, Colombia

Alianza Fiduciaria

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 - 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

4797

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE JULIO DEL 2023

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CODIGO SIFI 113392

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín — Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos — www.fogafin.gov.co

4798

ESTADO DE CUENTA

FIDEICOMISO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTI
Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130
CALI VALLE

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 4000006842
SUCURSAL CENTRO 93

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	14,499,096,591.25	*SALDO PROMEDIO*	$	11,895,350,842
TOTAL ABONOS	$	7,548,107.64	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	3,508,596,822.05	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,548,107.64
SALDO ACTUAL	$	10,998,047,876.84	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,780,500.68	14,500,877,091.93
7/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-960.09	14,500,876,131.84
7/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,826,215.89	14,488,049,915.95
7/07	PAGO A PROVE ORGANIZACION TE			-3,206,552,831.00	11,281,497,084.95
7/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.42	11,281,496,902.53
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			5,542,528.24	11,287,039,430.77
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			225,078.72	11,287,264,509.49
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-43.31	11,287,264,466.18
31/07	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	OSE CUCUTA		-289,205,761.34	10,998,058,704.84
31/07	VALOR IVA			-1,729.00	10,998,056,975.84
31/07	COMIS TRASLADO EN SUCURSAL			-9,099.00	10,998,047,876.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4799

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

4800

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASISTENCIA DIARIA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

4801

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS | **FECHA:** 31-07-2023 / 06-08-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	YEISON GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	
2	CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	
3	VERONICA CABARCA LIZCA	COORDINADOR SST	Veronica 7:00 5:00	Veronica 7:00 5:00	Veronica 7:00 5:00	7:00 5:00	Veronica 7:00 5:00	Veronica 7:00 12:00	
4	CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	Carlos A 7:00 5:00	Carlos H 7:00 5:00	Carlos H 7:00 5:00	Carlos H 7:00 5:00	Carlos H 7:00 5:00	Carlos H 7:00 12:00	
5	THERLY YANINY CONTRERAS	AMBIENTAL	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00	Therly CP 7:00	Primavera 7:00 12:00	
6	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	6:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	6:00 6:00	
7	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	Victor Giraldo 6:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 6:00 6:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 1:00	
8	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	Yordano Ramos 7:00 5:00	Yordano Ramos 6:00 6:00	Yordano Ramos 7:00 5:00	Yordano Ramos 7:00 5:00	Yordano Ramos 6:00 6:00	Yordano Ramos 7:00 11:00	
9	Jair Peña	Almacenista					7:00 5:10	7:00	
10									
11									
12									
13									

4802

COMISIONES SOCIALES DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	WILSON CARDENAS	FECHA:	31-07-2023 / 06-08-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON CARDENAS	CONTRATISTA							
2	JEISON CARDENAS	AYUDANTE	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 [illegible]	
3	Javier	Operador		Javier Arenas 7:00 5:00	Javier Arenas 7:00 5:00	Javier Arenas 7:00 5:00	✓	✓	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

4803

DIVISIONES ESCUELAS DEPORTIVAS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA	FECHA:	24-07-2023 / 30-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA GOMEZ	OPERADOR	7 | 5	7 | 5	7 | 5	7 | 5	7 | 5	7 | 5	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4804

DOMICILIO DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	METALREC	FECHA:	31-07-2023 / 06-08-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NORBEY GIRALDO NOREÑA	SUPERVISOR							
2	CARLOS AUGUSTO URIBE	SUPERVISOR							
3	DIRLEHAN MONSALVE ESCUDERO	SUPERVISOR							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4805

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA	FECHA:	24-07-2023 / 30-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
1	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA GOMEZ	OPERADOR	7	5	7	5	7	5	7	5	1	5	7	12		
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

4806

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	WILSON CARDENAS	FECHA:	24-07-2023 / 30-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON CARDENAS	CONTRATISTA							
2	JEISON CARDENAS	AYUDANTE							
3	JHONATAN GARCIA	AYUDANTE							
4	LUIS GONZALEZ	AYUDANTE							
5	PEDRO CALENTURA	AYUDANTE							
6	YERSON ARIAS	AYUDANTE							
7									
8									
9									
10									
11									
12									

4807

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS **FECHA:** 24-07-2023 / 30-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	YEISON GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	
2	CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	Primavera	
3	VERONICA CABARCA LIZCA	COORDINADOR SST	Veronica 7:00 5:00	Veronica 7:00 5:00	Veronica 7:00 5:00	Veronica 7:00 5:00	Veronica 7:00 5:00	Veronica 7:00 12:00	
4	CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	
5	THERLY YANINY CONTRERAS	AMBIENTAL	Therly CP 7:00 6:30	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00	
6	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	7:00 5:00	6:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	6:00 5:00	7:00	
7	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 6:00 6:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	7:00 6:00	6:00 6:00	
8	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	6:00 6:00	7:00 6:00	5:00 5:00	6:00 5:00	7:00 6:00	6:00	
9									
10									
11									
12									
13									

4808

CONSORCIO RECREADORES DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2022

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	METALREC	FECHA:	24-07-2023 / 30-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NORBEY GIRALDO NOREÑA	SUPERVISOR							
2	CARLOS AUGUSTO URIBE	SUPERVISOR							
3	DIRLEHAN MONSALVE ESCUDERO	SUPERVISOR							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4809

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: WILSON CARDENAS **FECHA:** 17-07-2023 / 23-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON CARDENAS	CONTRATISTA							
2	JEISON CARDENAS	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 4:30	7:00 5:00	7:00	
3	JHONATAN GARCIA	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5	7:00		7:00 5:00	7:00 12:00	
4	LUIS GONZALEZ	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00	7:00	7:00	7:00 5:00	7:00	
5	PEDRO CALENTURA	AYUDANTE					7:00 5:00		
6	YERSON ARIAS	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00	7:00		7:00 5:00		
7	MIGUEL MASTID x	OPERACI	7:00						
8	Alejandro Rodriguez x	Aparejador	07:15						
9	JEFFERSON PINEDA	OPERADOR	7:00 5:30	7:00 5:30	7:00 9:00	7:00 7:00	7:00 7:00	7:00 10:00	
10									
11									
12									

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN SOES **FECHA:** 17-07-2023 / 23-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NATALIA GARCIA	AUX ADMINISTRATIVA	Natalia Garcia 7:00 5:00	Natalia Garcia 7:00 5:00	Natalia Garcia 7:00 5:00		Natalia Garcia 7:00 5:00		
2	YEFERSSON JACOME	OFICIAL	Yeferss Jacome 7:00 5:00	Yeferss Jacome 7:00 5:00	Yeferss Jacome 7:00 5:00	Yeferss Jacome	Yeferss Jacome 7:00 5:00		
3	JUAN DAVID ROJAS GARZON	AYUDANTE	Juan David R 7 5	Juan David R 7 5	Juan David R 7 5	Juan David R 7 5	Juan David R		
4	JHON ALAN GONZALEZ AGREDO	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00	6:30		7:00		
5	JONATHAN RAFAEL CORDERO COLMENAREZ	AYUDANTE	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00		Jonathan 7:00	Jonathan 7:00	
6	BENEDICTO RAMIREZ CEPEDA	AYUDANTE	Benedicto 7am 5pm	Benedicto 7am 5pm	Benedicto 7am 5pm		Benedicto 7am 5pm	Benedicto 7am	
7	JEISON ANDRES RIVEROS	AYUDANTE	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00		
8	JEFFERSSON PEÑALOZA CORDEIRO	AYUDANTE	Jefferson Peñaloza 7:00	Jefferson Peñaloza 7:00	Jefferson Peñaloza 7:00	Jefferson Peñaloza 7:00	Jefferson Peñaloza 5:00	Jefferson Peñaloza 7:00	
9	JONATAN ESTIVEN JACOME GAVIRIA	AYUDANTE	Stiven 7:00	Stiven 7:00 5:00	Stiven 7:00 5:00		Stiven 7:00 5:00	Stiven 7:00 1:00	
10	MIGUEL CASTRO	OPERARIO	7:30 5:00	7:30		7:00 5:00	7:00 5:00		
11	Alejandro Rodriguez	Aseador	07:00 17:00	07:30 17:00	07:00 17:00	7:00 5:00	7:00 5:00		
12									
13									
14									
15									
16									

4811

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	METALREC	FECHA:	17-07-2023 / 23-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NORBEY GIRALDO NOREÑA	SUPERVISOR							
2	CARLOS AUGUSTO URIBE	SUPERVISOR							
3	DIRLEHAN MONSALVE ESCUDERO	SUPERVISOR							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4812

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	TOPOGRAFIA	FECHA:	17-07-2023 / 23-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JESUS ALBERTO HERNANDEZ LEON	TOPOGRAFO	ALFONSO 7:00 5:00	ALFONSO 5:00 5:00	alfonso	—	ALFONSO	alfonso	
2	ALEXANDER PARDO BONILLA	CADENERO	—	—	—	—	—	/	
3	ALFONSO HERNANDEZ	CADENERO	7:00 5:00	7:0 5:00	7:00 5:00		7:00 5:00	/	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4813

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA	FECHA:	17-07-2023 / 23-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CAMILO ANDRES CASTAÑEDA GOMEZ	OPERADOR	7 5	7 5	7 5		7 5	7 12	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4814

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS **FECHA:** 17-07-2023 / 23-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	YEISON GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	Primero	Primero	Primero	Primero	Primero	Primero	
2	CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	Primero 7:00 5:00	Primero 7:00 5:00	Primero	Primero	Primero	Primero	
3	VERONICA CABARCA LIZCA	COORDINADOR SST	Veronica 7:00 7:00	Veronica 7:00 5:00	Veronica 7:00 7:00	Veronica 7:00 4:30	Veronica 7:00 7:00	Veronica 5:00	
4	CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
5	THERLY YANINY CONTRERAS	AMBIENTAL	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 7:00	Therly CP 7:00 4:30	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 12:00	
6	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE					7:00	7:00	
7	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	Victor Giraldo 7:00 6:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 6:00	Victor Giraldo 6:00 6:00	Victor Giraldo 7:00 6:00	Victor Giraldo 7:00	
8	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	Yordano Ramos 7:00 5:00	Yordano Ramos 7:00 6:00	Yordano Ramos 7:00 5:00		Yordano Ramos 7:00 2:00	Yordano Ramos 6:00	
9									
10									
11									
12									
13									

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN SOES | **FECHA:** 10-07-2023 / 16-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NATALIA GARCIA	AUX ADMINISTRATIVA	Natalia 6 7:00 5:00	Natalia 6 7:00 5:00	Natalia 6 7:00 5:00	Natalia 6 7:00 5:00	Natalia 6 7:00 5:00	Natalia 6 7:30 1:00	
2	YEFERSSON JACOME	OFICIAL	Yeferss Jac 7:00 5:00	Yeferss Jac 9:00 5:00	Yeferss Jac 7:00	Yeferss Jac 7:00 5:00	Yeferss Jac 7:00 1:00	Yeferss Jac 7:00 1:00	
3	JUAN DAVID ROJAS GARZON	AYUDANTE		Juan David 7:00 5:00	Juan David 7 5	Juan David 7 5	Juan David 7 5	Juan David 7 1	
4	MAYRA ALEJANDRA ROCHA MARTINEZ	AYUDANTE							
5	JHON ALAN GONZALEZ AGREDO	AYUDANTE	Alan 6.50	Alan 6.50 6:00	Alan 6.50	Alan 6.50	Alan 6.50	Alan 6.50 1:00	
6	JONATHAN RAFAEL CORDERO COLMENAREZ	AYUDANTE	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00 6:00	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00 1:00	
7	BENEDICTO RAMIREZ CEPEDA	AYUDANTE	Benedicto 7am 5pm	Benedicto 7am 5pm	Benedicto 7am. 5pm	Benedicto 6:30 5pm	Benedicto 7am 5pm	Benedicto 7:00 1:00	
8	JEISON ANDRES RIVEROS	AYUDANTE	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 6:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 1:00	
9	VICTOR HUGO GIRALDO	AYUDANTE	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 5:00			
10	JEFFERSSON PEÑALOZA CORDEIRO	AYUDANTE	Jefferss Peñaloza 7:00	Jefferss Peñaloza 7:00	Jefferss Peñaloza 7:00	Jefferss Peñaloza 7:00	Jefferss Peñaloza 7:00	Jefferss Peñaloza 7:00 1:00	
11	JONATAN ESTIVEN JACOME GAVIRIA	AYUDANTE	Estiven 7:00 5:00	Estiven 7:00 5:00	Estiven 7:00	Estiven 7:00 5:00	Estiven 7:00 5:00	Estiven 7:00 1:00	
12	[illegible]	[illegible]	7 5	7 5	7 5	7 5	7 5		
13	[illegible]	[illegible]		7:00 5:00					
14	Alejandro Rodriguez	Aparejador	07:15		07:00 1700	0700 1700	0700 1700	1700 1300	
15									
16									

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA:	10-07-2023 / 16-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	YEISON GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	Primera	Primera	Primera	Primera	Primera	Primera	
2	CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 8:00	7:00 15:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
3	VERONICA CABARCA LIZCA	COORDINADOR SST	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 3:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
4	CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 5:00	7:00 6:00	7:00 9:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 17:00	
5	THERLY YANINY CONTRERAS	AMBIENTAL	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 16:00	7:00 6:20	7:00 12:00	
6	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	6:00 6:00	6:00 6:00	6:00 3:00	6:00 6:00	6:00 5:00	Calamidad	
7	[illegible]	[illegible]					7:00 5:30	7:00 2:00	
8	[illegible]	[illegible]					7:00 5:00	7:00 2:00	
9									
10									
11									
12									
13									

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	TOPOGRAFIA	FECHA:	10-07-2023 / 16-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JESUS ALBERTO HERNANDEZ LEON	TOPOGRAFO	—	—	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	—	
2	ALEXANDER PARDO BONILLA	CADENERO	—	—		ALFONSO 7:00 5:00	ALFONSO 7:00 5:00	ALFONSO 7:00 6:00	
3	ALFONSO HOEZ	CADENERO							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4818

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	WILSON CARDENAS	FECHA:	10-07-2023 / 16-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON CARDENAS	CONTRATISTA							
2	JEISON CARDENAS	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
3	JAVIER ARMANDO CIPAGAUTA	OPERADOR	7:00 5:00	7:00 5:00					
4	JHONATAN GARCIA	AYUDANTE	7:00	7:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	
5	LUIS GONZALEZ	AYUDANTE	7:00	7:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
6	PEDRO CALENTURA	AYUDANTE	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
7	Yerson Arias	Ayudante	7:00 5:00	Yerson Arias	7:00 5:00	5:00		12:00	
8									
9									
10									
11									
12									

4819

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	METALREC	FECHA:	10-07-2023 / 16-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NORBEY GIRALDO NOREÑA	SUPERVISOR							
2	CARLOS AUGUSTO URIBE	SUPERVISOR							
3	DIRLEHAN MONSALVE ESCUDERO	SUPERVISOR							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4820

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2022

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA: METALREC

FECHA: 03-07-2023 / 09-07-2023

			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
1	NORBEY GIRALDO NOREÑA	SUPERVISOR	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	12:00		
2	CARLOS AUGUSTO URIBE	SUPERVISOR	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	12:00		
3	DIRLEHAN MONSALVE ESCUDERO	SUPERVISOR	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	5Pm	7am	5Pm	7:00	12:00		
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	WILSON CARDENAS	FECHA:	03-07-2023 / 09-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON CARDENAS	CONTRATISTA							
2	JEISON CARDENAS	AYUDANTE		Jeison Card 7:00 5:00	Jeison C. 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison C. 7:00 5:00	Jeison Card 7:00 5:00	
3	JAVIER ARMANDO CIPAGAUTA	OPERADOR		07:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 17:00	
4	Jhordan García	Ayudante	— // —	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 17:00	
5	Luis Gonzales	Ayudante	— // —	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00			
6	Pedro Calentura	Ayudante	—			7:00 5:00	7:00 17:00	7:00 17:00	
7									
8									
9									
10									
11									
12									

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN SOES	FECHA:	03-07-2023 / 09-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NATALIA GARCIA	AUX ADMINISTRATIVA	Natalia G 7:00 4:00	Natalia G 7:00 5:00	Natalia G 7:00 5:00	Natalia G 7:00 5:00	Natalia G 7:00 5:00	Natalia G 7:00 1:00	
2	YEFERSSON JACOME	OFICIAL	Yefer Jac 7:00 1:00	Yefer Jac 7:00 5:00	Yefer Jac 7:00 5:00	Yefersson Jac 7:00 5:00	Yefer Jac 7:00 5:00		
3	JUAN DAVID ROJAS GARZON	AYUDANTE	Juan David R 7:00 2:00	Juan David R 7:00 5:00	Juan David R 7:00 5:00	Juan David R 7 12:00	—	Juan David R 7:00 5:00	
4	MAYRA ALEJANDRA ROCHA MARTINEZ	AYUDANTE	Alejandra Rocha 7 2	Alejandra Rocha 7 5	Alejandra Rocha 7 5	Alejandra Rocha 7 5	Alejandra Rocha 7 5	Alejandra Rocha 7 1	
5	JHON ALAN GONZALEZ AGREDO	AYUDANTE	— 11 —	Alan G 6:50 5	Alan G 7:00 5:00	Alan G 7:00 5:00	Alan G 7:00	Alan G 7 1	
6	JONATHAN RAFAEL CORDERO COLMENAREZ	AYUDANTE	Jonathan 7:00 2:00	Jonathan 7:00 5:00	Jonathan 7:00 5:00	Jonathan 7:00 5:00	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00 1	
7	BENEDICTO RAMIREZ CEPEDA	AYUDANTE	Benedicto 7 AM 2 PM	Benedicto 7 AM 5 PM	Benedicto 7 AM 5:00	Benedicto 7 AM 5:00	Benedicto 7:00 5:00	Benedicto 7:00 1	
8	JEISON ANDRES RIVEROS	AYUDANTE	ANDRES RIVEROS 7:00 2:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 5:00	ANDRES RIVEROS 7:00 1	
9	VICTOR HUGO GIRALDO	AYUDANTE	Victor Giraldo 7:00 2:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 5:00	Victor Giraldo 7:00 1	
10	SEBASTIAN ARRENDO MEDINA	AYUDANTE	—	—	—	—	—	—	
11	BRAYAN CHAVES ROJAS	OPERADOR - SERVIALTURAS	— 11 —	— 11 —	—	—	—	—	
12	JEFFERSSON PEÑALOZA CORDEIRO	AYUDANTE	Yeferson Peñaloza 7:00	Yeferson Peñaloza 7:00	Yeferson Peñaloza 7:00	Yeferson Peñaloza 7:00	Yeferson Peñaloza 7:00	Yeferson Peñaloza 7:00	
13	JONATAN ESTIVEN JACOME GAVIRIA	AYUDANTE	Stiven 7:00	Stiven	Stiven	Stiven	Stiven 7:00 5:00	Stiven 7 1	
14	Brayan Tejada	Aparejador				7:00			
15	Miguel Castro	Operario				7:00			
16	Alejandro Rodriguez	Aparejador					5:00		

4823

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA:	03-07-2023 / 09-07-2023

	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	YEISON GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA		7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
2	CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA		7:00 5:00	7:00 5:30	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00	
3	VERONICA CABARCA LIZCA	COORDINADOR SST	7:00 2:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
4	CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA		7:00 5:00	6:00 9:00	5	5	7:00 1	
5	THERLY YANINY CONTRERAS	AMBIENTAL		7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	Permiso	
6	YEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE		6:00 6:00	6:00 5:15	6:00 6:00	6:00 6:00	6:00 12:00	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4824

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

SST-F029-01 10/05/2023

CONTRATISTA:	TOPOGRAFIA	FECHA:	03-07-2023 / 09-07-2023

		CARGO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
1	JESUS ALBERTO HERNANDEZ LEON	TOPOGRAFO	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00						
2	ALEXANDER PARDO BONILLA	CADENERO	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00	7:00	5:00				
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

4825

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

10/05/2023

CONTRATISTA: METALREC **FECHA:** 25-06-2023 / 02-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NORBEY GIRALDO NOREÑA	SUPERVISOR	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	
2	CARLOS AUGUSTO URIBE	SUPERVISOR	Carlos U. 7:56 7:5	Carlos U 7:00 5:00	Carlos U 7:00 5:00	Carlos U 7:00 5:00	Carlos U 7:00 5:00	Carlos U 7:00 5:00	
3	DIRLEHAN MONSALVE ESCUDERO	SUPERVISOR	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
4			Dirl.	Dirl.	Dirl.	Dirl.	Dirl.	Dirl.	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4826

CONSORCIO ESCEN... DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

10/05/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA:	-06-2023 / 04-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	YEISON GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA							
2	CARLOS ANDRES CAICEDO CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:30	7:00 5:30	7:00 5:00	7:00 9:00	
3	VERONICA CABARCA LIZCA	COORDINADOR SST	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 2:00	
4	ILVANOVER MOSQUERA	PORTERO	6:00 6:00	6:00 6:00	6:00 6:00	6:00 6:00	6:00 6:00	6:00 12:00	
5	CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	7:00 5:00	7:00 5:00	6:00 9:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	
6	THERLY YANINY CONTRERAS	AMBIENTAL	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00 5:00	Therly CP 7:00	Therly CP 7:00	
7	Jeisson Vizcaino	Auxiliar					7:00 5:00	7:00 6:00	
8	Alex Rodriguez	Auxiliar					Reemplazo 7:00	— // —	
9									
10									
11									
12									
13									

4877

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

10/05/2023

CONTRATISTA:	WILSON CARDENAS	FECHA:	19-06-2023 / 02-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON CARDENAS	CONTRATISTA							
2	JEISON CARDENAS	AYUDANTE	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00		
3	Javier Capacura	Operador		Indigest 7:00 5:00	Indigest 7:00 5:00	Indigest 7:00 5:00	Indigest 7:00 5:00		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2022

ASISTENCIA DIARIA

10/05/2023

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN SOES **FECHA:** 29-06-2023 / 02-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	NATALIA GARCIA	AUX ADMINISTRATIVA	Natalia García 7:00 5:00	Natalia García 7:00 5:00	Natalia García 7:00 5:00	Natalia García 7:00 5:00	Natalia García 7:00 5:00	Natalia García 7:00 5:00	
2	YEFERSSON JACOME	OFICIAL	Yefersson Jacome 7:00 5:00	Yefersson Jacome 7:00 5:00	Yefersson Jacome 7:00 5:00	Yefersson Jacome 7:00	Yefersson Jacome 7:30	—	
3	JUAN DAVID ROJAS GARZON	AYUDANTE	Juan David R 7:00 5:00	Juan David R 7:00 5:00	Juan David R 7:00 5:00	Juan David R 7:00 5:00	Juan David R 7:00 5:00	Juan David R 7:00 2:00	
4	MAYRA ALEJANDRA ROCHA MARTINEZ	AYUDANTE	—	Alejandra Rocha 7 5	Alejandra Rocha 7 5	Alejandra Rocha 7 5	Alejandra Rocha 7 5	Alejandra Rocha 7 2:00	
5	JHON ALAN GONZALEZ AGREDO	AYUDANTE	—	—	[signature]	[signature] 6:50 5:00	[signature] 7:00 5:00	[signature] 6:50 5:00	
6	JONATHAN RAFAEL CORDERO COLMENAREZ	AYUDANTE	Jonathan 7:00 5:00	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00	Jonathan 7:00 2:00	
7	BENEDICTO RAMIREZ CEPEDA	AYUDANTE	Benedicto 7 am 15:00	Benedicto 7 5	Benedicto 7 5	Benedicto 7 5	Benedicto 7 5	Benedicto 7 am 2:00	
8	JEISON ANDRES RIVEROS	AYUDANTE	Andres Riveros 7:00 12:00	Andres Riveros 7:00 5:00	Andres Riveros 7:00 5:00	Andres Riveros 7:00 5:00	Andres Riveros 7:00 5:00	Andres Riveros 7:00 2:00	
9	VICTOR HUGO GIRALDO	AYUDANTE		Victor Grabb 7:00 5:00	Victor Grabb 7:00 5:00	Victor Grabb 7:00 5:00	Victor Grabb 7:00 5:00	Victor Grabb 7:00 2:00	
10	SEBASTIAN ARRENDO MEDINA	AYUDANTE	Sebastian 7:00 5:00	Sebastian 7:00 5:00	Sebastian 7:00 5:00	Sebastian 7:00 5:00	Sebastian 7:00 5:00	Sebastian 7:00 2:00	
11	BRAYAN CHAVES ROJAS	OPERADOR - SERVIALTURAS	—	—	—	—	—	—	
12	JEFFERSSON PEÑALOZA CORDEIRO	AYUDANTE	Jefferson Peñaloza 7:00 5:00	Jefferson Peñaloza 7:00 5:00	Jefferson Peñaloza 7:00 5:00	Jefferson Peñaloza 7:00 5:00	Jefferson Peñaloza 7:00 5:00	Jefferson Peñaloza 7:00 2:00	
13	JONATAN ESTIVEN JACOME GAVIRIA	AYUDANTE	Estiven 7:00 5:00	Estiven 7:00 5:00	Estiven 7:00 5:00	Estiven 7:00 5:00	Estiven 7:00 5:00	Estiven 7:00 2:00	
14									
15									
16									

4829

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

10/05/2023

CONTRATISTA: TOPOGRAFIA

FECHA: 27-06-2023 / 02-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JESUS ALBERTO HERNANDEZ LEON	TOPOGRAFO	7:00 5:00			7:00 5:00	7:00 5:00		
2	ALEXANDER PARDO BONILLA	CADENERO	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 5:00	7:00 12:00	
3	ALFONSO HERNANDEZ OLAYA	CADENERO	ALFONSO 7:00 5:00			ALFONSO 7:00 5:00	ALFONSO 7:00 5:00		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

4830

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

ASISTENCIA DIARIA

10/05/2023

CONTRATISTA:	WILSON CARDENAS	FECHA:	23-06-2023 / 02-07-2023

IT	NOMBRE	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	WILSON CARDENAS	CONTRATISTA							
2	JEISON CARDENAS	AYUDANTE		Jeison Car 7:00 5:00	Jeison Cardenas 7:00 5:00	Jeison Car 7:00 5:00	Jeison car 7:00	Jeison C 7:00 5:00	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

4831

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-126
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/11/2022
	INFORME DE OBRA	Versión: 01


INFORME PMT
JULIO/2023

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

4832

INFORME MENSUAL

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

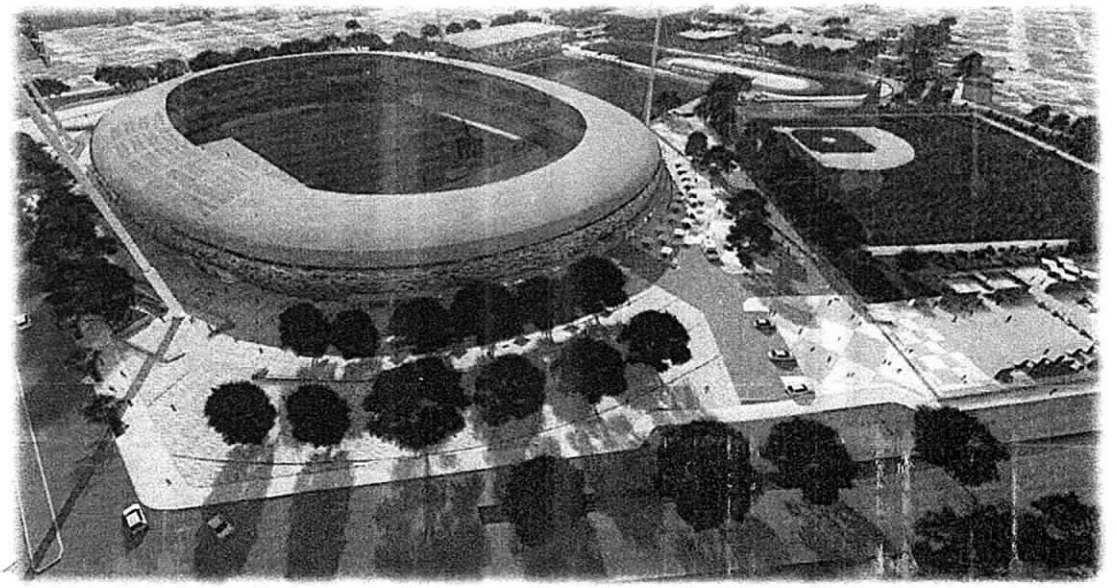

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA

CONTRATO N° 106 de 2023

PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

JULIO 2023

VILLAVICENCIO META

CONTENIDO

Contenido

INFORME MENSUAL 1
Tablas 3
1 INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO GENERAL 5
2.1 Objetivos Específicos 5
3. ALCANCE 6
4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 6
5. CATEGORIA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 7
6. CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA 7
6.1 Clasificación zona de Influencia 8
Tabla 1 Clasificación vial en el área de influencia 8
6.2 Localización del Proyecto 10
7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE ZONA DE INFLUENCIA 11
8. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO 16
Tabla 2 Información legal del proyecto 16
9. ATENCIÓN A USUARIOS Y HABITANTES DE LA ZONA 16
10. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 17
10.1 Información y divulgación del plan de manejo de tránsito 18
10.1.1 Atención vecinos y usuarios 18
10.1.2 Medios de difusión a utilizar 19
10.1.3 Quejas y reclamos 20
10.2 Implementación del plan manejo de tránsito 20
11. ACTIVIDADES DE OBRA EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2023 22
11.1 Instalación de señalización pmt. 23
11.2 Supervisión por parte de área técnica 25
11.3 Charlas de seguridad a trabajadores 25
11.4 Mantenimiento de señalización en obra 26
11.5 Puntos de emergencia en obra 27
12. DISPONIBILIDAD E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA EL PLAN 28
12.1 Equipo y maquinaria 28
12.2 Señalización utilizada fuera de la obra 31
12.3 Características de la señalización. 31
12.4 Señalización informativa de obra. 34
13. COORDINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN (PMT). 35

14. SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO. 35
15. CONCLUSIONES 36
16. ANEXOS 37
1703-F-Mov-11-V1 Formato Registro Bitácora PMT JULIO 37
1703-F-Mov-11-V1. Formato de Evaluación Plan de Manejo de Transito Señalización y Desvíos (1-07AL31-07) 37

Tablas

Tabla 1 Clasificación vial en el área de influencia 6
Tabla 2 Información legal del proyecto 9

Ilustración 1 ubicación señalización 8
Ilustración 2 ubicación señalización av maracos 9
Ilustración 3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 10
Ilustración 4 carrera 19 12
Ilustración 5 carrera 18 Av Maracos 13
Ilustración 6 Carrera 16 14
Ilustración 7 Calle 25 15
Ilustración 8 instalación señalización pmt 23
Ilustración 9 instalación señalización pmt 24
Ilustración 10 instalación señalización pmt 24
Ilustración 11supervisión del área técnica 25
Ilustración 12 Charlas de seguridad 26
Ilustración 13 Charlas de seguridad 26
Ilustración 14 Mantenimiento de la señalización 26
Ilustración 15 Mantenimiento de la señalización 27
Ilustración 16 28
Ilustración 17 29
Ilustración 18 29
Ilustración 19 29
Ilustración 20 30
Ilustración 21 30
Ilustración 22 30
Ilustración 23 31
Ilustración 24 Maletín 31
Ilustración 25 Maletín 32
Ilustración 26 Señalización vial 32
Ilustración 27 32
Ilustración 28 ubicación señalización pmt 33
Ilustración 29 ubicación señalización pmt 33
Ilustración 30 34
Ilustración 31 34
Ilustración 32 controlador vial 35

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presenta el informe mensual del mes de **julio** de la implementación del plan de manejo de tránsito realizado por el Consorcio Escenarios deportivos villa olímpica 2023. del Contrato de obra No. 106 2023. "**CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".**

La implementación se realiza de acuerdo con la viabilidad otorgada por la secretaria de Movilidad de la Alcaldía Municipal de Villavicencio-Meta. mediante oficio **1703-19.18/0680 del17 de mayo del 2023** y lo emanado en la resolución No.1885 de 2015 "Manual de Señalización adoptado por el Ministerio del Transporte".

El informe se ha estructurado con un primer capítulo sobre los datos generales. tales como. los responsables del proyecto. la descripción de este. los tiempos. rutas y movimientos. así como las actividades a realizar. seguido de las características generales del entorno. la características físicas y operativas del área del proyecto. la característica del tránsito y la forma de ejecución sin generar mayores impactos en la comunidad. Para la definición de este PMT. se tiene como base de referencia el documento correspondiente al Manual de señalización 2015 y el Nuevo Código de Tránsito 2002. el cual se asume como viable y se acoge para la elaboración del documento único a presentar. realizando los ajustes necesarios para garantizar los requerimientos. de la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.**

2. OBJETIVO GENERAL

Mitigar los impactos generados por la obra durante la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** con el fin de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil en los desplazamientos para los trabajadores de la obra, visitantes y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito.

El proyecto no contempla la intervención de la calzada o algún elemento de su diseño trasversal, debido a esto no se presenta ningún tipo de diseño de señalización horizontal y/overtical definitivo ya que la señalización a utilizar será de manera temporal de acuerdo al capítulo 4 del Manual de señalización vial 2015.

El PMT es una herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causados por la ejecución de una obra vial o aquellas que intervenganel espacio público, de manera que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la vía, de los ciudadanos en general y de quienes participan en la construcción de la obra.

2.1 Objetivos Específicos

- Procurar la seguridad e integridad de los conductores, y trabajadores de laobra.
- Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares ypeatonales.
- Ofrecer a los usuarios y personal una señalización clara y de fácil interpretación.
- Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influenciade la obra en ejecución.

3. ALCANCE

Identificar los impactos que pueda generar la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** en el tránsito y vecinos del sector, e implementar medidas que conlleven a la mitigación de los mismos, mediante la implementación de señalización adecuada de acuerdoal Manual de señalización Vial.

4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

- Las estrategias para el manejo temporal del tránsito por obras civiles o constructivas debenapoyarse en los siguientes principios fundamentales:
- Prevención de accidentes viales en el área de trabajo
- La seguridad de los trabajadores en áreas de control de tránsito debe ser un elemento fundamental y de alta prioridad en todo el proyecto.
- Establecer criterios para mantener la limpieza en las zonas aledañas.
- Seleccionar y cuantificar los dispositivos que serán necesarios durante el desarrollo del proyecto.
- Diseñar, programar e implementar coherentemente las rutas alternativas y/o desvíos requeridos para la ejecución de la obra de manera que no afecten lo mínimo posible al transporte público y particular.

5. CATEGORIA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial 2015, el PMT del **ConsorcioEscenarios deportivos villa olímpica 2023** se clasifica como categoría 1, de acuerdo al numeral **4.5.4.1.** Obras de Interferencias Mínimas

"Son aquellas en que los espacios de circulación son muy poco afectados por las intervenciones y no hay afectación sobre zonas aledañas. Hay poca o nula intervención en los espacios de circulación peatonal. El impacto de la obra sobre el tránsito de vehículos puede ser mitigado por la misma infraestructura a intervenir sin esperar que los flujos sean desviados. La señalización necesaria se puede lograr siguiendo uno o más de los esquemas".

6. CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA

El Complejo Deportivo Villa Olímpica se encuentra localizado en la Comuna Número 5 de la ciudad de Villavicencio, la cual está compuesta por los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, Cataluña, Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, Ariguani, Vizcaya, Hacaritama, Villa Mélida, Ciudadela San Antonio, Aguas Claras, Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires.

El Complejo Deportivo se encuentra en un polígono delimitado de Sur a Norte por la Avenida los Maracos o Carrera 18 y la Calle 25 y de Oriente a Occidente por la Carrera 16 y la Avenida Carrera 19, respectivamente. En la actualidad hay accesibilidad a las instalaciones del Complejo Deportivo por la Calle 25 y la Carrera 16.

6.1 Clasificación zona de Influencia

Con base en la información descrita en el numeral anterior, la clasificación de las vías que actualmente existen en el área de influencia del proyecto fue clasificada como se observa a continuación (véase TABLA).

Tabla 1 Clasificación vial en el área de influencia

VIA	DESDE	HASTA	CLASIFICACION VIAL	PERFIL VIAL
Av. Cra 19	Calle 15	Calle 25	Vía arterial	V-3
Cra. 18 av. maracos	Av. Cra. 19	Cra. 16	Vía arterial	V-3
Calle 25	Av. Cra. 19	Cra. 16	Vía Local	V-4
Cra. 16	Calle 25	Cra. 18	Vía Local	V-5
Calle 15	Av. Cra. 19	Cra. 16	Vía Local	V-5

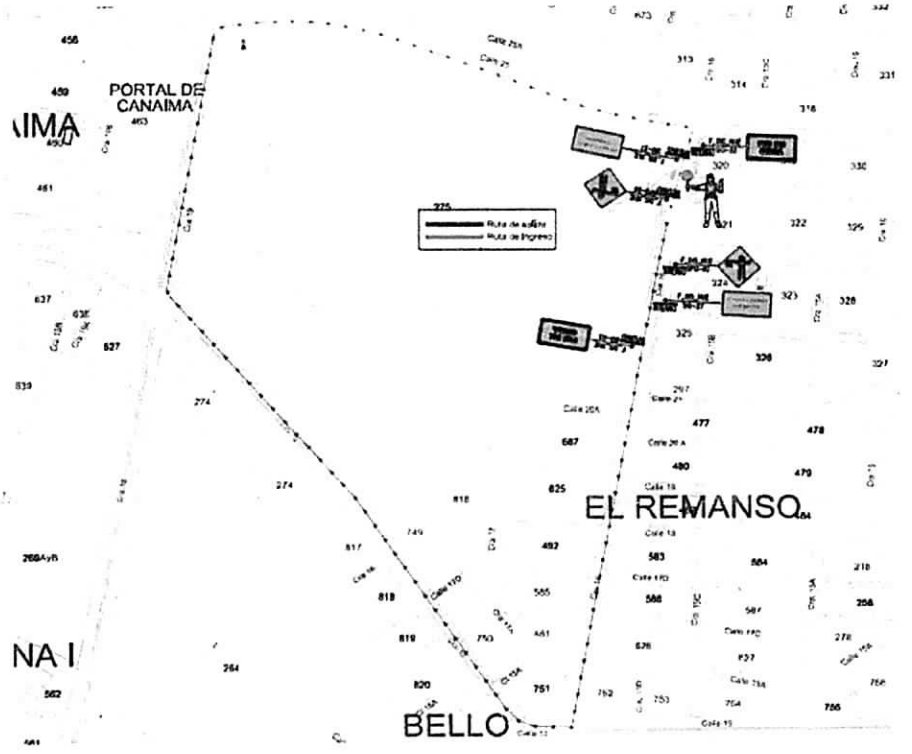


Ilustración 1 ubicación señalización

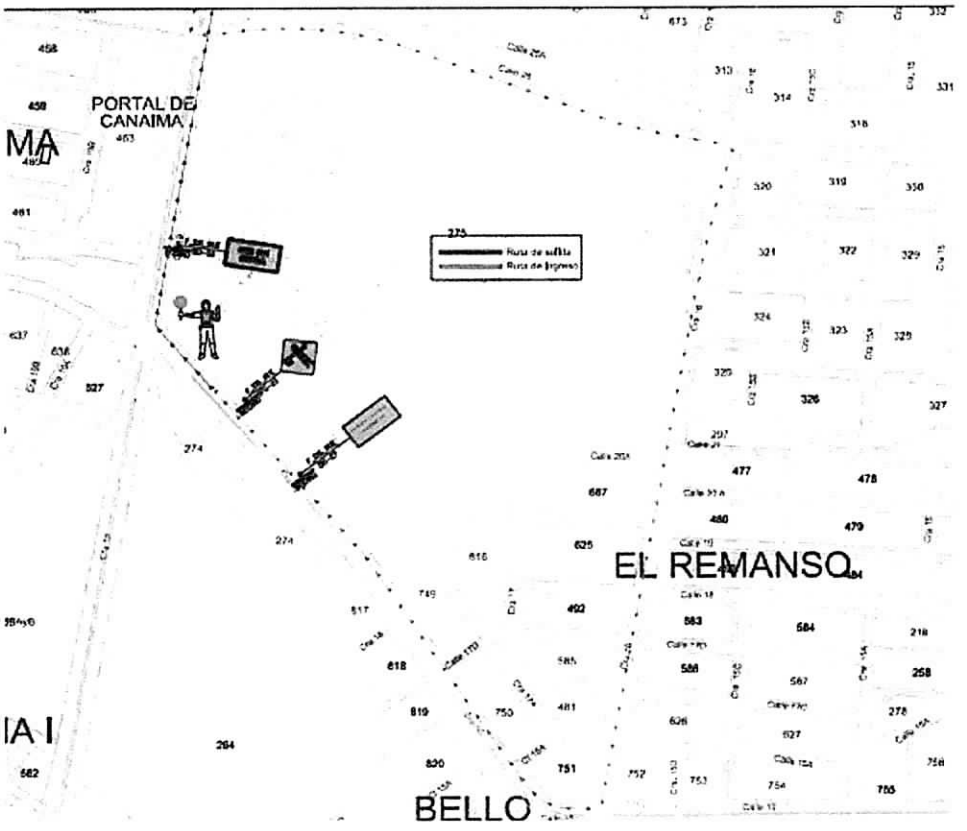


Ilustración 2 ubicación señalización av maracos

6.2 Localización del Proyecto

La zona donde se está ejecutando la obra del presente plan de manejo de tránsito, se encuentra ubicada en un polígono delimitado de Sur a Norte por la Avenida los Maracos o Carrera 18 y la Calle 25 y de Oriente a Occidente por la Carrera 16 y la Avenida Carrera 19, respectivamente. En la actualidad hay accesibilidad a las instalaciones del Complejo Deportivo por la Calle 25 y la Carrera 16.

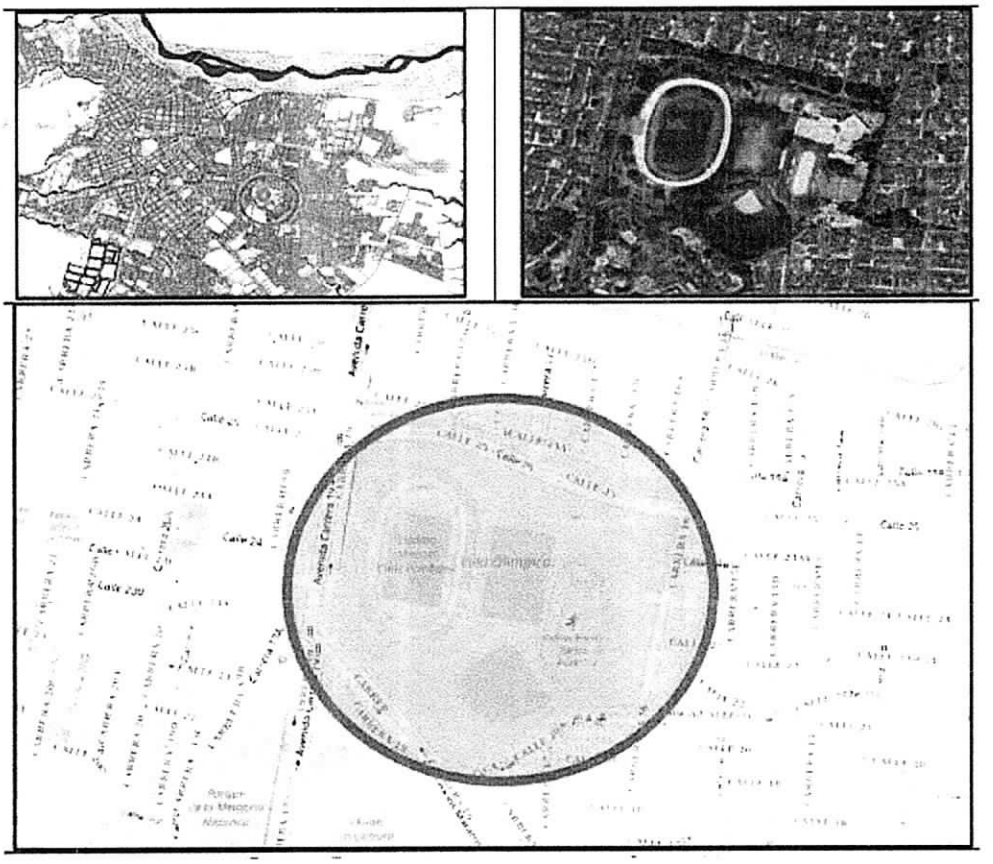


Ilustración 3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE ZONA DE INFLUENCIA

Los segmentos viales por donde se realizará el ingreso y salida de maquinaria corresponden a la Carrera 16 para las actividades de la construcción de los escenarios multipropósitos y la Carrera 18 (Avenida maracos) para el desarrollo de las actividades de construcción de la pista de atletismo. las cuales como se menciona anteriormente se ubican en la comuna 5. las características de estas vías localizadas dentro del área de influencia de la zona a intervenir se indican a continuación.

Además. se realiza una descripción de la infraestructura vial que se encuentra dentro del área de influencia.

A continuación. se presenta la descripción y caracterización de las vías principales que estándirectamente relacionadas con el funcionamiento del proyecto.

AVENIDA CARRERA 19

La Avenida Carrera 19 entre la Calle15 y la Calle 25 pertenece a la malla vial arterial de la ciudad de Villavicencio. con un perfil V-3 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta dos calzadas vehiculares con dos carriles de circulación cada una de estas. con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible). para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación norte – sur y viceversa. con un ancho promedio por calzada de aproximadamente 9.0 metros y separador central en material blando con un ancho aproximado de 1.0 metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal. con anchos que varía entre los 5 y 6 metros.

En cuanto a señalización vertical. señalización horizontal y controles semafóricos. sobre la Avenida Carrera 19 entre la Calle 15 y la Calle 25. se localizado dos intersecciones semaforizadas. una a la altura de la Calle 15 o Carrera 18 y la segunda sobre la Calle 25. las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las maniobras vehiculares présentes en cada una de las intersecciones. La demarcación

se encuentra en regulares condiciones, las marcas viales presentan un desgaste significativo y sin retrorreflexión; la señalización vertical se encuentra en regulares condiciones.

En la actualidad, lo concurrido de este corredor hace que por este transiten una cantidad significativa de rutas de transporte público ya que este es un punto de gran concurrencia. A continuación, en la tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.

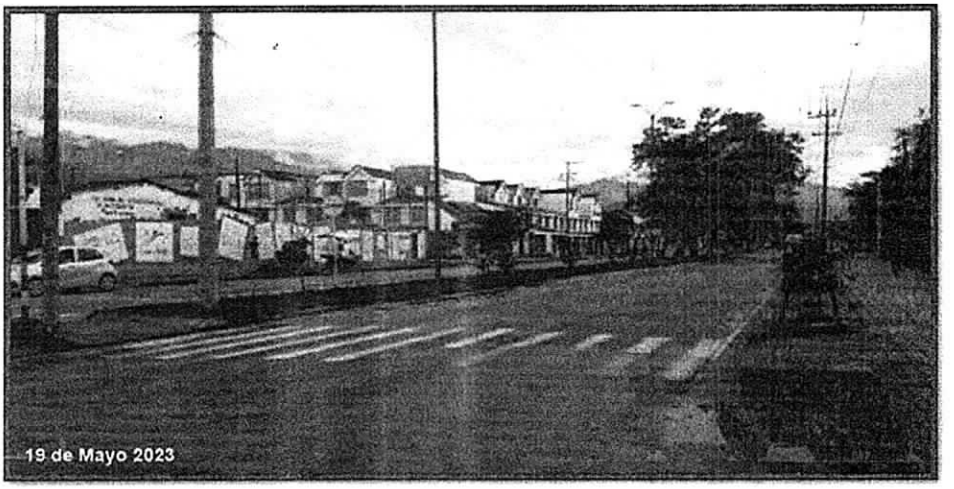


Ilustración 4 carrera 19

CARRERA 18 (AVENIDA LOS MARACOS)

La Avenida Los Maracos o Carrera 18 entre la Avenida Carrera 19 y la Carrera 16 pertenece a la malla vial arterial de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-3 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta dos calzadas vehiculares con dos carriles cada una, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible), para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación Oriente a Occidente y viceversa, con un ancho promedio por calzada de 8.0 metros y separador central en material blando, con un ancho aproximado de 0,5 metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varían entre los 3 y 4 metros.

En cuanto señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Avenida Los Maracos (Carrera 18) entre la Carrera 19 y la Carrera 16, se localizan dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Avenida Carrera 19 y la segunda sobre la Carrera 16, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las manobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones. La demarcación se encuentra en buenas condiciones, las marcas viales presentan una condición aceptable; y así mismo la señalización vertical se encuentra en condiciones favorables.

En la actualidad, por este corredor transitan rutas de transporte publico producto de la concurrencia del sector, a continuación, en la tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.



Ilustración 5 carrera 18 Av Maracos

CARRERA 16

La Carrera 16 entre la Calle 15 y la Calle 25 pertenece a la malla vial local de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-5 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta una única calzada vehicular con dos carriles, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible) en mal estado, para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación Norte - Sur y viceversa, con un ancho promedio de calzada de 7,5

metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varían entre los 3 y 4 metros.

En cuanto señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Carrera 16 entre la Calle 15 y la Calle 25, se localizan dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Calle 15 o Avenida los Maracos (Carrera 18) y la segunda sobre la Calle 25, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las manobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones. La demarcación se encuentra en malas condiciones, las marcas viales presentan un desgaste significativo y sin retrorreflexión; la señalización vertical se encuentra en regulares condiciones. En la actualidad, por este corredor transitan rutas de transporte publico producto de la concurrencia del sector, a continuación, en la tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.

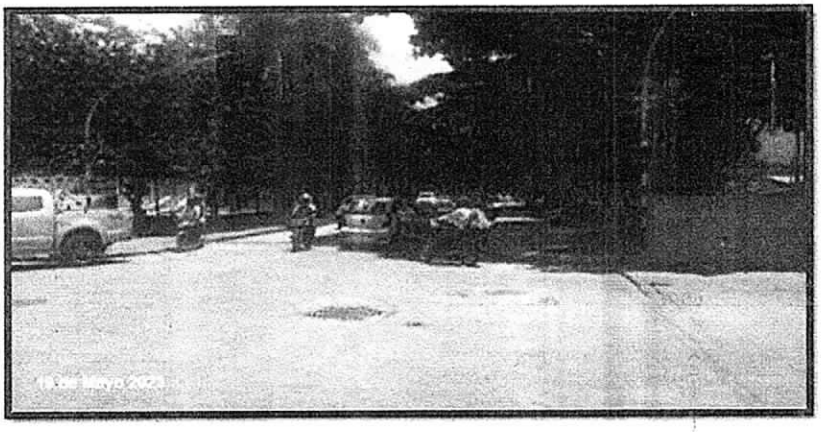


Ilustración 6 Carrera 16

CALLE 25

La Calle 25 entre la Carrera 19 y la Carrera 16 pertenece a la malla vial local de la ciudad de Villavicencio, con un perfil V-4 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para la capital del departamento del Meta. Presenta una única calzada vehicular con dos carriles, con una carpeta de rodadura asfáltica (pavimento flexible)

en mal estado, para uso del tránsito mixto. Presenta doble circulación Oriente – Occidente y viceversa, con un ancho promedio de calzada de 7,5 metros. En ambos costados de la vía cuenta con infraestructura propia para la movilidad peatonal, con anchos que varían entre los 3 y 4 metros.

En cuanto señalización vertical, señalización horizontal y controles semafóricos, sobre la Calle 25 entre la Carrera 19 y la Carrera 16, se localizan dos intersecciones semaforizadas, una a la altura de la Carrera 19 y la segunda sobre la Carrera 16, las cuales permiten el paso seguro de peatones; y así mismo las manobras vehiculares presentes en cada una de las intersecciones. La demarcación se encuentra en malas condiciones, las marcas viales presentan un desgaste significativo y sin retrorreflexión; la señalización vertical se encuentra en regulares condiciones.

En la actualidad, por este corredor transitan rutas de transporte publico producto de la concurrencia del sector, a continuación, en la siguiente tabla se presentan las rutas identificadas en esta vía.



Ilustración 7 Calle 25

8. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO

La responsabilidad de la obra está a cargo de las siguientes instituciones y personas:

PROYECTO	Construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.
CONTRATO	**N° 106 DE 2023**
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto de Deporte y Recreación del Meta
REPRESENTANTE LEGAL:	Fabián Hernán Gonzalo Torres Carrillo –Director General director@idermet.gov.co
CONTRATISTA:	Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023
DIRECTOR DE OBRA	ING. YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO direccion.escenariosdeportivos@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON HENRY ORTIZ GARCIA

Tabla 2 Información legal del proyecto

9. ATENCIÓN A USUARIOS Y HABITANTES DE LA ZONA

El Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023 como contratista del proyecto **'construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta'**, tendrá a disposición de la ciudadanía los medios necesariospara recibir quejas, reclamos y sugerencias como estrategia de veeduría, así mismo recibiráa representantes comunitarios, comerciantes, residentes y otros para atender sus quejas, reclamos y sugerencias en cuanto al Plan de Manejo de Transito implementado.

En la atención a la comunidad y cualquier persona se atenderá en la siguiente dirección carrera 16 N 24-2 a 24-58, villa olímpica, en el cual se seguirá el siguiente proceso:

1. Recibir, registrar e iniciar el proceso de atención de quejas y reclamos, informando al reclamante cómo se atenderá su solicitud.

2. Dar solución a cualquier inquietud.

3. Hacer seguimiento a la ejecución de la respuesta o acción necesaria para atender la queja o reclamo.

4. Informar al solicitante sobre la respuesta o acción llevada a cabo para atender la quejao reclamo.

10. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

La ejecución del plan de manejo de tránsito de la **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** se realiza de acuerdo con la viabilidad otorgada por la secretaria de Movilidad de la Alcaldía Municipal de Villavicencio-Meta, mediante oficio **1703-19.18/0680 del 17 de MAYO DE 2023** y lo emanado en la resolución No.1885 de 2015 "Manual de Señalización adoptado por el Ministerio del Transporte".

Mediante esta resolución se da inicio a la implementación del plan de manejo de tránsito delCONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.

Una vez aprobado el Plan de Manejo de Tránsito por las autoridades y entidades competentes, se procederá a realizar su implementación en la zona de obra.

El ingeniero residente de la obra supervisará la correcta implementación del PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad y en caso de ser necesario realizarán ajustes o retroalimentaciones al Plan de Manejo de Tránsito. El grupo constructor será encargado de realizar labores de revisión, limpieza, reposición, recuperación y arreglo de las señales viables a volver a instalar.

10.1 Información y divulgación del plan de manejo de tránsito

La divulgación e información del plan de manejo de tránsito. se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra y será responsabilidad del componente ambiental del mismo.

- Mensajes informativos y de sensibilización hacia la obra y colaboración de la ciudadanía. donde se informa sobre la duración y tipo de obra. desvíos y precauciones a tomar.

- La información al usuario durante este periodo de ambientación. se realiza a travésde acciones de prevención y mitigación por la construcción de las obras. ambientando a la población acerca de los beneficios que conlleva la construcciónde la misma.

- Antes de iniciar las obras. se le debe informar a la comunidad sobre el proyecto.su proceso. la duración de la construcción y sus implicaciones. molestias que generará la obra y los beneficios que se obtendrán con la construcción del proyectopor parte de la concesionaria.

- Se indica de manera clara los desvíos y precauciones a tomar.

- Instalación de señalización en torno a lo implementado en el PMT.

10.1.1 Atención vecinos y usuarios

El Consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023. responsable de la obra pondrá a disposición de laciudadanía los medios necesarios para recibir las quejas. reclamos y sugerencias como estrategia de veeduría.

El consorcio recibirá a representantes comunitarios. comerciantes. residentes y otros para atender sus quejas. reclamos y sugerencias en cuanto al plan de manejo de tránsito implementado.

En la atención a la comunidad y cualquier persona, se seguirá el siguiente proceso:

- Recibir, registrar e iniciar el proceso de atención de quejas y reclamos, informandoal reclamante cómo se atenderá su solicitud.

- Remitir a la dependencia interna del constructor o a la entidad oficial a que corresponda, el formato de registro de la queja.

- Hacer seguimiento a la ejecución de la respuesta o acción necesaria para atenderla queja o reclamo.

- Informar al solicitante sobre la respuesta o acción llevada a cabo para atender la queja o reclamo.

- Difundir a través de las organizaciones locales a los municipios del Área de Influencia Directa las respuestas y acciones ejecutadas para atender quejas y reclamos de la comunidad.

- El Consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, a través de la oficina destinada para tal efecto, gestionará la cantidad y ubicación de los buzones de sugerencias para aquellas personas que quieran presentar sus inquietudes por escrito, generando así un canal de comunicación directo. La difusión de estos, será responsabilidad del consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023.

10.1.2 Medios de difusión a utilizar.

La gestión Comunitaria es parte integral del proyecto y tiene como objetivo principal el de fortalecer y conservar las relaciones con las comunidades directamente afectadas relacionadas con la ejecución del proyecto, a través de los mecanismos de información, atención a emergencias y eventual resolución de conflictos.

De forma previa a la iniciación de los trabajos se dará a conocer el proyecto a la comunidad afectada de acuerdo con los criterios establecidos por la Oficina de

Gestión Social de CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.. informando los horarios de trabajo y coordinando los horarios de acceso a los parqueaderos de las viviendas en la zona. será divulgado por medio de Volantes informativos a la población del Área de Influencia de la ciudad de Villavicencio.

10.1.3 Quejas y reclamos

En el consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023. hasta la fecha no se han presentado quejas o reclamos por parte del personal aledaño a la obra. sin embargo. el consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023 está a disposición de la población para atender cualquier inconformidad.

10.2 Implementación del plan manejo de tránsito

El plan de manejo de tránsito se implementará de la siguiente manera:

- Si bien no se realizarán obras de rehabilitación de calzada vehicular y por consiguiente no se efectuarán cierres parciales ni totales de ninguna vía. en la zona de obra se dispondrá de un cerramiento en poli sombra. poli malla y/o dispositivos canalizadores (colombinas y cinta plástica). así como de la señalización indicada en los planos de diseño de los PMT anexos a este documento técnico.

- Para la etapa de suministro de material y/o cargue de escombros producto de la obra. se efectuará este procedimiento al interior del predio: es decir. dentro del lote objeto de intervención. con lo cual no se afectará el normal comportamiento del tránsito en la zona de influencia de la obra.

- Existen en la zona de la obra. presencia de rutas de transporte público colectivo urbano. las mismas no se verán afectadas.

- No se realizarán desvíos con ocasión de las obras a desarrollar.

- Las labores no implican afectación de andenes y en el lugar de las obras no existe

infraestructura para bici usuarios: no obstante, se cuenta con una zona de aproximadamente 2.00 mts de espacio público, las cuales serán destinadas para la conformación de senderos peatonales.

- El cargue y descargue del material se realizará directamente dentro de la zona de obra, sin tener afectación a vías aledañas, de tal manera que se retire el material periódicamente en horas valle. Se contará con un auxiliar de tránsito para controlar la entrada y la salida al predio de los vehículos de cargue y descargue del material de obra.

- Para el manejo y disposición de escombros y desechos de construcción se tendrá en cuenta lo dispuesto en el decreto municipal 254 de 2012. Para el manejo y disposición de escombros y desechos de construcción se tendrá en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente.

- La disposición de material resultante de demolición se realizará en las instalaciones del sector Guatiquia.

- Disponibilidad de celulares para la comunicación en los extremos de la obra.

- Disponibilidad del área HSEQ.

- Rotulación de volquetas con la aprobación del PMT.

- Inicio de actividades Implementado el plan de manejo de tránsito, se realizarán los ajustes que se exijan en terreno, de acuerdo con las condiciones operacionales del momento, por parte del Contratista y la Interventoría.

11. ACTIVIDADES DE OBRA EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2023

En el periodo correspondiente al mes de julio se realizaron las siguientes actividades en la obra **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.**

- Instalación de las señales de tránsito con el fin de que la población aledaña tenga presente que se está interviniendo en esa zona. se instalan los 3 avisos de señalización externa ubicados en la carrera 18.

- Verificación y adecuación de la lona que fue instalada como cerramiento de obra. en la zona de cancha auxiliar y calle 25.

- Supervisión por parte del área SST en la implementación del plan de manejo de tránsito **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta.** supervisión por parte de interventoría. verificando el cumplimiento a la implementación y funcionamiento del PMT.

- Finalización de la actividad que constaba en la extracción de material sobrante de escombros de la pista de patinaje culmina el día 11 de julio. con respecto al ingreso de volquetas con material de relleno de diferentes pulgadas para la adecuación de la vía interna termina el día 10 de julio. Así mismo se inician actividades de extracción del material de escombros proveniente de la demolición de sardineles de la pista atlética. inicia el día 17 de julio y finaliza el 25 de julio.

- Ingreso de tractocamión para la extracción de la estructura metálica. material de cubierta. sanitarios. luminarias y demás materiales provenientes del desmonte de los escenarios existentes.

- Ingreso de maquinaria minicargador el día 17 de julio para el retiro de grama sintética. y material sobrante de escombros.

- Ingreso de camión de estacas con el fin de hacer la disposición final en cormacarena de las llantas que se encontraban en los fosos del escenario de gimnasia.

- Se verifica el Ingreso de vehículos propios de la obra, automóviles motocicletas y ciclas.

- Supervisión por parte de interventoría, verificando el cumplimiento a la implementación y funcionamiento del PMT.

11.1 Instalación de señalización pmt.

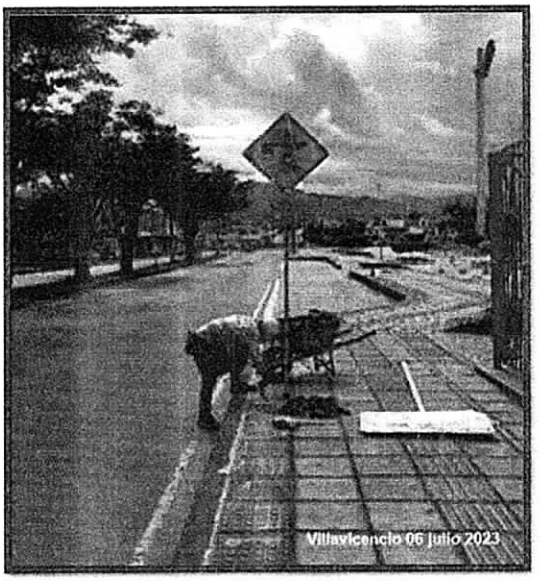


Ilustración 8 instalación señalización pmt

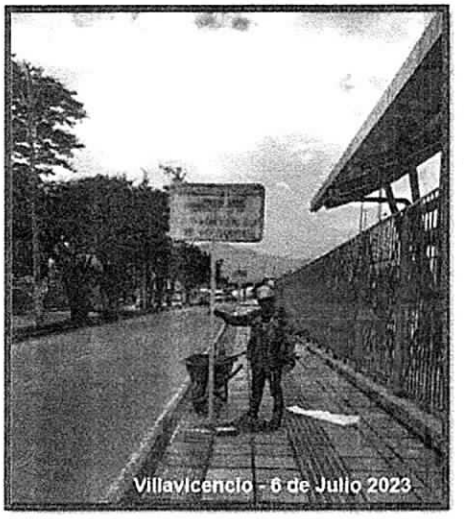


Ilustración 9 instalación señalización pmt



Ilustración 10 instalación señalización pmt

11.2 Supervisión por parte de área técnica

En la obra del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023, se tiene a diario la supervisión por parte del área técnica en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

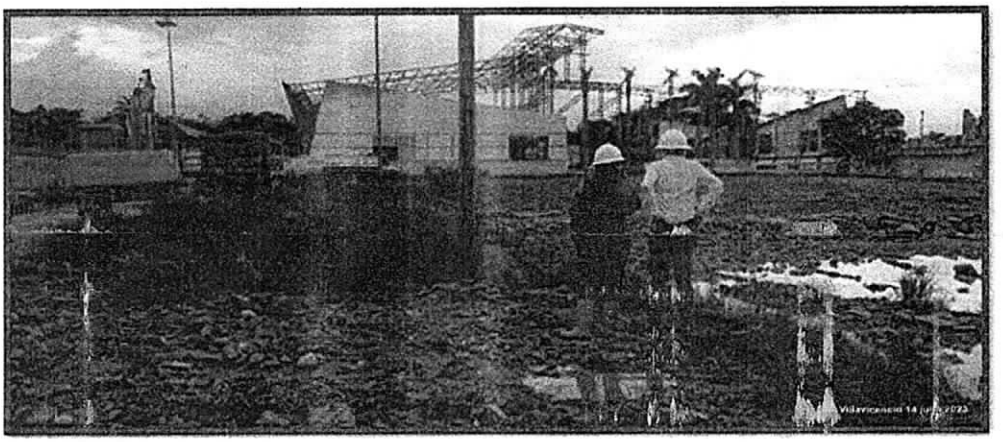


Ilustración 11supervisión del área técnica

11.3 Charlas de seguridad a trabajadores

Diariamente se realizan charlas de seguridad a todo el personal trabajador de la obra nuevoconsorcio, con el fin de concientizar a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial.



Ilustración 12 Charlas de seguridad

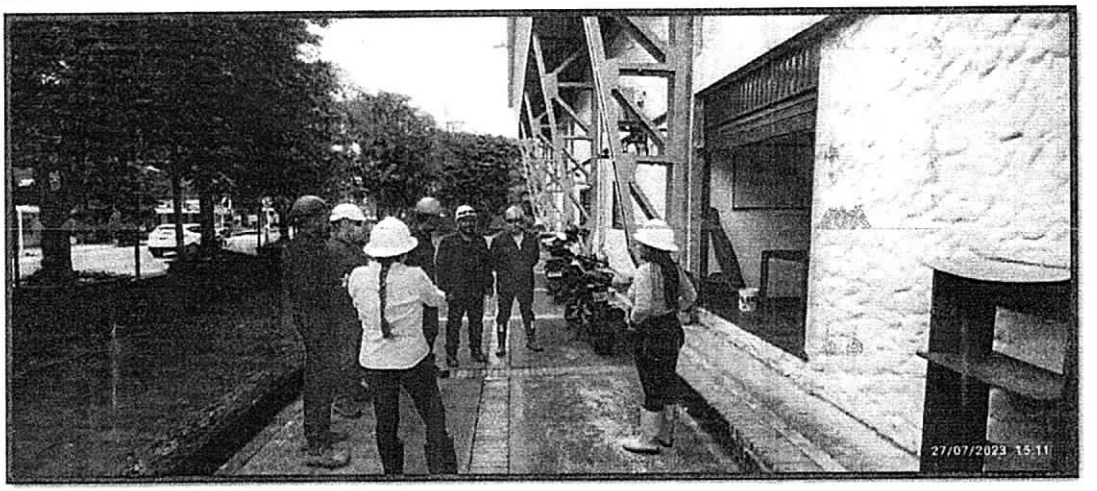


Ilustración 13 Charlas de seguridad

11.4 Mantenimiento de señalización en obra

Se verifica que la lona instalada en el cerramiento de la obra esté en buenas condiciones y así garantizar el no paso a personal ajeno a la obra.

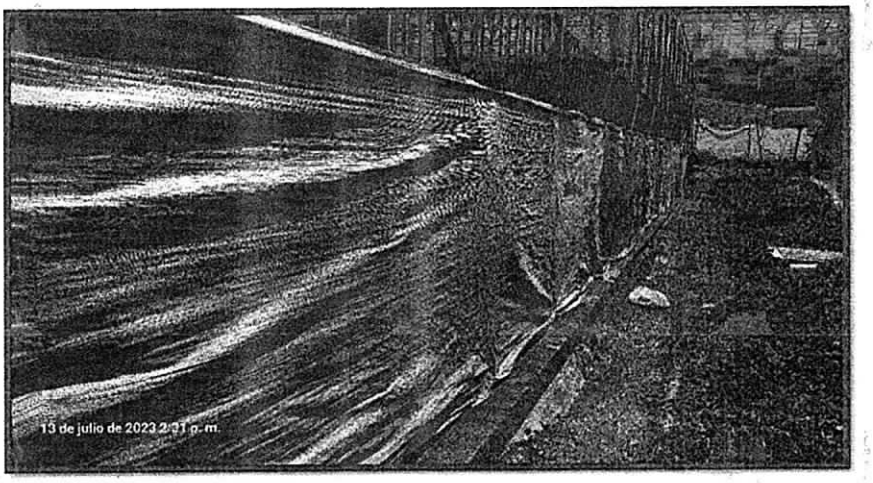


Ilustración 14 Mantenimiento de la señalización

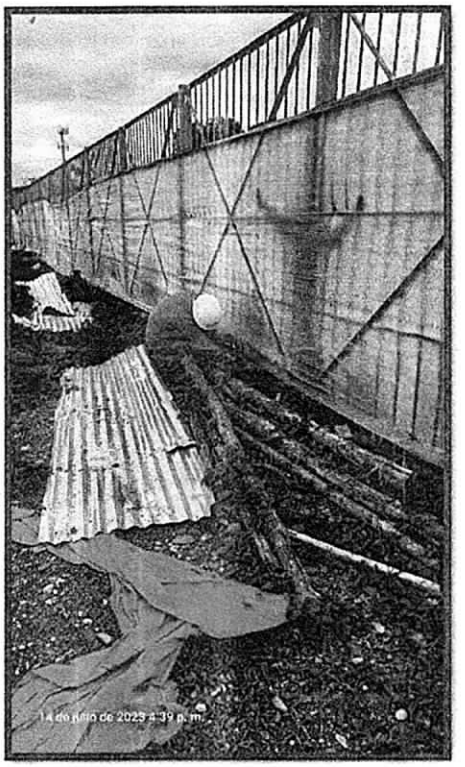


Ilustración 15 Mantenimiento de la señalización

11.5 Puntos de emergencia en obra

En la obra se cuenta con 3 puntos de emergencia ubicados en zonas donde se están ejecutando actividades en caso de un accidente, así mismo el consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023, tiene conformada por 4 personas, una brigada integral de emergencia, en caso de alguna eventualidad que se llegue a presentar en la obra.

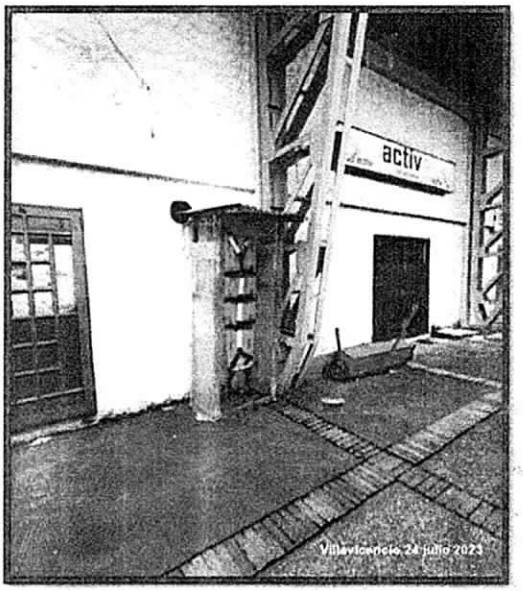


Ilustración 16

12. DISPONIBILIDAD E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA EL PLAN

Se cuenta con la señalización reglamentaria para el ingreso y salida de los vehículos. se instala señalización en puntos estratégicos fuera de la obra en torno a lo autorizado en el PMT, así mismo se cuenta con el personal idóneo para la ejecución de la labor.

12.1 Equipo y maquinaria

La maquinaria para la correcta ejecución de la obra. consta principalmente de:

- Volquetas.
- Minicargador
- Grua Ph.
- Retroexcavadora.
- Herramientas Básicas y equipos de construcción.

Esporádicamente ingresan a obra vehículos de carga pesada. tractomulas y camiones

por parte de los subcontratistas.



Ilustración 17



Ilustración 18

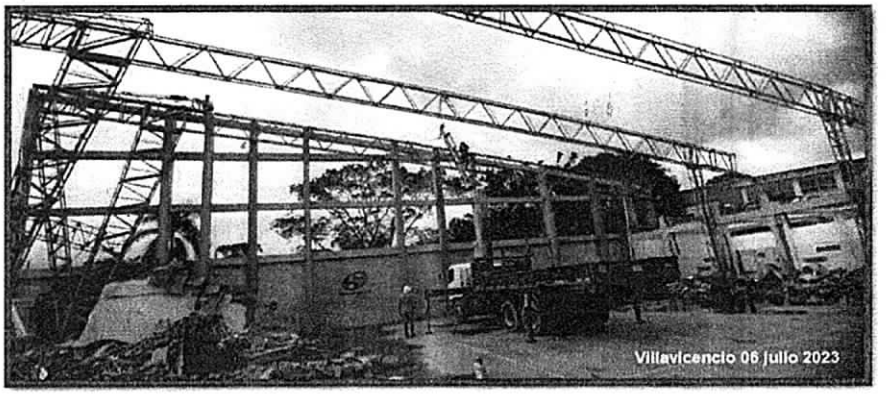


Ilustración 19



Ilustración 20

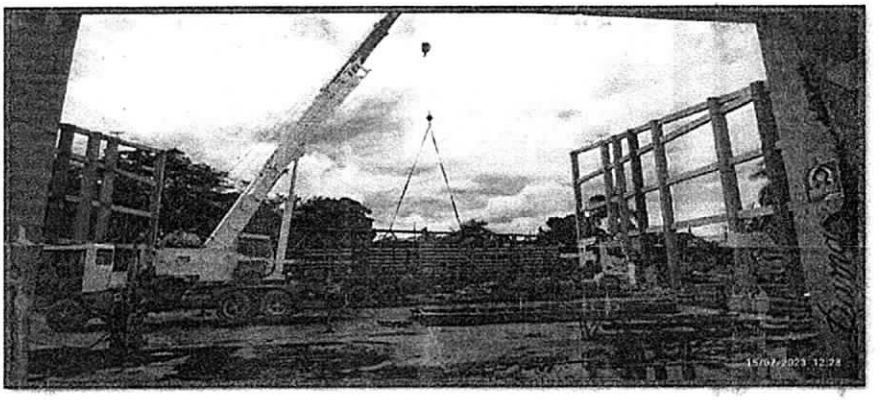


Ilustración 21



Ilustración 22



Ilustración 23

12.2 Señalización utilizada fuera de la obra

Se realiza instalación de señalización externa con el fin de que los peatones tengan cuidado a la hora de pasar por el frente de las actividades que se están realizando.

12.3 Características de la señalización.

La señalización implementada garantiza que la información sea clara a los usuarios de la vía y los conductores en la zona interna de la obra.

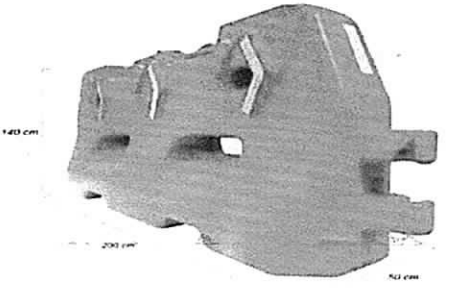


Ilustración 24 Maletín

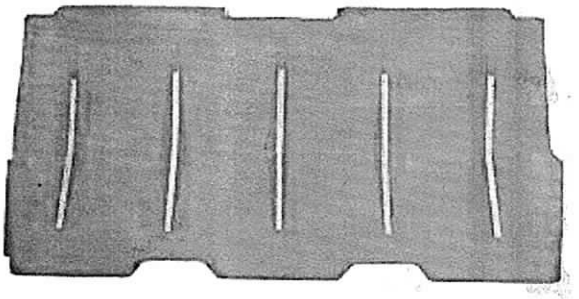


Ilustración 25 Maletín

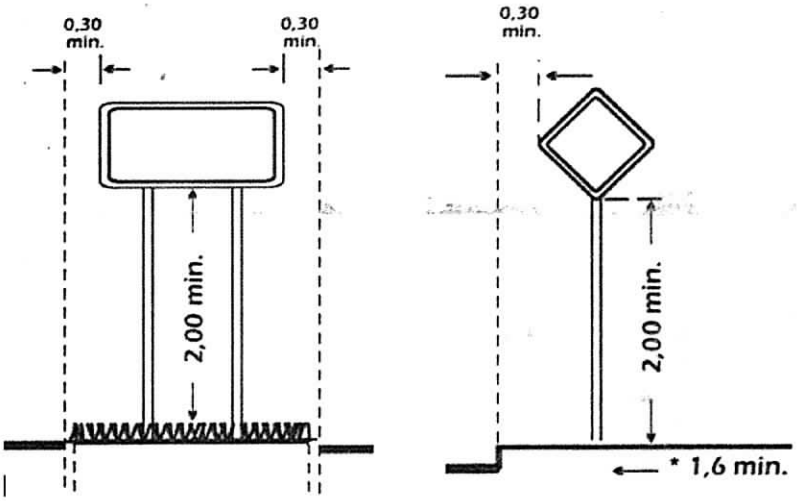


Ilustración 26 Señalización vial

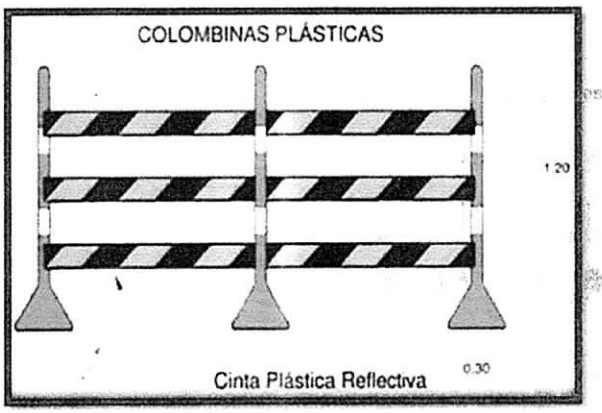


Ilustración 27

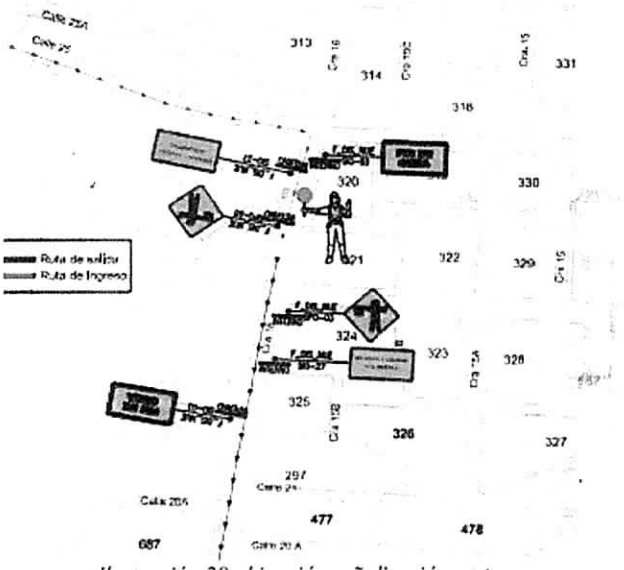


Ilustración 28 ubicación señalización pmt

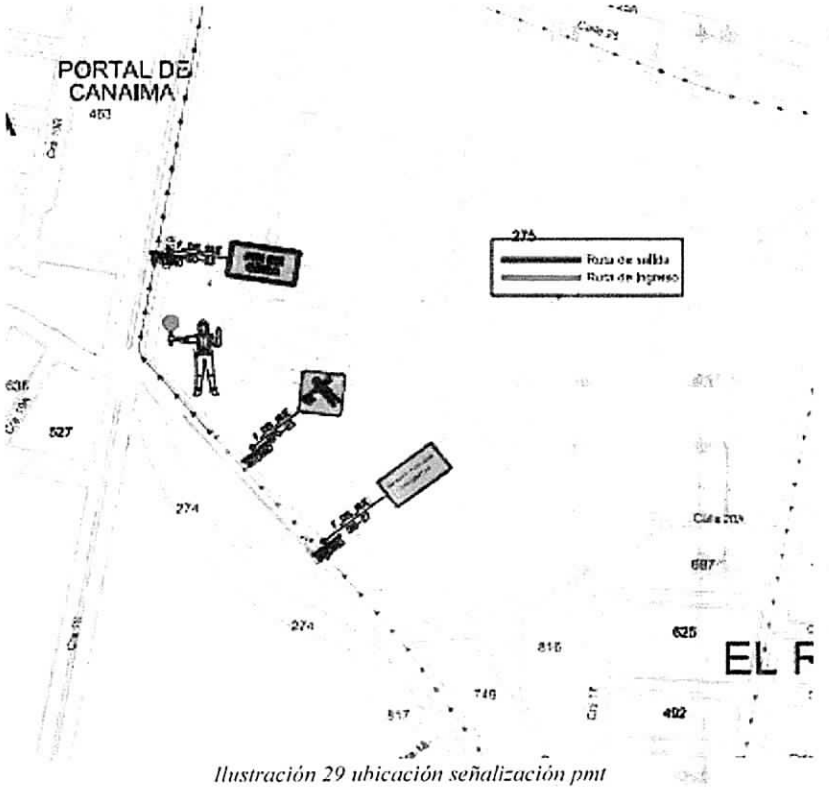


Ilustración 29 ubicación señalización pmt

12.4 Señalización informativa de obra.

Corresponde a señales informativas de entrada y salida de volquetas, fin de obra y paletero, que se ubicarán cada 50 metros de distancia desde el punto donde se ubica la última señal, en ambos costados, informando sobre la precaución de paso vehicular existente, en forma general para la ejecución de la labor.



Ilustración 30



Ilustración 31

13. COORDINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN (PMT).

La obra de **construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio departamento del meta,** cuenta con persona de seguridad ysalud en el trabajo, quien es la encargada de la supervisión de las actividades realizadas en la obra, así mismo se cuenta con una persona certificada en seguridad vial a quien se le designa roles para las actividades del manejo de tránsito en la obra al momento de la circulación de peatones y vehículos.



Ilustración 32 controlador vial

14. SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.

El plan de manejo de tránsito es supervisado por el director de obra, Ing. Yeison Esneider Gómez Guerrero, quien es el encargado de la supervisión y ejecución de las actividades que se realizan a diario, así mismo es supervisado por el ingeniero residente y a su vez por la persona encargada del área de seguridad y salud en el

Municipio de Villavicencio

trabajo del consorcio escenarios deportivos villa olímpica 2023.

15. CONCLUSIONES

- No se presentaron accidentes o incidentes en la obra en este periodo del mes de diciembre
- La implantación del PMT es supervisado por el director de obra quien es el encargado de dirigir la obra, así mismo es supervisado por la interventoría quien está muy pendiente de todo lo relacionado con vehículos y maquinaria pesada que entra a obra.
- En el mes de julio se contó un ingreso moderado de vehículos y maquinaria, ya que la obra se encuentra en una etapa de extracción de material sobrante de escombros y desmontes, pero debido a que es un ingreso intermitente no se cuenta con la bitácora completa de los 31 días.

ING YEISON E. GOMEZ GUERRERO
Director de Obra

16. ANEXOS

1703-F-Mov-11-V1 Formato Registro Bitácora PMT JULIO
1703-F-Mov-11-V1 Formato de Evaluación Plan de Manejo de Transito Señalización y Desvíos (1-07AL31-07)

4870

Proceso de Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso de la Administracion de la Movilidad
EVALUACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACION Y DESVIOS

Municipio de Villavicencio

CALIFICACIÓN MENSUAL DE TRÁNSITO								
CORRESPONDIENTE AL PERIODO			DEL	1/07/2023			AL	31/07/2023
ITEM	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	100%	90%	50%	0%	NO APLICA	OBSERVACIONES	
1	**Señalización Vertical y Dispositivos**							
	Pasacalles					X		
	Señales Reglamentarias					X		
	Señales Preventivas					X		
	Señales Informativas	X					SEÑALIZACION CARRERA 18	
	Señalización luminosa					X		
	Canalizaciones (Cintas, delineadores tubulares, maletines, etc.)					X	NO HAY INTERVENCIÓN EN LA VIA	
	Barricadas					X	NO HAY INTERVENCIÓN EN LA VIA	
	Señalización Horizontal							
	Separación de Carriles					X		
	Paraderos					X		
	Pasos peatonales y líneas de pare					X		
	Vías de desvío					X		
2	**Manejo Peatonal**							
	Señales Informativas	X					SEÑALIZACION CARRERA 18 NUEVA	
	Canalización de Senderos					X	ZONA PEATONAL HABILITADA	
	Adecuación de rampas					X		
	Adecuación superficie zonas peatonales					X		
	Adecuación Paraderos					X		
	Adecuación superficie Paraderos					X		
	Iluminación					X		
3	**Estado de las vías**							
	Corredor a Intervenir					X	EL PROYECTO NO INTERVIENE NINGUN CORREDOR	
	Vías de desvío					X	EL PROYECTO NO INTERVIENE NINGUNA VIA	
4	**Manejo de Intersecciones o intercambiadores**							
	Tiempo de ejecución (duración)					X		
	Implementación del PMT correspondiente					X		
5	**Cumplimiento de Parámetros de Tránsito**							
	Velocidad					X		
	Accidentalidad					X		
6	**Cumplimiento de compromisos**							
	Cumplimientos de compromisos	X						
7	**Tiempos de vigencia de los PMT**							
	Tiempos de vigencia de los PMT	X						
8	**Personal asignado al PMT**							
	Personal profesional	X						
	Auxiliares de Tránsito	X					ACOMPAÑAMIENTO ENTRADA DE VEHICULOS	
	Brigada de Mantenimiento					X		
	Asistencia y participación en los Comités de Tránsito					X		
9	**Informes Mensuales de Tránsito**							
	Entrega puntual		X				RETRASO DE 1-3 DIAS	
10	**Inconformidades al PMT**							
	Número de Soluciones dadas / Quejas recibidas	X						

CALIFICACIÓN MENSUAL 90 %

PERIODO EVALUADO: 1 DE JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023

ING LEONEL ROA RUIZ
INTERVENTORÍA

ING YEISON E. GOMEZ GUERRERO
CONTRATISTA

1. Señalización: Para efectos de la evaluacion del cumplimiento del Contratista en cuanto a la señalización que debe disponer de acuerdo con lo señalado en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, se entenderá que una señal (sea esta vertical u horizontal) es considerada para efectos de este numeral como efectivamente ejecutada, cuando cumple con las caracteristicas fisicas señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos y cuando se encuentra dispuesta durante el tiempo alli señalado.

Esta evaluación se debe aplicar a cada nivel de señalización y demarcación en forma independiente.
La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

• Si el Contratista ejecuta el 100% de las actividades señaladas en el Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 90%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 50%.

• Si el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 0%.

2. Manejo Peatonal: Para efectos de la evaluación del cumplimiento en cuanto al manejo peatonal, que debe realizar y mantener el contratista, se entenderá que el manejo peatonal ha sido efectivamente ejecutado cuando los senderos peatonales han sido dedibidamente implementados conforme al Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:
• Si el Contratista ejecuta el 100% de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 90%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 50%.

• Si el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades de manejo peatonal señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 0%.

3. Estado de las vías:
Para efectos de la evaluación del Contratista en cuanto al estado de condición de las vías, sobre el corredor y las vías utilizadas como desvío, se efectuará la siguiente evaluación:

• Si, durante el mes correspondiente, todo el corredor y todas las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 100%.

• Si, durante el mes correspondiente, menos del 100% pero más del 90% del corredor y las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 90%

• Si, durante el mes correspondiente, menos del 90% pero más del 70% del corredor y las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 50%.

• Si, durante el mes correspondiente, el 70% o menos del corredor y las vías utilizadas como desvíos se encuentran en buen estado, la calificación del Contratista será del 0%.

4. Manejo de Intersecciones e Intercambiadores:
Se evalúa el cumplimiento del Contratista en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos para las intersecciones e intercambiadores en las cuales se ejecutaron Obras de Construcción durante el mes correspondiente con las condiciones de tiempo, horario, forma, indicadas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

• Si el Contratista ejecuta el 100% de las actividades señaladas en el Plan de manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 100%, pero más del 90% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 90%.

• Si el Contratista ejecuta menos del 90%, pero más del 70% de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 50%.

• Si el Contratista ejecuta el 70% o menos de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos (aprobado e incluyendo los ajustes que se efectúen en el Comité de Tránsito), el Contratista recibirá una calificación del 0%.

5. Cumplimiento de los parámetros de control de Tránsito:
El cumplimiento de los parámetros de control de Tránsito se calificará si o no, es decir que en caso de no alcanzar los valores acordados se dará por no cumplido y la calificación será 0%, en caso contrario será 100%.

El cumplimiento de los parámetros del tránsito se dará teniendo en cuenta los indicadores fijados en la construcción de la linea base.

6. Cumplimiento de Compromisos: Como resultado de los comités semanales de seguimiento del PMT, se acordarán acciones concretas a seguir por el Contratista, dichas actividades se consignarán en las actas precisando los alcances y tiempos para su ejecución. Estos compromisos serán evaluados si se cumplieron o no, con 100% para el cumplimiento y 0% para el caso contrario.

7. Tiempos de vigencia de los PMT: Los PMT se aprueban con una vigencia establecida por el contratista, por lo tanto, se tendrá en cuneta su cumplimiento. Estos compromisos serán evaluados si se cumplieron o no, con 100% para el cumplimiento y 0% para el caso contrario.

8. Personal asignado al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos:
Del personal profesional y de apoyo con que debe contar el contratista, se evalúa su efectiva disponibilidad, la asistencia a los comités de Tránsito (de acuerdo a la periodicidad establecida con la SMV mediante acta), su presencia en la vía y su dotación.

• Si el personal del Contratista cumple el 100% en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el personal del Contratista cumple en menos del 100%, pero más del 90% en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 90%.

• Si el personal del Contratista cumple en menos del 90%, pero más del 70% en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 50%.

• Si el personal del Contratista cumple el 70% o menos en asistencia, disponibilidad, cumplimiento y dotación, el Contratista recibirá una calificación del 0%.

9. Informes mensuales de Tránsito

Se evalúa la entrega y contenido de los informes de seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, lo cual debe realizarse dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes y debe contener los diferentes aspectos planteados.

• 100% si el informe ha sido entregado a tiempo y su contenido cumple con el 100% de lo solicitado.

• 50% si el informe ha sido entregado entre los 11 y 15 días del mes o su contenido cumple entre el 70% y el 100% de lo solicitado.

• 0% si el informe ha sido entregado después del día 15 o si, aún entregado a tiempo, su contenido no cumple con, por lo menos el 70% de lo solicitado.

10. Inconformidades al PMT

Se entenderán como inconformidades al PMT, las manifestaciones que en tal sentido formulen las comunidades y/o usuarios o en forma directa a la SMV . En igual sentido se considerarán favorablemente las soluciones que el Contratista tome en forma directa para atender las inconformidades recibidas. Para la parametrización de la calificación se tomarán en consideración, en porcentaje, el número de soluciones dadas sobre el número de quejas presentadas, teniendo en cuenta la siguiente fórmula

(Soluciones dadas/quejas recibidas) x 100
• Si el procentaje del producto de esta fórmula está entre el 100% y el 91% tendrá una calificación de 100%.
• Si se encuentra entre el 90% y el 71% tendrá una calificación de 90%.
• Si se encuentra entre el 70% y el 49% tendrá una calificación del 50%.
• Si es inferior al 49% tendrá una calificación de 0%.

CAUSALES DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS DEL CONTRATISTA.
La SMV podrá imponer las multas señaladas en la Cláusula de la minuta del Contrato MULTAS y por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el PMT, cuando el Contratista, entre otras:
1. No alcance la calificación de por lo menos el 80% en las listas de chequeo según la evaluación presentada por la Interventoría en el informe mensual.
2. Incumpla en tres (3) o más periodos mensuales consecutivos uno o varios ítems de las listas de chequeo.
3. Incumpla los requerimientos oficiados por la Interventoría o la SMV, en tres (3) o más ocasiones.

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de 19 viajes.	

FECHA: 4 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

4874

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje se hace el retiro de 17 viajes.	

FECHA: 5 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio


Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA


NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se traen 3 viajes de relleno para el arreglo de la vía de acceso y se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje, se hace el retiro de 14 viajes. Adicional a estas actividades se hizo la instalación de los 3 avisos de señalización externa por la carrera 18.	

FECHA: 6 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



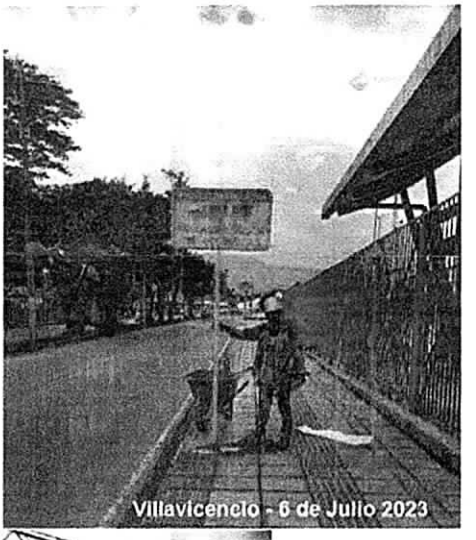

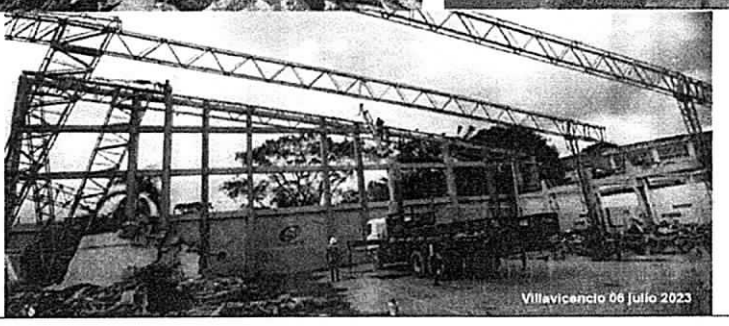

FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS PERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se traen 11 viajes de relleno para el arreglo de la vía de acceso y se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje, se hace el retiro de 16 viajes.	

FECHA: 7 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje, se hace el retiro de 9 viajes.	

FECHA: 8 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se traen 2 viajes por última vez de relleno para el arreglo de la vía de acceso y se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje, se hace el retiro de 18 viajes.	

FECHA: 10 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se continua con la extracción del material de escombros proveniente de la pista de patinaje, se hace el retiro de 18 viajes.	

FECHA: 11 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO






FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se da el ingreso a un vehículo tractocamión con el fin de hacer el cargue del material proveniente del desmonte de los escenarios deportivos.	

FECHA: 13 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

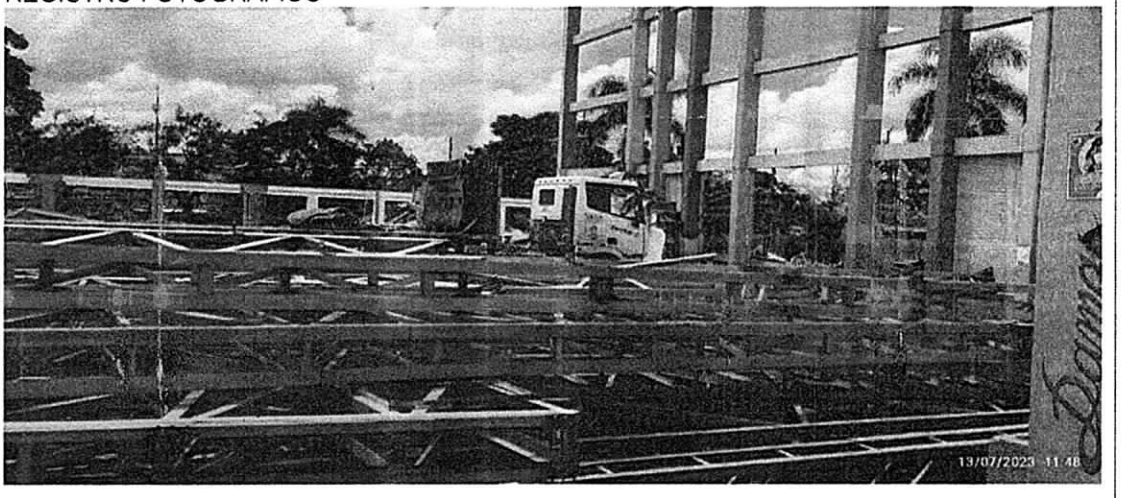

FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se da el ingreso a un vehículo tractocamión con el fin de hacer el cargue del material proveniente del desmonte de los escenarios deportivos.	

FECHA: 14 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ


Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se da el ingreso a un vehiculo tractocamión con el fin de hacer el cargue del material proveniente del desmonte de los escenarios deportivos.	

FECHA: 15 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

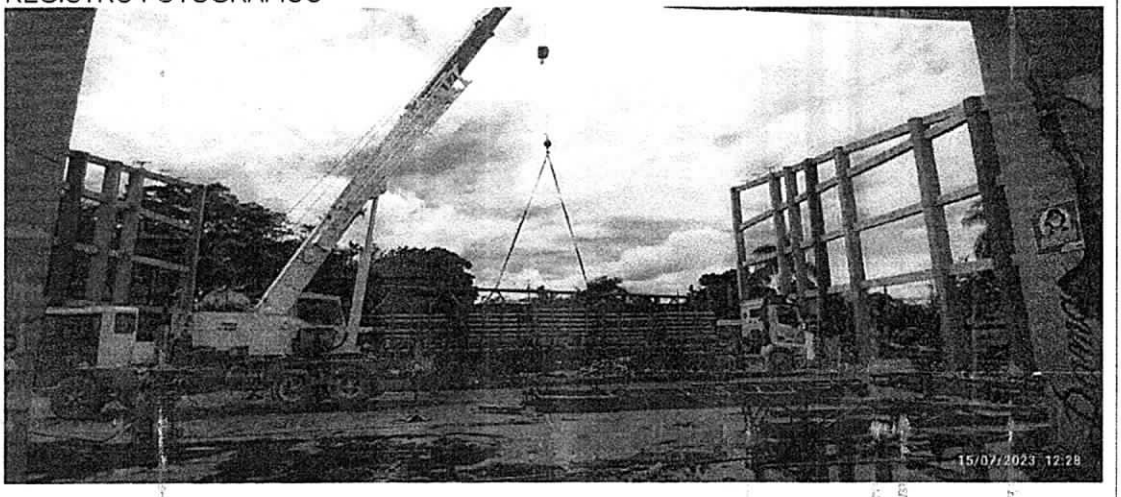

FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se empieza el retiro de material de escombros proveniente de la pista atlética, sardineles internos y externos. Se hace la disposición de 5 viajes.	

FECHA: 17 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ


NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se hace el retiro de material de escombros proveniente de la pista atlética, sardineles internos y externos. Disposición de 1 viaje. De manera simultánea se da el ingreso a un vehículo tractocamión con el fin de hacer el cargue del material proveniente del desmonte de los escenarios deportivos.	

FECHA: 18 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





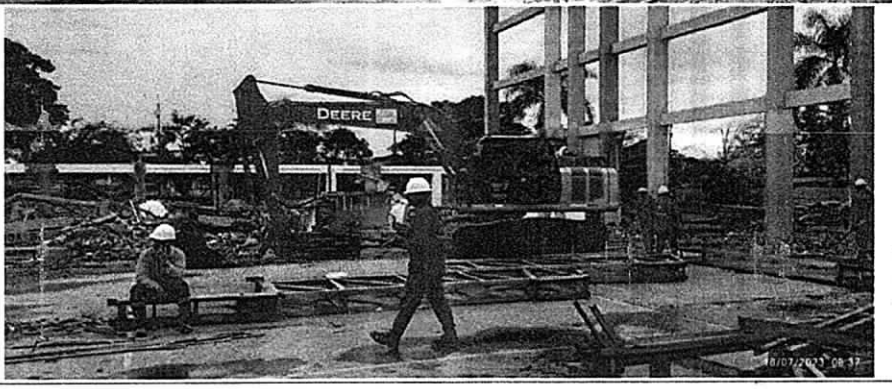

FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se da el ingreso a un vehiculo tractocamión con el fin de hacer el cargue del material proveniente del desmonte de los escenarios deportivos.	

FECHA: 19 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se da el ingreso a un vehículo tractocamión con el fin de hacer el cargue del material proveniente del desmonte de los escenarios deportivos.	

FECHA: 20 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES: Se hace el retiro de material de escombros proveniente de la pista atlética, sardineles internos y externos. Se hace la disposición de 4 viajes.	

FECHA: 25 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES:	

FECHA: 28 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

VERONICA GOMEZ

FIRMA HSEQ

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso Administración de la Movilidad
REGISTRO DE BITÁCORA DIARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES:	

FECHA: 29 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA RESIDENTE

FIRMA HSEQ

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
ESTUDIO DE MOVILIDAD:	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: 1703-19.18/0680	**CONSECUTIVO RADICADO:** 4107 DEL 28 DE ABRIL 2023
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.	
INGENIERO DE OBRA: ING. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL	
INGENIERO PMT: JHORMAN TIBAMBRE MENDEZ	
OBSERVACIONES:	

FECHA: 31 DE JULIO 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA RESIDENTE

VERONICA GARCIA
FIRMA HSEQ

4891

INFORME SST

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

4892

CONTRATO N.° 106 -2023

PERIODO
De 01 ju1io de 2023 al 31 de julio de 2023
Villavicencio, Meta



CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

NIT: 901.828.871 – 2
Carrera 16 # 24-03 villa olímpica.
escenariosdeportivos2023@gmail.com
Cel: 310 2453562

INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SST
PERIODO
De 01 julio de 2023 al 31 de julio de 2023

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	VERÓNICA CABARCA LIZCA	SST	Veronica Cabarca
APROBÓ	ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO	SST	

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVOS 6
OBJETIVO GENERAL: 6
OBJETIVOS ESPECIFICOS 6
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
ACTIVIDADES SGSST EJECUTADAS EN EL PERIODO: 8
RELACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PERIODO JULIO 2023 11
PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES: 11
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES: 12
AUSENTISMO LABORAL: 12
CHARLAS DE SEGURIDAD - PREOPERACIONALES. 13
SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 13
ORDEN Y ASEO 14
CONCLUSIONES 15

LISTA DE ANEXOS

Anexo N°1 *Asistencia diaria.*
Anexo N°2 *Inspección de EPP.*
Anexo N°3 *Asistencia actividades.*
Anexo N°4 *Permisos de Trabajo en alturas.*
Anexo N°5 *Permisos de Trabajo en caliente.*
Anexo N°5 *Entrega de dotación y EPP.*
Anexo N°6 *Preoperacional de maquinaria.*
Anexo N°7 *Control de equipos.*
Anexo N°8 *GES-FO-33 Acta de relación de personal de obra e interventoría.*
Anexo N°9 *GES-FO-39 Acta control y seguimiento seguridad social y parafiscal.*

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la ejecución del contrato 106 - 2023 y los procedimientos establecidos, el presente documento pone en manifiesto las consideraciones y actividades reglamentarias para el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, velando por la calidad de vida, la salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades, el desempeño y desarrollo personal y social, promovidas a través del plan de salud y seguridad en el trabajo implementado durante todas las etapas constructivas de este proyecto.

La obra de Construcción escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la villa olímpica del municipio de Villavicencio - Departamento del Meta, puede presentar importantes impactos en la población trabajadora, que deben ser regulados a través del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

El presente documento se relaciona las actividades que se han desarrollado como parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el periodo de JULIO del 2023.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo, esto para eliminar o reducir cualquier riesgo que esté relacionado con las actividades que pueda desencadenar un accidente de trabajo o enfermedad laboral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- *Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.*
- *Identificar los peligros y evaluar los riesgos presentes durante la ejecución de las actividades de los trabajadores.*
- *Generar acciones de Promoción y Prevención.*
- *Evaluar condiciones de SST en obra, en pro de prevenir condiciones no seguras que atenten contra la integridad física y mental del trabajador, brindando los EPP pertinentes y señalando los espacios no seguros transitados en obra.*
- *Presentar las evidencias correspondientes de acuerdo con la ejecución de las actividades desarrolladas en la ejecución de los proyectos en los diferentes frentes de trabajo.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BASICA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 31.845.658.891
	$ 8.805.724.533
	$ 10.228.557.418
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR ACTUALIZADO:	$50.871.940.842
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CORREO ELECTRONICO:	Escenariosdeportivos2023@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 de 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRONICO:	sstvilla.2023@gmail.com

ACTIVIDADES SGSST EJECUTADAS EN EL PERIODO:

En el presente documento relaciona las actividades desarrolladas en obra, como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, realizadas durante el mes de JULIO de 2023.

Las actividades son ejecutadas teniendo en cuenta las necesidades de obra civil, y bajo estricto cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad para la Prevención y mitigación del COVID-19, tanto para los trabajadores como para contratistas que hacen parte del proyecto VILLA OLIMPICA – CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADIO MACAL.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
1/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. *IMPLEMENTACIÓN DE INSPECIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD. *IMPLEMENTACIÓN DE FORMATO PLAN DE IZAJE. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * ELABORACIÓN INFORME MENSUAL.	
3/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. * VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CARGUE METALREC. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * REALIZACIÒN DE AUTOEVALUACION AL SGSST EN PLATAFORMA ARL.	
4/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS.	
5/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * VERIFICACIÓN DE PERMISOS DE ACTIVIDADES.	
6/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS.	
7/7/2023	*IMPLEMENTACIÓN DE PREOPERACIONAL DE MEZCLADORAS PORTATILES. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS.	
8/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL DE CONTRATISTAS.	

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
10/7/2023	*CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN BRIGADAS DE EMERGENCIAS. *CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *SUPERVISIÓN DE RETIRO DE MATERIAL METALREC.	
11/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * VERIFICACIÒN DE CONDICIONES PARA DESMONTE DE ESTRUCTURA EN ESCENARIO DE TAEKONDO. *VERIFICACIÒN DE PLAN DE IZAJE.	
12/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * REMISION DE PROCEDIMIENTO DE DEMOLICIÓN. * VERIFICACIÒN DE DOCUMENTACIÒN INGRESO DE MAQUINARIA A OBRA.	
13/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL DE CONTRATISTAS. * SUBSANACION DE OBSERVACIONES SST EN OBRA.	
14/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * VERIFICACIÓN PLAN DE IZAJE.	
15/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * VERIFICACIÓN PLAN DE IZAJE. * RETIRO DE MATERIAL METALREC.	
17/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * DILIGENCIAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJOS. * VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA DE INGRESO. * SUPERVISIÓN CUMPLIMIENTO PMT. ACOMPAÑAMIENTOS EN TAREAS CRITICAS.	
18/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *INGRESO DE MAQUINA PARA DEMOLICIONES. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA. * ACOMPAÑAMIENTO RETIRO MECANICO DE TAPETE EN PISTA ATLETISMO. * RETIRO DE MATERIAL POR PARTE DE METALREC.	

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
19/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *INGRESO DE MAQUINA PARA DEMOLICIONES. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DIARIO DE MAQUINARIA.	
20/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *INGRESO DE MAQUINA PARA DEMOLICIONES. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA. *ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE TALA. * DEMOLICIÓN DE MUROS INTERNOS ESCENARIOS.	
21/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA.	
22/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *RETIRO DE MAQUINA DE OBRA JHON DEERE 210. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA.	
24/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA.	
25/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA.	
26/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA.	
27/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. *INGRESO DE MAQUINA PARA DEMOLICIONES. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA.	
28/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA.	

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
29/7/2023	*CHARLA PREOPERACIONAL. * ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRA. *VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES DE ACTIVIDADES Y EQUIPOS. * INSPECCIONES DE EPP PERSONAL CONTRATISTAS. * ELABORACIÓN INFORME MENSUAL. *INGRESO DE MAQUINA PARA RETIRO DE ESCOMBRO. *SEÑALIZACIÓN DE AREAS. * INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINA.	

RELACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PERIODO JULIO 2023

De acuerdo con el control generado en obra se diligencia el formato GES-FO-33 ACTA DE REALACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA, documento el cual se anexa al final de este informe.

- ***Ver tabla de anexos - GES-FO-33 acta de relación de personal de obra e interventoría.***

De igual manera se informa también, que el personal que ingresa a obra cuenta con la documentación al día y en regla, El área de la Seguridad y salud en el trabajo vela por el cumplimiento de las normas de la seguridad y salud en el trabajo establecidas en el proyecto y se realiza verificación documental previo al ingreso.

PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES:

Se realiza supervisión y seguimiento por parte del Área de Seguridad y salud en el trabajo, a los contratistas sobre la respectiva certificación del pago de la seguridad social, pensión, y riesgos Laborales de las personas que laboran para el contrato N° 106-2023.

A los contratistas se les exige el cumplimiento de la normatividad vigente en este aspecto, por esto actualmente deben enviar la documentación requerida para el ingreso a obra y esta permanece en el archivo digital de obra y se presenta anexa en estos informes mensuales.

Los Contratista atienden los lineamientos establecidos, presentando las planillas de pago de EPS, ARL, Pensiones y Parafiscales, las cuales anexas a este informe se presentan las siguientes:

Se presenta planilla de pago N°: 9454869241 – CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS.
Se presenta planilla de pago N°: 1056759415 – CONSORCIO ESCENARIOS OPERADOR.
Se presenta planilla de pago N°: 9455896935 – ORGANIZACIÓN SOES.
Se presenta planilla de pago N°: 9453092767 – WILSON CARDENAS OPERADOR.
Se presenta planilla de pago N°: 9456884609 – WILSON CARDENAS.

Las anteriores planillas de pago de aportes fueron aportadas por la sociedad ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS, la cual es miembro del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.

Las actividades ejecutadas corresponden a las actividades necesarias a mano de obra especializada para la ejecución de los capítulos de obra informados en este presente periodo.

La siguiente corresponde a los contratistas vinculados por el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.

Se presenta planilla de pago N°: 9454961637 – JUAN ANTONIO BARBOSA.

NOTA; *Se deja claridad que algunas planillas que se anexan corresponden al mes anterior dado que se paga según los últimos dígitos de la identificación del aportante, por lo cual algunos contratistas se encuentran en vigencia en las fechas en las que se presenta este informe y por tal motivo no se anexa la planilla correspondiente al mes del informe.*

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES:

Los exámenes médicos ocupacionales, se realizan al personal que va a ingresar a laborar directa e indirectamente en la obra, en el caso de los contratistas hace parte de los requisitos documentales de ingreso, para así vigilar el cumplimiento de este.

El examen periódico, y retiro se realiza conforme al tiempo de duración del trabajador.

Dando así cumplimiento en este periodo al examen de ingreso.

- ***Exámenes médicos ocupacionales anexo a la documentación de ingreso del personal del mes.***

AUSENTISMO LABORAL:

El ausentismo laboral es la inasistencia al trabajo por periodos de uno o más días, lo cual se genera un gran impacto sobre el desarrollo y avance de la ejecución, pero además sobre la empresa quien ve afectada su productividad, lo que al final se traduce en una desaceleración y bajo rendimiento.

El ausentismo laboral se refleja ya sea por accidentes, enfermedades, motivos personales etc., y de lo cual se presenta e informa en este informe.

- ***Ver tabla de anexos – No se presentaron ausencias.***

CHARLAS DE SEGURIDAD - PREOPERACIONALES.

Las actividades relacionadas con la formación, capacitación, charlas de seguridad y salud en el trabajo, fortalecimiento de la comunicación interna, y desarrollo de valores, entre otros; han permitido que el clima laboral mejore especialmente en la dimensión laboral.

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento a la normatividad legal vigente, la cual obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de la seguridad y salud en el trabajo.



- ***Ver tabla de anexos - Registro Asistencia Charlas de seguridad.***

SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:

Los elementos de protección personal deben utilizarse como medida de protección de acuerdo a los establecido en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos de protección personal, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar en las diferentes actividades que desarrollan dentro del proyecto, en donde además se busca la prevención y disminución de incidentes y accidentes laborales, además del control de los riesgos laborales.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta.
Para la selección de los elementos de protección personal se tiene como base la matriz de elementos de protección, donde se hace relación el cargo, la actividad a ejecutar y la protección a utilizar.

Se cuenta con el registro de entrega de los elementos de protección personal, individual y de elementos, tanto de ingreso como el cambio cada que se requiere, para así mitigar los riegos presentes durante la ejecución de las actividades.

Para la reposición el trabajador debe hacer entrega de los elementos de protección que desea cambiar.


- ***Ver tabla de anexos - Entrega de Epp y Elementos de Bioseguridad.***


ORDEN Y ASEO

Los lugares de trabajo deben permanecer limpios y ordenados, esto con el fin de optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo, evitar problemas sanitarios, incidentes o accidentes laborales y en general, por conservar un entorno más seguro para toda la población vinculada directa o indirectamente a la obra.

Para ello se cuenta en cada frente de trabajo con un punto ecológico, debidamente señalizado y demarcado para la disposición adecuada de los residuos.

- ***SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.***

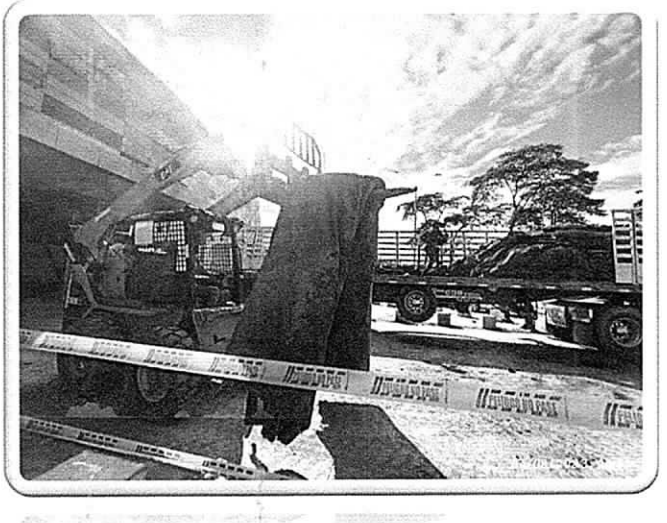

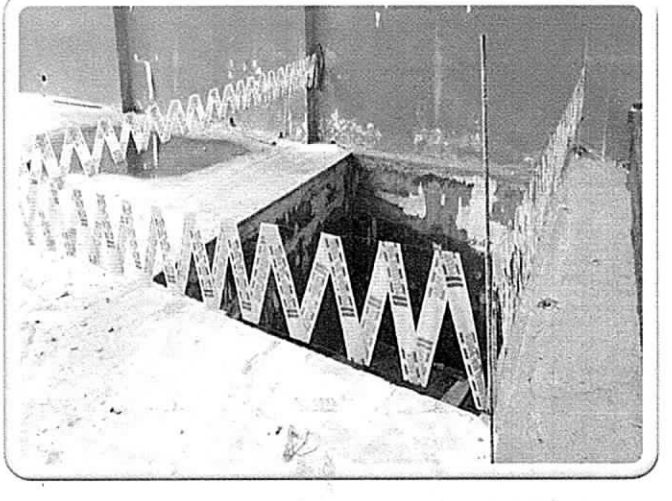

CONCLUSIONES

Durante el periodo de tiempo evaluado en el presente informe, se han evidenciado las diferentes prácticas implementadas en la obra "CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META" que pretenden el mejoramiento continuo de la seguridad y salud del trabajador, bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud e el trabajo, Siguiendo las normas establecidas para así lograr minimizar los riesgos presentes en las actividades que se ejecutan día a día.

4907

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSPECCIÓN DE EPP

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

4908

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: Natalia Garcia PROYECTO: JOC - 2023 FECHA: 01 - 07 - 2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL																	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Natalia Garcia	Aux Adm		X	X			X	X			X		X		X	X			
2	Juan David Payan	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
3	Mayra Pacha	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
4	Yeferson Jaramo Gaviria	Oficial	X		X		X		X			X		X		X	X			
5	Jeison Andres Rivera	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
6	Victor Hugo Giraldo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
7	Jhon Alan Gonzalez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
8	Jonathan Rafael Cordero	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
9	Jeferson Peralta	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
10	Jonaton Estiven Jaramo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
11	Benedicto Ramirez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
12	Yeison Vizcaino	Ayudante	X		X		X		X		X			X	X		X			
13																				
14																				
15																				

Natalia Garcia

FIRMA RESPONSABLE

4909

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: Natalia Garcia PROYECTO: JOC - 2023 FECHA: 04-04-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	Natalia Garcia	Aux Adm	X		X			X	X			X		X		X	X				
2	Benedicto Ramirez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
3	Juan David Rojas	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
4	Mayra Pacha	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
5	Jeison Andres Riveros	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
6	Victor Hugo Giraldo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
7	Jhon Alan Gonzalez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
8	Jonatan Estiven Jacome	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
9	Jefferson Perdomo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
10	Yeferson Jaramillo	Oficial	X		X		X		X			X		X		X	X				
11	Jonathan Rafael Cordero	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
12	Yeison Vizcaino	Ayudante	X		X		X		X			X	X		X		X				
13																					
14																					
15																					

Natalia Garcia

FIRMA RESPONSABLE

4910

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: Natalia García PROYECTO: JOC - 2023 FECHA: 05-07-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	Yefersson Jurado Garcia	Oficial	X		X		X		X			X		X		X	X				
2	Jerson Andres Rivera	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
3	Victor Hugo Giraldo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
4	Jhon Alan Gonzalez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
5	Jonathan Rafael Cardoso	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
6	Jefferson Peñaloza	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
7	Jonatan Estiven Jurado	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
8	Benedicto Ramirez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
9	Juan David Rojas	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
10	Mayra Alejandra Pacho	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
11	Natalia Garcia	Aux Adm	X		X			X	X			X		X		X	X				
12	Yeison Vaquino	Ayudante	X		X		X		X		X			X	X		X				
13																					
14																					
15																					

Natalia Garcia

FIRMA RESPONSABLE

4911

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: Natalia Garcia PROYECTO: Cubierta Escenarios FECHA: 06-07-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Yefersson Jarone Saavira	Oficial	X		X		X		X			X		X		X	X			
2	Jhon Alan Gonzalez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
3	Victor Hugo Giraldo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
4	Jeison Andres Rivera	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
5	Mayra Rocha	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
6	Juan David Rojas	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
7	Benedicto Ramirez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
8	Jonatan Estiven Jaramo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
9	Jefferson Peralosa	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
10	Jonathan Rafael Cadena	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X			
11	Natalia Garcia	Ass Adm	X		X		X		X			X		X		X	X			
12	Jeison Pizarro	Ayudante	X		X		X		X		X			X	X		X			
13																				
14																				
15																				

Natalia Garcia

FIRMA RESPONSABLE

4912

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: Natalia Garcia PROYECTO: 106-2023 FECHA: 04-04-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	Natalia Garcia	Ax Adm		X	X			X	X			X		X		X	X				
2	Mayra Alejandra Pedra	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
3	Juan David Rojas	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
4	Benedicto Ramirez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
5	Jonatan Estiven Jacome	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
6	Jefferson Peñaloza	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
7	Jonathan Rafael Cadero	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
8	Yeferson Jacome Garnica	Oficial	X		X		X		X			X		X		X	X				
9	Jhon Alan Gonzalez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
10	Victor Hugo Caraballo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
11	Jerson Andres Rivera	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
12	Neison Vizcaino	Ayudante	X		X		X		X		X			X	X		X				
13																					
14																					
15																					

Natalia Garcia

FIRMA RESPONSABLE

4913

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: Natalia García PROYECTO: 106 2023 FECHA: 8-07-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	Jonathan Puyol Cardero	Ayudante		X	X			X	X			X		X		X	X				
2	Yeferssen Jacome Gaviria	Oficial	X		X		X		X			X		X		X	X				
3	Jefferssen Penaloza	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
4	Jonatan Estiven Jacome	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
5	Benedicto Ramirez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
6	Juan David Rojas	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
7	Mayra Alejandra Rocha	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
8	Jison Andres Riveros	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
9	Victor Hugo Giraldo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
10	Jhon Alan Gonzalez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
11	Natalia Garcia	Aux Adm	X		X		X		X			X		X		X	X				
12	Yeison Vizcaino	Ayudante	X		X		X		X		X			X	X		X				
13																					
14																					
15																					

Natalia García

FIRMA RESPONSABLE

4914

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: Natalia García PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 10-07-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	Natalia García	Aux Admi		X	X			X	X			V		X		X	X				
2	Yeferssin Jacome Gavina	Oficial	X		X		X		X			X		X		X	X				
3	Jonathan Rafael Cider	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
4	Jefferssen Penaloza	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
5	Jonatan Estiven Jacome	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
6	Benedicto Ramirez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
7	Juan David Rojas	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
8	Mayra Rocha	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
9	Jeison Andres Riveral	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
10	Victor Hugo Giraldo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
11	Jhon Alan Gonzalez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
12	Edson Pacheco	AYUDANTE	X		X		X		X		X			X	X		X				
13																					
14																					
15																					

Natalia García

FIRMA RESPONSABLE

4915

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: Natalia Garcia PROYECTO: 106-2023 FECHA: 13-07-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	Juan David Rojas	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
2	Mayra Alexandra Rocha	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
3	Yefersson Jerome Garcia	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
4	Jeison Andres Rivera	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
5	Jhon Alan Gonzalez	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
6	Victor Hugo Giraldo	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
7	Jonathan Rafael Cadena	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
8	Benedicto Ramirez	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
9	Jonaten Estiven Jerome	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
10	Jeffersson Parada	Auxiliar	X		X		X		X			X		X		X	X				
11	Natalia Garcia	Aux Adm		X	X			X	X			X		X		X	X				
12	Jeisson Vizcaino	Auxiliar	X		X		X		X		X			X	X		X				
13																					
14																					
15																					

Natalia Garcia

FIRMA RESPONSABLE

4916

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: Natalia García PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 19-07-2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	Natalia García	Aux Adm		X	X			X	X			X		X		X	X				
2	Benedicto Ramirez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		✓	X				
3	Jonatan Estiven Jaramo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
4	Jefferson Panaloza	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
5	Jonathan Rafael Cadeno	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
6	Jhon Alan Gonzalez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
7	Victor Hugo Giraldo	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
8	Jeiser Andres Rivera	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
9	Yeferson Jaramo Garcia	Oficial	X		X		X		X			X		X		X	X				
10	Mayra Alejandra Rodriguez	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
11	Juan David Rojas	Ayudante	X		X		X		X			X		X		X	X				
12	Ericson Vizcaino	Ayudante	X		X		X		X		X			X	X		X				
13	Victor Hugo Giraldo	Ayudante	X		X		X		X		X			X	X		X				
14	Nodoro Ramos	Ayudante	X		X		X		X		X			X	X		X				
15																					

Natalia García

FIRMA RESPONSABLE

4917

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA | PROYECTO: 106 - 2023 | FECHA: 19/7/2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	X		X		X		X		X		X		X		X				
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	X		X		X		X		X		X		X		X				
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	X		X		X		X		X		X		X		X				
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					

FIRMA RESPONSABLE

4918

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA | PROYECTO: 106 - 2023 | FECHA: 20/7/2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	√		√		√		√		√		√		√		X			
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	√		√		√		X		√		X		X		X			
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	√		√		√		X		√		√		X		X			
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

FIRMA RESPONSABLE

4919

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2022

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: **VERONICA CABARCA** PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 21/7/2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																OTRO	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT			
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X			
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	X		X		X		X		X			X	X		X			
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	X		X		X		X		X			X	X		X			
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

FIRMA RESPONSABLE

4920

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA | PROYECTO: 106 - 2023 | FECHA: 22/7/2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	X		X		X		X		X			X	X		X			
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X			
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X			
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

FIRMA RESPONSABLE

4921

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA | PROYECTO: 106 - 2023 | FECHA: 25/7/2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																OTRO	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT			
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X			
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	X		X		X		X		X			X	X		X			
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X			
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

FIRMA RESPONSABLE

4922

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: **VERONICA CABARCA** PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 27/7/2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	✓		X		✓		X			X		X	X		X				
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓				
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	✓		✓		✓		X			✓		✓	✓		X				
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					

FIRMA RESPONSABLE

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

4923

RESPONSABLE: **VERONICA CABARCA** PROYECTO: 106 - 2023 FECHA: 29/7/2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																	OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X			
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X			
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X			
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

FIRMA RESPONSABLE

4924

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
VILLA OLÍMPICA 2023

INSPECCIÓN USO DE EPP

SST-F002-01 19/04/2023

RESPONSABLE: VERONICA CABARCA | PROYECTO: 106 - 2023 | FECHA: 31/7/2023

GA: GAFAS C: CASCO GU: GUANTES BS: BOTAS DE SEGURIDAD TO: TAPA OIDOS TB: TAPA BOCA IM: IMPERMEABLE DT: DOTACION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL																		OBSERVACIONES
			GA		C		GU		BS		TO		TB		IM		DT		OTRO		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	JEISSON EDUARDO VIZCAINO GARZON	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X				
2	VICTOR HUGO GIRALDO CARREÑO	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X				
3	YORDANO ALBERTO RAMOS ROMERO	AYUDANTE	X		X		X		X			X		X	X		X				
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					

FIRMA RESPONSABLE

4925

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASISTENCIA A ACTIVIDADES.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

4926

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 01-07-23 Hora de Inicio: 6:45 Hora de Finalización: 7:05 Lugar: ESCENARIOS DEPORTIVOS

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: AMBIENTE DE TRABAJO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Alexandra Rocha	A.F	1121899817	Alexandra Rocha
2	Juan David Rojas S	Aux	1006457106	Juan David Rojas S
3	Andres Rivero	Soldador	1121877300	
4	Victor M. Ovalle	Aux	1.124.830.660	
5	Jhonatan Jaramc	Aux	1121430714	
6	Jonathan cardozo	Soldador	6485253	Jonathan
7	Benedicta Ramirez	Aux	1824618277	Benedicta
8	[illegible]	Aux	[illegible]	[illegible]
9	Javier Ordoñez	Aux	1121964364	
10	Natalia Garcia	Sup	1006716849	
11	Tuerly Contreras Peña	Ambiental		
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4927

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 07-07-2023 Hora de Inicio: 6:45 Hora de Finalización: 7:05 Lugar: ESCENARIOS DEPORTIVOS

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: AMBIENTE DE TRABAJO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Victor M. Gaviria	Aux	1121826666	Victor Gaviria
2	Jonathan Cardona	Soldador	6485253	Jonathan
3	Natalia Garcia	SyP	1036714547	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4928

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 04-07-2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:25 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Entrenamiento ☐

Tema: El Almacenamiento Adecuado evita accidentes

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Vicosino		1.121.812.077	
2	Carlos Hurtado	Ayudante	1121928572	
3	Carlos Alcalcado Castaño	Ayudante	1121899675	
4	Jhonatan García	Aux	1121962263	
5	Fabian Gonzalez	Soldador	6343956	
6	Juan David Rojas	Aux	1001225708	Juan David R
7	Jonathan cardona	Soldador	6485253	Jonathan
8	Andres Rivera	Soldador	1121871200	
9	Jeiverson Perilla	Aux	1121 214 364	Jeiverson
10	Victor M. Giraldo	Aux	1.121836660	Victor M Giraldo
11	Alejandra Lecha	Aux	1121899327	Alejandra Lecha
12	Jhonatan Jaramillo	Aux	1121930714	
13	Benedicto Ramirez	Aux	1899787	Benedicto
14	Alexander Pardo T	Cadenero	86049519	
15	ALBERTO HERNANDEZ LEON	TOPOGRAFO	72423294	

OBSERVACIONES

4929

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 04-07-2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:25 Lugar: OBAR

Actividad. Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Entrenamiento ☐

Tema: -El almacenamiento Adecuado evita accidentes

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Cristian Juan	SSP	1121878772	Cristian Juan
2	Jeison Cardenal Hernandez	Ayudante	1141934592	Jeison Cardenal
3	Luis orlando Gonzalez	Aydant	79277418	
4	Javier Monroy	Operador	1053613222	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4930

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 5-07-23 Hora de Inicio: 6.49 Hora de Finalización: 7:10 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: TRABAJAR CORRECTAMENTE

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Yherly Contreras Peña	Ambiental	1122815443	Yherly C
2	Alexander Pardo B	Cadenero	86067518	
3	Juan David Reyes	AUX	1006825708	Juan David Reyes
4	Jonathan Cordero	Salvavidas	6485253	Jonathan
5	Jhonatan Jacome	aux	1121930714	
6	Yhoxin Peñaloza	Aux	1112111364	Yhoxin
7	Alejandra Rocha	aux	1141899327	Alejandra Rocha
8	[illegible]	salvador	1121972300	
9	Donzalo	Salvador	6343956	
10	[illegible]	Sup	1141978772	
11	Victor M Grelado	Aux	112836665	Victor Grelado
12	Benedicto Ramirez	Aux	1822287	Benedicto
13	Dirección de Gestión	AYT	79237148	
14	Jhonatan García	Aux	1121962263	
15	Carlos A Caicedo Castaño	Aux Rec	1121899675	

OBSERVACIONES

4931

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 05-07-23 Hora de Inicio: 6:49 Hora de Finalización: 7:10 Lugar: CDIKA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: TRABAJAR CORRECTAMENTE

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Juan Pablo Gonzalez	Soldador	6343956	
2	Cristian Jacin	Sup	1124676772	
3	Andres Rivera	Soldador	1121872300	
4	Jonathan cordero	Soldador	6485253	
5	Victor Giraldo	Aux	1121836666	
6	Jonathan cordero	Soldador	64	
7	Juan Raul Rojas	Aux	1006815708	
8	Alejandra Rocha	apt	1121899127	
9	Jefferson Penilla	Aux	1121 [illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	1077.88.7	
11	Jhonatan Jaramc	Aux	1121 [illegible] 74	
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4932

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 05-07-23 Hora de Inicio: 6:49 Hora de Finalización: 7:10 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: TRABAJAR CORRECTAMENTE

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Carlos A Humaca Acevedo	Ing RAD	1127413858	
2	Jesus Fabian Cardenas Tornal	Ayudante	1121434546	
3	ALBERTO HERNANDEZ León	TOPOGRAFO	17423294	
4	Jeison Vizcaino	ayudante	1.121.812.037	
5	Alexander Pardo B	Cadenero	86867518	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 06-07-23 Hora de Inicio: 6:55 Hora de Finalización: 7:10 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: LA DEPRESION

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jesus Cardenas Hernandez	Ayudante	1124934567	Jesus Cardenas
2	Alexander Pardo B	Cadenero	80067518	
3	Yeferson Jacome	Sup	1121672772	
4	ANDRES RICELES	Soldador	1128723000	
5	Juan David Rojas	Aux	1006825108	Juan David Rojas
6	Jonathan cordero	Soldador	6485253	
7	Benedicto Ramirez	Arg	18221227	
8	Jhonatan Jacome	aux	1124307114	
9	Alv Gonzalez	Soldador	6345866	
10	Yelvin Arrieta	Aux	1121114354	
11	Victor M. Giraldo	Aux	1.121836.660	
12	Alejandra Rocha	aux	1121899367	
13	Thesly Contreras Peña	Ambiental	1122815243	
14	ALBERTO HDEZ LEON	TOPOGRAFO	17423294	
15	Noticia Garcia	SUP	1006719817	

OBSERVACIONES

4934

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 06-07-23 Hora de Inicio: 6:55 Hora de Finalización: 7:18 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: LA DEPRESION

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jairo Vizcaino		1.121.817.035	
2	Jhonatan Garcia	Aux	1121962263	
3	Luis Orlando Gonzalez	Ad.	79237148	
4	Javier Monroy	Operador	1053613777	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4935

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 06/09/2023 Hora de Inicio: 7:30Am Hora de Finalización: 10:00Am Lugar: Velódromo

Actividad: Capacitación [X] Otro [X] ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Entrenamiento [ ]

Tema: Capacitación previo al inicio de Actividad de desmonte de estructura.

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	ANDRES RIVEROS	soldador	1121877300	
2	Alan Gonzalez	Soldador	C.C 1143978	
3	Jonathan cardozo	Soldador	6485253	
4	Alejandra Rocha	Aux	1121699327	Alejandra Rocha
5	Jonatan Jaramillo	Aux	1121930714	
6	Benedicto Ramirez	Aux	1192121227	
7	Victor H. Giraldo	Aux	1121836660	Victor H. Giraldo
8	Yeferson Peñaloza	Aux	1121 [illegible] 369	
9	Cristian Jaramillo	Sup	1121878772	
10	Natalia García	Sup	1006719847	
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 07-07-23 Hora de Inicio: 7:00AM Hora de Finalización: 3:20AM Lugar: Escenarios Dep

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: TRABAJAR CORRECTAMENTE ASCENSO CON ESCALERA

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Cardenas Hernandez	Ayudante	1121934592	Jeison Cardenas
2	Juis orlando Gonzalez	Ayd T.	79237148	
3	Pedro pablo	ayudan	74323740	
4	Jhonatan Garcia	Ayudante	1121962263	
5	ANDRES RUEDOS	Soldador	1128722300	
6	AL gonzalo	Soldador	6343756	
7	Kevin Pinilla	Aux	1121 209 364	
8	Jonathan cordero	Soldador	6485253	Jonathan
9	Therly Contreras Pena	Ambiental	1128154413	Therly CP
10	Benedicto Ramirez	Ay	18991827	Benedicto
11	Victor M. Gualdo	Aux	1121836660	Victor Gualdo
12	Jhonatan Arcos	aux	1121930714	
13	Jeison vizcaino		1121812035	
14	Alexander Pardo B	Cadenero	86067518	
15	Alberto Hernandez Leon	Topografo		

OBSERVACIONES

4937

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 07-07-23 Hora de Inicio: 7:00Am Hora de Finalización: 7:20Am Lugar: ESCENARIOS DEP

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: TRABAJAR CORRECTAMENTE ASCENSO CON ESCALERA RVA

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Carlos A Calcedo Castaño	Ayud Ops	1127894675	
2	Carlos A. Amaya Ariza	Ing Ops	1124138952	
3	Natalia García	SST	1006798847	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4938

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 03-07-2023 Hora de Inicio: 7:00 AM Hora de Finalización: 7:15 AM Lugar: Exteriores DLT

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Habitos de trabajo

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Cardenas Hernandez	Auxiliar	1121915564	Jeison Cardenas
2	Luis Carlos de Gonzalez	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Pedro Pablo Cadena Tarazona	[illegible]	1.123.[illegible]	[illegible]
4	Jhonatan Steven Garcia	Ayudante	1121962263	[illegible]
5	Jeiller Vizcaino	[illegible]	1.121.812.[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Oscar David Reyes Gaitan	Aux	1004[illegible]	[illegible]
9	Jonathan Cardozo	Soldador	6405253	Jonathan
10	Benedicto Ramirez	Rig	1822127	[illegible]
11	ANDRES RIVEROS	SOLDADOR	1094[illegible]	[illegible]
12	Victor M Cuadro	Aux	[illegible]	[illegible]
13	Gloria Peñaloza	Aux	1121 211 369	[illegible]
14	Alejandra Rocha	Aux	1121[illegible]	[illegible]
15	Shangtao Jacome	Aux	1121932[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

4939

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 08-07-2023 Hora de Inicio: 7:00AM Hora de Finalización: 7:15AM Lugar: ESCENARIOS LAS

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Habitos de trabajo

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Alejandro Rodriguez	Aparejador	1236238399	
2	Carlos Alberto Humoca	Ingeles	1121913857	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4940

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 10-07-2023 Hora de Inicio: 7:00am Hora de Finalización: 3:25 Lugar: Escenarios Dep.

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: EL FUEGO NOS PUEDE QUITAR LA VIDA EN EL TRABAJO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Cadenas Hernandez	Ayudante	1121934152	Jeison Cadenas
2	Jhonatan Steven Francia	Ayudante	1121962263	Jhonatan Francia
3	Luis orlando Gonzalez	Ayudt.	79237111	
4	Carlos A Caicedo C	Ayudante	1127894675	
5	Therly Contreras Peña	Ambiental	1122815443	Therly CP
6	Victor M. Cuadro	Aux	1121836660	Victor Cuadro
7	Jhon [illegible] Gonzalez	Soldador	6343956	
8	Jhonatan Jaramillo	Aux	1121930714	
9	Marlon Peñaloza	Aux	1121219369	
10	Benedicto Ramirez	Aux	18221227	
11	Jonathan Cardozo	Soldador	6485253	
12	Natalia Garcia	Sup	1006719847	
13	[illegible]	Soldador	1121832000	
14	Yeisson Arias	Ayudante	1121855015	
15	Javier Monroy	Operador	1053813722	

OBSERVACIONES

2141

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 10-07-2023 Hora de Inicio: 7:00Am Hora de Finalización: _ Lugar: Escenarios Dep.

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: El Fuego nos Puede Quitar la Vida en el trabajo

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Andrés Alvarez	Ing Res	1121913857	
2	Jairon Vizcaino		1.121.912.035	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 11-07-23 Hora de Inicio: 6:55 Hora de Finalización: 7:25 Lugar: ESCENARIOS DEP.

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Uso Adecuado del Casco

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Cardenas Hernandez	Ayudante	1121934582	Jeison Cardenas
2	Jhonatan Stiven Garcia	Ayudante	1121962263	Jhonatan Garcia
3	Luis orlando Gonzalez	AyDMT	79137148	
4	Yeisson Andres Amaya	AY	1121835 013	
5	Juan Pablo Reyes	AUX	1006835748	Juan Reyes
6	Benedicto Ramirez	AY	18221227	
7	Yeison perdomo	AUX	1121 214 364	Yeison
8	Alan Gonzalez	Soldador	63439756	
9	Jonathan cordero	Soldador	6485253	Jonathan
10	ANDRES RUEDOS	Soldador	1018783300	
11	Victor Giraldo	AUX	1121836666	Victor Giraldo
12	Pedro Pablo	AUX	71323	
13	Jhonatan Jacome	AUX	1121930714	
14	Natalia Garcia	SST	1020	
15	Thaly Cortes Pena	Practicante	1122815443	

OBSERVACIONES

4943

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 11-07-2023 Hora de Inicio: 6:55 Hora de Finalización: 7:25 Lugar: ESCENARIO DEPORTIVOS

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Uso Adecuado del Casco

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Catherine Jacque Saumia			
2	Jeison Vizcaino		1121872035	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 12-07-2023 Hora de Inicio: 6:55 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: ESCENARIOS DEP.

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Uso Adecuado de gafas de Protección

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Cardenas L.	Ayudante	1121934582	Jeison Cardenas
2	Thomas Stiven Lopez	Ayudante	1121962263	Thomas Stiven Lopez
3	Yeosson Andrey Arias	Ayudante	1121825015	
4	Juan Orlando Gonzalez	AUX	70130118	
5	Pedro Perez	AUX	72193269	
6	Jeison viccaino		1.121.812035	
7	Thirly Cordoba Peña	Ambiental	1122815443	Thirly CP
8	Juan David Rojas	Ayudante	1006825708	Juan David Rojas
9	Victor H. Cuadro	AUX	1.121836666	Victor H Cuadro
10	Jeferson Penaloza	AUX	1121219369	
11	Benedicto Ramirez	AUX	1822727	Benedicto
12	Thomas Salome	AUX	1121930714	
13	Alan Gonzalez	Soldador	6345256	
14	ANDRES RIVEROS	Soldador	1121872300	
15	Alejandro Rodriguez.	Aparejador	1236238899	

OBSERVACIONES

4945

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 12-01-2023 Hora de Inicio: 6:55 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: ESCENARIOS DEP

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Uso Adecuado de EPPs de Seguridad

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jonathan cabarca	Soldador	6485253	Jonathan
2	Natalia García	Sup	1006719947	
3	Carlos Andres Caicedo C	Ayu Res	1122840675	
4	Carlos Alberto Herrera A.	Ing Res	1124913857	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4946

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 13-07-23 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 9:15 Lugar: ESCENARIO DEP.

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: LAS LLAVES Y LAS LESIONES

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Cardenas Hernandez	Ayudante	1121934582	Jeison Cardenas
2	Cristian Jacome	Sup	1121818772	Cristian Jacome
3	Victor Cadavid	Aux	[illegible]	[illegible]
4	Jhonatan Jacome	Aux	1121930714	[illegible]
5	Alvaro Gonzalez	Soldador	1121[illegible]	[illegible]
6	ANDRES RIVEROS	Soldador	1128[illegible]3CO	[illegible]
7	Bernardita Ramirez	Aux	1122[illegible]297	[illegible]
8	Wendy Peñaloza	Aux	[illegible]	[illegible]
9	Natalia Garcia	Sup	1006[illegible]847	[illegible]
10	Luis orlando Gonzalez	AyT	79237[illegible]48	[illegible]
11	Pedro Pablo Cardenas	Aux	1.139[illegible]	[illegible]
12	Yeyson Andres Agos [illegible]	[illegible]	1121835015	[illegible]
13	Jhonatan Steven Tascón	Ayudante	1121962763	Jhonatan Cadavid
14	ALBERTO HERNANDEZ LEÓ	TOPOGRAFO	[illegible]123294	[illegible]
15	Jeison Vizcaino	[illegible]	1.121[illegible].035	[illegible]

OBSERVACIONES

4947

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 13 - 07 - 23 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:45 Lugar: ESCENARIOS DCP

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: LAS LLAVES Y LAS LESIONES

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Therly Contreras Peña	1122815443	1122815443	Therly CP.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 14-07-2023 Hora de Inicio: 6:55 Hora de Finalización: 7:18 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Manejo de herramientas manuales

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Cardenas Fernandez	Ayudante	1122934582	Jeison Cardenas
2	Victor [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Juan David Rosero	AUX	1007275705	Juan David Rosero
4	Jhonatan Jacome	AUX	1193214	[illegible]
5	Benedicto Ramirez	[illegible]	17221222	Benedicto
6	Yeferson Peñaloza	AUX	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	ANDRES RIVEROS	Soldador	1122872300	[illegible]
9	Natalia Garcia	SSO	1007319617	Natalia
10	[illegible]	AUX	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	AUX	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	AUX	1121962263	[illegible]
13	Yeisson Andrey Agudelo Tovar	AUX	1121835015	[illegible]
14	Carlos Andres Carcamo C	AYUDANTE	1121899613	[illegible]
15	Jeison Vizcaino	[illegible]	1121812077	[illegible]

OBSERVACIONES

4949

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 14-07-2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: MANEJO DE HERRAMIENTAS

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

LASO

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 15-07-23 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:30 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: ROPA PROTECTORA

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Thesly Cantillo Peña	Res Ambiental	1122[illegible]	Thesly CP.
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Jeison Cadena Hernandez	Ayudante	1121934587	Jeison Cadena
4	Yeison Andres Arca	A y	1121835158	[illegible]
5	ALFONSO HERNANDEZ	cadenero	1741892	ALFONSO
6	Natalia Garcia	Supervisora	[illegible]	Ngarcia
7	Benedicto Ramirez	[illegible]	[illegible]	Benedicto
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Jonathan carrazco	Soldador	6485253[illegible]	Jonathan
10	Juan David Rojas	Soldador	[illegible]	Juan David Rojas
11	Juan Alex Gonzalez	Soldador	[illegible]	[illegible]
12	ANDRES RIVEROS	Soldador	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	AUX	[illegible]	[illegible]
14	Yeferson Jaramillo	Sup	[illegible]	[illegible]
15				

OBSERVACIONES

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 17-07-2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:18 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Los ojos Posesion Inestimable

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	AYUDANTE	53541[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	Ayudante	1.12[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	Sup	1121[illegible]	[illegible]
4	ANDRES RIVERO	[illegible]	1121[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	Soldador	63439[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	Soldador	6495253	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	1[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	Aux	1121[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	AUX	1121[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	AUX	1006[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	Ambiental.	1122[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	Ayudante	1121[illegible]	[illegible]
13	ALFONSO HERNANDEZ	cadenero	1F418[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	SSP	1[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	OP GRUA	79[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

4952

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 17-07-2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:18 Lugar: OCA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Los ojos Posesion inestimables

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Alejandro Rodriguez	Aparejador	1.236238391	
2	Yesson Arias Torres	A y	1127833015	
3	Luis Orlando Gonzalez	A y	79257711	
4	Jeison Cardenas Hernandez	Ayudante	1121934582	Jeison Cardenas
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4953

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 18-07-23 Hora de Inicio: 7:01 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: MANEJO DE PULIDORA

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Benedicto Ramirez	Hyg	18821287	Benedicto
2	Alexis Perdomo	Aux	1121 210 359	Alexis
3	Jonathan Jacome	Aux	1121930914	Jonathan
4	Juan David Rojas	Aux	7006925108	Juan David
5	ANDRES RIVERO	soldador	1121872300	
6	Victor M Galde	Ayudante	1121836666	Victor M Galde
7	Thirly Contreras Pena	Res Ambiental	1122815743	Thirly CP
8	Mauricio Rojas	AYUDANTE	5374170	
9	Natalia Garcia	Sup	1006219847	Natalia
10	Jonathan Cardoso	Soldador	6485253	Jonathan
11	Pedro Doncel	Soldador	6345782	
12	Cristian Jacome	Sup	1121878772	Cristian
13	ALFONSO HERNANDEZ	cadenero	1=41892	ALFONSO
14	Jesus Cardenas Hernandez	Ayudante	1121934582	Jesus Cardenas
15	Jhonatan Stiven Garcia	Ayudante	1121962263	Jhonatan Garcia
	ALBERTO HERNANDEZ	TOPOGRAFO	77432914	

OBSERVACIONES

4954

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 18-07-23 Hora de Inicio: 7:03 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: OGIA

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Entrenamiento ☐

Tema: MANEJO DE POLICORA

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Yesson Andrey Arias	A Y	1171825015	
2	Pedro Pabón Calentamiento	A Y	71323144	
3	ALBERTO HERNANDEZ León	Tolderero	1214232704	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 19-07-2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:25 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Entrenamiento ☐

Tema: INSPECCIONES

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Cardenas Hernandez	Ayudante	1121934589	Jeison Cardenas
2	Pedro Pablo Cadavid	Aux	1121937469	
3	Jhonatan Jhon Cano	Ayudante	1121962263	
4	Yeison Andrey Arboleda	A y	1121833015	
5	Benedicto Ramirez	Ayu	18221222	
6	Jeison Pendonza	Ayu	1121 214 369	
7	Jhonatan Jarome	Aux	1121980714	
8	Victor U Giraldo	Ayudante	1121836660	
9	Luis orlando Gonzalez	Ayud	7409791	
10	Pedro Gonzalez	Soldador	6345751	
11	ANDRES RIVERES	soldador	1121872000	
12	Jonathan cossaro	Soldador	6485253	
13	Yeferson Perez	Ayudante	5374170	
14	ALFONSO HERNANDEZ	cadenero	1741892	ALFONSO
15	Jefferson Pineda	op	1121883077	

OBSERVACIONES

4956

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 19-04-2023 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:25 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Entrenamiento ☐

Tema: INSPECCIONES

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Natalia Garcia	Supervisora	1006719847	
2	Juan David Rojas	AUX	1006827708	
3	Peterson Jacome	Sup	1124878772	
4	Miguel Castro	OPERA	7973981	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4957

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 21-07-23 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:19 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Entrenamiento ☐

Tema: CARGAS Y DESCARGAS CORRECTAS

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jonathan Cordero	Soldador	6485253	Jonathan
2	Jhoxtan Jacome	AUX	1121930214	
3	Benedicto Ramirez		15221227	Benedicto
4	[illegible] Moncada	Ent Todo	6343958	
5	ANDRES RUEDAS	Soldador	1121812300	
6	Juan Raul Pena	Soldador	1005825708	
7	Victor M. Gaviria	Ayudante	1.121.836.66	
8	ALFONSO HERNANDEZ	CARPINTERO	17418920	ALFONSO
9	[illegible] Jacome	SUP	1141878772	
10	Thirly Cabeza Tejada	Res Ambiental	1122815403	
11	Jesus Cardenas Hernandez	Auxiliar	1121934582	Jesus Cardenas
12	Pedro Pablo [illegible]	[illegible]	7732764	
13	Natalia Cervera	SUP	1006161814	
14	Yeisson Agudelo Tamayo	X X	1121835015	
15	Wisvelando Gonzalez	Aux	1042371118	

OBSERVACIONES

4958

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 21-07-23 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:19 Lugar: obra

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Cargas y descargas correctas

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	ALBERTO HERNANDEZ	TOPOGRAFO	1142320114	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4959

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 22-07-2023 Hora de Inicio: 7:05 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Actividades de Alto Riesgo

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeison Vizcaino	AYUDANTE	1 121 812 033	
2	Yeferson Rojas	AYUDANTE	532 4170	
3	Jaison Cardenas Hernandez	Ayudante	1121945816	Jaison Cardenas
4	Yeisson Arico Jaime	A y	1121835015	Yeisson Aric
5	Victor M Galdo	Ayudante	1121836626	Victor Galdo
6	Maria pinzon	Aux	1121 964 269	Maria
7	Benedicto Ramirez	Aux	1884287	Benedicto
8	Juan Orlando Gonzalez	Aux	1049347142	
9	Jhonatan Jacome	Aux	1-1191307144	
10	Jonathan cardozo	Soldador	1485253	Jonathan
11	Natalia García	Sup	1004211220	Natalia
12	alfonso HERNANDEZ	cadenero	1741892	alfonso
13	Thesly Contreras Pena	Res Ambiental	1122815443	Thesly CP
14				
15				

OBSERVACIONES

4960

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 24-07-23 Hora de Inicio: 6:50 Hora de Finalización: 7:18 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Cargas y descargas correctas

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Victor M Gold	Ayudante	1121 [illegible]	[illegible]
2	Yeisson Andres Arias	[illegible]	1121833015	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	72323 [illegible]	[illegible]
4	Jhonatan Stiven [illegible]	Ayudante	1121 [illegible]	[illegible]
5	Luis orlando Gonzalez	Ayudante	7493748	[illegible]
6	Jesus Cardenas Hernandez	Ayudante	1121 [illegible]	[illegible]
7	Jeison Vizcaino		1.121.812.075	[illegible]
8	Orlando Perez	Ayudante	5374170	[illegible]
9	Therly Contreras Pena	Res Ambiental	1122815443	Therly CP
10	alfonso HERNANDEZ	cadenero	1741820	alfonso
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4961

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 25-07-23 Hora de Inicio: 7:01 Hora de Finalización: 9:21 Lugar: OBRA

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Cargas suspendidas

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeisson vizcaino		1.121.917.035	
2	Jerson Cardenas Hernandez	Ayudante	1121934582	Jerson Cardenas
3	Yordano Ramos	5394170	1121836660	Yordano Ramos
4	Victor H. Giraldo	Ayudante	1121836660	Victor H. Giraldo
5	Jhonatan Stiven Garcia	Ayudante	1121962263	Jhonatan Garcia
6	Yersson Andrey Arias Tamayo	A x	1121835015	Yersson Arias
7	Luis orlando Gonzalez	Ayte	79137148	
8	Pedro Pablo calentura	Ayte	77323140	
9	Therly Contreras Peña	Res Ambiental	1122815443	Therly CP.
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4962

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 26-07-23 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 9:20 Lugar: ESCENARIOS

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Actividad lúdica

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeiver Cardenas Hernandez	Ayudante	1129345982	Jeiver Cardenas
2	Luis Orlando Quintero	N V	1002744	
3	Jhordan Stiven Zarcia	Ayudante	1121962263	
4	Pedro Pablo Calderon	Ayudante	7732374	
5	Victor M Giraldo	Ayudante	1121536665	Victor Giraldo
6	Jeiver vizcaino		1121612035	
7	[illegible]	5374170	[illegible]	
8	Thorly Contreras Peña	Res Ambiental	1122815443	Thorly CP
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4963

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 27-07-23 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: ESCENARIOS

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Entrenamiento ☐

Tema: Herramientas cortantes

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeilon vizcaino		1121812.075	
2	Ubaldo Ramos	Ayudante	5374170	
3	Victor Ubaldo	Ayudante	1118[illegible]	
4	Jason Cardenas Hernandez	Ayudante	1121954582	
5	Luis Gonzales	Ayudante		
6	Therly Contreras Peña	Res Ambiental	1122815443	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4964

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 28-07-23 Hora de Inicio: 7:07 Hora de Finalización: 7:28 Lugar: ESCENARIOS DEP.

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: SEGURIDAD CON MAQUINARIA EN OBRA - AUTOCUIDADO

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jaison Cardenas Hernandez	Ayudante	1192734328	Jaison Cardenas
2	Jaison Vizcaino		1.121.812.031	
3	[illegible]	Ayudante	53741.90	[illegible]
4	[illegible]	Ayudante	1019[illegible]	[illegible]
5	Camilo Bastardo	Operador	1019008320	
6	Thuly Contreras Pena	Ges Ambiental	1177515493	Thuly CP
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

Actu

4965

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 30/07/2023 Hora de Inicio: 6:55 Hora de Finalización: 7:20 Lugar: Escenarios

Actividad: Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Tema: Stips para resolver Conflictos

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Thirly Contreras Peña	Res Ambiental	1122815443	Thirly C.P.
2	Jeisson Vizcaino		1121612075	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	53748170	[illegible]
5	[illegible]	Res	1121943852	[illegible]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4966

ASISTENCIA

SST-F001-01 19/06/2023

Fecha: 31-07-23 Hora de Inicio: 7:00 Hora de Finalización: 9:30 Lugar: ESCENARIOS

Actividad: Capacitación ☐ Otro ☒ ¿Cuál? PREOPERACIONAL

Entrenamiento ☐

Tema: Reporte de Accidentes de trabajo

Nombre Facilitador: VERONICA CABARCA

Empresa: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Jeisson Lizcano	AYUDANTE	1.121.823.037	
2	Thely Cantera Peña	Res Ambiental	1122895443	Thely CP
3	Jesus Cardenas Hernandez	Ayudante	1121954572	Jesus Cardenas
4	Victor M Grateles	Ayudante	1.121.836.66[illegible]	V. de M. Grateles
5	YOVANI Pinto	AYUDANTE	5373470	YOVANI Pinto
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

4967

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PERMISOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia

4968

PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

F001-1 19/05/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: (dd-mm-aa)	29 de junio 2023	HORA INICIO DE TAREA:	7:00 a. m.
PERMISO DE TRABAJO VALIDO HASTA: (dd-mm-aa)	01 de julio 2023	HORA FIN DE TAREA:	17:00:00 p. m.
CONTRATISTA RESPONSABLE DEL TRABAJO	ORGANIZACIÓN SOES SAS		
PROCESO / ÁREA	AREA OPERATIVA		

NOMBRE Y PELLIDOS DE LOS EJECUTANTES DEL TRABAJO - FIRMA

N° arnés	Nombres y Apellidos	Firma del trabajador	N° arnés	Nombres y Apellidos	Firma del trabajador
1	Andres Rivaros		6	Juan David R	
2	Yeferson Jacome		7	Alejandro Rocha	
3	Alan Gonzalez		8		
4	Victor Arevalo		9		
5	Jonathan Cortes		10		

ESTADO DE SALUD	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Se le practicó y aprobó el examen médico ocupacional para trabajo en altura hace menos de un año?	✓		✓		✓				✓				✓								
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓								
Miedo a las alturas (acrofobia)?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓								
Está certificado en trabajo de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓								
Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas? Cuales?		✓		✓		✓		✓		✓											
Tiene la seguridad social al día (EPS, ALP, AFP)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓								

Comprobaciones previas al inicio del Trabajo (realizadas por el Responsable de la Tarea)	SI	NO	N/A	Observaciones
Colocar barandas de protección en aberturas de paredes y zonas de vacio a los niveles donde se realizará el trabajo			✓	
Colocar protecciones en las aberturas sobre el suelo	✓			
Delimitar la zona de trabajo y señalizarla (establecer un perímetro de segundad suficiente)	✓			
Se dispone de arnés de cuerpo entero	✓			
Eslinga de posicionamiento	✓			en Y
Línea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador	✓			
En caso de utilizar escaleras fijas, que éstas cumplan con las normas de seguridad			✓	
En caso de utilizar andamios, que éstos cumplan con las normas de seguridad			✓	
En caso de utilizar plataformas elevadoras, que éstas cumplan con las normas de seguridad			✓	
Equipos y herramientas revisados y en buen estado	✓			
Control o sistema caida de objetos (porta herramientas)	✓			
Los trabajadores tienen formación / información específica sobre los riesgos y medidas preventivas	✓			
Existe supervisión directa de los trabajos	✓			
Se han previsto medios de rescate, en caso de ser necesario	✓			
Otros (especificar):				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Marcar con una X, los necesarios)	Ojos	Cuerpo	Manos	Pies	Cabeza	Respitarorio	Auditivo	Obs.
	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Entrega AUX/HSE: Comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados, certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados

Firma:

Nombre: Yeferson Cabrera

CC: 1121907775

Recibe el responsable del área: Inspeccionada el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados, certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados

Firma: Yeferson Jacome

Nombre: Yeferson Jacome

CC: 1121878772

Es necesario renovar el permiso de trabajo SI [✓] NO [ ]

4969

LISTA DE CHEQUEO PARA TSA

F002-1 19/05/2023

Empresa:	Organizacion SOES	Ciudad:	Villavicencio
Area/Proceso:	Operativa	Fecha de realizacion del Trabajo:	29-Jun-2023
Lugar de Trabajo:	Villa olimpica	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:30 am
Ubicación donde se realiza el trabajo:	Cubierta escenarios	Hora de finalización (a.m./p.m.):	5:00 pm

Tipos de trabajos en alturas a realizar: Desmonte de cubierta de escenarios deportivos 6.

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 18 mts.

ANALISIS DE LA TAREA

ITEMS	DESCRIPCION	Si	No	N/A
	PLANEACION DE LA LABOR			
1	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.	X		
2	Se dispone de los elementos necesarios para trabajar en alturas.	X		
3	El personal esta certificado para desarrollar trabajos en altura.	X		
4	Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 1.2 metros de circuitos eléctricos energizados.			X
	AREA DE TRABAJO			
5	El área de ejecución de la labor se encuentra limpia, ordenada y es optima para	X		
6	Se señalizo y delimito el área de trabajo, teniendo en cuenta la zona de caída.	X		
	EPP Y VERIFICACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			
7	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	X		
8	Guantes	X		
9	Botas de seguridad	X		
10	Gafas de seguridad	X		
11	Protección auditiva			X
12	Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP y el sistema de protección contra caídas.	X		
13	Están todos los elementos de protección contra caídas en buen estado.	X		
14	Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		X	
	VERIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE Y CONECTORES			
14	El trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo.	X		
15	Existen puntos de anclajes seguros (Estructurales, autorizados)	X		
	PLAN DE RESCATE			
17	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área.	X		
18	En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua.	X		

ITEM	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	1121872300	Andres Rivero	
2	1140838772	Cristian Jacome	
3	1143795856	Alan Gonzalez	
4	1.121886666	Victor Giraldo	
5	1085253	Jonathan cardona	
6	1006975606	Juan David Rojas	
7	1121879327	Alejandra Rivera	

OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN AUTORIZA	CEDULA	FIRMA
Andres Rivera	1121887775	
EMISOR DEL PERMISO	**CEDULA**	**FIRMA**
Cristian Jacome	1140838772	

4970

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
F003 27/06/2023

FECHA DE INICIO	29-06-2023	FECHA FIN	01-07-2023	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
HORA	7:55AM	HORA	5:00PM	DESMONTE CUBIERTA	ORGANIZACIÓN SOES SAS

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
1. CASCO CON BARBUQUEJO	6. DOTACION
2. GUANTES	
3. BOTAS	
4. GAFAS LENTE CLARO	
5. GUANTES DE SEGURIDAD	
2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	
1. ESLINGA TIPO Y	6. ARNES CUERPO COMPLETO
2. CUERDAS	7 FRENO PARA LINEA DE VIDA
3. LINEA DE VIDA	
4. PULIDORA INHALAMBRICA	
5. TALADRO INHALAMBRICO	

3. DESCRIPCIÓN

N°	PASOS BÁSICO DE LA TAREA	FACTOR DE RIESGO	PELIGROS	CONSECUENCIA DERIVADA DE LA EXPOSICIÓN	MEDIDAS DE CONTROL
1	Limpieza y señalizacion del area de trabajo	sobreesfuerzo	peso excesivo	trastornos musculo esqueleticos y lesiones, como distensiones, calambres contracturas y desgarros	Respetar las cargas maximas según sexo y edad Proporcionar formación para la manipulación de cargas
2	Ingresar los trabajadores a la cubierta en la canasta del manlift o de manera manual por las columnas principales asegurandose paso a paso con la eslinga a la columna principal de la estructura de escenarios , hasta llegar al punto mas alto (Max 18.0 m) donde se encuentra ubicada la cubierta	Caida desde altura	El principal peligro asociado con subir por una columna es el riesgo de caídas desde altura. Desprendimiento o rotura de la eslinga Lesiones por golpes. Si hay objetos sueltos o salientes en la columna, existe el peligro de golpearse y sufrir lesiones al subir. Falta de seguridad en la estructura de soporte.	Puede causar heridas, fracturas (extremidades, columna, pelvis; caída sobre extremidades inferiores), graves lesiones de la cabeza y en órganos internos y en consecuencia insuficiencia respiratoria, pérdida de sangre y shock	Utilizar un arnés de seguridad y asegurarse de que esté correctamente ajustado y conectado a un punto de anclaje seguro. Inspeccionar la eslinga antes de usarla para asegurarse de que esté en buenas condiciones y cumpla con los estándares de seguridad. Verificar que la estructura de soporte este sólida y estable antes de asegurar la eslinga. Los trabajadores que suban por la columna deben recibir capacitación sobre los procedimientos seguros de acceso y las medidas de control necesarias.
3	Instalar tres lineas de vida a la estructura principal de la cubierta de escenarios.La primera, segunda y tercera línea de vida se fija de punto a punto con una medida de 27.55 amarrada con un mosquetón a la estructura principal y en el otro punto con un nudo. La primera línea se va a utilizar como punto de anclaje para realizar descenso de teja hunter Douglas desmontada. La segunda y tercera línea de vida se utilizarán para hacer senos con otra línea de vida para el desplazamiento del personal en cubierta	Trabajo en altura	Caída desde altura debido a un mal equilibrio, resbalones o falta de protección. Lesiones por mal uso de los equipos a utilizar	Puede causar heridas, fracturas (extremidades, columna, pelvis; caída sobre extremidades inferiores), graves lesiones de la cabeza y en órganos internos y en consecuencia insuficiencia respiratoria, pérdida de sangre y shock Inflamación y dolor en los músculos, tendones y nervios golpes, heridas	Utilizar equipos de protección personal, como casco, arnés de seguridad y calzado antideslizante. Establecer zonas de exclusión debajo de la zona de trabajo para evitar que personas no autorizadas se acerquen. Asegurarse de que el área esté despejada de objetos sueltos que puedan caer y causar lesiones. Capacitarse en el uso adecuado de equipos inalámbricos y seguir las instrucciones del fabricante. Mantener una comunicación clara y constante con el operador de la base o con otros trabajadores presentes en el área.
4	Se trasladarán por la linea de vida e iran desengrapando la teja hunter Douglas con una palanca y desatornillando con taladro inalámbrico la primera teja y una vez desengrapadas, se realizan cortes con pulidora en la teja aproximadamente cada 14 metros para facilitar manejo y se dejan a un costado. Se retira manualmente el poliuretano que se encuentra en medio de la teja y se desplazan con el material hasta el punto de la linea de vida uno. Luego proceden a retirar la ultima teja del mismo modo que la primera haciendo un acopio por modulo a un costado, para luego llevarlas al punto de la linea de vida uno	Manipulación de materiales y trabajo en equipo	Lesiones por levantamiento y manipulación incorrecta de materiales pesados. Golpes o impactos debido a la caída de objetos o escombros durante el proceso de bajada de la fachada. Atrapamiento o aplastamiento al manipular los componentes de la fachada. Lesiones musculoesqueléticas debido a posturas incómodas o movimientos repetitivos.	Lesiones en la espalda, músculos o articulaciones debido a una manipulación inadecuada de los materiales. Lesiones por golpes o impactos de objetos que caen. Fatiga muscular o lesiones musculoesqueléticas debido a posturas y movimientos incorrectos.	Inspeccionar y asegurar la estabilidad de la cubierta antes de comenzar el desmonte.Asegurar que la línea de vida esté correctamente anclada a una estructura resistente y diseñada para soportar cargas de caída.Establecer una comunicación clara y efectiva entre los trabajadores involucrados para coordinar las actividades y advertir sobre posibles peligros.

5	Para el descenso del material se atan dos tejas en tres puntos y se desciende lentamente a piso, para el poliuretano se atan diez laminas en un punto medio y se desciende lentamente a piso.	Manipulacion de cargas	Levantar y transportar tejas puede provocar tensiones y lesiones en la espalda, los brazos y otras partes del cuerpo. Existe el riesgo de que las tejas caigan desde altura durante el descenso o el transporte, lo que puede causar lesiones a los trabajadores o daños a la propiedad.	La manipulación incorrecta de las tejas puede provocar lesiones en la espalda, los hombros, los brazos y otras partes del cuerpo. Si las tejas caen desde altura, pueden causar lesiones graves a los trabajadores o dañar equipos, vehículos u otras estructuras cercanas.	Capacitar a los trabajadores en técnicas adecuadas de levantamiento y manipulación de cargas. Utilizar equipos de protección personal, como guantes de trabajo, calzado de seguridad y casco. Establecer una zona de exclusión alrededor de la zona de trabajo para proteger a otras personas de posibles caídas de objetos. Realizar una evaluación previa de la estructura de soporte para garantizar su estabilidad durante el proceso de bajada. Planificar y coordinar el trabajo en equipo de manera eficiente y comunicarse claramente entre los miembros del equipo. Utilizar técnicas de descenso controlado para evitar movimientos bruscos y caídas de materiales. Establecer un sistema de señalización o comunicación para advertir a otros trabajadores y mantener la seguridad durante el proceso. Realizar pausas regulares y rotar tareas para evitar la fatiga y reducir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Antes de comenzar el trabajo, inspeccionar las tejas para asegurarse de que estén en buenas condiciones y no presenten defectos que puedan aumentar el riesgo de caídas o lesiones.
	Ya en piso el material es llevado a punto de acopio en la zona dispuesta por la obra. Terminada la jornada laboral desciende el personal ya sea por manlift o de manera manual por columna principal anclados con la eslinga en y. Una vez en piso se retiran y se verifican el estado de quipos herramientas y maquinaria.	Descenso del personal al terminar la jornada laboral	Caída desde altura durante el descenso en manlift. Caída desde altura durante el descenso manual por la columna principal anclados con la eslinga en Y.	Lesiones graves o fatales debido a caídas desde altura.	Realizar una evaluación de riesgos y establecer procedimientos seguros para el descenso del personal al finalizar la jornada laboral. Proporcionar y utilizar equipos de protección personal adecuados, como arneses de seguridad, eslingas y cascos. Capacitar al personal sobre los procedimientos seguros para el descenso y asegurarse de que estén familiarizados con el uso correcto de los equipos de protección personal. Inspeccionar regularmente los equipos de descenso, como manlifts y eslingas, para asegurarse de que estén en buen estado de funcionamiento. Implementar sistemas de supervisión y control para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de descenso seguros. Realizar seguimiento y revisión periódica de los controles implementados para garantizar su eficacia y realizar mejoras continuas.

4. PERSONAL PARTICIPANTE

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	ANDRES RUEDAS	1128872300	
2	Cristian Jacome	1121878772	Cristian Jacome
3	Alex Gonzalez	C343956	
4	Victor H. Giraldo	1.121.836.660	Victor Giraldo
5	Jonathan cordero	8485253	Jonathan
6	Juan David Reyes	1006823108	Juan David R
7	Alejandra Rocha	1121849317	Alejandra Rocha
8			

Veronica Parra — Inspector SST

Cristian Jacome — Ing. Residente

4972

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta. Colombia
