E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**									
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	112,50	$ 3.850,00	$ 433.125	-	- 0,50	-$ 1.925	112,00	$ 431.200
1,2	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	119,55	$ 18.600,00	$ 2.223.630	-	- 0,73	-$ 13.578	118,82	$ 2.210.052
1,3	DESMONTE DE SANITARIO	und	2,00	$ 55.000,00	$ 110.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 110.000
1,4	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	112,50	$ 8.000,00	$ 900.000	-	- 0,50	-$ 4.000	112,00	$ 896.000
1,5	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	132,30	$ 8.500,00	$ 1.124.550	+	10,70	$ 90.950	143,00	$ 1.215.500
2	**OBRAS DE URBANISMO**									
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	38,47	$ 79.800,00	$ 3.069.906	-	- 1,25	-$ 99.750	37,22	$ 2.970.156
3	**OBRAS EN CUBIERTA**									
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	129,62	$ 97.500,00	$ 12.638.243	+	5,99	$ 584.220	135,62	$ 13.222.463
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	129,62	$ 1.800,00	$ 233.316	+	6,00	$ 10.791	135,62	$ 244.107
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	14,62	$ 92.800,00	$ 1.356.736	-	- 0,12	-$ 11.136	14,50	$ 1.345.600

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	155,80	$ 60.000,00	$ 9.348.000	-	- 22,60	-$ 1.356.000	133,20	$ 7.992.000
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**									
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	70,68	$ 39.500,00	$ 2.791.860	+	13,67	$ 540.056	84,35	$ 3.331.916
4,2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	14,00	$ 9.500,00	$ 133.000	-	- 5,79	-$ 55.005	8,21	$ 77.995
4,3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	259,00	$ 33.200,00	$ 8.598.800	-	- 56,16	-$ 1.864.602	202,84	$ 6.734.198
4,4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	78,90	$ 37.000,00	$ 2.919.300	+	35,06	$ 1.297.324	113,96	$ 4.216.624
4,5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	57,60	$ 37.000,00	$ 2.131.200	-	- 1,56	-$ 57.639	56,04	$ 2.073.561
5	**PISOS Y CIELO RASO**									
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	104,04	$ 52.300,00	$ 5.441.292	-	- 7,54	-$ 394.342	96,50	$ 5.046.950

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	101,70	$ 173.000,00	$ 17.594.100	-	- 11,07	-$ 1.915.110	90,63	$ 15.678.990
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	100,88	$ 85.000,00	$ 8.574.800	-	- 0,09	-$ 7.650	100,79	$ 8.567.150
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	97,66	$ 83.000,00	$ 8.105.780	+	5,93	$ 492.190	103,59	$ 8.597.970
6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**						-	$ 0		$ 0
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	25,70	$ 80.500,00	$ 2.068.850	-	- 2,16	-$ 173.558	23,54	$ 1.895.292
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	4,90	$ 80.500,00	$ 394.450	-	- 0,08	-$ 6.424	4,82	$ 388.026
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1,00	$ 345.000,00	$ 345.000	=	0,00	$ 0	1,00	$ 345.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 450.000,00	$ 900.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 900.000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 280.000,00	$ 560.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 560.000
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 70.000
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 70.000
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**									
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000	=	0,00	$ 0	1,00	$ 85.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	5,08	$ 62.000,00	$ 314.960	+	0,50	$ 31.149	5,58	$ 346.109
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	2,00	$ 345.000,00	$ 690.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 690.000
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**									
8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000	-	- 1,00	-$ 450.000	0,00	$ 0
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	1,00	$ 55.000,00	$ 55.000	-	- 1,00	-$ 55.000	0,00	$ 0
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	15,00	$ 145.000,00	$ 2.175.000	-	- 1,00	-$ 145.000	14,00	$ 2.030.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	16,00	$ 105.000,00	$ 1.680.000	-	- 1,00	-$ 105.000	15,00	$ 1.575.000
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	15,00	$ 105.000,00	$ 1.575.000	-	- 1,00	-$ 105.000	14,00	$ 1.470.000
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**									
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	31,20	$ 92.500,00	$ 2.886.000	-	- 2,20	-$ 203.500	29,00	$ 2.682.500
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	12,60	$ 8.500,00	$ 107.100	+	22,80	$ 193.800	35,40	$ 300.900
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	6,00	$ 1.250,00	$ 7.500	+	9,00	$ 11.250	15,00	$ 18.750
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	2,00	$ 52.600,00	$ 105.200	=	0,00	$ 0	2,00	$ 105.200

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	2,00	$ 52.600,00	$ 105.200	=	0,00	$ 0	2,00	$ 105.200
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1,00	$ 52.600,00	$ 52.600	=	0,00	$ 0	1,00	$ 52.600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	2,00	$ 62.400,00	$ 124.800	=	0,00	$ 0	2,00	$ 124.800
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	2,00	$ 56.200,00	$ 112.400	=	0,00	$ 0	2,00	$ 112.400
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1,00	$ 77.364,50	$ 77.365	=	0,00	$ 0	1,00	$ 77.365
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	4,00	$ 19.000,00	$ 76.000	+	3,00	$ 57.000	7,00	$ 133.000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	3,00	$ 15.000,00	$ 45.000	+	5,00	$ 75.000	8,00	$ 120.000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	12,00	$ 24.000,00	$ 288.000	+	18,80	$ 451.200	30,80	$ 739.200
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	4,00	$ 17.000,00	$ 68.000	+	2,00	$ 34.000	6,00	$ 102.000
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2,00	$ 180.000,00	$ 360.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 360.000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	3,00	$ 45.600,00	$ 136.800	-	- 1,00	-$ 45.600	2,00	$ 91.200

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000	=	0,00	$ 0	1,00	$ 1.700.000
10	**ASEO GENERAL**									
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	112,50	$ 4.500,00	$ 506.250	+	43,21	$ 194.467	155,71	$ 700.717
TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES INICIALES				**TOTAL**	**$ 105.919.112**	**COSTOS DIRECTOS PRESENTE ACTA**				**$ 102.912.690**

	ADMINISTRACION		**19,00%**		**$ 20.124.631**					**$ 19.553.411**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 1.059.191**					**$ 1.029.127**
	UTILIDADES		**5,00%**		**$ 5.295.956**					**$ 5.145.634**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 132.398.890**					**$ 128.640.862**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	128.640.862
VALOR CONDICIONES ACTUALES	128.640.862
DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DEL CONTRATO Y VALORES A EJECUTAR	0

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	128.640.862

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL

En San Agustín Huila, a los 11 días del mes de junio del 2024, se reunieron la Ing. YUDI TATIANA HERNANDEZ como interventora del contrato, el señor OLMEDO BRAVO NAVIA, como supervisor del contrato y el Arq. WILSON UNI COLLAZOS, Contratista de obra, el Ing EDWIN JIMENEZ HURTADO como apoyo a la supervision con el fin de suscribir la presente acta de mayores y menores cantidades teniendo en cuenta las siguientes modificaciones.

Descripcion de las modificaciones mas relevantes:

1. disminuyo el item de correas ya que se modifico la cubierta para realizarla como una sola con lo cual disminuyo teja y estructura
2. Aumento pintura exterior ya que se pañeto toda la parte ´posterior de la edificacion igualmete se pinto y estuco
3. no se realizo el cambio de caja de contador ni breakers, ya que se encontraron en buen estado
4. Aumento el aseo general ya que es necesario dejar limpia toda la propiedad como se recibio

YUDI TATIANA HERNANDEZ
Interventora

WILSON UNI COLLAZOS
Contratista

OLMEDO BRAVO NAVIA
Supervisor

Ing EDWIN JIMENEZ HURTADO
Apoyo a la supervision

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	112,00	$ 3.850,00	$ 431.200	112,00	$ 431.200	112,00	$ 431.200
1,2	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	118,82	$ 18.600,00	$ 2.210.052	118,82	$ 2.210.052	118,82	$ 2.210.052
1,3	DESMONTE DE SANITARIO	und	2,00	$ 55.000,00	$ 110.000	2,00	$ 110.000	2,00	$ 110.000
1,4	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	112,00	$ 8.000,00	$ 896.000	112,00	$ 896.000	112,00	$ 896.000
1,5	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	143,00	$ 8.500,00	$ 1.215.500	143,00	$ 1.215.500	143,00	$ 1.215.500
2	**OBRAS DE URBANISMO**								
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	37,22	$ 79.800,00	$ 2.970.156	37,22	$ 2.970.156	37,22	$ 2.970.156
3	**OBRAS EN CUBIERTA**								
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	135,62	$ 97.500,00	$ 13.222.463	135,62	$ 13.222.463	135,62	$ 13.222.463
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	135,62	$ 1.800,00	$ 244.107	135,62	$ 244.107	135,62	$ 244.107
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	14,50	$ 92.800,00	$ 1.345.600	14,50	$ 1.345.600	14,50	$ 1.345.600

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	133,20	$ 60.000,00	$ 7.992.000	133,20	$ 7.992.000	133,20	$ 7.992.000
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**								
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	84,35	$ 39.500,00	$ 3.331.916	84,35	$ 3.331.916	84,35	$ 3.331.916
4,2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	8,21	$ 9.500,00	$ 77.995	8,21	$ 77.995	8,21	$ 77.995
4,3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	202,84	$ 33.200,00	$ 6.734.198	202,84	$ 6.734.198	202,84	$ 6.734.198
4,4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	113,96	$ 37.000,00	$ 4.216.624	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	56,04	$ 37.000,00	$ 2.073.561	56,04	$ 2.073.561	56,04	$ 2.073.561
5	**PISOS Y CIELO RASO**								
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	96,50	$ 52.300,00	$ 5.046.950	96,50	$ 5.046.950	96,50	$ 5.046.950

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSÍ AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	90,63	$ 173.000,00	$ 15.678.990	90,63	$ 15.678.990	90,63	$ 15.678.990
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	100,79	$ 85.000,00	$ 8.567.150	100,79	$ 8.567.150	100,79	$ 8.567.150
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	103,59	$ 83.000,00	$ 8.597.970	103,59	$ 8.597.970	103,59	$ 8.597.970
6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**							-	
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	23,54	$ 80.500,00	$ 1.895.292	23,54	$ 1.895.292	23,54	$ 1.895.292
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	4,82	$ 80.500,00	$ 388.026	4,82	$ 388.026	4,82	$ 388.026
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1,00	$ 345.000,00	$ 345.000	1,00	$ 345.000	1,00	$ 345.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 450.000,00	$ 900.000	2,00	$ 900.000	2,00	$ 900.000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 280.000,00	$ 560.000	2,00	$ 560.000	2,00	$ 560.000
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**								
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000	0,00	0,00	0,00	0,00

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	5,58	$ 62.000,00	$ 346.109	0,00	0,00	0,00	0,00
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	2,00	$ 345.000,00	$ 690.000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**						0,00	0,00	
8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	und	0,00	$ 450.000,00	$ 0	0,00	0,00	0,00	0,00
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	0,00	$ 55.000,00	$ 0	0,00	0,00	0,00	0,00
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	14,00	$ 145.000,00	$ 2.030.000	14,00	$ 2.030.000	14,00	$ 2.030.000
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	15,00	$ 105.000,00	$ 1.575.000	15,00	$ 1.575.000	15,00	$ 1.575.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	14,00	$ 105.000,00	$ 1.470.000	14,00	$ 1.470.000	14,00	$ 1.470.000
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**								
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	29,00	$ 92.500,00	$ 2.682.500	29,00	$ 2.682.500	29,00	$ 2.682.500
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	35,40	$ 8.500,00	$ 300.900	35,40	$ 300.900	35,40	$ 300.900
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	15,00	$ 1.250,00	$ 18.750	15,00	$ 18.750	15,00	$ 18.750
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	2,00	$ 52.600,00	$ 105.200	2,00	$ 105.200	2,00	$ 105.200
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	2,00	$ 52.600,00	$ 105.200	2,00	$ 105.200	2,00	$ 105.200
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1,00	$ 52.600,00	$ 52.600	1,00	$ 52.600	1,00	$ 52.600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	2,00	$ 62.400,00	$ 124.800	2,00	$ 124.800	2,00	$ 124.800
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	2,00	$ 56.200,00	$ 112.400	2,00	$ 112.400	2,00	$ 112.400
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1,00	$ 77.364,50	$ 77.365	1,00	$ 77.365	1,00	$ 77.365

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	7,00	$ 19.000,00	$ 133.000	7,00	$ 133.000	7,00	$ 133.000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	8,00	$ 15.000,00	$ 120.000	8,00	$ 120.000	8,00	$ 120.000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	30,80	$ 24.000,00	$ 739.200	30,80	$ 739.200	30,80	$ 739.200
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	6,00	$ 17.000,00	$ 102.000	6,00	$ 102.000	6,00	$ 102.000
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2,00	$ 180.000,00	$ 360.000	2,00	$ 360.000	2,00	$ 360.000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2,00	$ 45.600,00	$ 91.200	2,00	$ 91.200	2,00	$ 91.200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000
10	**ASEO GENERAL**								
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	155,71	$ 4.500,00	$ 700.717	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 02				**$ 102.912.690**		**$ 96.734.241**		**$ 96.734.241**
	ADMINISTRACION		**19,00%**		**$ 19.553.411**		**$ 18.379.506**		**$ 18.379.506**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 1.029.127**		**$ 0**		**$ 0**

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	UTILIDADES		5,00%		$ 5.145.634		$ 4.836.712		$ 4.836.712
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				$ 128.640.862		$ 119.950.458		$ 119.950.458

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	128.640.862
VALOR EJECUTADO	119.950.458
VALOR A EJECUTAR	8.690.404
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO	64.320.431
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	55.630.027

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	119.950.458

En San Agustín Huila, a los 12 dias del mes de agosto de 2024, se reunieron la Ing. YUDI TATIANA HERNANDEZ, Interventora del proyecto, el Sr OLMEDO BRAVO NAVIA, supervisor del contrato, el Arq. WILSON UNI COLLAZOS, Contratista de obra, el Ing. EDWIN JIMENEZ HURTADO, como apoyo a la supervision del contrato y el Ing ROBERTO ÑAÑEZ, como supervisor del contrato, con el fin de suscribir la presente acta de entrega parcial de obra

El valor de la presente acta es de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 119,950,458).

Valor amortizacion del anticipo SESENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($64,320,431,oo)

Valor a cobrar presente acta CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 55,950,458,oo)

Dada en el municipio de San Agustin Huila a los 12 dias del mes de agosto de 2024

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL

Ing YUDI TATIANA HERNANDEZ
Interventora

WILSON UNI COLLAZOS
Contratista

OLMEDO BRAVO NAVIA
Supervisor

Ing EDWIN JIMENEZ HURTADO
Apoyo a la supervision


Ing. ROBERTO ~~ROBERTO~~ ÑAÑEZ
Apoyo a la supervision

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024			
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS				**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024			
CAPITULO	1. PRELIMINARES	**ITEM**	1,1	**DESCRIPCION**	LOCALIZACION Y REPLANTEO	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		

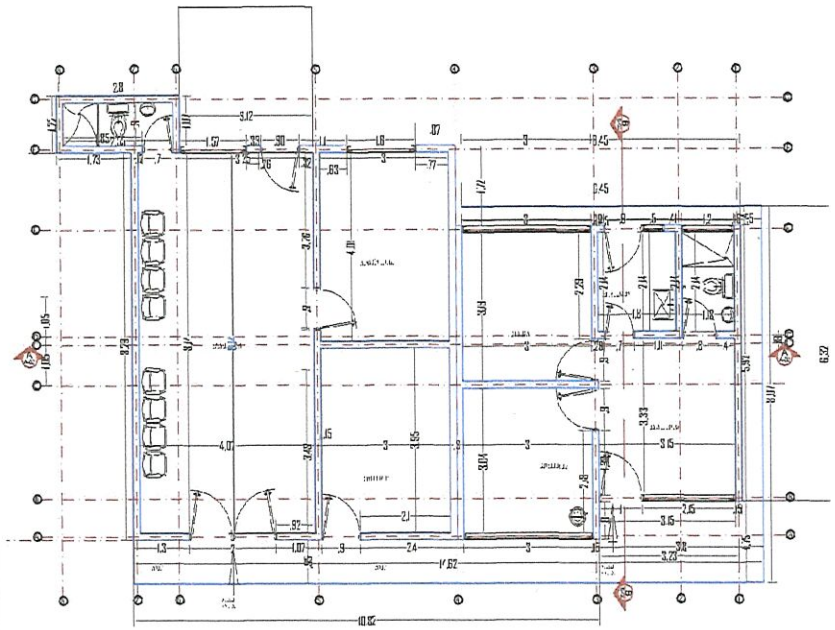

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJE A Y F Y EJES 1 Y 6	14	8			112,00	

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	112,00	112,00
VIENEN		
TOTAL	112	

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana N.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	1. PRELIMINARES		**ITEM**	1,2	**DESCRIPCION**	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE A ENTRE EJES 3 Y 7	0,95	10,82			**10,28**	ANDEN
EJE A ENTRE EJES 1 Y 3	1,75	3,23			**5,65**	ANDEN
EJE A ENTRE EJES 5 Y 6	0,15	2			**0,3**	PUERTA
EJE A ENTRE EJES 4 Y 5	0,15	0,9			**0,14**	PUERTA
EJE B ENTRE EJES 2 Y 3	0,15	1			**0,15**	PUERTA
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES B Y D	3,15	3,33			**10,49**	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E	1,18	2,14			**2,53**	BAÑO
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES D Y E	1,8	2,14			**3,85**	ESTERILIZACION
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y C´	3	3,04			**9,12**	CONSULTORIO
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES C´ Y E	3	3,19			**9,57**	CITOLOGIAS
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y C	3	3,95			**11,85**	CONSULTORIO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y F	3	4,01			**12,03**	ALMACEN COCINA
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES A Y F	4,07	8,14			**33,13**	ODONTOLOGIA
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G	0,9	2,55			**2,3**	BAÑO
EJE 3 ENTRE EJES B Y C´	0,15	0,9			**0,14**	PUERTA
EJE 3 ENTRE EJES C´ Y D	0,15	0,9			**0,14**	PUERTA
EJE D ENTRE EJES 1 Y 2	0,15	0,8			**0,12**	PUERTA
EJE D ENTRE EJES 2 Y 3	0,15	0,7			**0,11**	PUERTA
EJE E ENTRE EJES 2 Y 4	0,15	0,9			**0,14**	PUERTA
EJE 5 ENTRE EJES C Y D	0,15	0,9			**0,14**	PUERTA
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	0,15	0,95			**0,14**	PUERTA
EJE F ENTRE EJES 6 Y 7	0,15	0,7			**0,11**	PUERTA
EJE 1 ENTRE EJES B Y F	0,5	6,32			**3,16**	ANDEN
EJE 3 ENTRE EJES 1 Y 4	0,5	6,45			**3,23**	ANDEN POSTERIOR

SUB-TOTAL	118,82	**118,82**
VIENEN		
TOTAL	118,82	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**			124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS				**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**			122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	1. PRELIMINARES	**ITEM**	1,3	**DESCRIPCION**	DESMONTE DE SANITARIO		**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES DY E				1	1	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				1	1	
					SUB-TOTAL	2
					VIENEN	
					TOTAL	2

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**			124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS				**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**			122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	1. PRELIMINARES	**ITEM**	1,4	**DESCRIPCION**	DESMONTE RED ELECTRICA (luminarias)	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJE A Y F Y EJES 1 Y 6	14	8			112,00	

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	112,00	112,00
VIENEN		
TOTAL	112,00	

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	1. PRELIMINARES	ITEM	1,5	DESCRIPCION	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	UNIDAD	ML	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
BLOQUE 1						
EJE A ENTRE EJES 1 Y 4		7,5		1	**7,5**	
ENTRE EJES A Y B Y EJES 1 Y 4		7,5		1	**7,5**	
ENTRE EJES B Y C Y EJES 1 Y 4		7,5		3	**22,5**	
ENTRE EJES C Y D Y EJES 1 Y 4		7,5		2	**15**	
ENTRE EJES D Y E Y EJES 1 Y 4		7,5		2	**15**	
ENTRE EJES E Y F Y EJES 1 Y 4		7,5		1	**7,5**	
BLOQUE 2						
ENTRE EJES A Y B Y EJES 4 Y 7		8,5		1	**8,5**	
ENTRE EJES B Y C Y EJES 4 Y 7		8,5		2	**17**	
ENTRE EJES C Y D Y EJES 4 Y 7		8,5		1	**8,5**	
ENTRE EJES D Y E Y EJES 4 Y 7		8,5		3	**25,5**	
ENTRE EJES E Y F Y EJES 4 Y 7		8,5		1	**8,5**	
				SUB-TOTAL	143	143
				VIENEN		
				TOTAL	143	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	2,OBRAS DE URBANISMO		**ITEM**	2,1	**DESCRIPCION**	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE A ENTRE EJES 1 Y 7		15,1			**15,1**	
EJE 1 ENTRE EJES B Y E		6,82			**6,82**	
EJE E ENTRE EJES 1 Y 4		6,45			**6,45**	
EJE 4 ENTRE EJES E Y G		2,72			**2,72**	
EJE F ENTRE EJES 4 Y 6		3,43			**3,43**	
ENTRE EJES 5 Y 6 Y ACCESO Y EJE A		2,7			**2,7**	

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	37,22	**37,22**
VIENEN		
TOTAL	37,22	

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	3. OBRAS EN CUBIERTA		**ITEM**	3,1	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 4 Y EJES A Y C´	6,4	4,45			28,48	
ENTRE EJES 1 Y 4 Y EJES C´ Y E	6,4	4,4			28,16	
ENTRE EJES 4 Y 7 Y EJES A Y C´	8,1	4,45			36,05	
ENTRE EJES 4 Y 7 Y EJES C´Y F	8,1	5,3			42,93	
				SUB-TOTAL	135,62	135,62
				VIENEN		
				TOTAL	135,62	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos


Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	3. OBRAS EN CUBIERTA	**ITEM**	3,2	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		

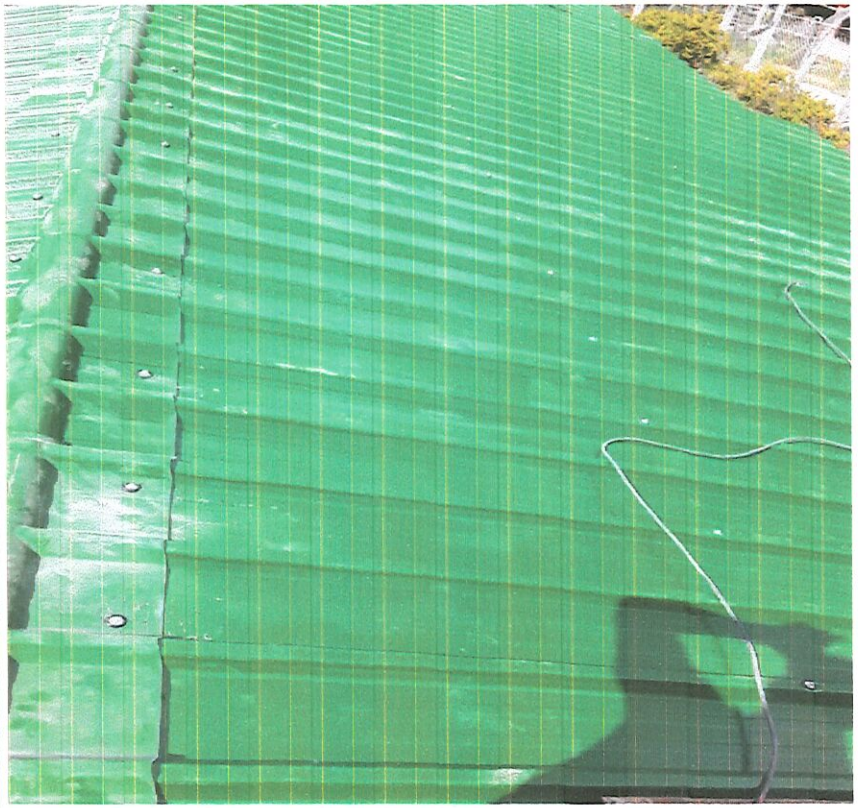

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 4 Y EJES A Y C´	6,4	4,45			28,48	
ENTRE EJES 1 Y 4 Y EJES C´ Y E	6,4	4,4			28,16	
ENTRE EJES 4 Y 7 Y EJES A Y C´	8,1	4,45			36,05	
ENTRE EJES 4 Y 7 Y EJES C´Y F	8,1	5,3			42,93	
				SUB-TOTAL	135,62	
				VIENEN		135,62
				TOTAL	135,62	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**			124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS				**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**			122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	3. OBRAS EN CUBIERTA	**ITEM**	3,3	**DESCRIPCION**	LIMATESA TERMOCUSTICA		**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE C´ENTRE EJES 1 Y 7		14,5			14,5	

SUB-TOTAL	14,5	14,5
VIENEN		
TOTAL	14,5	

OBSERVACIONES:


Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	3. OBRAS EN CUBIERTA		**ITEM**	3,4	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

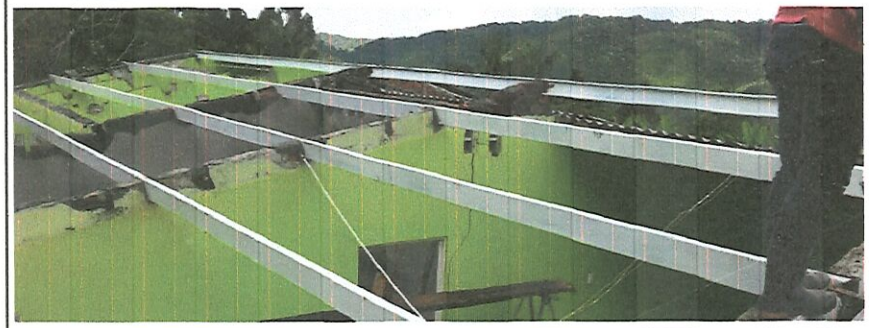



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE A ENTRE EJES 1 Y 7		14,5		1	14,5	
ENTRE EJES A Y B Y EJES 1 Y 7		14,5		1	14,5	
ENTRE EJES B Y C´ Y EJES 1 Y 7		14,5		2	29	
ENTRE EJES C´ Y C Y EJES 1 Y 7		14,5		1	14,5	
ENTRE EJES D Y E Y EJES 1 Y 7		14,5		3	43,5	
ENTRE EJES E Y F Y EJES 1 Y 7		8,5		1	8,5	
EJE 7 ENTRE EJES A Y C		2,9		1	2,9	LONGITUDINALES
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES A Y C		2,9		1	2,9	LONGITUDINALES
EJE 5 ENTRE EJES A Y C		2,9		1	2,9	LONGITUDINALES

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	4. MANPOSTERIA Y PINTURA		ITEM	4,1	DESCRIPCION	PAÑETE LISO MUROS 1:4		UNIDAD	ML	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE A ENTRE EJES 4 Y 5	2,1		2,35	1	4,94	
EJE A ENTRE EJES 4 Y 5	0,9		0,34	1	0,31	ENCIMA PUERTA
EJE C ENTRE EJES 4 Y 5	3		2,9	2	17,40	AMBOS LADOS
EJE 4 ENTRE EJES A Y C	3,95		2,65	1	10,47	
EJE 5 ENTRE EJES A Y C	3,95		2,65	1	10,47	
EJE 4 ENTRE EJES C Y F	4,01		2,45	1	9,82	
EJE 4 ENTRE EJES E Y F	1,72		2,4	1	4,13	EXTERIOR
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	0,77		2,05	1	1,58	INT COCINA
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	1,6		0,9	1	1,44	DEBAJO VENTANA
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	1,6		0,08	1	0,13	ENCIMA VENTANA
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	0,63		2,05	1	1,29	
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	0,87		2,26	1	1,97	
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	1,6		0,25	1	0,40	ENCIMA VENTANA
EJE F ENTRE EJES 4 Y 6	1,6		0,96	1	1,54	DEBAJO VENTANA
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	1,1		2,26	1	2,49	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	0,9		0,25	1	0,23	ENCIMA PUERTA
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	0,3		2,25	1	0,68	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 7	1,57		0,25	1	0,39	ENCIMA VENTANA
EJE F ENTRE EJES 5 Y 7	1,57		0,9			DEBAJO VENTANA
EJE 6 ENTRE EJES F Y G	1,07		2,03	1	2,17	
EJE G ENTRE EJES 6 Y 8	2,8		2,03	1	5,68	
EJE G ENTRE EJES 6 Y 8	2,55		1,95	1	4,97	INT BAÑO
EJE F ENTRE EJES 7 Y 8	1,85		1,95	1	3,61	INT BAÑO
EJE 6 ENTRE EJES F Y G	0,9		1,95	1	1,76	INT BAÑO
EJE 8 ENTRE EJES F Y G	0,9		1,95	1	1,76	INT BAÑO
				SUB-TOTAL	84,35	
				VIENEN		84,35
				TOTAL	84,35	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	4. MANPOSTERIA Y PINTURA		**ITEM**	4,2	**DESCRIPCION**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE 4 CON EJE F			2,26		2,26	
EJE 6 CON EJE G			2,03		2,03	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6			1,96		1,96	VENTANA
EJE F ENTRE EJES 5 Y 7			1,96		1,96	VENTANA

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	4. MANPOSTERIA Y PINTURA		ITEM	4,3	DESCRIPCION	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	UNIDAD	ML	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE B ENTRE EJES 2 Y 3	1		0,43	1	**0,43**	**ENCIMA PUERTA**
EJE 1"ENTRE EJES 1 Y 3	2,15		1,61	1	**3,46**	DEBAJO VENTANA
EJE 1"ENTRE EJES 1 Y 3	2,15		0,42	1	**0,90**	ENCIMA VENTANA
EJE 1 ENTRE EJES B Y D	3,33		2,83	1	**9,42**	
EJE 3 ENTRE EJES BY C	1,38		2,7	1	**3,73**	
EJE 3 ENTRE EJES BY C	0,9		0,66	1	**0,59**	ENCIMA PUERTA
EJE 3 CON EJE C	0,15		2,92	1	**0,44**	CARTERA
EJE 3 ENTRE EJES C Y D	0,9		0,8	1	**0,72**	ENCIMA PUERTA
EJE D ENTRE EJES 1 Y 2	0,42		3,03	1	**1,27**	
EJE D ENTRE EJES 1 Y 2	0,78		0,88	1	**0,69**	ENCIMA PUERTA
EJE D ENTRE EJES 2 Y 3	1,11		3,03	1	**3,36**	
EJE D ENTRE EJES 2 Y 3	0,92		0,86	1	**0,79**	
EJE D ENTRE EJES 2 Y 3	0,15		3,03	1	**0,45**	
EJE D ENTRE EJES 1 Y 2	0,4		0,72	1	**0,29**	BAÑO
EJE D ENTRE EJES 1 Y 2	0,77		0,66	1	**0,51**	ENC. PUERT BAÑO
EJE 1 ENTRE EJES D Y E	2,14		0,56	1	**1,20**	BAÑO
EJE 2 ENTRE EJES D Y E	2,14		0,56	1	**1,20**	BAÑO
EJE E ENTRE EJES 1 Y 2	1,18		0,31	1	**0,37**	ENCIMA VENTANA BAÑO
EJE D ENTRE EJES 2 Y 3	0,72		1,55	1	**1,12**	BAÑO
EJE D ENTRE EJES 2 Y 3	0,92		0,68	1	**0,63**	
EJE E ENTRE EJES 2 Y 3	0,25		1,16	1	**0,29**	
EJE E ENTRE EJES 2 Y 3	0,5		0,3	1	**0,15**	ENCIMA VENTANA
EJE E ENTRE EJES 2 Y 3	0,86		0,3	1	**0,26**	ENCIMA PUERTA
EJE 2 ENTRE EJES D Y E	2,15		1,35	1	**2,90**	
EJE 3 ENTRE EJES D Y E	2,15		2,64	1	**5,68**	
EJE A ENTRE EJES 3 Y 4	3		1,6	1	**4,80**	DEBAJO VENTANA
EJE A ENTRE EJES 3 Y 4	3		0,22	1	**0,66**	ENCIMA VENTANA
EJE C CON EJES 3 Y 4	3		2,87	1	**8,61**	
EJE 3 ENTRE EJES A Y C	2,1		2,56	1	**5,38**	
EJE 3 ENTRE EJES A Y C	0,9		0,63	1	**0,57**	ENCIMA PUERTA
EJE 3 ENTRE EJES C YE	0,9		0,77	1	**0,69**	
EJE 3 ENTRE EJES C YE	2,29		2,64	1	**6,05**	
EJE 4 ENTRE EJES A Y C	3,05		2,67	1	**8,14**	
EJE 4 ENTRE EJES C Y E	3,19		2,78	1	**8,87**	
EJE E ENTRE EJES 3 Y4	3		0,34	1	**1,02**	ENCIMA VENTANA
EJE E ENTRE EJES 3 Y4	3		1,59	1	**4,77**	DEBAJO VENTANA
				SUB-TOTAL	**90,39**	
				VIENEN		**90,39**
				TOTAL	**90,39**	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	4. MANPOSTERIA Y PINTURA	**ITEM**	4,3	**DESCRIPCION**	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE A ENTRE EJES 4 Y 5	2,11		2,35	1	4,96	
EJE A ENTRE EJES 4 Y 5	0,9		0,34	1	0,31	
EJE C ENTRE EJES 4 Y 5	3		2,91	1	8,73	
EJE ENTRE EJES A Y C	3,95		2,64	1	10,43	
EJE 4 ENTRE EJES C Y F	4,01		2,45	1	9,82	
EJE 5 ENTRE EJES C Y D	0,25		2,7	1	0,68	
EJE 5 ENTRE EJES C Y D	0,95		0,68	1	0,65	
EJE 5 ENTRE EJES D Y F	2,81		2,83	1	7,95	
EJE 5 ENTRE EJES A Y C	3,95		2,64	1	10,43	
EJE C ENTRE EJES 4Y 5	3		2,71	1	8,13	
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	0,7		2,04	1	1,43	
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	1,58		0,1	1	0,16	ENCIMA VENTANA
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	1,58		0,9	1	1,42	DEBAJO VENTANA
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5	0,7		2,04	1	1,43	
EJE A ENTRE EJES 5 Y 6	0,91		2,18	1	1,98	
EJE A ENTRE EJES 5 Y 6	2		0,17	1	0,34	ENCIMA PUERTA
EJE A ENTRE EJES 5 Y 6	1,03		2,18	1	2,25	
EJE 5 ENTRE EJES A Y C'	4,37		2,52	1	11,01	
EJE 5 ENTRE EJES A Y C'	0,95		0,68	1	0,65	ENCIMA PUERTA
EJE 5 ENTRE EJES C'Y F	2,81		2,28	1	6,41	
EJE 7 ENTRE EJES A Y F	8,14		2,43	1	19,78	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	0,24		2,03	1	0,49	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	0,9		0,1	1	0,09	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	0,5		2,03	1	1,02	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	1,57		0,1	1	0,16	ENCIMAVERNTANA
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	1,57		0,93	1	1,46	DEBAJO VENTANA
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	0,15		2,03	1	0,30	

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	112,44	202,84
VIENEN	90,39	
TOTAL	202,84	

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	4 MAMPOSTERIA Y PINTURA		**ITEM**	4,5	**DESCRIPCION**	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE A ENTRE EJES 5 Y 6	2		2	2	**8,00**	PUERTA 2 LADOS
EJE A ENTRE EJES 4 Y 5	0,9		2	2	**3,60**	PUERTA 2 LADOS
EJE A ENTRE EJES 3 Y 4	3		0,6	2	**3,60**	VENTANA 2 LADOS
EJE B ENTRE EJES 2 Y 3	0,98		2,2	2	**4,31**	PUERTA 2 LADOS
EJE B ENTRE EJES 1 y 3	2,12		0,6	2	**2,54**	VENTANA 2 LADOS
EJE D ENTRE EJES 1 Y 2	0,78		2,16	2	**3,37**	PUERTA 2 LADOS
EJE D ENTRE EJES 2 Y 3	0,95		2,15	2	**4,09**	PUERTA 2 LADOS
EJE E ENTRE EJES 1Y 2	1,18		0,59	2	**1,39**	VENTANA 2 LADOS
EJE E ENTRE EJES 2 Y 3	0,9		2,16	2	**3,89**	PUERTA 2 LADOS
EJE E ENTRE EJES 2 Y 3	0,5		0,6	2	**0,60**	VENTANA 2 LADOS
EJE 3 ENTRE EJES B Y C´	0,9		2,18	2	**3,92**	PUERTA 2 LADOS
EJE 3 ENTRE EJES C´Y C	0,9		2,18	2	**3,92**	PUERTA 2 LADOS
EJE E ENTRE EJES 3 Y 4	3		0,6	2	**3,60**	VENTANA 2 LADOS
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	0,9		1,93	2	**3,47**	PUERTA 2 LADOS
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	1,57		0,98	2	**3,08**	VENTANA 2 LADOS
EJE F ENTRE EJES 6 Y 7	0,68		1,95	2	**2,65**	PUERTA 2 LADOS

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	5. PISOS Y CIELO RASO		**ITEM**	5,1	**DESCRIPCION**	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M		**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE A ENTRE EJES 5 Y 6	0,15	2			0,3	PUERTA
EJE A ENTRE EJES 4 Y 5	0,15	0,9			0,14	PUERTA
EJE B ENTRE EJES 2 Y 3	0,15	1			0,15	PUERTA
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES B Y D	3,15	3,33			10,49	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E	1,18	2,14			2,53	BAÑO
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES D Y E	1,8	2,14			3,85	ESTERILIZACION
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y C´	3	3,04			9,12	CONSULTORIO
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES C´ Y E	3	3,19			9,57	CITOLOGIAS
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y C	3	3,95			11,85	CONSULTORIO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y F	3	4,01			12,03	ALMACEN COCINA
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES A Y F	4,07	8,14			33,13	ODONTOLOGIA
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G	0,9	2,55			2,3	BAÑO
EJE 3 ENTRE EJES B Y C´	0,15	0,9			0,14	PUERTA
EJE 3 ENTRE EJES C´ Y D	0,15	0,9			0,14	PUERTA
EJE D ENTRE EJES 1 Y 2	0,15	0,8			0,12	PUERTA
EJE D ENTRE EJES 2 Y 3	0,15	0,7			0,11	PUERTA
EJE E ENTRE EJES 2 Y 4	0,15	0,9			0,14	PUERTA
EJE 5 ENTRE EJES C Y D	0,15	0,9			0,14	PUERTA
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	0,15	0,95			0,14	PUERTA
EJE F ENTRE EJES 6 Y 7	0,15	0,7			0,11	PUERTA
				SUB-TOTAL	96,50	96,50
				VIENEN		
				TOTAL	96,50	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	5. PISOS Y CIELO RASO		**ITEM**	5,2	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES B Y D	2,95	3,13			**9,23**	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES D Y E	1,6	1,94			**3,10**	ESTERILIZACION
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y C	2,8	2,84			**7,95**	CONSULTORIO
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES C Y E	2,8	2,99			**8,37**	CITOLOGIAS
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y C	2,8	3,75			**10,50**	CONSULTORIO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y F	2,8	3,81			**10,67**	ALMACEN COCINA
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES A Y F	3,87	7,94			**30,73**	ODONTOLOGIA
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	2,8	2,8			**7,84**	PATIO
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES A Y B	0,7	3,2			**2,24**	ACCESO SALA DE ESPERA
				SUB-TOTAL	90,63	**90,63**
				VIENEN		
				TOTAL	90,63	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos


Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024		
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024		
CAPITULO	5. PISOS Y CIELO RASO		ITEM	5,3	DESCRIPCION	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	UNIDAD	ML	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

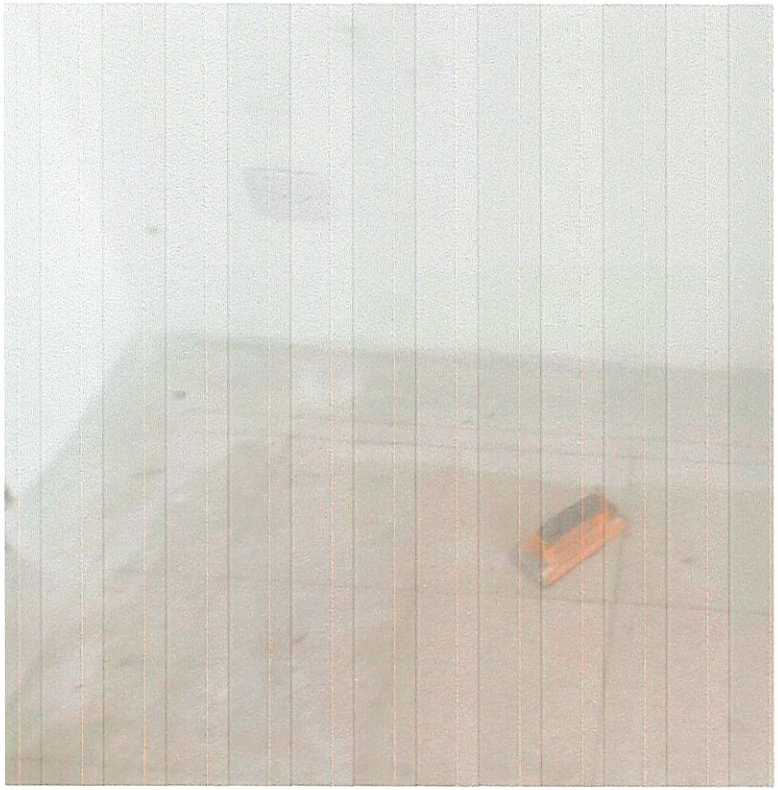

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE B ENTRE EJES 1 Y 3		3,15		2	6,30	EXTERIOR E INTER.
EJE D ENTRE EJES 1"Y 3		3,15		1	3,15	
EJE 1 ENTRE EJES B Y D		3,33		1	3,33	
EJE 3 ENTRE EJES B Y D		3,33		1	3,33	
EJE 2 ENTRE EJES D Y E		2,14		1	2,14	
EJE 3 ENTRE EJES D Y E		2,14		1	2,14	
EJE D ENTRE EJES 2 Y 3		1,8		1	1,80	
EJE E ENTRE EJES 2 Y 3		1,8		1	1,80	
EJE 3 ENTRE EJES A Y C´		3,04		1	3,04	
EJE 3 ENTRE EJES C´ Y E		3,19		1	3,19	
EJE 4 ENTRE EJES A Y C´		3,04		1	3,04	
EJE 4 ENTRE EJES C´Y E		3,19		1	3,19	
EJE A ENTRE EJES 3 Y 4		3		1	3,00	
EJE C´ ENTRE EJES 3 Y 4		3		2	6,00	2 LADOS
EJE E´ ENTRE EJES 3 Y 4		3		1	3,00	
EJE 4 ENTRE EJES A Y C		3,95		1	3,95	
EJE 4 ENTRE EJES C Y F		4,01		1	4,01	
EJE 5 ENTRE EJES A Y C		3,95		1	3,95	
EJE 5 ENTRE EJES C Y F		4,01		1	4,01	
EJE A ENTRE EJES 4 Y 5		3		1	3,00	
EJE C ENTRE EJES 4 Y 5		3		2	6,00	2 LADOS
EJE F ENTRE EJES 4 Y 5		3		1	3,00	
EJE 5 ENTRE EJES A Y F		8,14		1	8,14	
EJE 7 ENTRE EJES A Y F		8,14		1	8,14	
EJE A ENTRE EJES 5 Y 7		4,07		1	4,07	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 7		4,07		1	4,07	
				SUB-TOTAL	100,79	100,79
				VIENEN		
				TOTAL	100,79	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos


Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	5. PISOS Y CIELO RASO		**ITEM**	5,4	**DESCRIPCION**	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

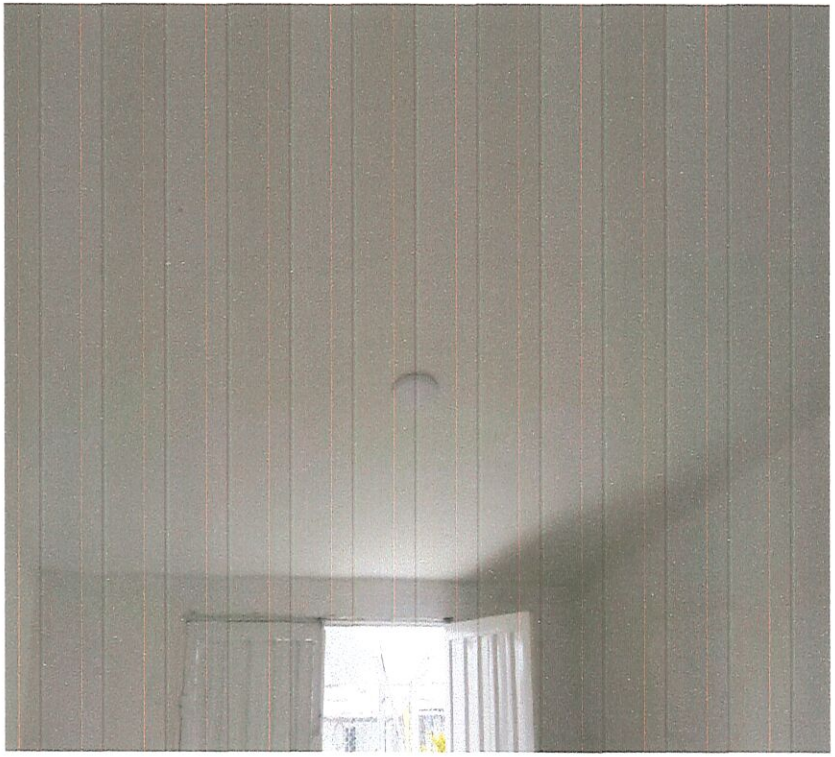

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES B Y D	3,15	3,33			**10,49**	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E	1,2	2,14			**2,57**	BAÑO
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES D Y E	1,8	2,14			**3,85**	ESTERILIZACION
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y C	3	3,08			**9,24**	CONSULTORIO
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES C Y E	3	3,19			**9,57**	CITOLOGIAS
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y C	3	3,95			**11,85**	CONSULTORIO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y F	3	4,01			**12,03**	ALMACEN COCINA
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES A Y F	4,07	8,14			**33,13**	ODONTOLOGIA
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES A Y B	3,15	1,36			**4,28**	EXT FRENTE
EJE A ENTRE EJES 3 Y 4	3	0,54			**1,62**	EXT FRENTE
EJE A ENTRE EJES 4 Y 7	7,37	0,24			**1,77**	EXT FRENTE
ENTRE EJE 1 Y 3 Y EJES E Y F	3,16	0,52			**1,64**	EXT POSTERIOR
ENTRE EJE 3 Y 4 Y EJES E Y F	2,98	0,52			**1,55**	EXT POSTERIOR
				SUB-TOTAL	103,59	**103,59**
				VIENEN		
				TOTAL	103,59	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO	**ITEM**	6,1	**DESCRIPCION**	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE 1 ENTRE EJES D Y E		2,14	2,1		**4,49**	
EJE 2 ENTRE EJES D Y E		2,14	2,1		**4,49**	
EJE D ENTRE EJES 1 Y 2		1,18	1,5		**1,77**	
EJE E ENTRE EJES 1 Y 2		0,42	2,1		**0,88**	
EJE 6 ENTRE EJES F Y G		0,9	1,92		**1,73**	
EJE 8 ENTRE EJES F Y G		0,9	1,92		**1,73**	
EJE F ENTRE EJES 7 Y 8		1,85	1,92		**3,55**	
EJE F ENTRE EJES 6 Y 8		2,55	1,92		**4,90**	
				SUB-TOTAL	**23,54**	**23,54**
				VIENEN		
				TOTAL	**23,54**	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos


Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO		ITEM	6,2	DESCRIPCION	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	UNIDAD	M2	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

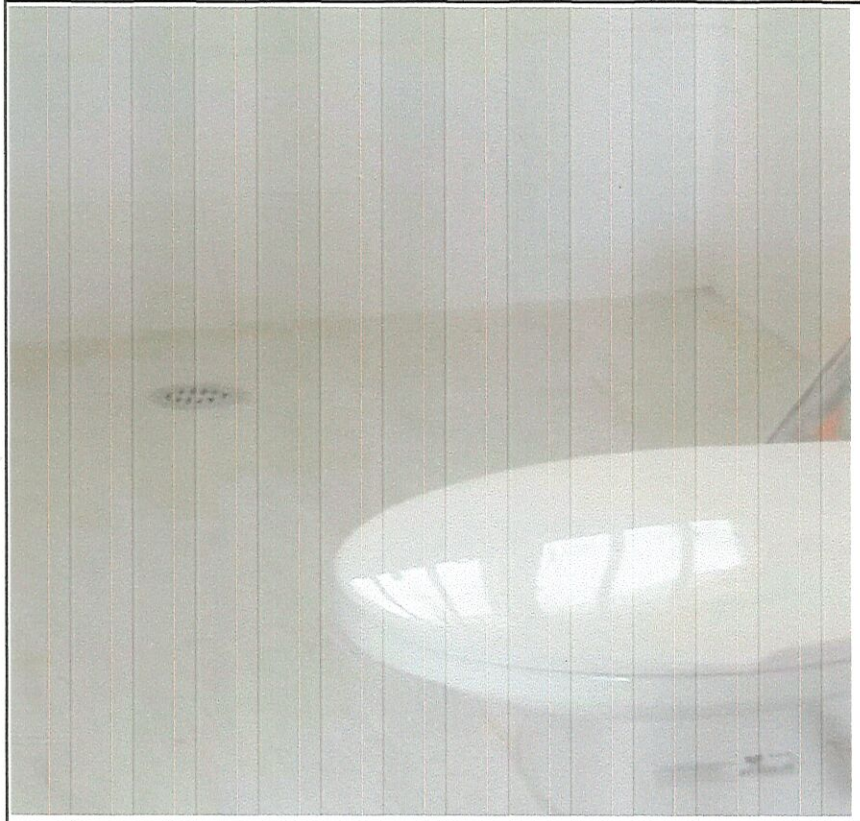

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E	1,18	2,14			2,53	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G	0,9	2,55			2,30	
				SUB-TOTAL	4,82	4,82
				VIENEN		
				TOTAL	4,82	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO		**ITEM**	6,3	**DESCRIPCION**	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE 6 CON EJE F				1	1,00	
SUB-TOTAL					1,00	1,00
VIENEN						
TOTAL					1,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos


Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO	**ITEM**	6,4	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

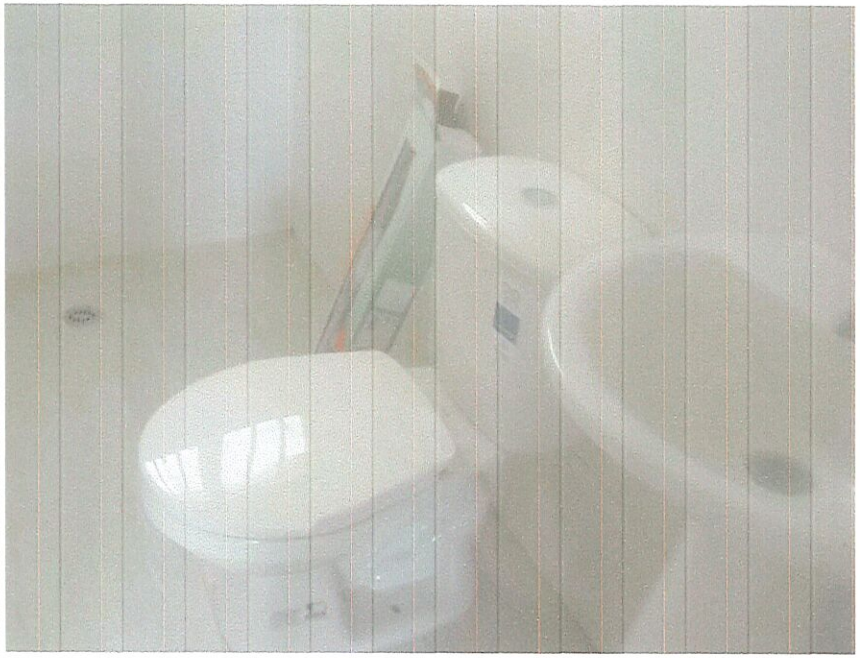

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				1	1,00	
					SUB-TOTAL	2,00
					VIENEN	
					TOTAL	2,00

2,00

OBSERVACIONES:


Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO	ITEM	6,5	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU	UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

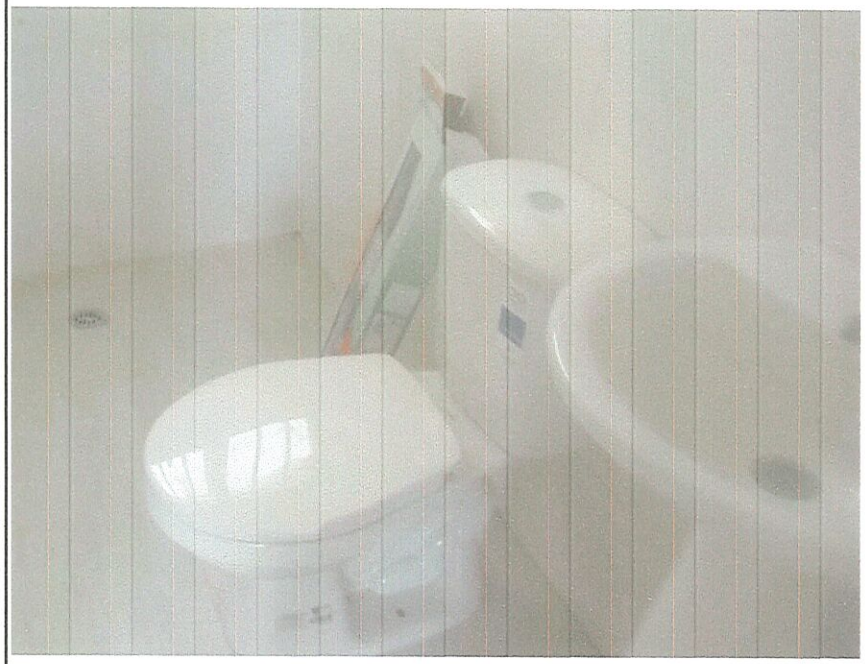

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				1	1,00	
				SUB-TOTAL	2,00	2,00
				VIENEN		
				TOTAL	2,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	8,SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS		**ITEM**	8,3	**DESCRIPCION**	SALIDAS PARA ILUMINACION 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA




LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES B Y D				1	1,00	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				1	1,00	BAÑO
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES D Y E				1	1,00	ESTERILIZACION
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y C				1	1,00	CONSULTORIO
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES C Y E				1	1,00	CITOLOGIAS
ENTRE EJES E Y F Y EJES 2 Y 3				1	1,00	EXTERIO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y C				1	1,00	CONSULTORIO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y F				1	1,00	ALMACEN COCINA
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES A Y F				3	3,00	ODONTOLOGIA
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				1	1,00	BAÑO
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES A Y B				1	1,00	EXT FRENTE
EJE A ENTRE EJES 3 Y 4				1	1,00	EXT FRENTE

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	8,SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	8,4	DESCRIPCION	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO	UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

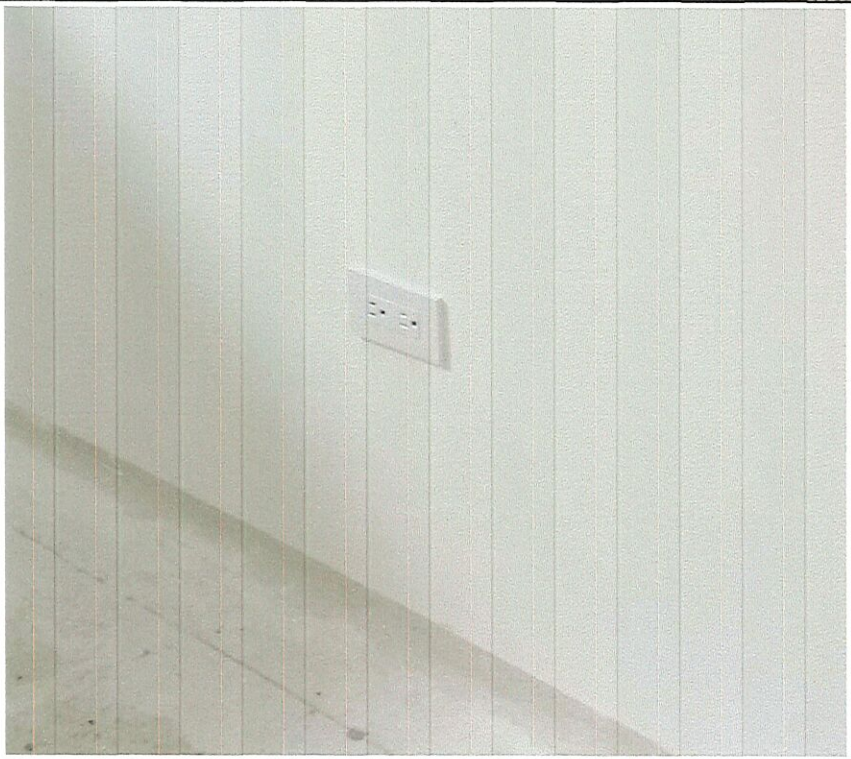

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES B Y D				1	1,00	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES D Y E				2	2,00	ESTERILIZACION
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y C				2	2,00	CONSULTORIO
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES C Y E				2	2,00	CITOLOGIAS
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y C				1	1,00	CONSULTORIO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y F				2	2,00	ALMACEN COCINA
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES A Y F				5	5,00	ODONTOLOGIA
				SUB-TOTAL	15,00	15,00
				VIENEN		
				TOTAL	15,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	8,SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	8,5	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		





LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES B Y D				1	1,00	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				1	1,00	BAÑO
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES D Y E				1	1,00	ESTERILIZACION
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y C				1	1,00	CONSULTORIO
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES C Y E				1	1,00	CITOLOGIAS
ENTRE EJES E Y F Y EJES 2 Y 3				1	1,00	EXTERIO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y C				1	1,00	CONSULTORIO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y F				1	1,00	ALMACEN COCINA
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES A Y F				3	3,00	ODONTOLOGIA
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				1	1,00	BAÑO
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES A Y B				1	1,00	EXT FRENTE
EJE A ENTRE EJES 3 Y 4				1	1,00	EXT FRENTE
					SUB-TOTAL	14,00
					VIENEN	14,00
					TOTAL	14,00

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos


Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,1	**DESCRIPCION**	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

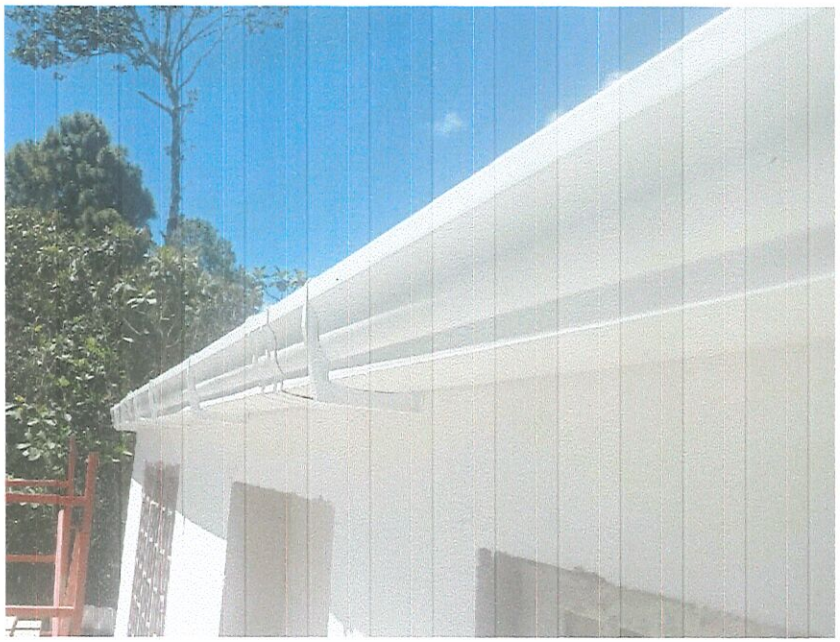

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE A ENTTRE EJES 1 Y 7		14,5			14,50	
EJE E ENTRE EJES 1 Y 4		6,4			6,40	
EJE F ENTRE EJES 4 Y 7		8,1			8,10	
				SUB-TOTAL	29,00	29,00
				VIENEN		
				TOTAL	29,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,2	**DESCRIPCION**	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE A ENTRE EJES 1 Y 7		13			13,00	
EJE 1 ENTRE EJES A Y E		8,4			8,40	
EJE 7 ENTRE EJES A Y G		14			14,00	

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	ITEM	9,3	DESCRIPCION	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE A ENTRE EJES 1 Y 7				3	3,00	
EJE 1 ENTRE EJES A Y E				6	6,00	
EJE 7 ENTRE EJES A Y G				6	6,00	
				SUB-TOTAL	15,00	15,00
				VIENEN		
				TOTAL	15,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		**ITEM**	9,4	**DESCRIPCION**	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				1	1,00	
				SUB-TOTAL	2,00	2,00
				VIENEN		
				TOTAL	2,00	

OBSERVACIONES:


Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		**ITEM**	9,5	**DESCRIPCION**	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

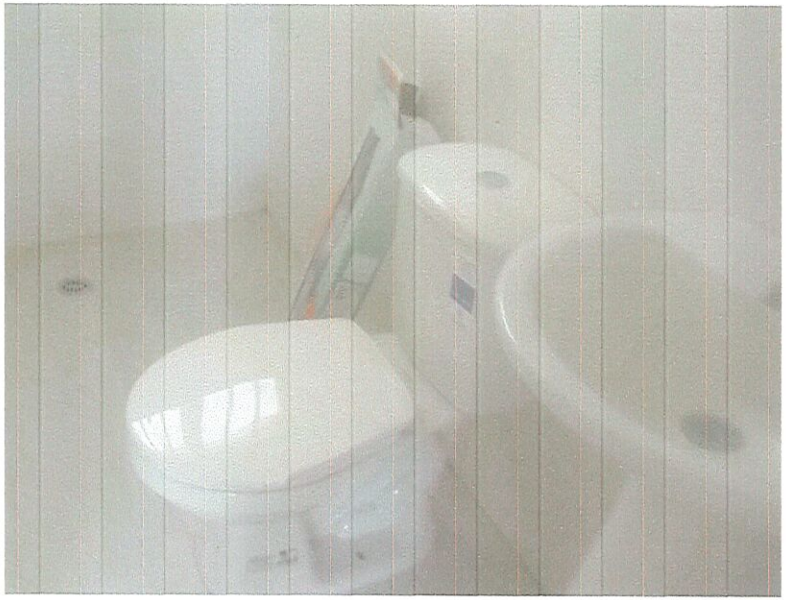

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				1	1,00	
					SUB-TOTAL	2,00
					VIENEN	
					TOTAL	2,00

2,00

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,6	**DESCRIPCION**	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	




LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE 6 CON EJE F				1	1,00	

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI						NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8						NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		ITEM	9,7	DESCRIPCION	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

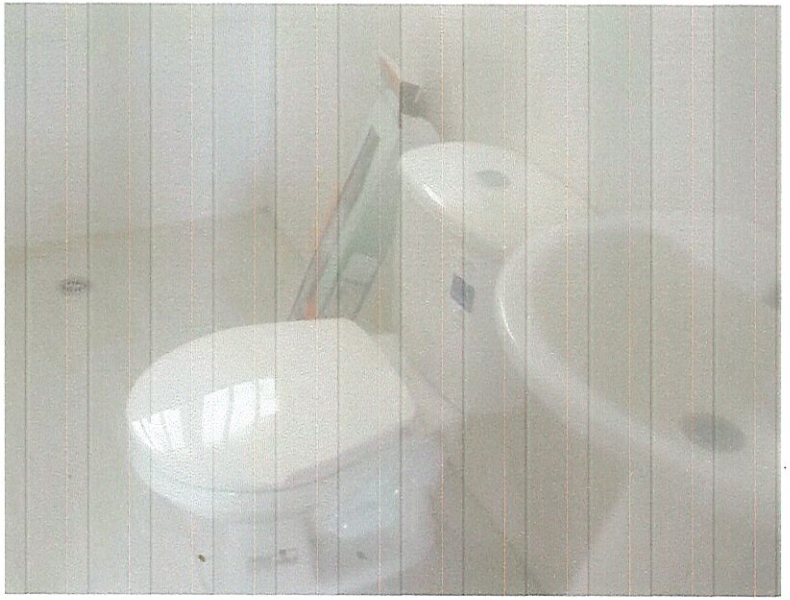

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				1	1,00	
				SUB-TOTAL	2,00	2,00
				VIENEN		
				TOTAL	2,00	

OBSERVACIONES:


Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		**ITEM**	9,8	**DESCRIPCION**	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

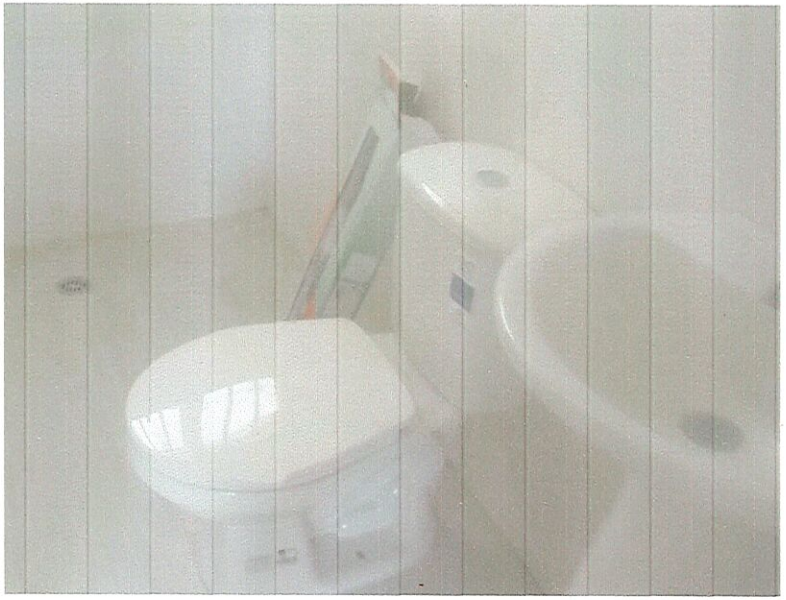

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				1	1,00	
				SUB-TOTAL	2,00	2,00
				VIENEN		
				TOTAL	2,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,9	**DESCRIPCION**	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE 6 CON EJE F				1	1,00	
					SUB-TOTAL	1,00
					VIENEN	
					TOTAL	1,00

1,00

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,10	**DESCRIPCION**	ACCESORIO SANITARIO 4"	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				2	2,00	
ENTRE EJES 6 Y 7 Y EJES B Y C				1	1,00	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				2	2,00	
ENTRE EJE 1 ENTRE EJES E Y F				1	1,00	
ENTRE EJE 1 Y EJE A				1	1,00	
				SUB-TOTAL	7,00	7,00
				VIENEN		
				TOTAL	7,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI						NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8						NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		ITEM	9,11	DESCRIPCION	ACCESORIO SANITARIO 3"	UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				4	4,00	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				4	4,00	
				SUB-TOTAL	8,00	8,00
				VIENEN		
				TOTAL	8,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Col/9205

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024		
CONTRATISTA	8					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024		
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		ITEM	9,12	DESCRIPCION	TUBERÍA 4" SANITARIA		UNIDAD	ML	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE A ENTRE EJES 1 Y 7		6			6,00	
EJE 1 ENTRE EJE F Y A VIA		13,2			13,20	
EJE 7 ENTRE EJEG Y LA VIA		11,6			11,60	
				SUB-TOTAL	30,80	30,80
				VIENEN		
				TOTAL	30,80	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Col/0205

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,13	**DESCRIPCION**	TUBERÍA 3" SANITARIA	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES D Y E				4	4,00	
ENTRE EJES 6 Y 8 Y EJES F Y G				2	2,00	
				SUB-TOTAL	6,00	6,00
				VIENEN		
				TOTAL	6,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,14	**DESCRIPCION**	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**No DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**	**DESCRIPCION**
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**			
ENTRE EJES E Y F Y EJES 1 Y 3				1	1,00	
EJE A ENTRE EJES 5 Y 7				1	1,00	ANTE JARDIN

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		**ITEM**	9,15	**DESCRIPCION**	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN		**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE 6 ENTRE EJE H Y I				1	1,00	
EJE A ENTRE EJES 4 Y 5				1	1,00	
				SUB-TOTAL	2,00	2,00
				VIENEN		
				TOTAL	2,00	

OBSERVACIONES:


Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**PAGINA 1 DE**		1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN								**ELABORO**		ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		**ITEM**	9,16	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL ROSARIO DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

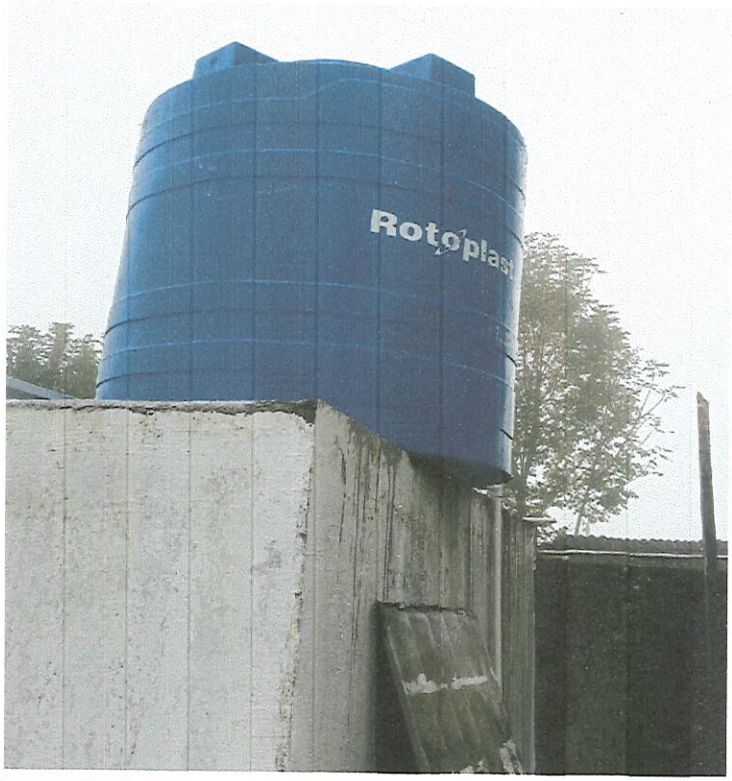

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJE F Y G Y EJES 6 Y 8				1	1,00	1100 LITROS
