E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAI	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	ANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**									
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	195,67	$ 3.850,00	$ 753.330	-	-0,12	-$ 462	195,55	$ 752.868
1,2	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	ml	15,00	$ 35.500,00	$ 532.500	+	29,61	$ 1.051.288	44,61	$ 1.583.788
1,3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	155,60	$ 24.500,00	$ 3.812.200	-	-7,41	-$ 181.545	148,19	$ 3.630.655
1,4	DESMONTE DE SANITARIO	und	2,00	$ 55.000,00	$ 110.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 110.000
1,5	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	155,60	$ 8.000,00	$ 1.244.800	-	-0,60	-$ 4.800	155,00	$ 1.240.000
1,6	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	130,10	$ 8.500,00	$ 1.105.850	+	227,50	$ 1.933.750	357,60	$ 3.039.600
2	**OBRAS DE URBANISMO**									
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	13,10	$ 95.500,00	$ 1.251.050	+	-10,00	-$ 955.000	3,10	$ 296.050
3	**OBRAS EN CUBIERTA**									
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	175,29	$ 115.200,00	$ 20.193.408	+	16,71	$ 1.924.992	192,00	$ 22.118.400
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	175,29	$ 1.800,00	$ 315.522	+	16,71	$ 30.078	192,00	$ 345.600

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAI	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	ANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	13,00	$ 105.300,00	$ 1.368.900	=	0,00	$ 0	13,00	$ 1.368.900
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	188,50	$ 60.000,00	$ 11.310.000	+	153,42	$ 9.205.200	341,92	$ 20.515.200
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**									
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	208,80	$ 42.600,00	$ 8.894.880	-	17,61	$ 750.356	226,41	$ 9.645.236
4,2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	41,00	$ 9.500,00	$ 389.500	+	4,00	$ 38.000	45,00	$ 427.500
4,3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	395,60	$ 36.900,00	$ 14.597.640	-	-143,54	-$ 5.296.788	252,06	$ 9.300.852
4,4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	105,30	$ 37.000,00	$ 3.896.100	-	-22,08	-$ 816.886	83,22	$ 3.079.214
4,5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	24,00	$ 42.500,00	$ 1.020.000	+	13,25	$ 563.168	37,25	$ 1.583.168
5	**PISOS Y CIELO RASO**									
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	155,60	$ 52.300,00	$ 8.137.880	+	15,27	$ 798.621	170,87	$ 8.936.501

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAI	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	ANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	163,71	$ 187.900,00	$ 30.761.109	+	0,77	$ 144.683	164,48	$ 30.905.792
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	151,96	$ 89.300,00	$ 13.570.028	-	-9,61	-$ 858.173	142,35	$ 12.711.855
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	155,60	$ 88.000,00	$ 13.692.800	-	-8,81	-$ 775.280	146,79	$ 12.917.520
6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**									
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	27,84	$ 88.800,00	$ 2.472.192	-	-3,38	-$ 300.073	24,46	$ 2.172.119
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	5,00	$ 88.800,00	$ 444.000	-	-0,08	-$ 7.246	4,92	$ 436.754
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1,00	$ 345.000,00	$ 345.000	=	0,00	$ 0	1,00	$ 345.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAI	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	ANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 450.000,00	$ 900.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 900.000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 280.000,00	$ 560.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 560.000
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 70.000
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 70.000
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**									
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000	=	0,00	$ 0	1,00	$ 85.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	ANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	17,00	$ 62.000,00	$ 1.054.000	-	-6,44	-$ 399.385	10,56	$ 654.615
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	2,00	$ 345.000,00	$ 690.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 690.000
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**									
8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	Und	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000	=	0,00	$ 0	1,00	$ 450.000
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	1,00	$ 55.000,00	$ 55.000	=	0,00	$ 0	1,00	$ 55.000
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	21,00	$ 145.000,00	$ 3.045.000	+	1,00	$ 145.000	22,00	$ 3.190.000
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	18,00	$ 105.000,00	$ 1.890.000	+	11,00	$ 1.155.000	29,00	$ 3.045.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAI	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	ANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	21,00	$ 105.000,00	$ 2.205.000	+	1,00	$ 105.000	22,00	$ 2.310.000
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**									
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO	ML	28,00	$ 92.500,00	$ 2.590.000	-	-2,00	-$ 185.000	26,00	$ 2.405.000
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	14,50	$ 8.500,00	$ 123.250	+	22,85	$ 194.225	37,35	$ 317.475
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	8,00	$ 1.250,00	$ 10.000	-	-3,00	-$ 3.750	5,00	$ 6.250
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	2,00	$ 52.600,00	$ 105.200	=	0,00	$ 0	2,00	$ 105.200
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	2,00	$ 52.600,00	$ 105.200	=	0,00	$ 0	2,00	$ 105.200
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1,00	$ 52.600,0	$ 52.600	=	0,00	$ 0	1,00	$ 52.600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	2,00	$ 62.400,00	$ 124.800	=	0,00	$ 0	2,00	$ 124.800
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	2,00	$ 56.200,00	$ 112.400	=	0,00	$ 0	2,00	$ 112.400
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1,00	$ 62.400,00	$ 62.400	=	0,00	$ 0	1,00	$ 62.400

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	ANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	4,00	$ 19.000,00	$ 76.000	+	4,00	$ 76.000	8,00	$ 152.000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	4,00	$ 15.000,00	$ 60.000	+	7,00	$ 105.000	11,00	$ 165.000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	17,00	$ 24.000,00	$ 408.000	+	2,16	$ 51.743	19,16	$ 459.743
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	12,00	$ 17.000,00	$ 204.000	+	15,50	$ 263.500	27,50	$ 467.500
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2,00	$ 180.000,00	$ 360.000	=	0,00	$ 0	2,00	$ 360.000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	3,00	$ 45.600,00	$ 136.800	-	-1,00	-$ 45.600	2,00	$ 91.200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000	=	0,00	$ 0	1,00	$ 1.700.000
10	**ASEO GENERAL**									
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	195,67	$ 4.500,00	$ 880.515	+	244,33	$ 1.099.498	440,00	$ 1.980.013
	TOTAL COSTO DIRECTO			**TOTAL**	**$ 158.403.854**			**COSTOS DIRECTOS PRESENTE ACTA**		**$ 168.208.966**

	ADMINISTRACION		**19,00%**		**$ 30.096.732**					$ 31.959.703
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 1.584.039**					$ 1.682.090
	UTILIDADES		**5,00%**		**$ 7.920.193**					$ 8.410.448
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 198.004.817**					**$ 210.261.207**

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAI	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	ANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
								VALOR TOTAL DEL CONTRATO		210.261.207
								VALOR CONDICIONES ACTUALES		210.261.207
								DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DEL CONTRATO Y VALORES A EJECUTAR		0
								VALOR TOTAL DEL PROYECTO		210.261.207

En San Agustín Huila, a los 11 días del mes de junio del 2024, se reunieron la Ing. YUDI TATIANA HERNANDEZ como interventora del contrato, el señor OLMEDO BRAVO NAVIA, como supervisor del contrato y el Arq. WILSON UNI COLLAZOS, Contratista de obra, el Ing EDWIN JIMENEZ HURTADO como apoyo a la supervision con el fin de suscribir la presente acta de mayores y menores cantidades teniendo en cuenta las siguientes modificaciones.

Descripcion de las modificaciones mas relevantes:

1. Sube el cerramiento en lona y madera, ya que se planteo necesario el cerramiento tal de la obra mientras dure la suspensión del contrato por seguridad.

2. Aumento la cantidad de desmonte de correa, ya que la estructura existente en madera estaba realizada cada 1,2 m tanto longitudinal como transversamente y fue necesario el desmonte de la totalidad

3. Disminuyo pañete, estuco y pintura, ya que el baño se enchapo, y se descontaron los vanos como puertas y ventanas y solo se pañeto hasta 1 mtr de altura

4. Aumento el aseo general ya que es necesario dejar limpia toda la propiedad como se recibio

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA No 2. DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024
	OTROSI AMPLIACION DE TIEMPO	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	

ACTA No 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES	
		UND	CANTIDAI	V/UNITARIO	V/TOTAL	+ -	ANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL

Yudy Tatiana H's.
YUDI TATIANA HERNANDEZ
Interventora

WILSON UNI COLLAZOS
Contratista

OLMEDO BRAVO NAVIA
Supervisor

Ing EDWIN JIMENEZ HURTADO
Apoyo a la supervision

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	195,55	$ 3.850,00	$ 752.868	195,55	$ 752.868	195,55	$ 752.868
1,2	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO	ml	44,61	$ 35.500,00	$ 1.583.788	44,61	$ 1.583.788	44,61	$ 1.583.788
1,3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS	m2	148,19	$ 24.500,00	$ 3.630.655	148,19	$ 3.630.655	148,19	$ 3.630.655
1,4	DESMONTE DE SANITARIO	und	2,00	$ 55.000,00	$ 110.000	2,00	$ 110.000	2,00	$ 110.000
1,5	DESMONTE RED ELECTRICA	m2	155,00	$ 8.000,00	$ 1.240.000	155,00	$ 1.240.000	155,00	$ 1.240.000
1,6	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES	ML	357,60	$ 8.500,00	$ 3.039.600	357,60	$ 3.039.600	357,60	$ 3.039.600
2	**OBRAS DE URBANISMO**								
2,1	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor	ml	3,10	$ 95.500,00	$ 296.050	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**OBRAS EN CUBIERTA**								
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	m2	192,00	$ 115.200,00	$ 22.118.400	192,00	$ 22.118.400	192,00	$ 22.118.400
3,2	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	m2	192,00	$ 1.800,00	$ 345.600	192,00	$ 345.600	192,00	$ 345.600

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,3	LIMATESA TERMOACUSTICA	ml	13,00	$ 105.300,00	$ 1.368.900	13,00	$ 1.368.900	13,00	$ 1.368.900
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO	ml	353,92	$ 60.000,00	$ 21.235.200	341,92	$ 20.515.200	341,92	$ 20.515.200
4	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**								
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	226,41	$ 42.600,00	$ 9.645.236	226,41	$ 9.645.236	226,41	$ 9.645.236
4,2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ml	45,00	$ 9.500,00	$ 427.500	45,00	$ 427.500	45,00	$ 427.500
4,3	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS	m2	252,06	$ 36.900,00	$ 9.300.852	0,00	0,00	0,00	0,00
4,4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	83,22	$ 37.000,00	$ 3.079.214	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA	M2	37,25	$ 42.500,00	$ 1.583.168	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PISOS Y CIELO RASO**								
5,1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M	m2	170,87	$ 52.300,00	$ 8.936.501	170,87	$ 8.936.501	170,87	$ 8.936.501

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA	m2	164,48	$ 187.900,00	$ 30.905.792	164,48	$ 30.905.792	164,48	$ 30.905.792
5,3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	ml	142,35	$ 89.300,00	$ 12.711.855	142,35	$ 12.711.855	142,35	$ 12.711.855
5,4	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	146,79	$ 88.000,00	$ 12.917.520	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**								
6,1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	24,46	$ 88.800,00	$ 2.172.119	24,46	$ 2.172.119	24,46	$ 2.172.119
6,2	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	4,92	$ 88.800,00	$ 436.754	4,92	$ 436.754	4,92	$ 436.754
6,3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	und	1,00	$ 345.000,00	$ 345.000	1,00	$ 345.000	1,00	$ 345.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 450.000,00	$ 900.000	2,00	$ 900.000	2,00	$ 900.000
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 280.000,00	$ 560.000	2,00	$ 560.000	2,00	$ 560.000
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**								
7,1	ESPEJO 4 MM	m2	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000	0,00	0,00	0,00	0,00

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE	m2	10,56	$ 62.000,00	$ 654.615	0,00	0,00	0,00	0,00
7,3	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M	Und	2,00	$ 345.000,00	$ 690.000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**								
8,1	CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR	Und	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000	0,00	0,00	0,00	0,00
8,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	1,00	$ 55.000,00	$ 55.000	0,00	0,00	0,00	0,00
8,3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	und	22,00	$ 145.000,00	$ 3.190.000	22,00	3190000,00	22,00	3190000,00
8,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	und	29,00	$ 105.000,00	$ 3.045.000	29,00	$ 3.045.000	29,00	$ 3.045.000

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	22,00	$ 105.000,00	$ 2.310.000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**								
9,1	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU	ML	26,00	$ 92.500,00	$ 2.405.000	0,00	0,00	0,00	0,00
9,2	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	37,35	$ 8.500,00	$ 317.475	37,35	$ 317.475	37,35	$ 317.475
9,3	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	und	5,00	$ 1.250,00	$ 6.250	5,00	$ 6.250	5,00	$ 6.250
9,4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	2,00	$ 52.600,00	$ 105.200	2,00	$ 105.200	2,00	$ 105.200
9,5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	2,00	$ 52.600,00	$ 105.200	2,00	$ 105.200	2,00	$ 105.200
9,6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1,00	$ 52.600,0	$ 52.600	1,00	$ 52.600	1,00	$ 52.600
9,7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	2,00	$ 62.400,00	$ 124.800	2,00	$ 124.800	2,00	$ 124.800
9,8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	2,00	$ 56.200,00	$ 112.400	2,00	$ 112.400	2,00	$ 112.400
9,9	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1,00	$ 62.400,00	$ 62.400	1,00	$ 62.400	1,00	$ 62.400
9,10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	8,00	$ 19.000,00	$ 152.000	8,00	$ 152.000	8,00	$ 152.000
9,11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	11,00	$ 15.000,00	$ 165.000	11,00	$ 165.000	11,00	$ 165.000
9,12	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	19,16	$ 24.000,00	$ 459.743	19,16	$ 459.743	19,16	$ 459.743

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,13	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	27,50	$ 17.000,00	$ 467.500	27,50	$ 467.500	27,50	$ 467.500
9,14	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2,00	$ 180.000,00	$ 360.000	2,00	$ 360.000	2,00	$ 360.000
9,15	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2,00	$ 45.600,00	$ 91.200	2,00	$ 91.200	2,00	$ 91.200
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000
10	**ASEO GENERAL**								
10,1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	440,00	$ 4.500,00	$ 1.980.013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 02					**$ 168.928.966**		**$ 132.262.535**		**$ 132.262.535**
	ADMINISTRACION		**19,00%**		**$ 32.096.503**		**$ 25.129.882**		**$ 25.129.882**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 1.689.290**		**$ 0**		**$ 0**
	UTILIDADES		**5,00%**		**$ 8.446.448**		**$ 6.613.127**		**$ 6.613.127**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 211.161.207**		**$ 164.005.544**		**$ 164.005.544**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	210.261.207
VALOR EJECUTADO	164.005.544
VALOR A EJECUTAR	46.255.663
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO	105.130.604
VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA	58.874.940

E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DELHULA PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA	CONTRATO No:	122	ACTA PARCIAL No 1 DE 2024
	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS PUESTOS DE SALUD PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	
	VALOR:	$ 679.505.761	
	CONTRATISTA:	WILSON UNI COLLAZOS	
	INTERVENTORA:	YUDI TATIANA HERNANDEZ	
	INICIACION:	18 DE MARZO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024
	PLAZO INICIAL:	2 MESES HASTA EL 18 DE MAYO DE 2024	
	OTROSI AMPL. EN TIEMPO 1	1 MES HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	
	OTROSI AMP. EN TIEMPO 2	1 MES HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	

ACTA PARCIAL No 1 DE 2024

ITEM	ACTIVIDADES	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 2 - DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO								164.005.544

En San Agustín Huila, a los 12 dias del mes de agosto de 2024, se reunieron la Ing. YUDI TATIANA HERNANDEZ, Interventora del proyecto, el Sr OLMEDO BRAVO NAVIA, supervisor del contrato, el Arq. WILSON UNI COLLAZOS, Contratista de obra, el Ing. EDWIN JIMENEZ HURTADO, como apoyo a la supervision del contrato y el Ing ROBERTO ÑAÑEZ, como supervisor del contrato, con el fin de suscribir la presente acta de entrega parcial de obra

El valor de la presente acta es de CIENTO SESENTA CUATRO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 164,005,544).

Valor amortizacion del anticipo CIENTO CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($105,130,604,oo)

Valor a pagar presente acta CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 58,874,940,oo)

Dada en el municipio de San Agustin Huila a los 12 dias del mes de agosto de 2024

Yudi Tatiana H.S.

Ing YUDI TATIANA HERNANDEZ
Interventora

WILSON UNI COLLAZOS
Contratista

OLMEDO BRAVO NAVIA
Supervisor


Ing EDWIN JIMENEZ HURTADO
Apoyo a la supervision

Ing. ROBERTO ÑAÑEZ
Apoyo a la supervision

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**			124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS				**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**			122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	1. PRELIMINARES	**ITEM**	1,1	**DESCRIPCION**	LOCALIZACION Y REPLANTEO	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		

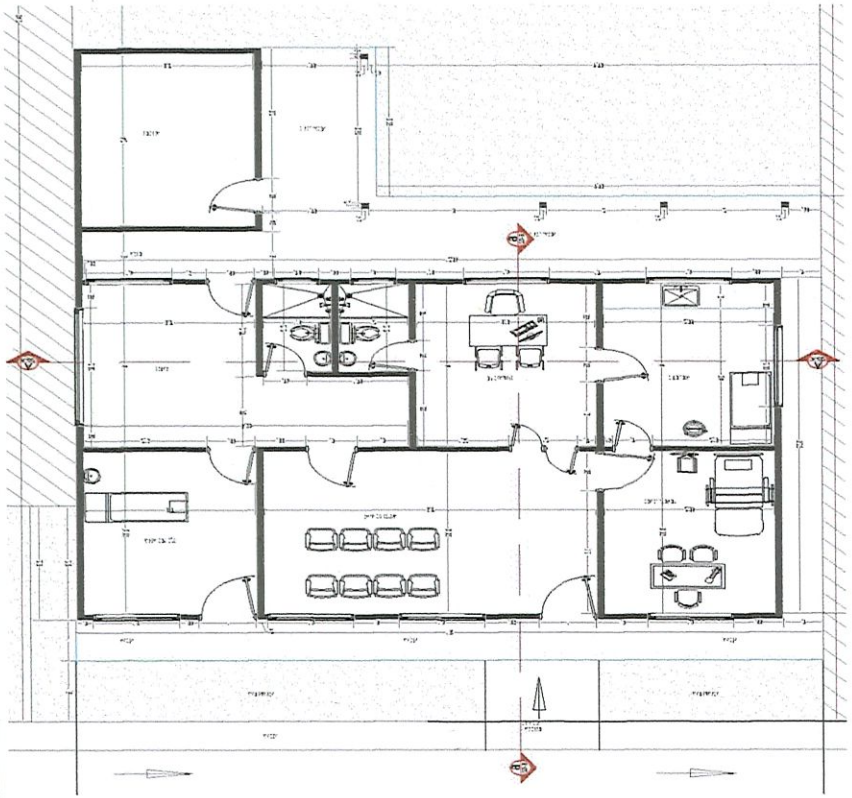

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 7 Y EJES A Y G	12,4	15,77			195,55	

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	195,55	195,55
VIENEN		
TOTAL	195,55	

Vbo. Contratista Wilson Uni CC 1.6205

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	1. PRELIMINARES		**ITEM**	1,2	**DESCRIPCION**	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPOPILENO	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE 1 ENTRE EJES A Y G		15			15	
EJE 7 ENTRE EJES A Y G		15			15	
EJE A ENTRE EJES 7 Y LOTE		7			7	
EJE G ENTRE EJES 7 Y LOTE		7,61			7,61	
				SUB-TOTAL	44,61	44,61
				VIENEN		
				TOTAL	44,61	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	1. PRELIMINARES		**ITEM**	1,3	**DESCRIPCION**	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS		**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES A Y F	1	12,4			**12,4**	ANDEN
EJE 2 ENTRE EJES B Y C	0,15	1			**0,15**	PUERTA
EJE 2 ENTRE EJES E Y F	0,15	1			**0,15**	PUERTA
ENTRE EJES A Y B Y EJES 2 Y 3	2,98	3,96			**11,8**	ODONTOLO
ENTRE EJES B Y E Y EJES 2 Y 3	5,81	3,96			**23,01**	SALA DE
ENTRE EJES E Y F Y EJES 2 Y 3	2,98	3,95			**11,77**	CONSUL
ENTRE EJES A Y B Y EJES 3 Y 5	2,98	3,57			**10,64**	CITOLOGIAS
ENTRE EJES B Y C Y EJES 3 Y 5	3,17	3,97			**12,58**	OFI JEFE
ENTRE EJES C Y E Y EJES 3 Y 4	2,51	1,72			**4,32**	HALL
ENTRE EJES C Y D Y EJES 4 Y 5	1,2	2,12			**2,54**	BAÑO
ENTRE EJES D Y E Y EJES 4 Y 5	1,18	2,12			**2,5**	BAÑO
ENTRE EJES E Y F Y EJES 3 Y 5	2,98	4,13			**12,31**	
ENTRE EJES 5 Y6 Y EJES A Y E"	10,24	2			**20,48**	CORREDOR INT
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E" Y G	1,15	2			**2,3**	HALL
ENTRE EJES D Y E" Y EJES 6 Y7	2	3,65			**7,3**	CORREDOR INT
ENTRE EJES E" Y G Y EJES 6 Y 7	3,01	4,2			**12,64**	COCINA
EJE 3 ENTRE EJES A Y B	0,15	0,7			**0,11**	PUERTA
EJE 3 ENTRE EJES B Y C	0,15	1,2			**0,18**	PUERTA
EJE 3 ENTRE EJES C Y E	0,15	0,9			**0,14**	PUERTA
EJE 3 ENTRE EJES E Y E"	0,15	0,85			**0,13**	PUERTA
EJE B ENTRE EJES 2 Y 3	0,15	0,85			**0,13**	PUERTA
EJE B ENTRE EJES 3 Y 5	0,15	0,85			**0,13**	PUERTA
EJE C ENTRE EJES 4 Y 5	0,15	0,75			**0,11**	PUERTA
EJE 4 ENTRE EJES C Y E	0,15	0,75			**0,11**	PUERTA
EJE 5 ENTRE EJES E Y E"	0,15	0,85			**0,13**	PUERTA
EJE E" ENTRE EJES 6 Y 7	0,15	0,85			**0,13**	PUERTA
				SUB-TOTAL	148,19	
				VIENEN		**148,19**
				TOTAL	148,19	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	1. PRELIMINARES		**ITEM**	1,4	**DESCRIPCION**	DESMONTE DE SANITARIO		**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				1	1	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				1	1	
			SUB-TOTAL		2	2
			VIENEN			
			TOTAL		2	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	1. PRELIMINARES		**ITEM**	1,5	**DESCRIPCION**	DESMONTE RED ELECTRICA (luminarias)	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJE 1 Y 6 Y EJES A Y F	12,4	10,8			134	
ENTRE EJE 6 Y 7 Y EJES E Y G	5	4,2			21	
					SUB-TOTAL	155
					VIENEN	155
					TOTAL	155

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	1. PRELIMINARES		**ITEM**	1,6	**DESCRIPCION**	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES		**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE A ENTRE EJES 1 Y 6		11,4		1	**11,4**	
ENTRE EJES A Y B Y EJES 1 Y 6		11,4		2	**22,8**	
ENTRE EJES B Y C Y EJES 1 Y 6		11,4		3	**34,2**	
ENTRE EJES C Y D Y EJES 1 Y 6		11,4		2	**22,8**	
ENTRE EJES D Y E Y EJES 1 Y 6		15,04		2	**30,08**	
ENTRE EJES EY E´ Y EJES 1 Y 6		15,04		2	**30,08**	
ENTRE EJES E´Y F Y EJES 1 Y 6		15,04		2	**30,08**	
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES A Y F		12,36		1	**12,36**	
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES A Y F		12,36		5	**61,8**	
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y F		12,36		2	**24,72**	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y F		12,36		2	**24,72**	
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES A Y F		12,36		3	**37,08**	
ENTRE EJES 6 Y 7 Y EJES D Y G		5,16		3	**15,48**	
				SUB-TOTAL	**357,6**	**357,6**
				VIENEN		
				TOTAL	**357,6**	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	3. OBRAS EN CUBIERTA		**ITEM**	3,1	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES A Y F	13	6,6			85,8	
ENTRE EJES 3 Y 7 Y EJES A Y F	13	6,2			80,6	
ENTRE EJES 6 Y 7 Y EJES D Y G	6	4			24	
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES F Y G	1	1,6			1,6	
				SUB-TOTAL	192	192
				VIENEN		
				TOTAL	192	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	3. OBRAS EN CUBIERTA	**ITEM**	3,2	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 3 Y EJES A Y F	13	6,6			**85,8**	
ENTRE EJES 3 Y 7 Y EJES A Y F	13	6,2			**80,6**	
ENTRE EJES 6 Y 7 Y EJES D Y G	6	4			**24**	
ENTRE EJES 5 Y 7 Y EJES F Y G	1	1,6			**1,6**	
				SUB-TOTAL	**192**	**192**
				VIENEN		
				TOTAL	**192**	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**			124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS				**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**			122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	3. OBRAS EN CUBIERTA	**ITEM**	3,3	**DESCRIPCION**	LIMATESA TERMOCUSTICA	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y F		13			13	
					SUB-TOTAL	13
					VIENEN	13
					TOTAL	13

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	3. OBRAS EN CUBIERTA		**ITEM**	3,4	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE 1 ENTRE EJES A Y F		13		1	13	CORREA TRANSVERSAL
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES A Y F		13		5	65	CORREA TRANSVERSAL
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES A Y F		13		2	26	CORREA TRANSVERSAL
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y F		13		1	13	CORREA TRANSVERSAL
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES A Y F		13		2	26	CORREA TRANSVERSAL
ENTRE EJES 6 Y 7 Y EJES D Y F		6		3	18	CORREA TRANSVERSAL
EJE A ENTRE EJES 1 Y 7		26,02		1	26,02	CORREA LONGITUDINAL
EJE B ENTRE EJES 1 Y 8		26,02		1	26,02	CORREA LONGITUDINAL
EJE C ENTRE EJES 1 Y 9		26,02		1	26,02	CORREA LONGITUDINAL
EJE E ENTRE EJES 1 Y 10		31,43		1	31,43	CORREA LONGITUDINAL
EJE F ENTRE EJES 1 Y 11		31,43		1	31,43	CORREA LONGITUDINAL
ENTRE EJES 6 Y 7 Y EJES A Y F		13		2	26	CORREA TRANSVERSAL
ENTRE EJES CY D Y EJES 6 Y 7		14		1	14	CORREA LONGITUDINAL
				SUB-TOTAL	341,92	
				VIENEN		341,92
				TOTAL	341,92	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	4. MANPOSTERIA Y PINTURA		**ITEM**	4,1	**DESCRIPCION**	PAÑETE LISO MUROS 1:4		**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
FACHADA FRONTAL						
EJE 2 ENTRE EJES A Y B	0,88		2,7	1	**2,38**	
EJE 2 ENTRE EJES A Y B	1,5		0,5	1	**0,75**	ENCIMA VENTANA
EJE 2 ENTRE EJES A Y B	1,5		1,08	1	**1,62**	DEBAJO VENTANA
EJE 2 ENTRE EJES A Y B	0,9		2,7	1	**2,43**	
EJE 2 ENTRE EJES B Y C	1		0,5	1	**0,50**	ENCIMA PUERTA
EJE 2 ENTRE EJES B Y C	0,96		2,7	1	**2,59**	
EJE 2 ENTRE EJES B Y C	1,5		1,08	1	**1,62**	DEBAJO VENTANA
EJE 2 ENTRE EJES B Y C	1,5		0,5	1	**0,75**	ENCIMA VENTANA
EJE 2 ENTRE EJES C Y E	0,8		2,7	1	**2,16**	
EJE 2 ENTRE EJES C Y E	1,5		1,08	1	**1,62**	DEBAJO VENTANA
EJE 2 ENTRE EJES C Y E	1,5		0,5	1	**0,75**	ENCIMA VENTANA
EJE 2 ENTRE EJES C Y E	0,2		2,7	1	**0,54**	
EJE 2 ENTRE EJES E Y F	1		0,5	1	**0,50**	ENCIMA PUERTA
EJE 2 ENTRE EJES E Y F	0,35		2,7	1	**0,95**	
EJE 2 ENTRE EJES E Y F	1,5		0,5	1	**0,75**	ENCIMA VENTANA
EJE 2 ENTRE EJES E Y F	1,5		1,08	1	**1,62**	DEBAJO VENTANA
EJE 2 ENTRE EJES E Y F	0,3		2,7	1	**0,81**	
EJE F ENTRE EJES 2 Y 3	2,8		1	1	2,80	
ZONA NTERIOR						
EJE 2 ENTRE EJES A Y B	2,98		1	1	**2,98**	
EJE 2 ENTRE EJES B Y E	4,81		1	1	**4,81**	
EJE 2 ENTRE EJES E YF	2,01		1	1	**2,01**	
EJE 3 ENTRE EJES A Y B	2,16		1	2	**4,32**	DOS LADOS
EJE 3 ENTRE EJES B Y D	0,88		1	1	**0,88**	
EJE 3 ENTRE EJES B YD	2,67		1	1	**2,67**	
EJE 3 ENTRE EJES D Y E	0,73		1	1	**0,73**	
EJE 3 ENTRE EJES E Y E	2,13		1	2	**4,26**	DOS LADOS
				SUB-TOTAL	**47,79**	
				VIENEN		**47,79**
				TOTAL	**47,79**	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	4. MANPOSTERIA Y PINTURA		ITEM	4,1	DESCRIPCION	PAÑETE LISO MUROS 1:4		UNIDAD	ML	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
FACHADA						
EJE 3 ENTRE EJES A Y B	0,15		1	1	0,15	
EJE 3ENTRE EJES B YC	0,3		1	1	0,30	
EJE 3ENTRE EJES B YC	1,62		1	1	1,62	
EJE 3ENTRE EJES C YD	0,9		1	1	0,90	
EJE 3ENTRE EJES D Y E´	0,88		1	1	0,88	
EJE 4 ENTRE EJES C Y D	1,18		2,1	1	2,48	BAÑO
EJE 4 ENTRE EJES D E´	0,43		2,1	1	0,90	BAÑO
EJE 4 ENTRE EJES C Y E´	1,78		1	1	1,78	
EJE 5 ENTRE EJES A Y B	2,98		1	1	2,98	
EJE 5 ENTRE EJES B Y C	3,13		1	1	3,13	
EJE 5 ENTRE EJES C Y D	1,18		1	1	1,18	
EJE 5 ENTRE EJES D Y E´	1,18		1	1	1,18	
EJE 5 ENTRE EJES E Y F	2,16		1	2	4,32	
EJE 5 ENTRE EJES A Y E´	9,24		1	1	9,24	
EJE 6 ENTRE EJES E Y F	2,01		2,7	1	5,43	
EJE 6 ENTRE EJES E Y G	3,01		2,7	1	8,13	
EJE 7 ENTRE EJES E´Y G	3,01		2,7	1	8,13	
EJE 7 ENTRE EJES E´Y G	3,16		2,7	1	8,53	
EJE A ENTRE EJES 2 Y 5	8,98		1	1	8,98	
EJE A ENTRE EJES 2 Y 3	3,96		1	1	3,96	
EJE A ENTRE EJES 3 Y 5	4		1	1	4,00	
EJE B ENTRE EJES 2 Y 3	3,01		1	2	6,02	DOS LADOS
EJE B ENTRE EJES 3 Y 4	1,6		1	2	3,20	DOS LADOS
EJE B ENTRE EJES 4 Y 5	1,55		1	2	3,10	DOS LADOS
EJE C ENTRE EJES 3 Y 4	1,88		1	2	3,76	DOS LADOS
EJE C ENTRE EJES 4 Y 5	1,37		1	1	1,37	
EJE C ENTRE EJES 4 Y 5	1,37		2,1	1	2,88	INT BAÑO
EJE D ENTRE EJES 4 Y 5	2,12		2,1	2	8,90	INT BAÑO 2 LADOS
EJE E´ ENTRE EJES 4 Y 5	2,12		2,1	1	4,45	INT BAÑO
EJE E´ ENTRE EJES 3 Y 5	3		1	1	3,00	
EJE E´ ENTRE EJES 3 Y 4	0,73		2,7	2	3,94	MURO COCINA 2 LADOS
				SUB-TOTAL	118,82	166,61
				VIENEN	47,79	
				TOTAL	166,61	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos


Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No		124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No		122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	4. MANPOSTERIA Y PINTURA		ITEM	4,1	DESCRIPCION	PAÑETE LISO MUROS 1:4		UNIDAD	ML	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

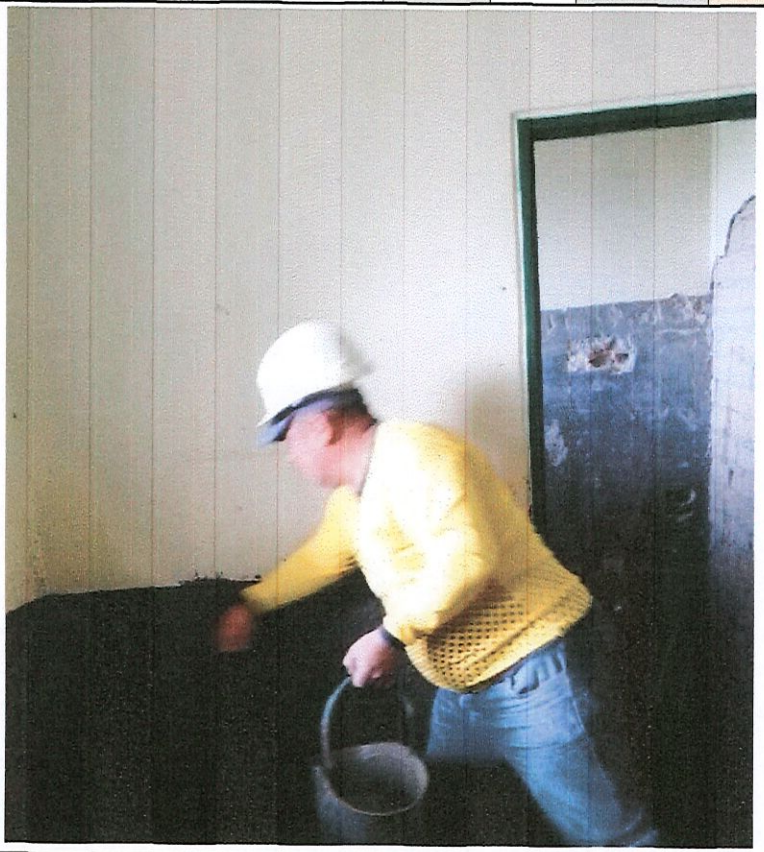

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE E´ ENTRE EJES 2 Y 3	3,96		1	1	3,96	
EJE E´ ENTRE EJES 2 Y 4	4,11		1	1	4,11	
EJE E ENTRE EJES 6 Y 7	0,45		2,7	1	1,22	
EJE E ENTRE EJES 6 Y 7	0,3		2,7	1	0,81	
EJE E ENTRE EJES 6 Y 7	3,05		2,7	2	16,47	ENCIMA PUERTA 2 LADOS
EJE F ENTRE EJES 2 Y 3	3,96		2,7	1	10,69	
EJE F ENTRE EJES 3 Y 5	4		1	1	4,00	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6	1,15		2,7	1	3,11	
EJE G ENTRE EJES 6 Y 7	4,2		2,7	1	11,34	
EJE A ENTRE EJES 3 Y 5	2,05		1	1	2,05	TAPADA CALADOS
EJE F ENTRE EJES 3 Y 5	2,05		1	1	2,05	TAPADA DE CALADOS

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	59,80	226,41
VIENEN	166,61	
TOTAL	226,41	

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	4. MANPOSTERIA Y PINTURA	**ITEM**	4,2	**DESCRIPCION**	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**No DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**	**DESCRIPCION**
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**			
EJE 2 CON EJE B			2,2	1	2,2	
EJE 2 ENTRE EJES B YC			2,2	2	4,4	
EJE 2 ENTRE EJES E"Y E			2,2	1	2,2	
EJE 2 ENTRE EJES E"Y E			2,2	2	4,4	
EJE 3 ENTRE EJES A Y B			2,2	4	8,8	
EJE 3 ENTRE EJES B Y C			2,2	4	8,8	
EJE B ENTRE EJES 3 Y 5			2,2	4	8,8	
EJE 5 CON EJE A			2,7	1	2,7	
EJE 6 CON EJE E			2,7	1	2,7	

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	45	45
VIENEN		
TOTAL	45	

Vbo. Contratista Wilson Uni Col 9205

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**			124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS				**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**			122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	5. PISOS Y CIELO RASO	**ITEM**	5,1	**DESCRIPCION**	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M		**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES A Y F	4,2	13,1			**55,02**	HALL DE ACCESO
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES A Y B	2,98	3,96			**11,8**	ODONTOLOGIA
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES B Y E	3,96	5,81			**23,01**	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES E Y F	3,01	3,96			**11,92**	CONSULTORIO 1
ENTRE EJES 3 Y 5 Y EJES A Y B	2,98	4			**11,92**	ESTERILIZACIO
ENTRE EJES 3 Y 5 Y EJES B Y C	3,13	4			**12,52**	OFIC JEFE
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES C Y E	1,73	2,53			**4,38**	HALL
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D	1,2	2,12			**2,54**	BAÑO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E	1,2	1,18			**1,42**	BAÑO
ENTRE EJES 3 Y 5 Y EJES E Y F	3,01	4			**12,04**	
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES A Y E	10,24	0,2			**2,05**	CORREDOR INT
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E Y F	1,15	2,01			**2,31**	CORREDOR INT
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E´Y G	3,01	4,2			**12,64**	COCINA
ENTRE EJES 6 Y7 Y EJES D Y E´	2	3,65			**7,3**	CORREDOR INT

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	170,87	**170,87**
VIENEN		
TOTAL	170,87	

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	5. PISOS Y CIELO RASO		**ITEM**	5,2	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0.33X0.33M BLANCO HUILA INC	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES A Y F	3,9	13			**50,7**	HALL DE ACCESO
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES A Y B	2,78	3,76			**10,45**	ODONTOLOGIA
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES B Y E	3,76	5,61			**21,09**	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES E Y F	2,81	3,76			**10,57**	CONSULTORIO 1
ENTRE EJES 3 Y 5 Y EJES A Y B	2,78	3,8			**10,56**	ESTERILIZACIO
ENTRE EJES 3 Y 5 Y EJES B Y C	2,93	3,8			**11,13**	OFIC JEFE
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES C Y E	1,53	2,33			**3,56**	HALL
ENTRE EJES 3 Y 5 Y EJES E Y F	2,81	3,8			**10,68**	
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES A Y E	8,6	1,8			**15,48**	CORREDOR INT
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E Y F	0,95	2,96			**2,81**	CORREDOR INT
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E Y G	2,81	4			**11,24**	COCINA
ENTRE EJES 6 Y7 Y EJES C Y E	1,8	3,45			**6,21**	CORREDOR INT

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	5. PISOS Y CIELO RASO		**ITEM**	5,3	**DESCRIPCION**	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE A ENTRE EJES 1 Y 2		4,2		1	**4,20**	
EJE 2 ENTRE EJES A Y F		13,1		1	**13,10**	
EJE 2 ENTRE EJES A Y B		2,98		1	**2,98**	
EJE 2 ENTRE EJES B Y E		5,81		1	**5,81**	
EJE 2 ENTRE EJES E Y F		3,01		1	**3,01**	
EJE 3 ENTRE EJES A Y B		2,98		2	**5,96**	2 LADOS
EJE 3 ENTRE EJES B YC		3,13		1	**3,13**	
EJE 3 ENTRE EJES B Y E		5,81		1	**5,81**	
EJE 3 ENTRE EJES C Y E		5,69		1	**5,69**	
EJE 3 ENTRE EJES E Y F		3,01		1	**3,01**	
EJE 4 ENTRE EJES C Y E		2,68		1	**2,68**	
EJE 5 ENTRE EJES A Y B		2,98		1	**2,98**	
EJE 5 ENTRE EJES B Y C		3,13		1	**3,13**	
EJE 5 ENTRE EJES E Y F		3,01		1	**3,01**	
EJE 5 ENTRE EJES A Y F		12,25		1	**12,25**	
EJE 6 ENTRE EJES E Y F		2,01		1	**2,01**	
EJE 6 ENTRE EJES E´ Y F		3,01		1	**3,01**	COCINA
EJE 7 ENTRE EJES E´ Y F		3,01		1	**3,01**	COCINA
EJE A ENTRE EJES 2 Y 3		3,96		1	**3,96**	
EJE A ENTRE EJES 3 Y 5		4		1	**4,00**	
EJE B ENTRE EJES 2 Y 3		3,96		2	**7,92**	2 LADOS
EJE B ENTRE EJES 3 Y 5		4		2	**8,00**	2 LADOS
EJE C ENTRE EJES 3 Y 5		4		1	**4,00**	
EJE C ENTRE EJES 3 Y 4		1,75		1	**1,75**	
EJE E ENTRE EJES 2 Y 3		3,96		1	**3,96**	
EJE E ENTRE EJES 4 Y 5		2,27		1	**2,27**	
EJE E ENTRE EJES 6 Y 7		4,2		2	**8,40**	DOS LADOS
EJE F ENTRE EJES 2 Y 3		3,96		1	**3,96**	
EJE F ENTRE EJES 3 Y 5		4		1	**4,00**	
EJE F ENTRE EJES 5 Y 6		1,15		1	**1,15**	
EJE F ENTRE EJES 6 Y 7		4,2		1	**4,20**	
				SUB-TOTAL	**142,35**	
				VIENEN		**142,35**
				TOTAL	**142,35**	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**			124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS				**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**			122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO	**ITEM**	6,1	**DESCRIPCION**	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
EJE C ENTRE EJES 4 Y 5		1,37	2,08	1	**2,85**	
EJE D ENTRE EJES 4 Y 5		2,12	2,08	2	**8,82**	DOS LADOS
EJE E ENTRE EJES 4 Y 5		2,12	2,08	1	**4,41**	
EJE 4 ENTRE EJES C Y D		1,2	2,08	1	**2,50**	
EJE 4 ENTRE EJES D Y E		0,45	2,08	1	**0,94**	
EJE 5 ENTRE EJES C Y D		1,2	2,08	1	**2,50**	
EJE 5 ENTRE EJES D Y E		1,18	2,08	1	**2,45**	
				SUB-TOTAL	**24,46**	**24,46**
				VIENEN		
				TOTAL	**24,46**	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI				**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**			124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS				**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**			122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO		**ITEM**	6,2	**DESCRIPCION**	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	**UNIDAD**	M2	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES C Y D Y EJES 4 Y 5	1,16	2,12			2,46	
ENTRE EJES D Y E Y EJES 4 Y 5	1,16	2,12			2,46	
				SUB-TOTAL	4,92	4,92
				VIENEN		
				TOTAL	4,92	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO		**ITEM**	6,3	**DESCRIPCION**	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E Y F				1	1,00	

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO		**ITEM**	6,4	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				1	1,00	
				SUB-TOTAL	2,00	2,00
				VIENEN		
				TOTAL	2,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	6, ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO	**ITEM**	6,5	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				1	1,00	

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	8,SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS		**ITEM**	8,3	**DESCRIPCION**	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES A Y F				3	3	HALL DE ACCESO
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES A Y B				2	2	ODONTOLOGIA
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES B Y E				2	2	SALA DE ESPERA
ENTRE EJES 2 Y 3 Y EJES E Y F				2	2	CONSULTORIO 1
ENTRE EJES 3 Y 5 Y EJES A Y B				2	2	ESTERILIZACIO
ENTRE EJES 3 Y 5 Y EJES B Y C				2	2	OFIC JEFE
ENTRE EJES 3 Y 4 Y EJES C Y E				1	1	HALL
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				1	1	BAÑO
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				1	1	BAÑO
ENTRE EJES 3 Y 5 Y EJES E Y F				1	1	
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES A Y E				2	2	CORREDOR INT
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E F				2	2	COCINA
ENTRE EJES 6 Y7 Y EJES C Y E				1	1	CORREDOR INT
				SUB-TOTAL	22,00	22,00
				VIENEN		
				TOTAL	22,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	8,SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS		**ITEM**	8,4	**DESCRIPCION**	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO, NO	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE A ENTRE EJES 2 Y 3				2	2,00	ODONTOLOGIA
EJE A ENTRE EJES 3 Y 5				2	2,00	CITOLOGIAS
EJE B ENTRE EJES 2 Y 3				2	2,00	ODONT.SALA DE ESPERA
EJE B ENTRE EJES 3 Y 5				2	2,00	ESTERILIZACIO
EJE B ENTRE EJES 3 Y 5				2	2,00	CIT. Y OFIC JEFE
EJE C ENTRE EJES 3 Y 4				2	2,00	OF JEFE Y HALL
EJE C ENTRE EJES 4 Y 5				1	1,00	OF JEFE Y HALL
EJE E ENTRE EJES 2 Y 3				2	2,00	SALA Y CONSUL
EJE G ENTRE EJES 6 Y 7				1	1,00	COCINA
EJE 2 ENTRE EJES B Y D				2	2,00	SALA DE ESPERA
EJE 2 ENTRE EJES E Y F				1	1,00	CONSULTORIO
EJE 3 ENTRE EJES A Y B				2	2,00	ODONTO-CITOLO
EJE 3 ENTRE EJES B Y C				2	2,00	SALA DE ESP Y JEFE
EJE 3 ENTRE EJES E Y F				2	2,00	CONSULT Y HAL
EJE 5 ENTRE EJES A Y B				1	1,00	PASILLO INT
EJE 5 ENTRE EJES E Y F				1	1,00	HALL INT
EJE 6 ENTRE EJES E Y G				1	1,00	COCINA
EJE 7 ENTRE EJES E Y G				1	1,00	COCNIA
				SUB-TOTAL	29,00	**29,00**
				VIENEN		
				TOTAL	29,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.


E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024	

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	ITEM	9,2	DESCRIPCION	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	UNIDAD	ML	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

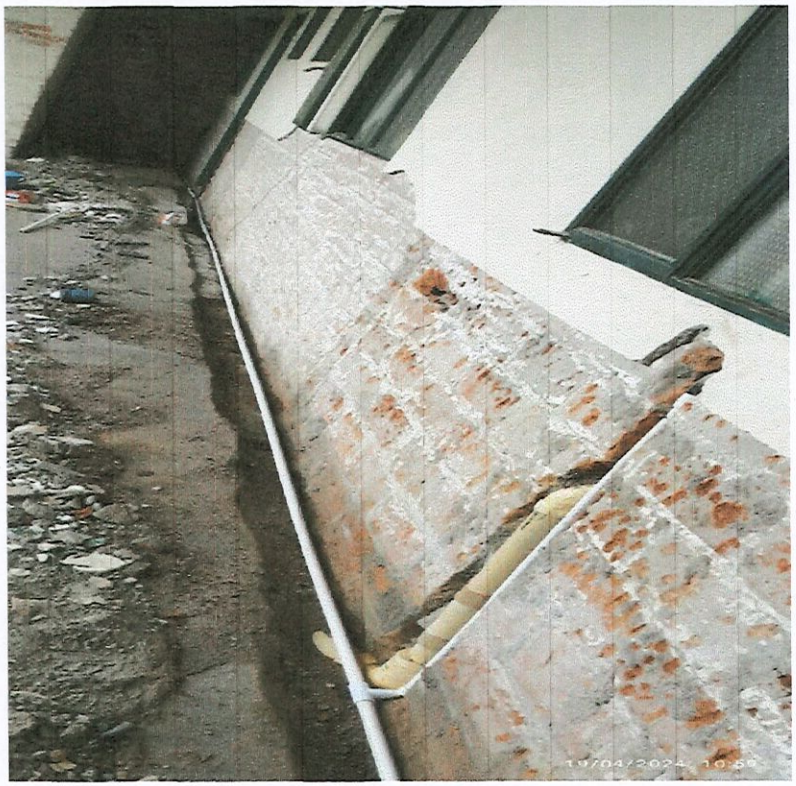

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE A ENTRE EJES 1 Y 6		14,35			14,35	
EJE 5 ENTRE EJES A Y F		12			12,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D		4			4,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E		4			4,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y B		3			3,00	
				SUB-TOTAL	37,35	37,35
				VIENEN		
				TOTAL	37,35	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos


Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,3	**DESCRIPCION**	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

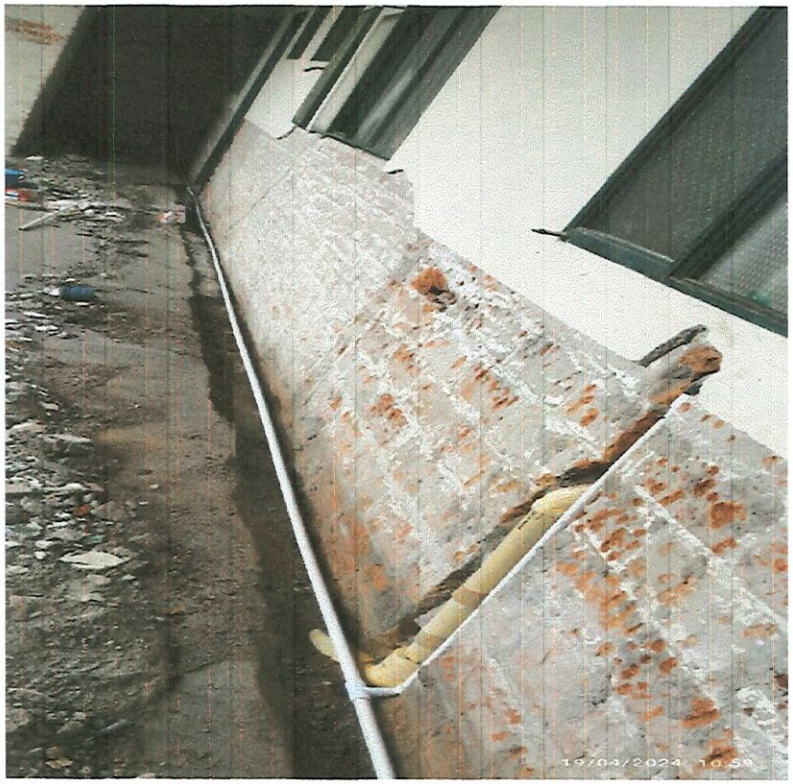

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE A ENTRE EJES 1 Y 5				4	4,00	
EJE 5 ENTRE EJES A Y F				1	1,00	
				SUB-TOTAL	5,00	5,00
				VIENEN		
				TOTAL	5,00	

OBSERVACIONES:


Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024		
CONTRATISTA	8					NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024		
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	ITEM	9,4	DESCRIPCION	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		

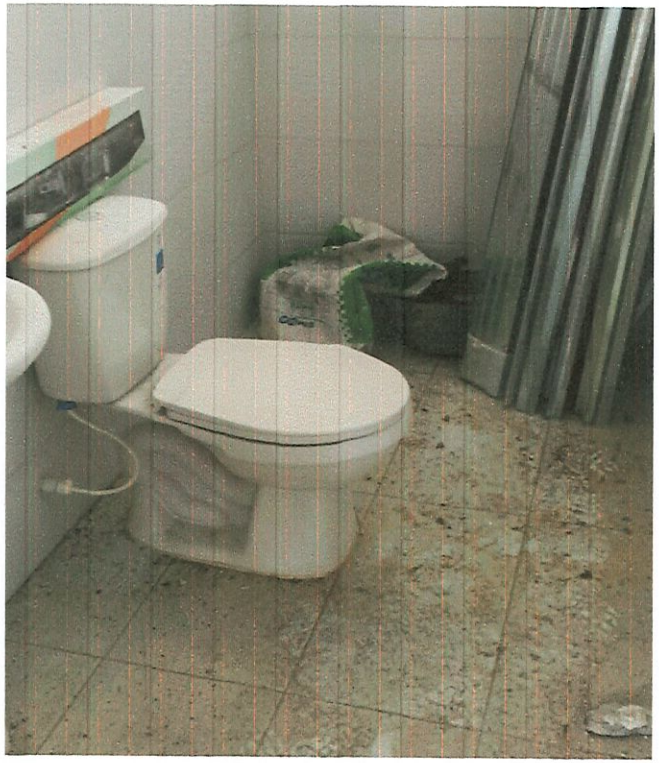

LOCALIZACION	DIMENSIONES			No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
	ANCHO	LARGO	ALTO			
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				1	1,00	
					SUB-TOTAL	2,00
					VIENEN	
					TOTAL	2,00

2,00

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos


Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI						NIT O CC	1.084.258.308	CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8						NIT O CC	12.169.279	CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		ITEM	9,5	DESCRIPCION	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	UNIDAD	UND	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	

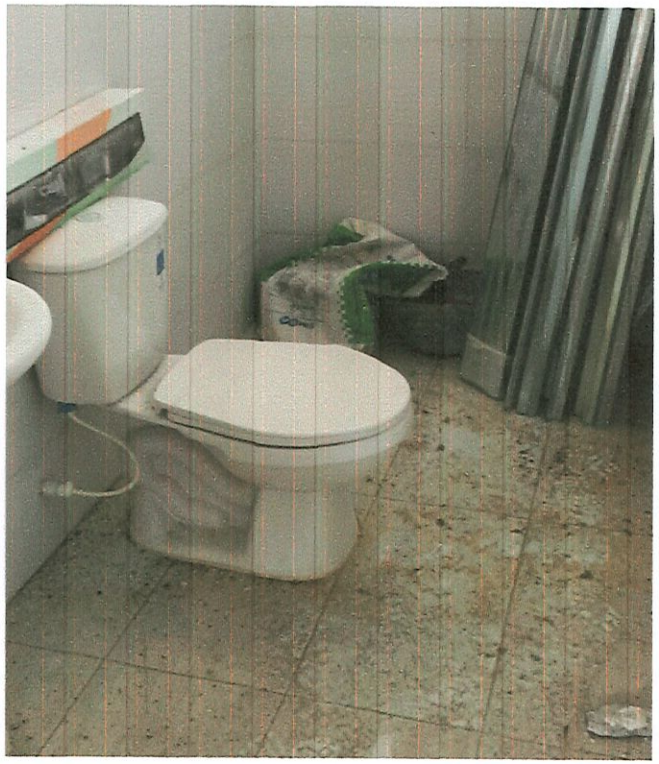

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				1	1,00	
				SUB-TOTAL	2,00	2,00
				VIENEN		
				TOTAL	2,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.


E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

PAGINA 1 DE 1

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024

CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,6	**DESCRIPCION**	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

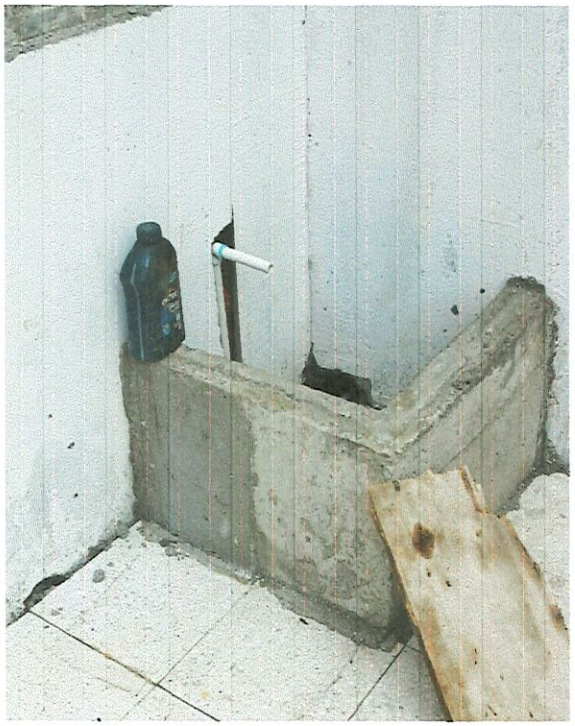

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E Y F				1	1,00	
					SUB-TOTAL	1,00
					VIENEN	1,00
					TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H.S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN									
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		**ITEM**	9,7	**DESCRIPCION**	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE		**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				1	1,00	
				SUB-TOTAL	2,00	2,00
				VIENEN		
				TOTAL	2,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024			**PAGINA 1 DE**		1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN						**CORTE No**	1	**ELABORO**		ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI						**NIT O CC**	1.084.258.308	**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8						**NIT O CC**	12.169.279	**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		**ITEM**	9,8	**DESCRIPCION**	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**		PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				1	1,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				1	1,00	
				SUB-TOTAL	2,00	2,00
				VIENEN		
				TOTAL	2,00	

OBSERVACIONES:


Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**ELABORO**	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	**PAGINA 1 DE** 1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,9	**DESCRIPCION**	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		

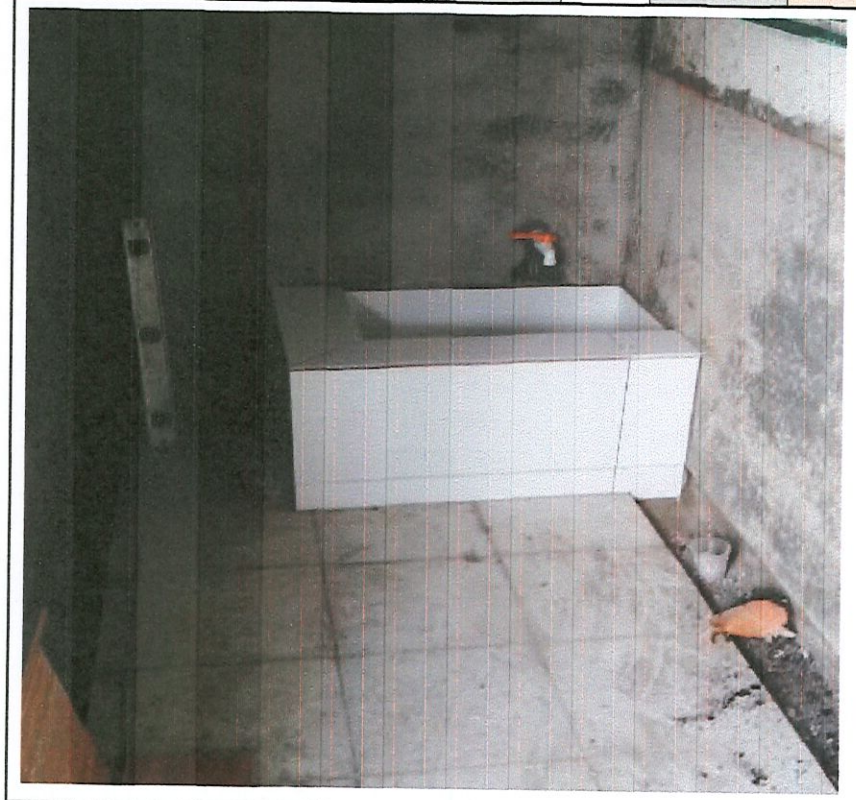

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E Y F				1	1,00	

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**PAGINA 1 DE**		1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN								**ELABORO**		ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		**ITEM**	9,10	**DESCRIPCION**	ACCESORIO SANITARIO 4"			**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				2	2,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				2	2,00	
EJE 5 ENTRE EJES C Y G				2	2,00	
EJE F ENTRE EJES 1 Y 5				2	2,00	
				SUB-TOTAL	8,00	**8,00**
				VIENEN		
				TOTAL	8,00	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024			**PAGINA 1 DE**		1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN						**CORTE No**	1	**ELABORO**		ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		**ITEM**	9,11	**DESCRIPCION**	ACCESORIO SANITARIO 3"		**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				2	2,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				2	2,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y B				2	2,00	
EJE 5 ENTRE EJES A Y C				2	2,00	
EJE A ENTRE EJES 1 Y 3				1	1,00	
EJE 2 ENTRE EJES A Y F				2	2,00	
					SUB-TOTAL	11,00
					VIENEN	
					TOTAL	11,00

11,00

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

								PAGINA 1 DE			1
FECHA	DIA	11	MES	6	AÑO	2024	CORTE No	1	ELABORO	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN										
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					NIT O CC	1.084.258.308		CONTRATO No	124 DEL 18 /03 /2024	
CONTRATISTA	8					NIT O CC	12.169.279		CONTRATO No	122 DEL 18 /03 /2024	
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS		ITEM	9,12	DESCRIPCION	TUBERÍA 4" SANITARIA		UNIDAD	ML	LUGAR	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA



OBSERVACIONES:

LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				2	2,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				2	2,00	
EJE 5 ENTRE EJES C Y G				5	5,00	
EJE F ENTRE EJES 1 Y 5				10,2	10,16	
				SUB-TOTAL	19,16	19,16
				VIENEN		
				TOTAL	19,16	

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024			**PAGINA 1 DE**		1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN						**CORTE No**	1	**ELABORO**		ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,13	**DESCRIPCION**	TUBERÍA 3" SANITARIA	**UNIDAD**	ML	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES C Y D				2	2,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES D Y E				2	2,00	
ENTRE EJES 4 Y 5 Y EJES A Y B				2	2,00	
EJE 5 ENTRE EJES A Y C				5,6	5,60	
EJE A ENTRE EJES 1 Y 3				3,6	3,60	
EJE 2 ENTRE EJES A Y F				12,3	12,30	
				SUB-TOTAL	27,50	27,50
				VIENEN		
				TOTAL	27,50	

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. S.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024	**CORTE No**	1	**PAGINA 1 DE**		1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN								**ELABORO**		ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,14	**DESCRIPCION**	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
ENTRE EJES 5 Y 6 Y EJES E Y F				1	1,00	
ENTRE EJES 1 Y 2 Y EJES E Y F				1	1,00	

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024			**PAGINA 1 DE**		1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN						**CORTE No**	1	**ELABORO**		ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,15	**DESCRIPCION**	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE 1 Y EJE 2				1	1,00	
EJE 1 ENTRE EJES 6 Y 7				1	1,00	
					SUB-TOTAL	2,00
					VIENEN	2,00
					TOTAL	2,00

OBSERVACIONES:

Vbo. Contratista Wilson Uni Collazos

Vbo. Interventoria Yudy Tatiana H. J.

E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS
DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA	**DIA**	11	**MES**	6	**AÑO**	2024			**PAGINA 1 DE**		1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN						**CORTE No**	1	**ELABORO**		ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
INTERVENTORIA	YUDY TATINANA HERNANDEZ SAMBONI					**NIT O CC**	1.084.258.308		**CONTRATO No**		124 DEL 18 /03 /2024
CONTRATISTA	8					**NIT O CC**	12.169.279		**CONTRATO No**		122 DEL 18 /03 /2024
CAPITULO	9, SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	**ITEM**	9,16	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	**UNIDAD**	UND	**LUGAR**	PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNCIIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA		



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	ALTO	No DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL	DESCRIPCION
EJE 6 CON EJE A				1	1,00	1100 LITROS
