OSCAR MORENO ROJAS

NIT 93379845-2

Ibagué, agosto 24 de 2024

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Doctora: SANDRA MILENA LONDOÑO RODRIGUEZ

Directora de Recursos Físicos

Ciudad.

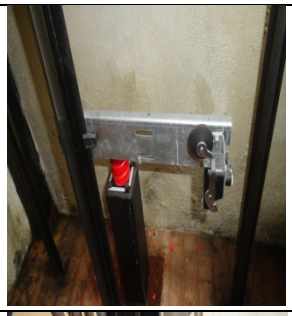
Ref. Respuesta a solicitud avance mantenimiento Ascensor Contrato 1965 2024

Respetado Doctora:

Me permito darle a conocer el estado actual de la ejecución para la Certificación NTC 5926-1, de acuerdo a la Inspección realizada por la empresa Certinex en junio 22 de 2024:

INFORME DE EJECUCION ACTIVIDADES PARA CERTIFICACION

"RP 34- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR UBICADO EN EL PALACIO MUNICIPAL					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	ESTADO	IMAGEN	% EJECUCIÓN
	LAS HOJAS DE VIDRIO LLEVAN MARCAS IDENTIFICATIVAS	1	CUMPLE		100
	LAS HOJAS DE VIDRIO LLEVAN MARCAS IDENTIFICATIVAS	1	CUMPLE		100

	LAS HOJAS DE VIDRIO LLEVAN MARCAS IDENTIFICATIVAS	1	CUMPLE		100
	EQUIPO DE ALARMA AUTONOMO(ES DECIR SIN BATERIA) COMPLETAMENTE AUDI BLE	1	CUMPLE		100
	NO DEBERA EXISTIR HUMEDAD HUMEDADES EN TECHO PAREDES Y SUELO DE LOS CUARTOS DE MAQUINAS, POLEAS Y DEL FOSO DEL ASCENSOR	1	CUMPLE		100
	NO DEBERA PRESENTAR OXIDACION EN CUALQUIER PARTE DEL CABLE TAL QUE , NO DEBE EXISTIR PERDIDA DE MATERIAL	1	CUMPLE		100
	LOS AMORTIGUADORES NO DEBERAN ESTAR OXIDADOS FISURADOS O SUELTOS	1	CUMPLE		100

	EXISTENCIA DE PLÑACA DE ESPECIFICACIONES DEL LIMITADOR O REGULADOR DE VELOCIDAD(EN DONDE SE ESTIPULE CUAL ES LA VELOCIDAD NOMINAL DE ACTUACION	1	NO CUMPLE		0

	EJECUCION TOTAL
	EJECUCION PARCIAL
	NO EJECUTADO

Atentamente,

OSCAR MORENO ROJAS

CONTRATISTA
