DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
INGENIERIA AL SERVICIO DEL ASCENSOR
NIT. 900.637.767-1

Santa Marta, 30 de julio 2024

Señores
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL MAGDALENA

Asunto: Informe de trabajos realizados

Mediante la presente, les estamos informando de los trabajos realizados en cada ascensor en el mes de junio del presente año:

ASCENSOR DE LOS JUZGADOS DE INFACIA Y ADOLESCENCIA

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite de la máquina.
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.
- Suministro y cambio de lubricadoras.
- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.

Dejando todo puesta en punta y sin ninguna novedad.

Evidencia fotográfica.






ASCENSOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA


Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite de la máquina.
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.
- Suministro y cambio de lubricadoras.
- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.
- Cambio de tarjeta
- Cambio de rellay
- Cambio motor operador de puertas
- Se instalo Fotocelda
- Se instalo lubricadoras

Evidencia fotográfica:

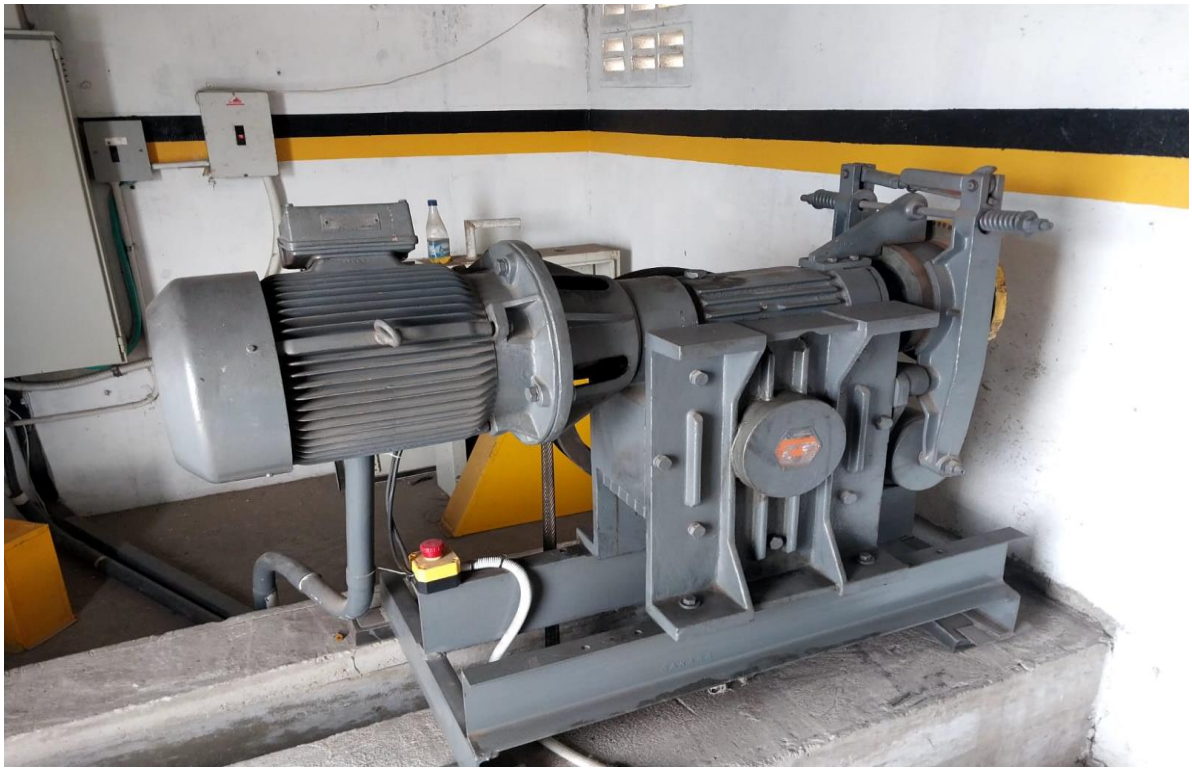

- 

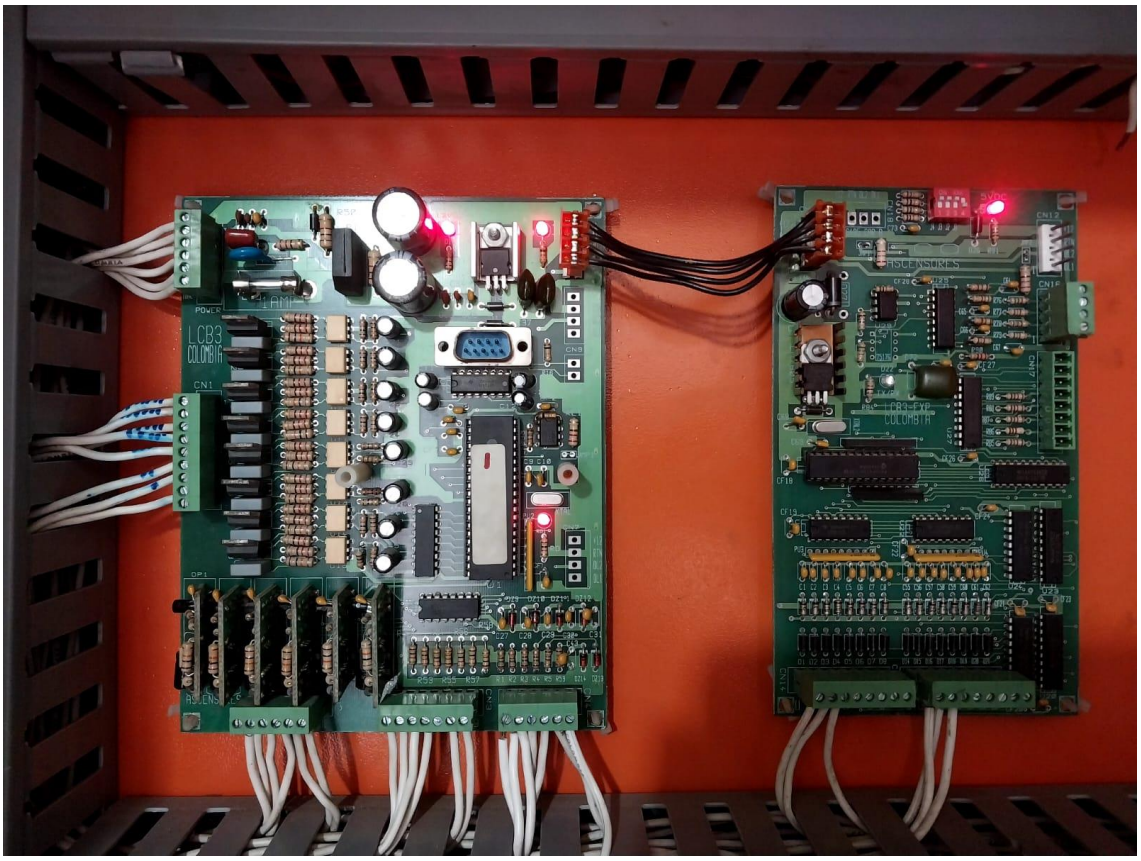
LCB3
COLOMBIA
CN1
ASCENSORES



ASCENSOR DEL EDIFICIO BENAVIDES MACEA DE SANTA MARTA-GRANDE

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite de la máquina.
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.
- Suministro y cambio de lubricadoras.
- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.
- Se suministro e instalo Kit de citofonía
- Ajustes de puertas
- Limpieza de recorrido
- Lubricación

Evidencia fotográfica:



- 
CAUTION
ALAMBRADO

ASCENSOR DEL EDIFICIO BENAVIDES MACEA DE SANTA MARTA-PEQUEÑO

En este ascensor ya se empezó a cambiar la parte tecnológica, se está instalando lo siguiente:

- Control marca Monarch
- Caja de inspección
- Inductoras de nivelación
- Encoder 1024 pulsos
- Cableado de pozo
- Variador de puertas
- Suiches para el variador de puertas
- Resistencia de frenado e iluminación encima de cabina
- Kit de citófono

ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA BATIENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PLATO – MAGDALENA

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite a la bomba
- Llenado de a la bomba
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.
- Suministro y cambio de lubricadoras.
- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.
- Ajustes de puertas
- Limpieza de recorrido
- Lubricación

Verificando que todo quedara en funcionamiento.

ASCENSOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIENAGA

Se realizo mantenimiento preventivo del ascensor, el cual costa de:

- Revisión de voltaje de control.
- Revisión de cada uno de los elementos tales como; contactores, tarjetas y variador de control.
- Revisión de aceite a la bomba
- Llenado de a la bomba
- Frenos.
- Bobina de freno.
- Revisión de guayas.
- Limpieza de contactos.
- Lubricación de guías.
- Suministro y cambio de lubricadoras.
- Verificación de voltaje al interior de la cabina, botones y display.
- Ajustes de puertas
- Limpieza de recorrido
- Lubricación

Verificando que todo quedara en funcionamiento.

Nota: El cambio tecnológico de control se realizará en el mes de septiembre, según cronograma enviado.

ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA BATIENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE EL BANCO – MAGDALENA

Se va a intervenir a partir de la segunda semana de agosto, según cronograma de trabajo.

No dudes en comentarme cualquier inquietud o duda que tengas al respecto a través de nuestros contactos.

Contactos: 3008268243 - 3008268243
Email: dasolucionesintegralessas@gmail.com

Somos un trabajo en equipo, quedamos atentos a cualquier duda, comentario o sugerencia.

Cordialmente,

DORIAN AGUIRRE
Gerente
