INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES
DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS INGENIERA CIVIL

Buenos Aires – Cauca 14 de agosto de 2024

OBJETIVO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. NOR1ESE-CAU-022-2023 COMO INGENIERA CIVIL PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. NOR1ESE- CAU-02- 2023 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA- CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD
NACIONAL "

☞ **PERIODO: - 19 de julio -14 de agosto de 2024**

1.- Ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos

ASUNTO	FECHA RADICADO	OBSERVACIÓN
Solicitud de informes técnicos de mayo de interventoría	18/006/2024	Enviado a interventoría email Respuesta de interventoría 21 de junio 2024
Comité técnico de obra No. 13	29/07/2024	Comité realizado por Google meet – Contratista-Interventoría -Supervisión
Comité técnico Biomédico	01/08/2024	Comité realizado por Google meet – Contratista-Interventoría -Supervisión-Ing. Biomédica ESE NORTE 1.
Solicitud de reprogramación de obra	02/08/2024	Enviado por interventoría a contratista oficio IHT-062
Solicitud pólizas actualizadas del reinicio 1	02/08/2024	Enviado por interventoría a contratista oficio IHT-063
Solicitud de informes sobre ejecución de los proyectos de infraestructura con recursos del PGN al contratista e interventoría	06/08/2024	Enviado a interventoría y contratista envió de informe de seguimiento los 25 de cada mes.
Visita de seguimiento al proyecto	09/08/2024	Recibido por email visita en sitio el día 14 de agosto de 2024.

Pólizas actualizadas contrato	09/08/2024	Recibido por email y reenviado a la jurídica de la ESE NORTE 1
Acta de visita de Minsalud	14/08/2024	Acta de visita Minsalud

OBSERVACIONES DE OBRA:

- Para este periodo se reinicia la obra el día 19 de Julio del 2024, pero los días 19 y 20 de Julio de presentan grandes alteraciones de orden público en la zona por lo cual los proveedores suspendieron el suministro de materiales a la falta de garantías, por lo cual el contratista labores físicas son retomadas el día 27 de julio. Teniendo así un atrás0 en el cronograma de obra, por lo cual en comité técnico 13 se solicita la entrega de un cronograma de obra ajustado las situaciones presentadas y teniendo en cuenta la prorroga en plazo que está en proceso de trámite por parte de la ESE NORTE 1 y no se tramito debido a la suspensión de la obra generado por las constantes situaciones de orden público, atrasos significativos en el suministro, las variaciones climáticas tan fuertes en la zona.
- A pesar de la situación anterior expuesta el contratista para la fecha de corte ejecuto un 30% para el 14 de agosto con respecto al porcentaje programado del 33% aun el esfuerzo del contratista el contrato presenta un atraso del 3,00% del acumulado.

- El día 14 de agosto se lleva a cabo en las instalaciones de la obra visita de seguimiento por parte del supervisor Minsalud, secretaria de salud departamental, contratista, interventoría y supervisión de obra la cual se anexa compromisos y avances

- Para la fecha de corte del presente informe la interventoría no ha presentado informes a corte de julio. Los informes cargados al PISIS son los elaborados por la supervisión del contrato.
- En el mes de julio la ESE NORTE 1 realizó el pago de las acta 1 y 2 de interventoría quedando así al día con los pagos.

PENDIENTES ESE NORTE 1

- Legalizar el Otrosí de prorroga 1 en plazo y valor para los tramites retie y retilab.
- Consignar los rendimientos financieros de la cuenta del proyecto a Minsalud año 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS



Imagen 1. Limpieza de obra



Imagen 2. Limpieza de obra



Imagen 3. Limpieza de obra



Imagen 4. Nivelación



Imagen 5. Hidratación material de relleno para compactación



Imagen 6. Compactación material de relleno



Imagen 7. Material de Relleno compactado



Imagen 8. Visita de seguimiento -Minsalud



Imagen. Instalación de tubería sanitaria bloque 2

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRATO DE OBRA

Para este periodo el consorcio TC-23 y consorcio IHT no presenta acta parcial de obra.

El avance de obra e interventoría se describen a continuación:

PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	% RETRASO/ AVANCE
Octubre				
$242.156.835	1.99%	$240.000.000	1.97%	-0.02%
Noviembre				
$279.531.551	2.30%	$264.530.254	2.17%	-0.12%
Diciembre				
$365.671.132	3.00%	$395.469.746	3.25%	+0.24%
Enero				
$672.057.436	5.52%	$462.181.567	3.80%	-1.72%
Febrero				
$1.014.975.312	8.34%	$266.870.410	2.19%	-6.15%
Reprogramación				
Marzo				
$93.575.767	0.77%	$852.002.494	7.00%	+0.01%
Abril				
$288.583.278	2.37%	$112.091.702	0.92%	-1.45%
Mayo				

$483.232.753	3.97%	$97.590.304	0.80%	-3.17%
Julio-Agosto	7.11%	$96.144.3828	7.90%	0.79%
Acumulado	**25.89%**	**$ 3.442.498.481**	**30 %**	

Estos rubros se tienen en cuenta con respecto a la forma de pago pactada en el contrato.

Obra			
Valor Obra		$	12.170.175.042
Acta Parcial	90%	$	10.953.157.538
Liquidación	10%	$	1.217.017.504

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

ESTADO DEL CONTRATO		
DESCRIPCION	**VALOR EJECUTADO**	**% AVANCE**
ACTA PARCIAL 1	$ 1.361.972.959,00	11,19%
ACTA PARCIAL 2	$ 1.119.081.694,00	9,20%
VALOR TOTAL	**$ 2.481.054.653,00**	**20,39%**

ESTADO AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTICIPO	**$**	**4.868.070.017**
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 1	$	544.789.184
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 2	$	447.632.678
TOTAL, AMORTIZADO	**$**	**992.421.862**
SALDO POR AMORTIZAR	**$**	**3.875.648.155**

SEGUIMIENTO AL AVANCE INTERVENTORIA

Avance Financiero de contrato interventoría **NOR1ESE-CAU-01-2023 CONSORCIO IHT**.

Forma de pago de Interventoría			
Valor Interventoría		**$626.859.801**	
Forma de Pago			
Avance Obra Física	70%	$438.801.861	mensual
Cuota mensual 17 cuotas	20%	$125.371.960	$ 7.374.821
Liquidación	10%	$62.685.980,00	

PERIODO	AVANCE MENSUAL FIJO	% EJEC OBRA	AVANCE INTERV	% AVAN MES	% AVANA CUM
Octubre	$7.374.821	1.97%	$ 8.653.322	2.56%	2.56%
Noviembre	$7.374.821	2.17%	$ 9.537.773	2.70%	5.25%
Diciembre	$7.374.821	3.25%	$14.258.863	3.45%	8.71%
Enero	$7.374.821	3.80%	$16.664.192	3.83%	12.54%
Febrero	$7.374.821	2.19%	$9.622.149	2.71%	15.25%
Marzo	$7.374.821	7.00%	$38.110.222	6.08%	21.33%
Abril	$7.374.821	0.92%	$11.411.798	1.82%	23.15%
Mayo	$7.374.821	0.80%	$10.893.489	1.74%	24.89%
Juli-Agosto	$7.374.821	7.90%	$43.077.293	6,87%	31,76%
Acumulado		**30.00%**	**$199.091.735**	**31.76%**	

ESTADO FINANCIERO INTERVENTORIA

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$626.859.801
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA	
VALOR ACTA 1 -PAGADA	$78.601.214
VALOR ACTA 2 -PAGADA	$55.119.412
VALOR ACUMULADO	$133.720.626
SALDO POR EJECUTAR	$493.139.175

ESE NORTE 1
¡Está en ti, en mí, en nosotros!

2.- solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando al incumplimiento se presente.	**ASUNTO**	**FECHA RADICADO**	**OBSERVACIÓN**
	Radicación de facturas contrato de interventoría NOR1ESE-CU-002-2023	05/006/2024	Enviado email gerencia y administración ESE NORTE 1
	Solicitud de rendimientos financieros de la cuenta de proyecto 2023	29/06/2024	Enviado por email Sr. Diego Erney Campo Sánchez
	Drive informaci ón de pisis para el cargue	29/06/2024	Por email se envía al Ing. sistemas Rodrigo Gómez las carpetas para el cargue en el pisis.
	Radicaciones informes de seguimiento	29/06/2024	Radicado por email supervisor Minsalud, secretaria de salud departamental y ESE NORTE 1
	Radicado de salud y protección social	04/07/2024	Radicado Id61153 Notificación por email a la gerencia y administración de la ESE NORTE 1.
	Recibo de comprobantes reintegros rendimientos financieros obra timba	10/07/204	Recibido vía correo electrónico por parte del Sr. Diego Erney Campo Sánchez-administrador ESE NORTE 1
	Recibo de formatos de informe	26/07/2024	Recibido vía correo de gerencia ESE NORTE 1
	Soporte cargue de información en pisis por parte Ing. Rodrigo Gómez	26/07/2024	Recibido vía correo electrónico
	Se envía proceso y formatos para reporte de rendimientos financieros a la cuenta nacional	29/07/2024	Envía correo electrónico del Sr. Diego Erney Campo Sánchez-administrador ESE NORTE 1
	Informe proyecto enviado para	29/07/2024	Envía correo electrónico del Sr. Diego Erney Campo

secretaria de salud departamental		Sánchez- administrador ESE NORTE 1
Soporte rendimientos financieros a junio 2024	30/07/2024	Envía correo electrónico del Sr. Diego Erney Campo Sánchez- administrador ESE NORTE 1
Soporte cargue de información en pisis por parte Ing. Rodrigo Gómez	31/07/2024	Recibido vía correo electrónico
Reiteración en el reporte de información relacionada con la resolución 933 de 2022	08/08/2024	Envía correo electrónico secretaria departamento- administrativo – gerencia.
Informe ejecución julio resolución 933 centro salud timba	12/08/2024	Enviado correo electrónico secretaria de salud departamental- supervisor ministerio - gerencia y administración ESE NORTE 1
Radicado de salud y protección social	12/07/2024	Radicado Id145262 Notificación por email a la gerencia y administración de la ESE NORTE 1.
Soporte cargue de información en pisis por parte Ing. Rodrigo Gómez	12/08/2024	Recibido vía correo electrónico
Radicación formato de seguimiento Excel centro salud timba cauca	14/08/2004	Enviado por email supervisor -gerencia- administración - interventoría

- Se solicita al contratista e interventoría la entrega de informes el día 25 de cada mes con el fin de cumplir con las fechas establecida por la secretaria de salud departamental y poder cumplir con el informe de supervisión para el día 29 de cada mes y reportar la información al PISIS por parte del ingeniero de sistemas.
- A la fecha de este informa se encuentran al día toda la información en PISIS y radicación de informes.

ANEXOS:

- Comité de obra No. 13
- Comité de técnico profesional Biomédica ESE NORTE 1
- Oficios e información soporte de seguimiento
- Informe contratista
- Registro informe al secop 2
- Factura electrónica
- Seguridad social

DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
Ingeniera Civil
CONTRATISTA ESE NORTE 1 BUENOS AIRES SUAREZ

Buenos Aires - Suárez
ESE NORTE 1
¡Está en ti, en mí, en nosotros!

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIANA MUÑOZ ROJAS INGENIERA CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1065a4a3defa5435d060358eb4750f6468584d6853fb8b5faacfadba4fcc2247ab470138845f94786b97b6a556c7f504

Número de Factura: FEVD-202
Fecha de Emisión: 06/09/2024
Fecha de Vencimiento: 06/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ ROJAS DIANA CAROLINA
Nombre Comercial: MUÑOZ ROJAS DIANA CAROLINA
Nit del Emisor: 31714327
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112;9319

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 77 3 N 35 BRR FLORALIA
Teléfono / Móvil: 3116433720
Correo: dianarojas.ingcivil@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9001460106
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Buenos Aires
Dirección: CALLE PRINCIPAL BUENOS AIRES CAUCA
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: administracion@esenorte1.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	80101706	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NOR1ESE CAU 022 2024 COMO INGENIERA CIVIL PARA LA SUPERVISION AL CONTRATO DE INTEERVENTORIA No NOR1ESECAU 02 2023 INT TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE CONST CENTRO SALUD TIMBA	NIU	1,00	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00

Notas Finales

Pago del mes de julio -agosto de 2024. Supervisión de proyecto Centro de salud timba Cauca
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/09/2024 09:32:54
Documento validado por la DIAN:
06/09/2024 09:32:55
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074799828 Rango desde: 201 Rango hasta: 300 Vigencia: 2026-07-10

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-08-10, 09:27:17 PM **Tipo Planilla:** Y: Planilla independientes empresas **Número Planilla:** 72605201

Periodo Cotización: julio de 2024

Periodo Servicio: julio de 2024

PAGADO 10/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Datos del Aportante

Razón Social	LEON CONSTRUCTORES OBRAS Y DISEÑOS SAS		
Documento	NI901071389	**Dirección**	CL 77 #3 N - 35
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4330701
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MUÑOZ ROJAS DIANA CAROLINA	**Identificación**	CC 31714327

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 111.400	$ 0	$ 111.400
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
Total Pagado				$ 567.400	$ 0	$ 567.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-10, 09:21:52 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LEON CONSTRUCTORES OBRAS Y DISEÑOS SAS
NIT	NI 901071389
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72605201
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	837036999
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 567.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 111.400	$ 0
		SubTotales:		$ 567.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 567.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	7,995,649,763.71	*SALDO PROMEDIO*	$	8,000,587,980
TOTAL ABONOS	$	57,300,676.41	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	51,772,337.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,076,489.41
SALDO ACTUAL	$	8,001,178,103.12	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	ABONO INTERESES AHORROS			327,277.33	7,995,977,041.04
3/01	PAGO INTERBANC ASMET SALUD EPS			51,772,337.00	8,047,749,378.04
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			329,409.87	8,048,078,787.91
5/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-51,772,337.00	7,996,306,450.91
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			3,273,645.10	7,999,580,096.01
25/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			451,850.00	8,000,031,946.01
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,146,157.11	8,001,178,103.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	8,001,178,103.12	*SALDO PROMEDIO*	$	7,988,480,651
TOTAL ABONOS	$	4,741,844.05	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	40,408,620.10	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,741,844.05
SALDO ACTUAL	$	7,965,511,327.07	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			3,111,825.67	8,004,289,928.79
20/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	8,004,282,738.79
20/02	PAGO A PROV			-40,400,064.00	7,963,882,674.79
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	7,963,881,308.69
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,630,018.38	7,965,511,327.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	7,965,511,327.07	*SALDO PROMEDIO*	$	7,467,234,079
TOTAL ABONOS	$	3,174,847.51	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	814,666,331.10	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,164,906.51
SALDO ACTUAL	$	7,154,019,843.48	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			544,506.66	7,966,055,833.73
6/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			9,941.00	7,966,065,774.73
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			762,372.81	7,966,828,147.54
13/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	7,966,820,957.54
13/03	PAGO A PROV			-814,657,775.00	7,152,163,182.54
13/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	7,152,161,816.44
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,858,027.04	7,154,019,843.48
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	7,154,019,843.48	*SALDO PROMEDIO*	$	6,484,363,937
TOTAL ABONOS	$	2,659,968.22	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	669,744,572.10	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,659,968.22
SALDO ACTUAL	$	6,486,935,239.60	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	7,154,012,653.48
1/04	PAGO A PROV			-669,736,016.00	6,484,276,637.48
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	6,484,275,271.38
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,659,968.22	6,486,935,239.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,486,935,239.60	*SALDO PROMEDIO*	$	6,487,023,942
TOTAL ABONOS	$	2,749,780.16	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,749,780.16
SALDO ACTUAL	$	6,489,685,019.76	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,749,780.16	6,489,685,019.76

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,489,685,019.76	*SALDO PROMEDIO*	$	6,489,773,759
TOTAL ABONOS	$	2,662,187.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,662,187.42
SALDO ACTUAL	$	6,492,347,207.18	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,662,187.42	6,492,347,207.18

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre Proyecto:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCION TIMBA DE LA ESE NORTE 1
Entidad Beneficiaria:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE
No. Resolución de Asignación:	0977 DE 2023
Valor Asignado	12.822.328.154,00
Valor Transferido MSPS:	12.822.328.154,00
Fecha de Giro:	29 DE JUNIO DE 2023
Acto Administrativo Incorporación Recursos:	ACUERDO No. 005 DE JUNIO 17 DE 2023
Entidad Bancaria (Manejo de Recursos):	BANCOLOMBIA
No. Cuenta Bancaria	83800006114
Tipo de Cuenta:	CUENTA DE AHORROS
Fecha de Apertura de la Cuenta:	14 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Cancelación de la Cuenta:	N/A

Detalle

Año: 2023		
Mes	**Valor**	**Soporte**
Enero	$ -	Extracto Enero
Febrero	$ -	Extracto Febrero
Marzo	$ -	Extracto Marzo
Abril	$ -	Extracto Abril
Mayo	$ -	Extracto Mayo
Junio	$ 524.842,57	Extracto Junio
Julio	$ 8.137.807,54	Extracto Julio
Agosto	$ 8.142.972,07	Extracto Agosto
Sptiembre	$ 7.885.215,95	Extracto Septiembre
Octubre	$ 6.674.494,08	Extracto Octubre
Noviembre	$ 4.925.739,41	Extracto Noviembre
Diciembre	$ 5.108.992,19	Extracto Diciembre
Total Año 20XX	**$ 41.400.063,81**	

Año: 2024		
Mes	**Valor**	**Soporte**
Enero	$ 5.528.339,41	Extracto Enero
Febrero	$ 4.741.844,05	Extracto Febrero
Marzo	$ 3.164.906,51	Extracto Marzo
Abril	$ 2.659.968,22	Extracto Abril
Mayo	$ 2.749.780,16	Extracto Mayo
Junio	$ 2.662.187,42	Extracto Junio
Julio	$ -	Extracto Julio
Agosto	$ -	Extracto Agosto
Sptiembre	$ -	Extracto Septiembre
Octubre	$ -	Extracto Octubre
Noviembre	$ -	Extracto Noviembre
Diciembre	$ -	Extracto Diciembre
Total Año 20XX	**$ 21.507.025,77**	

Gran Total	**$**	**62.907.089,58**

NOTA: LOES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPONIDENTE A LA VIGENCIA 2023 FUERON REINTEGRADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, EN CUANTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2024, SERAN DEPOSITADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024

Firma Tesorero

VoBo. Jefe Área Financiera

Powered by CamScanner

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre Proyecto:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCION TIMBA DE LA ESE NORTE 1
Entidad Beneficiaria:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE
No. Resolución de Asignación:	0977 DE 2023
Valor Asignado	12.822.328.154,00
Valor Transferido MSPS:	12.822.328.154,00
Fecha de Giro:	29 DE JUNIO DE 2023
Acto Administrativo Incorporación Recursos:	ACUERDO No. 005 DE JUNIO 17 DE 2023
Entidad Bancaria (Manejo de Recursos):	BANCOLOMBIA
No. Cuenta Bancaria	83800006114
Tipo de Cuenta:	CUENTA DE AHORROS
Fecha de Apertura de la Cuenta:	14 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Cancelación de la Cuenta:	N/A

Detalle

Año: 2023		
Mes	**Valor**	**Soporte**
Enero	$ -	Extracto Enero
Febrero	$ -	Extracto Febrero
Marzo	$ -	Extracto Marzo
Abril	$ -	Extracto Abril
Mayo	$ -	Extracto Mayo
Junio	$ 524.842,57	Extracto Junio
Julio	$ 8.137.807,54	Extracto Julio
Agosto	$ 8.142.972,07	Extracto Agosto
Sptiembre	$ 7.885.215,95	Extracto Septiembre
Octubre	$ 6.674.494,08	Extracto Octubre
Noviembre	$ 4.925.739,41	Extracto Noviembre
Diciembre	$ 5.108.992,19	Extracto Diciembre
Total Año 20XX	**$ 41.400.063,81**	

Año: 2024		
Mes	**Valor**	**Soporte**
Enero	$ 5.528.339,41	Extracto Enero
Febrero	$ 4.741.844,05	Extracto Febrero
Marzo	$ 3.164.906,51	Extracto Marzo
Abril	$ 2.659.968,22	Extracto Abril
Mayo	$ 2.749.780,16	Extracto Mayo
Junio	$ 2.662.187,42	Extracto Junio
Julio	$ -	Extracto Julio
Agosto	$ -	Extracto Agosto
Sptiembre	$ -	Extracto Septiembre
Octubre	$ -	Extracto Octubre
Noviembre	$ -	Extracto Noviembre
Diciembre	$ -	Extracto Diciembre
Total Año 20XX	**$ 21.507.025,77**	

Gran Total	**$**	**62.907.089,58**

NOTA: LOES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPONIDENTE A LA VIGENCIA 2023 FUERON REINTEGRADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, EN CUANTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2024, SERAN DEPOSITADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024

Firma Tesorero

VoBo. Jefe Área Financiera

Powered by CamScanner

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	7,995,649,763.71	*SALDO PROMEDIO*	$	8,000,587,980
TOTAL ABONOS	$	57,300,676.41	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	51,772,337.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,076,489.41
SALDO ACTUAL	$	8,001,178,103.12	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	ABONO INTERESES AHORROS			327,277.33	7,995,977,041.04
3/01	PAGO INTERBANC ASMET SALUD EPS			51,772,337.00	8,047,749,378.04
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			329,409.87	8,048,078,787.91
5/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-51,772,337.00	7,996,306,450.91
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			3,273,645.10	7,999,580,096.01
25/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			451,850.00	8,000,031,946.01
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,146,157.11	8,001,178,103.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	8,001,178,103.12	*SALDO PROMEDIO*	$	7,988,480,651
TOTAL ABONOS	$	4,741,844.05	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	40,408,620.10	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,741,844.05
SALDO ACTUAL	$	7,965,511,327.07	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			3,111,825.67	8,004,289,928.79
20/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	8,004,282,738.79
20/02	PAGO A PROV			-40,400,064.00	7,963,882,674.79
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	7,963,881,308.69
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,630,018.38	7,965,511,327.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	7,965,511,327.07	*SALDO PROMEDIO*	$	7,467,234,079
TOTAL ABONOS	$	3,174,847.51	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	814,666,331.10	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,164,906.51
SALDO ACTUAL	$	7,154,019,843.48	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			544,506.66	7,966,055,833.73
6/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			9,941.00	7,966,065,774.73
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			762,372.81	7,966,828,147.54
13/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	7,966,820,957.54
13/03	PAGO A PROV			-814,657,775.00	7,152,163,182.54
13/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	7,152,161,816.44
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,858,027.04	7,154,019,843.48
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	7,154,019,843.48	*SALDO PROMEDIO*	$	6,484,363,937
TOTAL ABONOS	$	2,659,968.22	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	669,744,572.10	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,659,968.22
SALDO ACTUAL	$	6,486,935,239.60	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	7,154,012,653.48
1/04	PAGO A PROV			-669,736,016.00	6,484,276,637.48
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	6,484,275,271.38
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,659,968.22	6,486,935,239.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,486,935,239.60	*SALDO PROMEDIO*	$	6,487,023,942
TOTAL ABONOS	$	2,749,780.16	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,749,780.16
SALDO ACTUAL	$	6,489,685,019.76	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,749,780.16	6,489,685,019.76

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83800006114

SUCURSAL SANTANDER DE QUILICHAO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

HOSPITAL CLE PPAL BUENOS AIRES

CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXTER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,489,685,019.76	*SALDO PROMEDIO*	$	6,489,773,759
TOTAL ABONOS	$	2,662,187.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,662,187.42
SALDO ACTUAL	$	6,492,347,207.18	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,662,187.42	6,492,347,207.18


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gmail **construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>**

Cargue Rendimientos Financieros HTimba

1 mensaje

Ing. Rodrigo Gómez G. <sistemas@esenorte1.gov.co> 31 de julio de 2024, 4:31 p.m.
Para: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>
CC: administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>

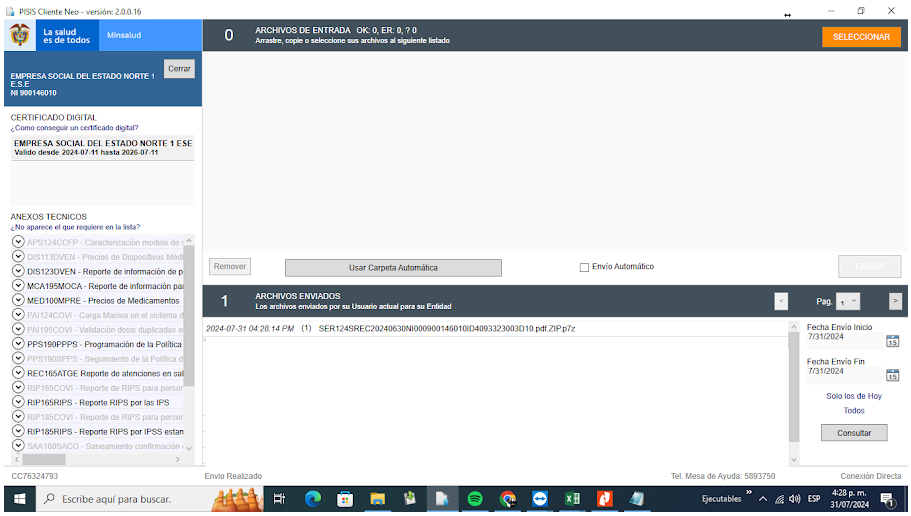

RODRIGO GÓMEZ GALÍNDEZ
Área Sistemas de Informacion
Cel: 3113-556046

Gmail **construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>**

INFORMACIÓN CENTRO SALUD TIMBA

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 4 de julio de 2024, 12:09 p.m.
Para: viafaral@gmail.com

Cordial saludo.

Adjunto la información solicitada por medio de Whatsapp.

Atentamente

Diana Muñoz

2 archivos adjuntos

Acta de suspensión Cto 01-2023.pdf
576K

01-2023 CONTRATO No. NOR1ESE-CAU 01-2023 CONSORCIO T-C 23.pdf
1400K

Gmail construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

INFORMACION CARGUE PISIS CENTRO SALUD TIMBA CAUCA ID4093323003

2 mensajes

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 31 de agosto de 2024, 8:00 a.m.
Para: "Ing. Rodrigo Gómez G." <sistemas@esenorte1.gov.co>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo. Ingeniero


Adjunto link de drive https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1mUXAYQ1bBwglTaUoDMCcZ6l17Sx0BX7- por favor cargar los archivos de las carpetas asi :
3 contratos / carpeta agosto/ actas de reinicio de obra
4 polizas / carpeta agosto/ polizas renicio
6 Informes /carpeta 2024 / carpeta agosto /informe julio

Gracias por su atencion

Atentamente

Diana Muñoz

Ing. Rodrigo Gómez G. <sistemas@esenorte1.gov.co> 31 de agosto de 2024, 2:57 p.m.
Para: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

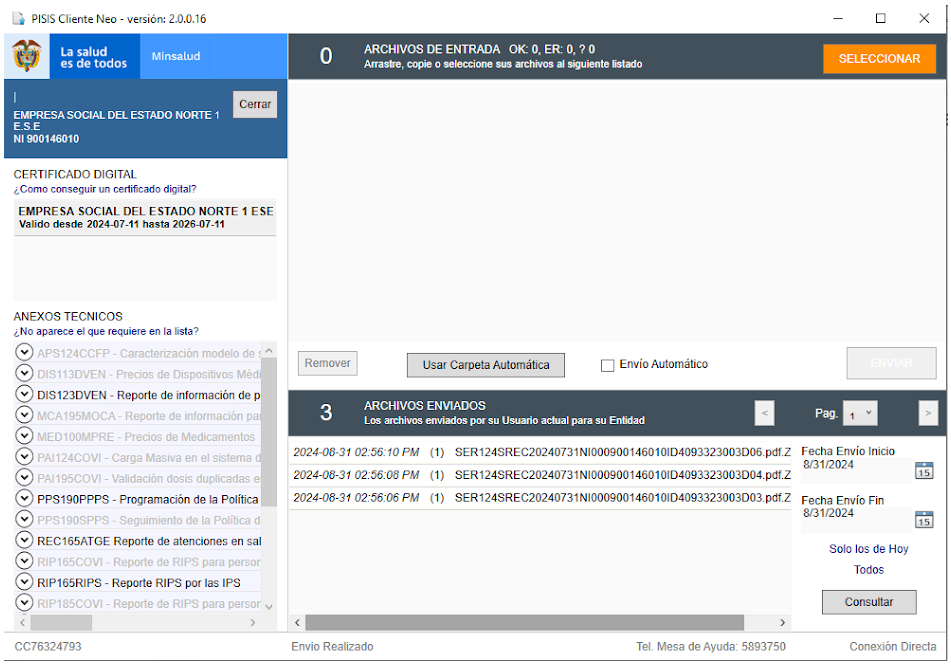

RODRIGO GÓMEZ GALÍNDEZ
Área Sistemas de Informacion
Cel: 3113-556046

[Texto citado oculto]

Gmail **construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>**

FORMATOS PARA REPORTE DE REINTEGROS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MINSALUD

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 29 de julio de 2024, 11:45 a.m.
Para: administracion@esenorte1.gov.co, gerencia@esenorte1.gov.co

Cordial saludo,

Don Diego, adjunto los formatos en los cuales se debe diligenciar la información de reportes y reintegros al ministerio. Por favor enviarmelos en cuanto los tenga listos para actualizar la carpeta del Pisis. Gracias

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor

2 archivos adjuntos

Anexo 3 Formato Rendimientos Financieros V1.xlsx
13K

Anexo 3 Formato Varias Entidades Territoriales.XLS
247K

Gmail **construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>**

Fwd: información instrutivos rendimientos financieros

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 29 de julio de 2024, 12:16 p.m.
Para: administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Inti Gabriel Rojas Parada** <irojasp@minsalud.gov.co>
Date: mar, 12 mar 2024 a la(s) 4:57 p.m.
Subject: información relativa a los rendimientos financieros
To: construccionhtimba@gmail.com <construccionhtimba@gmail.com>

psi

Inti Gabriel Rojas Parada

irojasp@minsalud.gov.co

Teléfono: 601 330 5000 Ext. 1787

Subdirección de Infraestructura en Salud

Cra. 13 No. 32- 76

Bogotá, Colombia

www.minsalud.gov.co

2 archivos adjuntos

3. Instructivo devolución de Rendimientos Financieros y reintegro de recursos.pdf
395K

4. Paso a paso PSE para CUENTAS BCO AGRARIO.PDF
838K

Gmail **construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>**

INFORMACIÓN CENTRO SALUD TIMBA

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 4 de julio de 2024, 12:09 p.m.
Para: viafaral@gmail.com

Cordial saludo.

Adjunto la información solicitada por medio de Whatsapp.

Atentamente

Diana Muñoz

2 archivos adjuntos

Acta de suspensión Cto 01-2023.pdf
576K

01-2023 CONTRATO No. NOR1ESE-CAU 01-2023 CONSORCIO T-C 23.pdf
1400K

Gmail **construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>**

INFORMES EJECUCION RECURSOS ESE NORTE 1 CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA – CAUCA

3 mensajes

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 29 de junio de 2024, 10:14 a.m.
Para: correo@minsalud.gov.co, irojasp@minsalud.gov.co
CC: gerencia@esenorte1.gov.co, didiergolondrino.salud@cauca.gov.co

Cordial saludo.
Señores Ministerio de Salud y la Protección Social

Adjunto informes de la ejecución de los recursos asignados en Resolución 933 de 2023 modificada por la Resolución 977 de 2023 a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E. en el drive.

Drive:https://drive.google.com/drive/u/7/folders/18sQ8IeZV8YMv4OX5t__Lj9RwvtwlSb5A

DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
Supervisor contratista ESE NORTE 1

Inti Gabriel Rojas Parada <irojasp@minsalud.gov.co> 3 de julio de 2024, 5:04 p.m.
Para: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>, Correo <correo@minsalud.gov.co>
CC: "gerencia@esenorte1.gov.co" <gerencia@esenorte1.gov.co>, "didiergolondrino.salud@cauca.gov.co" <didiergolondrino.salud@cauca.gov.co>

Cordial saludo,

De antemano agradezco la remisión de los informes del asunto. Sin embargo se hacen las siguientes aclaraciones.

1. En el marco de la Resolución 2361 de 2016, los informes deben cargarse también en la plataforma PISIS - SISPRO. Dado que, en revisión de la plataforma, se evidencia que el ultimo informe cargado hace relación al mes de febrero de 2024.
2. Por otra parte, al presente se anexa archivo excel de "FORMATO SEGUIMIENTO PROYECTOS SUBD. INFRAESTRUCTURA EN SALUD", el cual es un informe ejecutivo donde se resume el avance y estado actual del proyecto. Así las cosas, se solicita amablemente que, por parte de la supervisión de los contratos, sea diligenciado y remitido el avance del proyecto en el formato anexo al presente correo.

Agradezco su colaboración para el diligenciamiento de la ficha en Excel, con la información del estado actual del proyecto, y su remisión y cargue a PISIS, debidamente firmados.

Quedo pendiente a sus comentarios.

Atentamente,

Inti Gabriel Rojas Parada
irojasp@minsalud.gov.co
Teléfono: 601 330 5000 Ext. 1787
Subdirección de Infraestructura en Salud
Cra. 13 No. 32- 76
Bogotá, Colombia
www.minsalud.gov.co

De: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>
Enviado: sábado, 29 de junio de 2024 10:14
Para: Correo <correo@minsalud.gov.co>; Inti Gabriel Rojas Parada <irojasp@Minsalud.gov.co>
Cc: gerencia@esenorte1.gov.co <gerencia@esenorte1.gov.co>; didiergolondrino.salud@cauca.gov.co <didiergolondrino.salud@cauca.gov.co>
Asunto: INFORMES EJECUCION RECURSOS ESE NORTE 1 CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA – CAUCA

[Texto citado oculto]

FORMATO SEGUIMIENTO PROYECTOS SUBD. INFRAESTRUCTURA EN SALUD.xls
66K

---

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 10 de julio de 2024, 8:00 a.m.
Para: Inti Gabriel Rojas Parada <irojasp@minsalud.gov.co>
CC: Correo <correo@minsalud.gov.co>, "gerencia@esenorte1.gov.co" <gerencia@esenorte1.gov.co>, "didiergolondrino.salud@cauca.gov.co" <didiergolondrino.salud@cauca.gov.co>

Cordial saludo.

Adjunto a la presente el enlace del Drive de informes mensuales y ficha de seguimiento en excel y firmada en pdf.

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1E4dV3EJRD0s_FnBzufF_bDSAY9jxFyxn

Adjunto enlace drive para acceso de la carpeta que contiene la información para cargar en PISIS.

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1mUXAYQ1bBwglTaUoDMCcZ6l17Sx0BX7-

DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
Supervisor contratista ESE NORTE 1

[Texto citado oculto]
NOTA: La información cargada en la plataforma PISCIS- SISPRO fue del 29 de Junio 2024 con la información a corte mayo.

Gracias por la atención.
[Texto citado oculto]

Gmail **construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>**

INFORMES PROYECTO CENTRO SALUD TIMBA CAUCA

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 29 de julio de 2024, 11:58 a.m.
Para: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>
CC: administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>, "Ing. Rodrigo Gómez G." <sistemas@esenorte1.gov.co>, didiergolondrino.salud@cauca.gov.co

Buenos días Sra. Vivian Anyeli Rivera Corrales

Con respecto a los informes de ejecución del Proyecto Construcción Centro de Salud TImba Cauca. Adjunto los Link de acceso a los informes reportados a MinSalud y al Arq. Hinty Gabriel Rojas supervisor del contrato a través del correo electrónico.

- Drive de informes mensuales y ficha de seguimiento en excel y firmada en pdf.

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1E4dV3EJRD0s_FnBzufF_bDSAY9jxFyxn

- Drive para acceso de la carpeta que contiene la información de 12 componentes para cargar en PISCIS y de la otra carpeta OTROS que se carga información adicional.

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1mUXAYQ1bBwglTaUoDMCcZ6l17Sx0BX7-

ATENTAMENTE

DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
SUPERVISOR

Buenos días

El vie., 26 de julio de 2024 8:21 a. m., gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co> escribió:

> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Vivian Anyeli Rivera Corrales** <vivian.rivera@cauca.gov.co>
> Date: jue, 25 jul 2024 a las 23:25
> Subject: Solicitud de informes sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura hospitalaria
> To: <gerencia@esenorte1.gov.co>, <gerencia@quilisalud.gov.co>, gerencia Hospital <gerencia@hospitalsanjose.gov.co>, gerencia gerencia <gerencia@esetimbio.gov.co>, <gerencia@esesuroccidente-cauca.gov.co>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte3-cauca.gov.co>, Gerencia Hslv <gerenciahslv@hosusana.gov.co>
> Cc: Didier Iván Golondrino Leon <didiergolondrino.salud@cauca.gov.co>, <molicama@hotmail.com>
>
> SSD-PGPSI-0342
>
> Popayán, 25 de julio 2024

Respetados:
GERENTES
Empresas Sociales del Estado
Departamento del Cauca

Asunto: Solicitud de informes sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura hospitalaria financiados con recursos del PGN.

Atento saludo.

Considerando que sus Empresas Sociales del Estado han sido beneficiadas con la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección para la ejecución de obras de infraestructura hospitalaria y dentro de las responsabilidades las ESE deben reportar información mensual.

Se requiere que las ESE presenten los informes ejecutivos mensuales de avance de los proyectos, con corte al 25 y plazo hasta el 29 del mes reportado, los cuales deben contener como mínimo:

1. Generalidades de los contratos de obra e interventoría, estado actual.
2. El avance físico y financiero ejecutado vs. Programado (Balance Financiero).
3. Análisis de la ejecución y cumplimiento de lo aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
4. Registro fotográfico.
5. Reporte de los rendimientos financieros generados y reintegrados durante el período.
6. Acciones realizadas por la Secretaría Departamental del Atlántico en el periodo de ejecución y conclusiones.
7. Actas realizadas a la fecha.
8. Informes de obra, interventoría y supervisión a la fecha.

Además, me permito informar que en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones 1308 de 2022, 0933 - 0977 de 2023, 2525 de 2020 y 1117 de 2023, las E.S.E. ejecutoras deben realizar el cargue de los documentos que soportan la ejecución en la plataforma PISIS de manera mensual. Se ha evidenciado un cargue parcial de información en la plataforma PISIS.

En tal sentido, es de precisar que las Resoluciones por las cuales fueron efectuadas asignaciones de recursos a los proyectos de inversión, disponen en su articulado lo siguiente:

(…) El Ministerio, en desarrollo de sus funciones y de su objetivo misional realizará el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados (…), y de ser necesario, informará a las entidades de vigilancia y control, para lo de su competencia.

Parágrafo. *La Secretaría departamental de salud deberá efectuar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados y remitirá oportuna y eficazmente la información que la Subdirección de Infraestructura en Salud de este Ministerio les requiera, y de ser necesario, informará a las entidades de vigilancia y control, para lo de su competencia (…) subrayado fuera de texto*

Por otra parte, la Resolución (anexa al presente), por la cual se fijan lineamientos para la remisión de la información por parte de las entidades territoriales y otras beneficiarias por los recursos transferidos o asignados directamente y se establecen las directrices para el seguimiento y supervisión de la ejecución de dichos recursos; su artículo 7 reza así.

(…) *La falta de presentación de la información aquí requerida o las inconsistencias en la misma, darán lugar a la solicitud de explicaciones a la entidad reportante y en caso de ser necesario, se informará a las entidades de vigilancia y control para lo de su competencia*. (…) subrayado fuera de texto

Por lo anterior, se reitera la solicitud de información el 29 de cada mes, con los requisitos solicitados en este comunicado.

Agradezco su atención.

Institucionalmente,

--

Gobernación del Cauca
Secretaría de Salud

Vivian Anyeli Rivera Corrales
Líder de Programa
Proceso Gestión de la Provisión de Servicios Individuales
Secretaría de Salud Departamental del Cauca

Adjunto los formatos de PISIS para su reporte.
