CONSTRULIFE G&B
CONSTRUYENDO VIDA

Sitionuevo Magdalena,05 de septiembre del 2024

Señores
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SITIONUEVO**
**Secretaria de Prospectiva Estratégica**
**Y Ordenamiento Territorial**

**REFERENCIA**: Informe parcial de actividades realizadas en el Contrato de calamidad Pública No. MS-CPUB-003-2024, cuyo objeto consiste "EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA COMO RESPUESTAS A LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA Y CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS".

Respetados señores:

Por medio de la presente envío el informe parcial con registro fotográfico de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 24 de julio al 04 de septiembre del presente año al Contrato de Obra Pública No. MS-CPUB-003-2024, cuyo objeto consiste en "EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA COMO RESPUESTAS A LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA Y CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS".

Quedamos a su disposición para atender cualquier inquietud con respecto a este trabajo y confiamos para colaborarle en el futuro.

Atentamente,

MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ
CC. 1.045.680.477
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRULIFE G&B
CONSTRUYENDO VIDA

## INFORME PARCIAL DE OBRA

El presente informe es la recopilación de las actividades realizada del periodo comprendido del 24 de julio al 04 de agosto de 2024.

A los 24 días del mes de julio del año 2024, se firma el acta de inicio siendo las 1:51 pm y posteriormente se procedió a realizar visita de inspección a los diferentes lugares afectados por las lluvias ubicado en la cabecera municipal en compañía de la supervisora al Contrato de Obra Pública No. No. MS-CPUB-003-2024, **LUCIA LOPEZ TRILLOS** secretaria De Prospectiva Estratégica Y Ordenamiento Territorial y **MARUJA ISABEL TORREGROZA DE LA CRUZ** en calidad de representante legal de **CONSTRULIFE G & B**.
Se finalizó la visita y nos proyectamos para programar él envió de maquinaria y personal encargado a los diferentes puntos a intervenir iniciando de la siguiente forma:


### ITEM 1.1 ROCERIA MANUAL DESMONTE Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL

El día 29 de julio del 2024 se da inicio con 18 personas a la rocería y desmonte en los alrededores de los canales que se encuentran en el casco urbano del municipio los canales intervenidos son

- rodeo-salsita (en la entrada del municipio por la enea que se encuentra cerca a la cancha julio kenke)
- aguas vivas (en el inicio que conecta las salidas de aguas al barrio san José)

de este ítem en la presente acta se ejecutaron 4327 m2



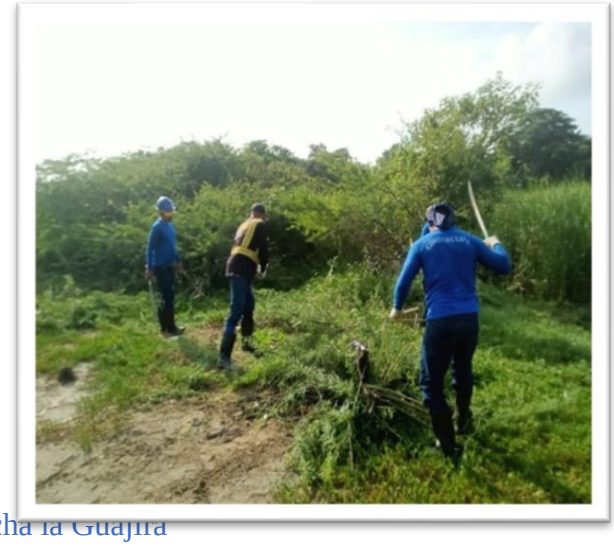










## ITEM 1.3 TRANSPORTE PARA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

Se realiza el retiro del material de corte saturado de las vías intervenidas en el municipio, del ítem 1.7 y el material residuo de la limpieza de la red de alcantarillado, del ítem 1.5





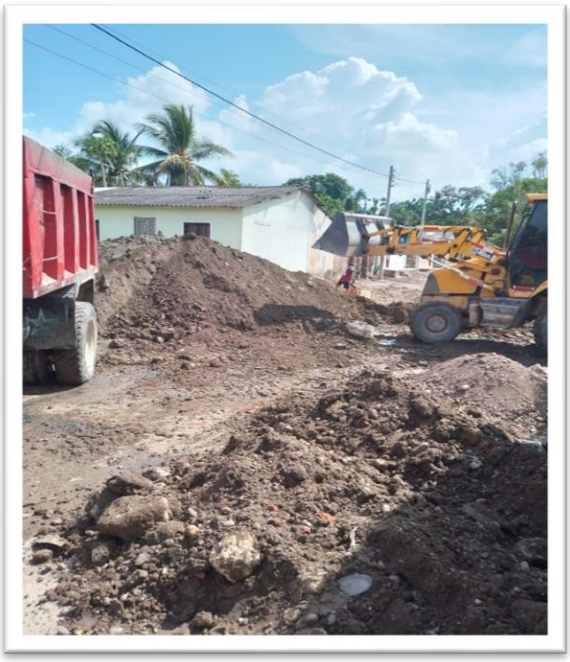


CONSTRULIFE G&B
CONSTRUYENDO VIDA

## ITEM 1.8 SUMINISTRO DE MOTOBOMBA AUTOCEBANTE

se suministra motobomba en los cales y carreras donde se presentan las inundaciones causadas por las lluvias como fueron Cra 7 entre calle 3 y 4 calle 2 entre Cra 2 y 3 y demás puntos autorizados a intervenir por la supervisión del contrato de este ítem en la presente acta se ejecutó una (1) unidad



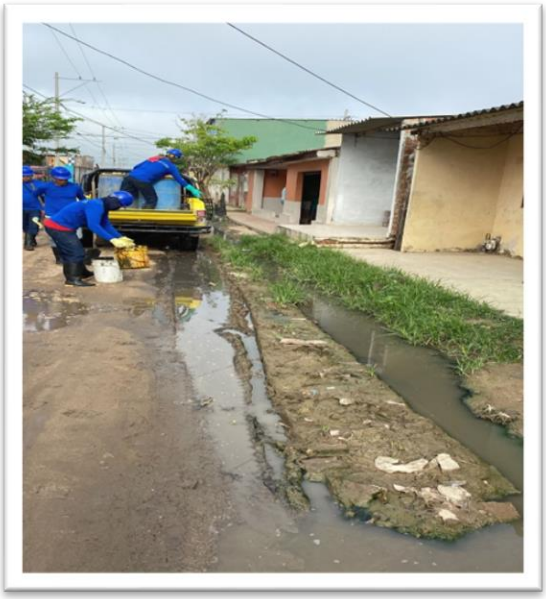







**ITEM 1.7 SUMINISTRO DE MATERIAL DE COMPACTACIÓN PARA RELLENO DE VÍAS**

El día 29 de julio del 2024, Ingresa Suministro de material de compactación para relleno de vías y uso de motobombas en diferente punto de la cabecera municipal específicamente intervenimos las calles 2 desde la Cra 1 hasta la Cra 7, la calle 4 desde la Cra 3 hasta la Cra 7 y calle 4 desde Cra 7 hasta la Cra 9 se realiza la intervención con un equipo topográfico para garantizar la pendiente y no se produzca estancamiento de las aguas lluvias en las vías a intervenir, equipos utilizados:

- motoniveladora
- retrocargador
- vibro compactador
- volquetas de 8 m3
- comisión de topografía


de este ítem en la presente acta se ejecutaron 3520 m3









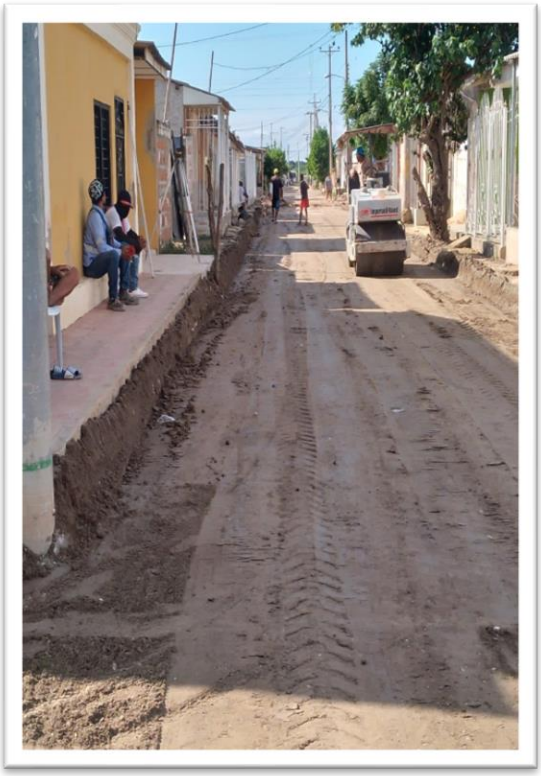






**ITEM 1.4 LIMPIEZA MANUAL DE CANALES RECOLECTORES DE AGUA**

El día 15 de agosto del 2024, se dio inicio con las limpiezas manuales de los canales recolectores de agua lluvia en la cabecera del municipio comenzando por el barrio san jose en las calles 12 con Cra 13 hasta la cra 10 continuando por la vía al matadero cruzando por la finca la fortuna específicamente logrando la desembocadura al canal aguas vivas, con esto evitamos la retención de las aguas lluvias por los residuos sólidos de basuras que taponan a estos mismos.

De este ítem en la presente acta se ejecutaron 5324 ML







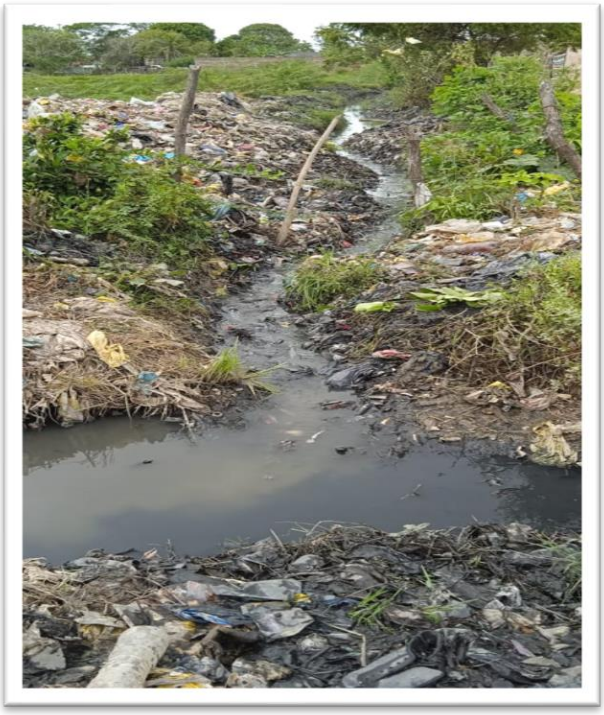





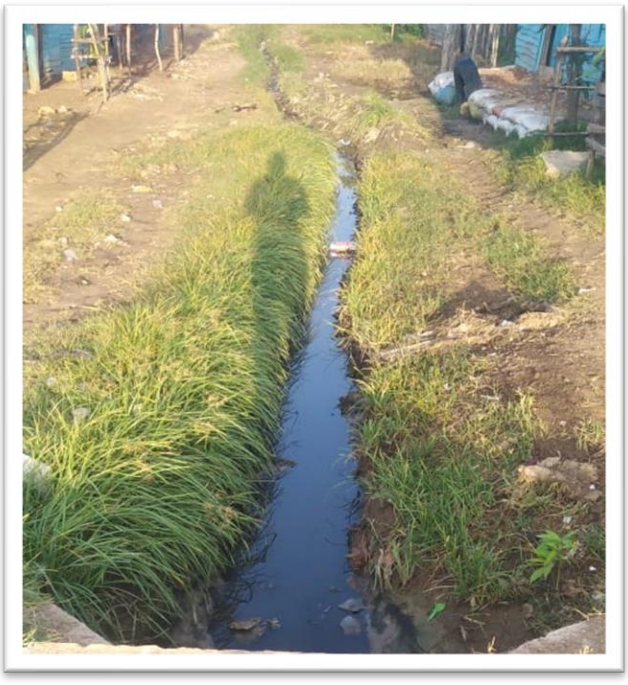

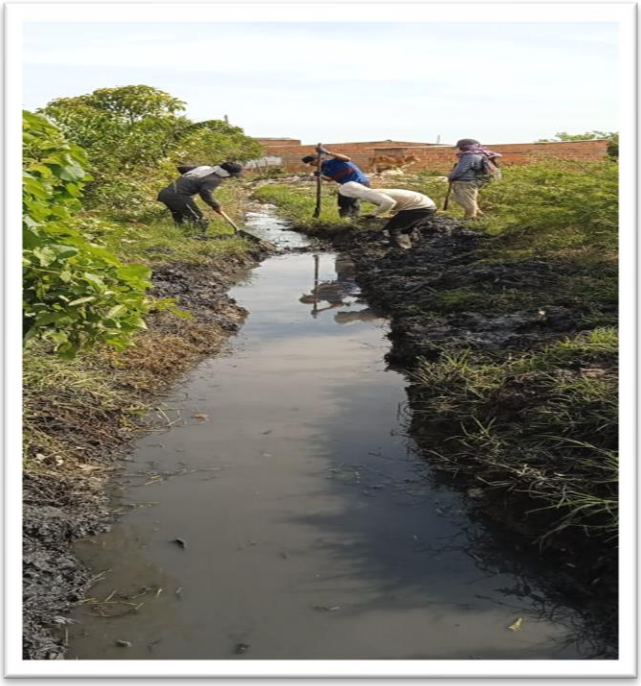






## ITEM 1.5 LIMPIEZA DE RES DE ALCANTARILLADO

Se hace necesaria la limpieza de la tubería ocasionado por el taponamiento de las mismas debido al material arrastrado por las lluvias, encontramos estas sedimentadas, y había vertimiento de aguas residuales sobre las calles del municipio a continuación dejamos la relación de las tuberías intervenidas

| CALLES INTERVENIDAS | ML |
|---|---|
| CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 - 7 | 480 |
| CALLE 1A ENTRE CARRERAS 1 - 3 | 240 |
| CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 - 17 | 1.150 |
| CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 - 18 | 1.230 |
| CALLE 4 ENTRE CARRERAS 1 - 21 | 1.369 |
| CALLE 5 ENTRE CARRERAS 1-21 | 1.318 |
| CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1-21 | 1.310 |
| CARRERA 10 ENTRE CALLES 9 Y 6 | 187 |
| CARRERA 1A ENTRE CALLES 4A Y 6 | 91 |
| **TOTALES** | **7.375** |

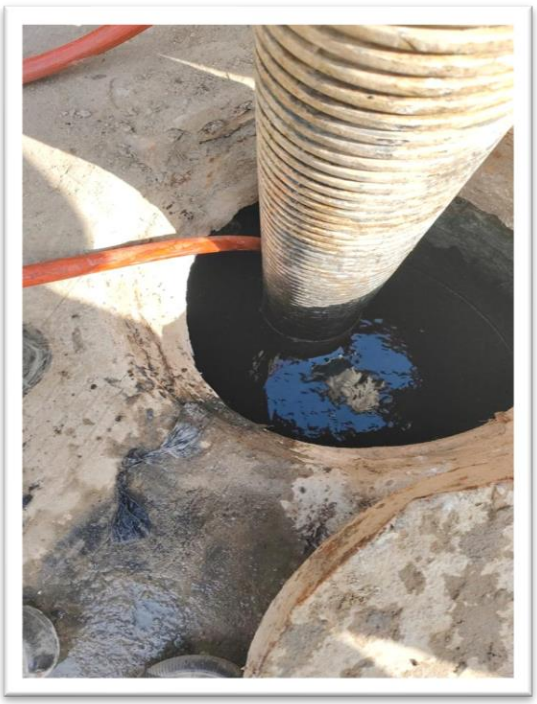

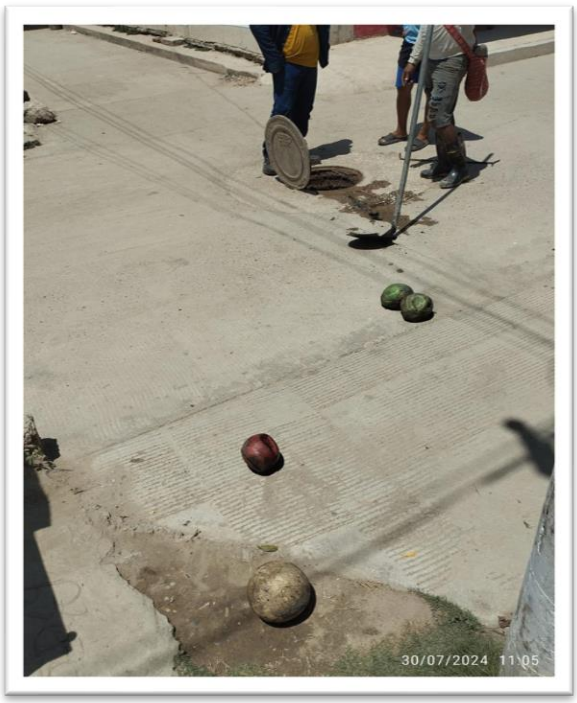
30/07/2024 11:05

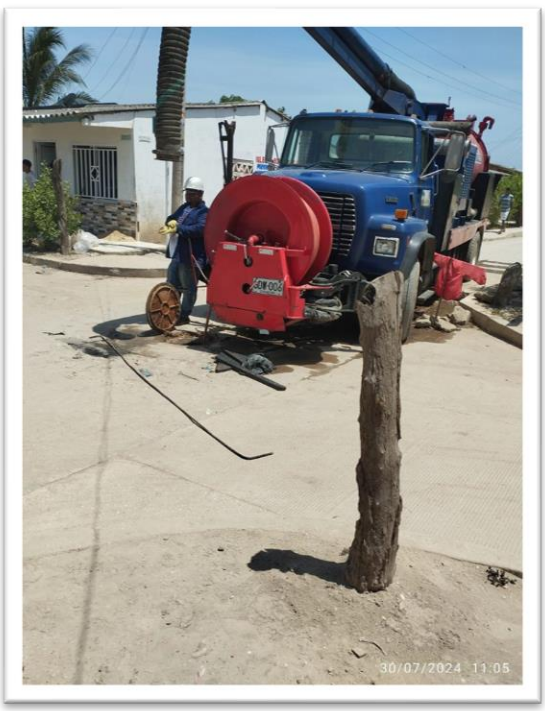
30/07/2024 11:05





## ITEM 1.6 RETIRO Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE POZOS DE INSPECCIÓN

| CALLES INTERVENIDAS | TOTAL, MANJOLES |
|---|---|
| CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 - 7 | 7 |
| CALLE 1A ENTRE CARRERAS 1 - 3 | 3 |
| CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 - 17 | 17 |
| CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 - 18 | 15 |
| CALLE 4 ENTRE CARRERAS 1 - 21 | 19 |
| CALLE 5 ENTRE CARRERAS 1-21 | 19 |
| CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1-21 | 16 |
| CARRERA 10 ENTRE CALLES 9 Y 6 | 3 |
| CARRERA 1A ENTRE CALLES 4A Y 6 | 1 |
| TOTALES | 100 |






# ACTA DE COBRO N°1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | |
| DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | | | | | |
| MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA | | | | | |
| ACTA DE COBRO PARCIAL N°1 | | | | | |
| CONTRATO DE OBRA MS-SAMC-001-2024 | | | | | |
| **OBJECTO DEL CONTRATO** | REHABILITACION FISICA DE BIENES INMUEBLES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA DE BIENESTAR MUNICIPAL PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BASICAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGADALENA | VALOR CONTRATO INICIAL | $ 2.000.000.000,00 | FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 11/09/2024 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE SITIONUEVO, MAGDALENA | VALOR ADICIONAL | $ - | VALOR PRESENTE ACTA | $ 1.146.661.594,63 |
| **CONTRATISTA** | CONSTRULIFE G&B SAS | NUEVO VALOR CONTRATO | $ 2.000.000.000,00 | VALOR ACUMULADO | $ 1.146.661.594,63 |
| **INTERVENTOR** | N/A | FECHA DE INICIO | 24/06/2024 | PLAZO ACTUAL | 120 días |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | LUCIA LOPEZ TRILLOS | PLAZO INICIAL | 120 días | | |

el once (11) del mes de septiembre del 2024, se reunieron las siguientes personas: MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ en su calidad de Contratista de Obra y como Supervisor LUCIA LOPEZ TRILLOS, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE COBRO PARCIAL N°1,

| 1 | ATENCION DE CALAMIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VL. UNITARIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | rocería manual desmonte y retiro de material vegetal | M2 | 4327,00 | $ 3.463,90 | $ 14.988.308,77 |
| 1,2 | limpieza mecánica de canales recolectores de agua lluvia | M3 | 0,00 | $ 17.584,39 | $ - |
| 1,3 | transporte para el retiro de material sobrante | M3 | 1918,00 | $ 9.800,00 | $ 18.796.400,00 |
| 1,4 | limpieza manual de canales recolectores de agua | ML | 5324,00 | $ 22.417,00 | $ 119.348.108,00 |
| 1,5 | limpieza de red alcantarillado | ML | 7375,00 | $ 6.818,00 | $ 50.282.750,00 |
| 1,6 | Retiro y Limpieza de residuos sólidos de pozos de inspección | UND | 100,00 | $ 108.752,00 | $ 10.875.200,00 |
| 1,7 | suministro de material de compactación para relleno de vías | M3 | 3520,00 | $ 185.000,00 | $ 651.200.000,00 |
| 1,8 | suministro de motobomba autocebante centrifuga con una potencia de 10 hacen boquilla de succión de 4" y boquilla de descargue de 4"(motor Diesel) | UND | 1,00 | $ 9.000.000,00 | $ 9.000.000,00 |
| 1,9 | dotación para limpieza manual | UND | 18,00 | $ 135.000,00 | $ 2.430.000,00 |
| 1,10 | conformación de jarillones con material seleccionado | M3 | 0,00 | $ 58.000,00 | $ - |
| 1,11 | suministro e instalación de bolsacreto con arena | M3 | 0,00 | $ 198.000,00 | $ - |
| | **TOTAL, COSTO DIRECTO** | | | | $ 876.920.766,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ADMINISTRACCION** | **24%** | $ 210.460.984,03 |
| | **IMPREVISTOS** | **2%** | $ 17.538.415,34 |
| | **UTILIDAD** | **4%** | $ 35.076.830,67 |
| | **IVA/UTILIDAD** | **19%** | $ 6.664.597,83 |
| | TOTAL, COSTO DE LA OBRA | | $ 1.146.661.594,63 |

CONSTRULIFE G&B
CONSTRUYENDO VIDA

CONSTRULIFE G & B S.A.S.

CONSTRULIFE G Y B S.A.S.
NIT 901.017.437-6
calle 23 N 7 25
Tel: (605) 3023508227
Riohacha - Colombia
Librilallerena@construlife.co

**No. DSC 317**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO | | |
| **NIT** | 891.780.103-9 | **Teléfono** | (605) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Carrera 7 No. 3-09 | **Ciudad** | Sitionuevo - Colombia |

| Fecha y hora comprobante | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2024-09-11 | 2024-09-11 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO DE OBRA MS-SAMC-001-2024 - CUENTA DE COBRO PARCIAL N° 1 | 1.00 | 876,920,766.77 |
| 2 | ADMINISTRACION 24% | 1.00 | 210,460,984.03 |
| 3 | IMPREVISTOS 2% | 1.00 | 17,538,415.34 |
| 4 | UTILIDAD 4% | 1.00 | 41,741,428.50 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Mil ciento cuarenta y seis millones seiscientos sesenta y un mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-11 por $ 1,146,661,594.64

**Observaciones:**
ACTA DE COBRO PARCIAL N°1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,139,996,996.81 |
| IVA 19% | 6,664,597.83 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 1,146,661,594.64 |

**Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.**
