Florencia, 12 de septiembre de 2024

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Florencia – Caquetá.

Asunto: Informe Visita Técnica.

Por medio de la presente, me permito dirigirme a ustedes con el fin de informarle el resultado de la visita técnica realizada el día de hoy a las Ocho (8:00) de la mañana en las instalaciones de la contraloría en lo referente al funcionamiento del motor para el manejo eléctrico del portón del garaje para los vehículos de dichas instalaciones.

SITUACION ENCONTRADA.

En visita técnica y ocular realizada en el día 11 de septiembre en horas de la mañana (8:00 a.m.) con la Dra. Marly Gómez y el Representante Legal del Grupo Empresarial Colombia E.U. Arq. Julio Cesar Gamboa Palacios, se evidencio que el motor CRAFTSMAN de 1/2 H.P. presenta fallas en tarjeta electrónica con componentes dañados como son capacitores, transistores y resistencias quemadas. El daño es debido a que el motor es de muy poca capacidad en fuerza para el peso que se requiere; por tal razón se sugiere el reemplazo del mismo por un motor de la siguiente referencia o similar LIFTMASTER 84505 RMC de 3/4 H.P.






Sistema motor existente CRAFTSMAN de 1/2 H.P.

900.038.276-5



Visita tecnica contratista, tecnico y funcionario contraloria.

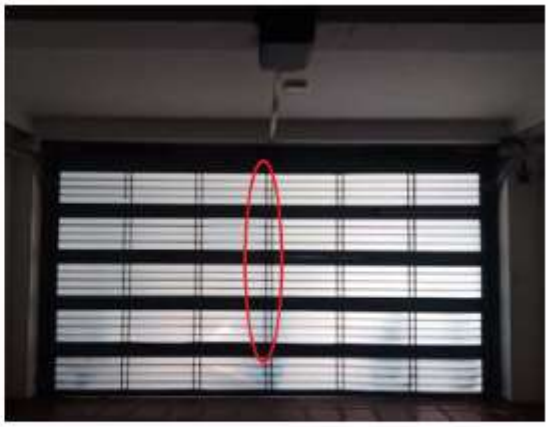

Ruptura guayas de elevacion y descenso porton.



Motor sugerido para reposición e instalación de la siguiente referencia o similar LIFTMASTER 84505 RMC de 3/4 H.P. o similar.

Agradezco su atención a esta solicitud y quedo a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U
900.038.276-5
