ACTA DE SUSPENSION Nº 01
CONTRATO SMC Nº 042-2024

JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA, mayor de edad y de esta vecindad, identificado con cédula de ciudadanía número 75.106.622 de Manizales, quien en calidad de Alcalde del Municipio de Villamaría-Caldas, según Acto de Posesión Nº 001 del 29 de diciembre de 2023, protocolizada ante la notaría única del círculo de Villamaría mediante escritura pública N° 1.388 del 29 de diciembre de 2023, actuando según las facultades otorgadas en especial por el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1551 modificado por la ley 136 de 1994 y demás normas afines, actuando como representante legal del Municipio de Villamaría del Departamento de Caldas, que para todos los efectos del presente contrato se denomina en adelante: **EL MUNICIPIO** de una parte y, de otra parte **DLO LOGISTICA S.A.S.** con **NIT Nº 901.290.107-0**, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos decidido celebrar la presente **ACTA DE SUSPENSION Nº 01** respecto al Contrato SMC Nº 042-2024, cuyo objeto es **"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA CONSTRUCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIÁN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA – CALDAS"** que se regirá por las cláusulas pertinentes, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS, suscribió con **DLO LOGISTICA S.A.S.** con NIT Nº 901.290.107-0 el contrato SMC Nº 042, cuyo objeto es **"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA LA CONSTRUCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIÁN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA – CALDAS".**

SEGUNDA: Que la Cláusula QUINTA del Contrato estipulo:

> ***CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION:*** *Por tres (3) meses contados desde la firma del acta de inicio y/o agotar presupuesto designado para esta, según la necesidad del suministro que vaya teniendo el Municipio.*

Que por solicitud del Contratista y autorización de la Secretaria de la Secretaria de Infraestructura y Vías se requiere realizar la **SUSPENSION TEMPORAL** del Contrato SMC Nº 042-2024 por el término de dos (02) meses, toda vez que según informe que se anexa, se han presentado situaciones que no han permitido el correcto trasegar del contrato bajo los tiempos y las condiciones establecidas, como fuertes lluvias, intervenciones en la del sector Corozal por parte de INVIAS y la armonización presupuestal por parte del Municipio. Por lo anterior, es menester suspender el mismo hasta tanto sean subsanadas las situaciones en comento que permitan la correcta ejecución del contrato.

Por lo anterior, se requiere suspender el presente contrato por el término de dos (02) meses; en razón a ello, las partes acuerdan realizar la presente **ACTA DE SUSPENSION Nº 1** al Contrato SMC Nº 042-2024 de la siguiente manera:

PRIMERA: Suspender, la ejecución del Contrato SMC Nº 042-2024 por el término de dos (02) meses.

SEGUNDA: La presente suspensión rige a partir de la suscripción de la misma por las partes intervinientes.

ACTA DE SUSPENSION Nº 01
CONTRATO SMC Nº 042-2024

Para lo anterior, se firma en el Municipio de Villamaria-Caldas el 11 de junio de 2024 por los que en ellos intervienen.

JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

DLO LOGISTICA S.A.S.
CONTRATISTA

Reviso: *Alejandro Franco Castaño- Asesor Jurídico*

Proyecto y Reviso: *Juan Carlos Marín Gaviria- Asesor Jurídico*

Villamaría, 11 de junio 2024

Señores
OFICINA JURÍDICA
Alcaldía de Villamaría
Municipio de Villamaría – Caldas

Ref. *Contrato Nro. SMC-042-2024 "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO PARA LA COSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIAN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS".*

Asunto: **Autorización Suspensión Nro. 01**

En concordancia con el asunto de referencia y teniendo en cuenta la solicitud allegada por el Contratista y el supervisor del contrato, en calidad de ordenar del gasto y en virtud de los motivos expuesto por las partes, me permito elevar visto bueno y **AUTORIZACIÓN** para la realización de la **Suspensión Nro. 1** al contrato Nro. SMC-042-2024.

No siendo otro asunto, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto
Villamaría, Caldas

Proyectó: Christian D.
Aux. Administrativo

Villamaría, 11 de junio de 2024

Doctor
JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA
Alcalde Municipal
Municipio de Villamaría - Caldas

Ref. *Contrato Nro. SMC-042-2024 "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO PARA LA COSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIAN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS".*

Asunto : **Solicitud y Concepto favorable –Suspensión Nro. 1**

De conformidad con el asunto y teniendo en cuenta mi calidad de supervisor del contrato relacionado en la referencia, me permito solicitar ***SUSPENSION Nro. 1*** teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que el contrato antes referenciado, cuenta como fecha de inicio el 29 de abril de 2024 y como fecha de culminación inicial hasta el 29 de julio de 2024, que así mismo, el contrato cuenta con un valor de **VEINTISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. ($26.199.421).**

2. Que, en cumplimiento de las obligaciones suscritas entre el Contratista y el Municipio se han prestado situaciones que no han permitido el correcto trasegar del contrato bajo los tiempos y las condiciones establecidas en su inicio, las cuales relaciono a continuación:

   - Se han presentado en los sitios de intervención del contrato fuertes lluvias que no han permitido el suministro de material para el ejecución de las obras, puesto que su disposición para aplicar a la obra debe ser inmediato y las fuertes lluvias no ha permito la adecuada disposición del mismo.

   - Como es de su conocimiento actualmente por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se vienen desarrollando intervenciones sobre la vía del sector Corozal, sitio en el cual se debe realizar la entrega de suministro objeto de este contrato, pero se han realizados cierres viales totales e interrupciones en la circular, situación que ha generado retrasos en el debido suministro del material para la ejecución de las obras en este punto.

   - Aunado a lo anterior es preciso poner de presente que a la fecha se encuentra en la etapa finalización la presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, situación que genera para el Municipio la entrada en cese de actividad presupuestal hasta tanto no se culmine la etapa de armonización presupuestal situación que impacta de manera directa

la ejecución de ciertas actividades administrativas que podrían generar retrasos en varios de los contratos suscritos con el Municipio, y para el caso particular el presente contrato debido a posibles retrasos en los pagos a realizar y las ordenes de sus suministro a indicar al Contratista.

3. Que, en concordancia con el panorama anterior y según conversaciones con el Contratista se requiere entonces, realizar el proceso de ***SUSPENSION Nro. 1*** al contrato teniendo en cuenta la normativa aplicable en materia contractual, por el termino de ***DOS (02) MESES***, contados a partir de la fecha con el fin de superar las contingencias presentadas y cumplir a cabalidad con las actividades pactadas en el Contrato y bajo las condiciones de tiempo, modo y lugar de la obligaciones suscrita.

De otro lado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, es obligación de los servidores públicos tener en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

En razón de lo expuesto, el suscrito Supervisor del contrato *Nro. SMC-042-2024 "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO PARA LA COSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIAN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS".* Da **CONCEPTO FAVORABLE, y avala** y solicita autorización para la ***SUSPENSION Nro. 1*** así:

SUSPENSION No 1:

Se otorgue la ***SUSPENSION Nro. 1*** el contrato en referencia por el término de ***(DOS 02 MESES)***, dejando como fecha de reanudación el día 11 de agosto de 2024.

Atentamente,

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
Secretario de Despacho
Secretaría de Planeación
Supervisor

Municipio de
Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

Villamaria, 11 de junio 2024

S.I.V. 410-263

Profesional
LINA PATRICIA LLANO DIAZ
Secretaria de Despacho
Secretaria de Planeación
Villamaria – Caldas

Asunto: **Solicitud de suspensión contrato 042-2024.**

Por medio de la presente y de la manera más atenta y cordial, la secretaria de infraestructura y vías se dirige a ustedes para solicitar la suspensión del contrato **042-2024,** por un periodo de dos (2) meses.

La solicitud se fundamenta en los siguientes motivos:

1. **Efectos del clima:** las condiciones climáticas adversas han dificultado la ejecución de los trabajos previstos en los contratos mencionados.

2. **Interrupción vía corozal:** es de aclarar que el acceso por la vía corozal se encuentra con dificultades de acceso, por trabajos en la misma, los cuales están siendo ejecutados por INVIAS.

3. **Armonización de recursos municipales:** la administración municipal está en proceso de armonización de recursos, lo que requiere una pausa temporal en la ejecución de ciertos proyectos para alinearlos con la nueva planificación y disponibilidad de recursos.

Agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedamos a disposición para cualquier aclaración o información adicional que se requiera.

Atentamente,

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura y Vías
Villamaria-Caldas

Proyecto J.A.H.R


REPORTE DIARIO DE LLUVIAS EN CALDAS

No. 152, 31 de mayo de 2024, desde 00:00 hasta 24:00 h

SIMAC
SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALDAS

Estaciones		Río Risaralda-La Palmera	San José	Río Supía-Los Pioneros	Río Supía-Supía	Río Tapias	Río Guacaica-El Jordán	Río Pozo	Río Pácora	Salamina-CHEC	Neira-Hogares Juveniles	Río Guacaica-CHEC	Q. El Rosario-Autopistas del Café	Río Rioclaro-La Batea	Río Chinchiná-El Bosque	Río Chinchiná-Centenario	Villamaría-Hospital	Alto Castillo	Liceo Isabel La Católica	Q. Olivares-El Popal	Q. Tesorito	Río Rioclaro-La Guayana	Q. Molinos PNNN.	Q. Nereidas-CHEC	Pirineos-CHEC	Q. Nereidas PNNN.	Río Riodaro PNNN.	Santa Isabel PNNN.	Maríulanda-El Páramo	Manzanares	Río Santo Domingo-Manzanares	Río Pensilvania-Microcentral	Marquetalia-Alcaldía	Río Doña Juana
Día																																	
M	1	0.0	1.8			0.0		11.4	0.0	0.0	19.6	9.8	10.0		0.6		0.0	0.2	0.6		0.0	0.8			1.4	4.6	1.0	1.8	0.0	0.2	0.2	2.6	0.0	1.4
J	2	10.6	3.6			12.2		7.8	10.2	3.0	29.6	4.8	17.4		1.6		12.2	2.6	4.6		9.2	14.0			5.8	1.6	0.6	0.8	0.0	1.0	0.0	2.0	10.4	0.0
V	3	1.2	17.2			0.6		0.8	1.6	1.6	11.8	0.0	0.4		0.0		0.6	2.2	1.8		9.4	19.0			6.2	1.8	0.2	0.0	3.6	0.6	0.2	1.2	0.0	0.0
S	4	12.2	14.2			12.6		7.0	4.4	9.2	23.4	23.4	43.2		39.4		41.2	23.2	29.4		19.8	4.6			3.6	3.2	3.4	2.8	2.0	11.8	13.8	47.8	61.4	6.8
D	5	2.0	2.6			5.6		3.0	13.2	4.8			5.6		5.6		10.0	5.2	9.2		11.0	7.6			5.2	12.0	20.2	18.6	7.2	8.2	11.6	8.2	14.5	5.4
L	6	5.2	2.0			0.6		2.2	7.8	2.0			5.4		3.2		1.6	0.4	7.2		0.0	4.4			1.4	1.2	3.6	6.6	1.8	4.2	2.6	3.6	14.0	5.4
M	7	19.6	41.0			13.6		24.0	11.0	3.6			35.4		13.6		26.6	14.8	30.6		12.8	15.8			1.0	2.2	4.8	7.2	4.6	15.4	6.8	18.0	7.6	0.0
M	8	28.4	28.8			17.8		2.6	9.2	2.6			2.8		16.8		15.2	19.4	16.2		5.4	42.6			4.8	5.4	5.4	7.8	9.2	2.0	1.6	10.6	2.3	2.0
J	9	18.0	15.0			12.4		27.0	47.8	30.8			15.0		21.4		32.0	19.4	27.6		28.2	24.8			23.6	39.2	15.8	28.2	25.4	31.0	35.0	33.6	52.6	32.4
V	10	2.2	3.8			7.8		1.6	2.2	2.2			19.0		11.0		1.8		5.2		4.8	5.0			4.6	2.6	28.4	14.6	6.8	16.5	2.8	3.4	22.8	0.0
S	11	9.8	2.0			33.6		0.4	8.6	2.2			2.2		1.4		9.0		10.8		14.2	8.4			4.6		1.4	3.2	0.6	4.4	0.0	4.0	0.0	0.0
D	12	1.6	1.4			10.4		43.6	13.6	14.0			2.8		3.0		10.4		13.2		16.0	9.6			8.0		19.6	16.0	20.2	29.7	22.0	20.8	52.1	43.8
L	13	0.0	0.0			0.2		0.0	7.6	0.0			0.0		0.0		0.0		1.4		0.0	20.8			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M	14	33.6	17.4			1.6		0.0	4.6	0.0	4.0	0.4							7.4		1.2	0.6			1.4		4.0	4.0	0.0	0.8	0.0	1.6	7.2	0.0
M	15	42.4	25.6			8.2		8.0	17.4	7.2	4.4	7.6							10.2		5.8	3.4			4.2	0.0	4.4	5.0	5.0	35.8	6.4	14.8	3.8	60.6
J	16	0.2	4.2			0.0		14.8	43.6	1.6	3.2	7.6	0.0		0.0		0.0		12.0		2.8	9.6			7.4	5.2	4.6	3.8	0.6	0.0	0.2	1.4	0.4	5.0
V	17	2.2	0.2			0.2		0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	8.8		9.6		4.8		0.0		0.2	0.8			0.8	2.2	5.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	5.0
S	18	1.4	0.0			0.0		0.0	1.6	0.8	0.0	0.2	0.0		0.0		0.0		2.4		0.2	2.0			0.2	0.6	2.6	2.2	0.0	6.6	0.0	1.8	0.8	0.2
D	19	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
L	20	0.0	0.0			1.6		0.0	2.2	0.0	0.4	0.8	0.0		6.8		0.8		0.0		18.0	33.8			6.6	5.2	7.6	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M	21	13.4	8.0			33.2		9.2	0.4	10.8	56.2	35.8	0.4		0.0		0.6		5.0		2.0	0.2			0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M	22	0.8	3.4			25.6		28.4	15.8	34.2	1.4	6.2	4.8		13.6		0.0		3.0		13.4	0.0			0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	23	7.0	0.8			0.8		10.0	15.2	3.0	2.8	8.0	0.4		0.0		3.2		6.6		3.2	0.4			1.4	4.0	6.2	3.6	5.0	34.0	30.6	4.2	13.8	7.6
V	24	0.8	0.4			0.4		0.8	2.4	11.2	0.2	0.0	3.6		5.0		0.0		0.4		0.8	0.0			0.2	0.2	0.2	0.0	1.6	0.4	0.6	1.0	9.8	1.8
S	25	0.0	0.4			13.0		0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.2			0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.0	0.4	0.4	2.8	6.6
D	26	0.2	0.4			0.0		0.0	24.2	0.6	0.0	0.0	1.0		0.0		0.0		0.0		0.0	3.2			11.6	5.2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L	27	0.0	0.2			0.0		1.8	3.0	0.6	1.4	1.4	0.0		0.2		0.0		2.0		4.2	1.4			0.2	0.6	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M	28	8.0	1.4			15.8		7.8	8.4	1.2	1.4	1.2	4.6		7.8		1.8	1.0	0.0		0.2	0.4			0.8	3.0	1.8	1.6	6.6	8.2	6.6	12.4	4.8	0.0
M	29	99.6	97.6			24.4		8.2	27.0	4.2	10.6	11.6	14.8		3.6		13.0	13.0	8.8		7.2	8.8			8.2	17.6	19.0	18.0	2.6	8.4	9.2	12.6	7.0	4.2
J	30	32.8	4.8			3.2		5.8	12.6	4.4	7.8	4.2	3.6		7.0		2.0	7.0	5.8		1.0	2.6			2.4	5.0	4.8	5.0	2.4	1.0	1.2	0.2	0.2	0.0
V	31	0.0	0.0			0.2		3.6	10.2	4.2	0.2	0.0	0.2		0.0		0.0	0.6	0.0		1.2	0.8			0.6	2.2	1.2	2.6	5.0	14.0	16.4	18.8	49.4	0.0
Ll. mes		353.2	298.2			255.6		229.8	327.4	162.8	178.4	123.0	201.4		171.2		186.8	109.0	221.4		192.2	245.6			114.2	125.0	165.0	166.0	112.2	237.2	168.2	225.4	337.7	188.2
Máx. mes		99.6	97.6			33.6		43.6	47.8	36.2	56.2	35.8	43.2		39.4		41.2	23.2	30.6		28.2	42.6			23.6	39.2	26.4	28.2	25.4	35.8	35.0	47.8	61.4	60.6
Ll. acum. en el año		726.2	658.8		206.0	562.2		405.0	780.2	448.0	554.4	391.8	752.2	80.0	552.0	264.6	647.8	752.2	623.6		541.0	604.0		43.4	316.6	280.0	369.4	355.6	312.0	630.4	840.4	889.6	1114.1	440.6
No. días lluvia año		82	84		28	73		59	84	68	58	46	78	67	55	63	56	64	71		76	104		6	78	55	85	70	75	85	90	110	91	44
% días lluvia año		54%	55%		18%	48%		39%	55%	45%	38%	30%	51%	44%	36%	41%	37%	42%	47%		50%	68%		4%	51%	36%	56%	46%	49%	56%	59%	72%	60%	29%



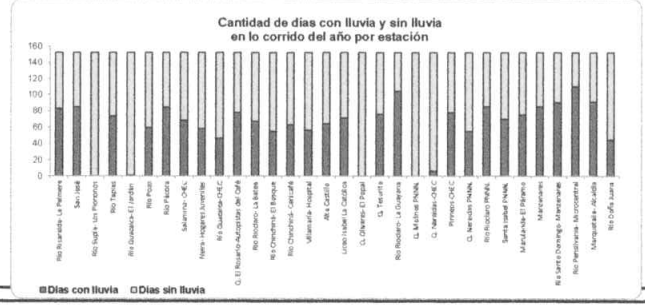

CONVENCIONES

Ll. d. : Lluvia diaria en mm
Ll. mes: Lluvia parcial o total en el mes en mm
Máx. mes: Valores máximos de lluvia diaria en el mes en mm
Ll. acum. en el año: Lluvia acumulada en el año en mm
No. días lluvia año: Número de días con lluvia en lo corrido del año
Resalta la lluvia diaria máxima del mes
valor: lluvia diaria posiblemente mayor o menor por falta de comunicación antes de terminar el día y se restablece el día siguiente
* Indicadores con base a los días de funcionamiento de cada estación
Datos resultados en rojo están incompletos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · Corpocaldas · Alcaldía de Manizales · GOBIERNO DE CALDAS · emas by VEOLIA · chec Grupo epm · VIVO CUENCA · Grupo de trabajo académico en Ingeniería Hidrológica y Ambiental · Grupo de Ambientes Inteligentes Adaptativos

CDIAC


GEOPORTAL

REPORTE DIARIO DE TEMPERATURA EN CALDAS

No. 152, 31 de mayo de 2024, desde 00:00 hasta 24:00 h

SIMAC
SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALDAS

Estaciones		Rio Rioclaro-La Batea			Rio Chinchiná-El Bosque			Rio Chinchiná-Cenicafé			Rio Rioclaro- La Guayana			Q. Molinos PNNN.			Q. Nereidas-CHEC			Pirineos-CHEC			Q. Nereidas PNNN.			Rio Rioclaro PNNN.			Santa Isabel PNNN			Marulanda- El Páramo			Manzanares			Rio Santo Domingo-Manzanares			Rio Pensilvania-Microcentral			Marquetalia-Alcaldía			Rio Doña Ju	
Día		Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media
M	1	24.2	19.1	15.4	25.0	21.5	18.3	27.2	22.1	18.4	25.8	18.5	14.5				18.5	12.8	9.5	13.8	9.6	6.4	9.6	6.6	3.7	8.6	6.0	2.6	4.8	2.8	0.8	18.9	14.7	11.8	24.9	19.7	17.1	26.8	21.6	18.3	25.9	22.5	20.1	24.3	20.8	18.7	30.3	27.9
J	2	21.6	18.5	16.5	25.1	21.2	19.3	25.1	21.4	19.8	21.4	17.8	15.6				16.3	13.3	11.2	13.1	9.6	7.9	8.6	6.4	4.4	7.6	5.1	2.4	3.9	2.6	1.2	17.7	14.8	13.1	24.7	19.7	17.2	28.3	22.1	17.7	25.7	22.1	19.8	23.3	20.3	18.6	31.7	28.3
V	3	23.6	18.2	16.1	27.0	21.3	19.0	26.1	21.4	19.4	23.3	17.7	15.4				16.8	12.8	10.5	11.9	9.1	6.6	8.5	6.1	3.5	8.4	5.2	2.9	4.1	2.4	0.8	18.1	15.6	12.6	24.2	20.8	18.2	28.3	23.4	19.9	25.8	22.8	20.3	26.0	22.1	18.5	35.9	30.7
S	4	20.3	17.7	16.3	22.8	20.0	18.5	22.1	20.1	18.8	20.7	17.3	15.2				16.5	13.0	10.5	11.4	9.1	7.1	10.3	6.5	3.9	9.6	5.1	1.7	3.1	2.1	1.1	15.3	13.6	11.7	20.9	18.7	17.5	24.7	20.8	19.0	24.9	22.1	21.2	21.4	18.8	17.5	29.8	27.2
D	5	22.6	18.8	16.6	24.9	20.8	18.5	25.5	21.3	18.8	22.6	18.4	16.0				18.4	14.3	11.9	13.5	10.0	8.3	9.6	6.5	4.3	8.2	5.2	2.6	3.4	1.8	-0.4	18.1	15.0	12.6	25.4	19.9	16.8	29.6	22.3	18.1	25.9	22.5	20.4	25.8	20.4	17.1	33.3	28.7
L	6	24.8	19.1	15.7	28.0	20.6	18.6	27.1	21.9	19.6	24.8	18.1	14.7				19.7	13.8	10.8	15.3	10.4	7.7	11.4	7.8	5.3	10.0	7.8	4.2	4.4	2.1	0.2	19.2	15.5	12.9	27.0	20.3	17.6	30.1	22.8	19.0	27.5	22.7	20.3	26.8	21.3	18.3	35.0	29.4
M	7	24.7	19.4	15.4	25.4	20.3	18.2	26.8	22.5	19.1	24.7	18.9	14.7				18.3	14.0	10.3	13.6	10.0	7.2	11.5	7.7	4.8	8.5	5.7	4.6	3.5	2.1	0.9	20.9	16.2	13.6	27.6	20.8	17.2	31.4	23.9	18.5	28.0	23.5	20.5	27.7	22.2	18.4	35.9	30.2
M	8	22.5	18.7	17.0	20.1	19.5	18.8	25.5	21.4	19.0	20.8	17.7	16.0				17.4	14.1	12.7	12.4	9.7	8.6	10.3	7.2	5.2	8.3	4.3	3.5	3.2	1.8	0.1	18.9	14.8	12.4	23.7	19.4	16.9	26.8	21.8	18.8	24.9	22.3	20.0	23.7	20.5	17.8	34.2	28.7
J	9	19.1	18.0	16.9	21.1	20.0	18.8	21.2	20.2	19.2	18.3	16.9	15.7				14.6	13.5	12.5	11.3	9.1	7.6	7.5	6.1	4.2				2.9	1.8	0.2	16.2	14.6	13.3	20.4	18.3	17.2	22.6	20.4	18.8	23.6	21.9	21.0	21.1	19.0	17.7	29.4	26.6
V	10	24.1	19.3	16.1	26.6	21.0	18.3	25.9	20.8	18.3	23.6	17.6	14.9				17.6	13.7	12.0	12.6	9.7	8.2	8.0	6.3	4.9	6.9	5.8	4.7	4.7	2.4	1.3	18.3	14.1	12.9	27.2	18.9	16.6	29.7	21.7	18.3	26.2	22.2	20.4	27.5	20.8	17.6	34.7	28.9
S	11	25.8	19.3	16.6	27.8	20.5	18.7	26.7	21.9	19.0	25.2	18.4	15.6				17.8	13.9	11.6	12.7	9.7	7.4	8.5	6.3	4.2	5.1	4.2	2.3	4.6	2.4	1.2	18.4	15.2	12.7	25.5	20.3	16.6	29.3	22.8	18.2	26.4	23.1	20.3	26.9	21.8	18.7	33.7	29.1
D	12	22.7	18.7	16.1	25.6	20.6	18.3	24.5	21.2	19.4	23.3	17.9	14.5				18.0	13.8	11.0	13.9	10.0	8.4	8.8	5.9	3.3	9.3	4.3	1.8	3.9	2.1	-0.1	18.7	14.4	12.6	22.8	18.8	17.2	25.3	20.7	18.4	23.8	21.7	19.7	22.2	19.5	17.1	28.7	26.7
L	13	22.5	16.2	14.5	24.2	19.4	17.1	23.7	19.6	18.2	24.8	17.9	13.3				20.8	13.8	9.8	16.2	11.0	7.2	10.9	7.3	4.3	11.2	6.2	2.7	6.1	3.0	1.3	20.1	16.7	13.3	28.8	21.4	17.3	33.1	23.9	17.9	29.4	23.4	19.2	28.7	22.7	18.7	34.5	29.4
M	14										22.1	18.3	15.9				16.5	13.5	11.3	12.3	9.6	7.4	9.9	6.9	5.4	10.9	5.7	4.0	3.8	2.0	0.7	18.6	15.5	12.9	26.6	20.8	18.1	29.4	23.5	19.4	27.4	23.5	21.2	27.5	22.3	19.7	33.5	29.5
M	15										20.8	17.9	15.8				15.6	13.5	11.9	10.4	9.2	7.5	10.1	6.6	4.7	9.4	5.4	3.7	3.6	2.0	0.8	17.4	14.6	13.2	25.2	19.5	17.7	29.6	22.1	19.1	26.9	22.9	21.1	26.4	20.6	17.8	34.0	28.4
J	16										22.9	17.6	14.3				16.6	13.4	10.7	12.2	9.3	7.2	8.4	5.8	4.1	9.7	5.1	2.5	4.4	1.9	0.4	18.1	14.6	13.1	24.7	19.6	17.0	27.8	22.1	18.8	25.9	22.7	20.7	26.4	21.2	18.3	33.5	27.6
V	17	23.6	20.1	16.4	26.5	23.0	19.1	26.2	23.1	20.4	22.8	18.2	15.2				18.0	13.6	11.1	12.9	9.5	7.5	10.1	6.8	4.8	4.1	3.7	3.3	3.7	2.1	0.8	18.3	15.4	13.1	26.3	20.6	16.8	30.4	23.1	18.1	27.8	23.2	20.1	27.6	21.8	18.4	34.0	28.5
S	18	25.3	19.8	15.7	26.1	21.5	18.8	27.1	22.8	19.6	26.2	19.1	14.2				17.8	13.9	10.2	13.1	9.8	6.6	11.2	7.1	5.1	11.5	5.9	3.6	3.8	1.7	-0.1	18.1	15.2	13.0	26.3	20.1	16.8	30.0	23.0	17.7	26.9	23.3	20.4	27.3	22.4	18.6	34.9	29.3
D	19	25.5	19.9	17.6	27.7	22.1	20.0	26.8	22.3	20.4	24.1	18.5	16.0				17.5	13.9	11.5	14.0	10.6	7.4	12.7	9.2	5.8	11.8	7.1	4.0	5.7	2.8	1.0	18.7	15.4	13.3	26.7	20.4	17.2	31.5	22.6	17.6	27.6	22.4	18.9	27.7	22.0	18.9	34.0	28.2
L	20	23.8	19.4	17.4	26.7	21.9	19.3	25.9	21.7	19.9	24.0	18.9	14.6				18.3	14.3	10.3	13.4	10.5	8.8	10.5	7.5	5.4	10.7	6.3	4.1	4.9	2.9	1.6	18.9	16.3	14.1	27.7	22.4	19.2	31.4	25.1	19.9	28.2	24.2	20.2	28.2	23.4	20.4	36.3	32.0
M	21	25.3	20.1	17.1	27.5	23.8	20.0	26.4	22.2	19.6	25.8	20.1	16.4				19.6	14.5	12.7	13.2	10.3	8.8	10.5	7.1	5.1	10.5	6.3	4.0	4.1	2.3	1.2	17.9	14.9	12.6	25.1	19.7	17.9	29.1	21.9	19.0	26.3	22.5	20.7	26.1	20.8	18.9	32.8	28.7
M	22	24.7	20.1	17.5	27.3	22.0	19.5	25.9	21.7	19.5	25.7	19.6	15.7				13.3	13.0	12.5	12.6	10.1	7.6	9.6	7.2	4.7	9.4	5.9	2.3	3.4	1.9	0.6	18.8	15.0	11.1	27.1	20.9	17.6	31.1	23.5	19.2	28.3	24.2	20.5	28.8	22.7	18.8	36.9	30.6
J	23	22.8	19.7	17.2	25.3	21.2	19.2	24.8	21.5	19.5	23.4	19.2	16.2							13.1	10.0	8.0	10.8	7.0	5.0	11.4	6.1	3.8	3.7	2.2	1.1	18.6	15.4	13.1	25.8	20.5	17.2	30.3	23.5	18.9	26.8	23.4	21.1	26.5	21.7	18.0	34.5	29.5
V	24	25.8	20.0	16.2	28.2	22.4	18.0	26.6	22.1	18.4	24.9	19.4	14.7							11.8	9.7	7.3	10.8	7.4	4.5	10.8	6.2	3.4	3.9	1.9	0.4	18.3	15.2	11.8	26.3	20.0	16.0	29.7	22.7	17.2	27.0	23.0	19.7	26.7	21.3	17.7	34.1	28.8
S	25	23.7	19.7	16.0	26.4	22.4	18.9	25.5	22.4	19.4	23.2	19.1	14.9							12.2	9.5	6.9	10.2	6.9	4.7	9.1	5.5	3.6	2.4	1.5	0.7	16.9	14.4	12.6	24.2	19.3	16.6	27.7	21.7	16.9	25.7	22.3	19.2	24.4	20.3	18.0	32.2	28.8
D	26	24.0	19.2	16.1	25.3	20.8	18.8	25.7	22.1	19.6	24.0	18.6	15.2							14.4	9.8	6.8	11.7	7.3	4.8	12.9	6.5	2.0	5.7	2.2	0.8	18.6	15.3	12.3	26.5	20.6	16.2	31.4	22.6	16.5	28.2	23.0	18.9	27.4	21.8	17.4	35.0	29.9
L	27	23.5	19.5	16.8	25.6	23.0	19.3	25.1	21.9	18.9	23.0	19.6	16.0							11.8	9.5	7.2	10.1	7.1	4.6	11.5	6.2	3.8	4.6	2.3	0.7	18.0	14.6	10.7	25.8	20.1	16.6	28.7	22.7	18.1	26.1	23.0	19.8	26.2	21.8	18.9	34.8	30.0
M	28	24.7	20.3	17.8	27.6	22.4	19.5	26.2	22.1	19.1	24.5	19.8	17.3							12.1	9.9	8.2	11.6	7.5	4.7	11.0	6.6	3.5	5.1	2.4	0.6	19.1	15.5	13.1	26.2	20.5	17.3	30.0	23.2	19.5	26.6	23.3	21.5	26.7	21.7	18.5	34.9	29.3
M	29	21.9	19.4	18.2	25.0	21.2	19.3	24.9	21.2	19.4	21.4	18.7	17.6							10.7	9.5	8.4	8.8	6.6	5.3	7.6	5.1	2.6	3.6	2.1	0.3	17.3	15.0	12.8	24.7	19.8	17.4	26.9	21.9	19.3	25.5	22.6	21.2	24.1	20.4	17.8	32.1	27.5
J	30	21.9	19.3	17.7	24.4	21.2	19.3	24.3	21.3	19.4	21.7	18.9	17.6							11.1	9.4	6.9	9.4	6.7	4.8	9.5	5.8	3.7	3.9	2.2	0.8	18.2	15.2	12.7	26.1	19.7	16.8	29.2	22.1	18.4	26.2	22.6	19.9	26.4	21.0	18.4	33.2	28.3
V	31	24.5	19.5	17.7	27.2	21.4	19.4	26.3	21.5	19.6	28.5	19.8	16.2							12.4	10.1	8.6	9.9	6.6	4.7	9.9	5.6	3.7	3.0	2.0	1.1	18.2	15.3	13.5	25.9	20.3	17.6	29.4	22.6	19.5	25.6	22.9	20.9	24.3	20.7	18.2	35.4	29.6

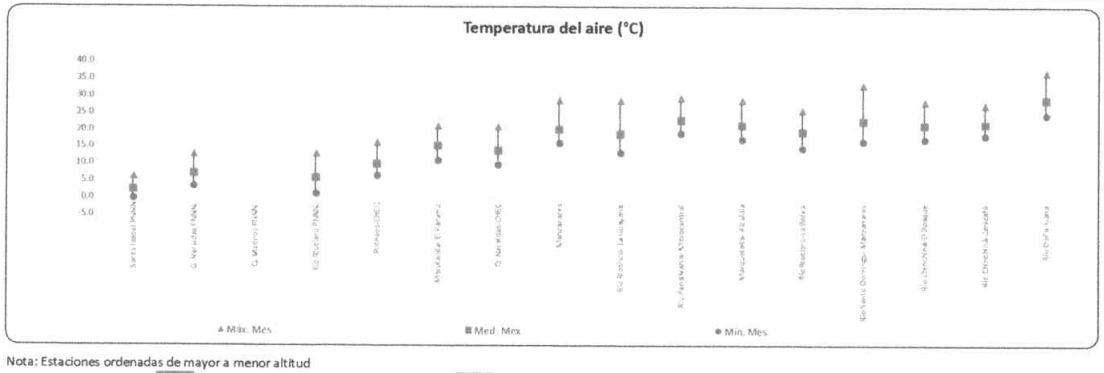

Altitud	Estaciones	Máx. Mes	Med. Mes	Min. Mes
4812	Santa Isabel PNNN	6.1	2.2	-0.4
4450	Q. Nereidas PNNN.	12.7	6.9	3.3
4240	Q. Molinos PNNN.			
4178	Rio Rioclaro PNNN.	12.9	5.7	1.0
3358	Pirineos-CHEC	16.2	9.8	6.4
3110	Marulanda- El Páramo	20.9	15.1	10.7
2945	Q. Nereidas-CHEC	20.8	13.7	9.5
1941	Manzanares	28.8	20.1	16.0
1807	Rio Rioclaro- La Guayan	28.5	18.5	13.2
1793	Rio Pensilvania- Microce	29.4	22.8	18.9
1591	Marquetalia- Alcaldía	28.8	21.2	17.1
1589	Rio Rioclaro-La Batea	25.8	19.2	14.5
1450	Rio Santo Domingo- Mar	33.1	22.5	16.5
1413	Rio Chinchiná-El Bosque	28.2	21.3	17.1
1289	Rio Chinchiná-Cenicafé	27.2	21.6	18.2
210	Rio Doña Juana	36.9	28.9	24.4



Nota: Estaciones ordenadas de mayor a menor altitud

CONVENCIONES Temperatura máxima en el mes por estacion | Temperatura minima en el mes por estación | Valores en rojo están incompletos y/o presentan fallas


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Corpocaldas
Alcaldía de Manizales
GOBIERNO DE CALDAS
emas by VEOLIA
chec Grupo epm
VIVO CUENCA
Grupo de trabajo académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental
Grupo de Ambientes Inteligentes Adaptativos
CDIAC
GEOPORTA

REPORTE DIARIO DE TEMPERATURA EN CALDAS

No. 152, 31 de mayo de 2024, desde 00:00 hasta 24:00 h

SIMAC
SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALDAS


Estaciones		Río Risaralda- La Palmera			San José			Río Supía- Los Piononos			Río Supía- Supía			Río Tapias			Río Guacaica- El Jordán			Río Pozo			Río Pácora			Salamina- CHEC			Neira- Hogares Juveniles			Río Guacaica- CHEC			Q. El Rosario- Autopistas del Café			Villamaría- Hospital			Alto Castillo			Liceo Isabel La Católica			Q. Olivares- El Popal			Q. Tesorito		
Día		Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Media	Mínima
M	1	32.6	27.2	23.0	26.9	22.0	18.9							33.1	25.9	21.4				30.8	27.6	22.1	29.7	24.6	19.9	23.9	19.8	16.7	24.3	20.8	17.7	32.7	27.0	23.0				24.9	19.9	15.9	22.0	18.1	15.1	23.1	18.9	15.6				22.1	19.6	17.5
J	2	32.1	26.5	22.2	24.4	21.1	18.3							29.9	24.6	21.1				28.5	24.8	22.3	26.0	23.1	21.4	20.7	18.7	15.8	20.4	18.6	16.9	28.7	24.7	22.7				21.6	18.5	16.8	18.4	16.6	15.6	19.8	17.5	15.9				20.9	19.5	18.4
V	3	32.8	26.4	23.3	24.4	21.1	19.6							31.7	25.5	22.4				29.2	25.1	22.3	28.5	23.9	21.6	22.5	19.3	17.3	22.6	18.9	17.1	31.0	25.0	21.8				23.1	18.6	16.7	21.3	16.6	15.1	20.8	17.4	15.8				21.5	19.1	17.6
S	4	26.9	24.6	23.8	20.8	19.5	18.8							27.9	23.3	21.5				27.3	23.8	21.8	24.0	21.8	19.9	18.6	17.7	16.7	17.2	16.7	16.4	23.2	22.1	21.4				19.9	17.2	15.6	17.2	15.6	14.8	18.5	16.1	15.2				20.7	18.9	17.4
D	5	31.6	26.0	22.9	25.0	20.7	18.6							31.5	24.5	21.2				31.2	24.9	21.7	27.7	22.8	20.2	22.7	19.2	15.9										22.4	18.6	16.0	20.1	16.7	14.6	21.2	17.4	14.8				21.9	19.6	18.1
L	6	33.8	26.7	23.5	26.6	22.3	20.1							33.3	25.0	21.8				32.3	25.8	23.6	29.8	23.6	21.4	24.4	19.6	16.9										24.2	18.9	16.0	19.7	16.9	15.8	22.2	18.1	16.1				22.3	19.7	17.8
M	7	33.4	27.2	23.4	26.6	22.2	19.1							32.5	25.9	21.5				32.5	25.6	22.2	29.8	24.1	20.8	23.8	19.8	16.7										23.8	19.7	15.6	21.7	18.0	15.4	21.9	18.6	16.1				21.6	19.8	17.5
M	8	31.0	25.5	23.2	23.9	20.2	18.1							30.7	24.9	21.5				29.4	25.6	22.7	27.8	23.9	20.9	21.9	18.6	16.1										35.4	26.1	20.2	22.1	18.7	16.4	15.6	14.9	14.7	20.1	17.3	15.2				21.0	19.5	18.4
J	9	25.4	23.6	22.7	19.6	18.8	17.9							24.4	22.9	21.7				25.2	23.3	22.8	25.1	22.3	21.1	18.1	16.9	15.9										23.2	22.3	21.1	18.4	17.2	16.2				16.8	15.7	14.8				19.7	19.0	18.7
V	10	32.6	25.8	22.2	26.0	21.0	17.9							31.1	23.6	21.0				28.4	24.6	22.3	27.6	23.0	20.6	23.4	19.0	15.8										28.1	22.8	20.8	24.2	18.6	15.7				22.6	17.6	14.7				22.0	19.5	18.0
S	11	33.3	26.6	22.2	25.2	21.7	19.1							31.6	24.6	20.8				31.9	26.0	22.7	29.4	23.8	21.3	24.2	19.6	16.4										22.9	20.9	20.4	24.7	19.2	16.6				21.4	17.7	15.6				22.1	19.5	18.2
D	12	31.4	26.2	23.0	23.4	20.8	18.8							29.7	24.0	21.6				28.0	24.2	22.6	26.1	22.9	20.8	21.1	18.3	15.2										24.9	22.1	20.1	22.5	18.7	16.5				21.6	17.5	15.3				22.1	19.6	18.0
L	13	33.3	27.2	22.1	27.3	22.6	19.4							31.7	25.0	20.4				31.5	25.6	21.5	29.5	23.7	19.6	24.9	20.3	17.2										23.6	19.6	18.4	21.7	16.9	15.6				23.4	19.4	15.0				22.4	19.8	17.2
M	14	30.8	26.5	24.0	24.1	21.0	19.2							29.7	25.1	22.7				29.2	25.8	23.3	27.3	23.5	20.4	21.7	19.2	17.6	21.0	18.7	17.7	27.7	25.0	23.5													20.4	17.7	16.5				20.9	19.6	18.3
M	15	29.9	25.2	22.3	22.8	19.8	17.9							30.0	24.3	21.3				28.9	24.9	22.6	27.6	23.2	20.6	20.5	18.2	15.9	21.6	17.9	16.0	28.5	24.1	21.9													19.1	16.5	15.1				21.0	19.2	17.9
J	16	31.7	26.1	22.0	24.7	21.2	19.4							31.7	25.2	22.1				31.2	25.5	22.9	28.9	23.3	20.8	22.5	18.5	16.5	22.7	18.5	16.5	30.2	24.3	21.0													21.2	17.3	15.0				21.5	19.4	17.7
V	17	32.6	26.8	23.8	25.2	21.7	19.6							32.4	25.7	22.4				31.3	26.0	23.3	28.1	23.9	21.4	22.6	19.5	17.1	22.8	19.2	17.2	30.4	25.1	21.8	26.8	24.1	20.8	22.5	20.3	16.7							21.0	18.0	15.8				21.3	19.4	17.9
S	18	34.8	27.0	23.6	25.7	22.5	19.9							33.6	26.3	21.5				31.1	26.8	23.1	29.6	24.7	21.4	25.4	20.4	17.3	24.7	20.0	17.3	32.9	26.0	22.3				25.6	20.3	15.7							23.2	18.7	15.7				22.1	19.7	17.3
D	19	33.1	26.7	23.9	24.8	21.9	20.4							32.1	24.9	21.8				32.0	26.0	22.6	29.5	23.2	19.6	25.0	20.1	18.0	22.2	22.1	21.7	32.0	31.7	31.5				24.4	19.9	17.9							21.2	18.4	16.4				22.0	19.9	18.5
L	20	32.2	26.8	22.3	24.8	22.2	20.1							30.6	25.7	22.3				30.5	27.2	22.4	28.6	25.2	20.5	23.9	20.8	19.3	22.6	19.7	17.5	30.4	25.6	21.5				23.2	20.0	17.9							21.2	18.5	15.9				22.0	19.4	17.6
M	21	33.8	27.2	23.6	26.1	22.1	18.8							31.6	24.9	21.1				31.1	26.1	23.5	28.5	23.5	21.4	22.7	19.2	16.8	23.8	20.2	16.5	31.1	26.0	22.4				24.8	20.2	17.3							22.1	18.7	16.0				22.1	20.0	18.7
M	22	35.4	27.3	22.9	26.9	22.3	20.2							33.2	25.5	21.9				31.0	26.0	22.2	27.3	23.9	21.3	23.1	19.5	16.9	20.4	18.2	17.6	27.0	23.8	22.5				25.6	20.0	17.5							21.4	18.5	16.3				21.9	19.9	18.2
J	23	32.0	26.4	23.5	24.4	21.3	19.6							31.8	24.8	21.9				30.0	25.2	22.6	27.1	23.6	20.6	23.4	19.0	16.2	23.1	19.3	17.3	30.0	25.8	22.7				22.5	19.6	17.4							20.4	18.0	16.2				21.5	19.8	18.0
V	24	34.8	27.4	22.0	26.1	21.9	18.6							33.4	25.1	20.6				31.7	26.6	22.7	29.5	24.1	20.1	23.9	19.6	15.9	24.3	21.1	18.7	32.1	27.4	24.0				25.4	20.0	15.7							22.9	18.5	14.5				22.1	19.7	17.3
S	25	31.0	26.4	23.5	24.7	21.6	19.8							31.5	25.0	21.1				30.3	26.1	23.0	28.5	24.5	21.8	23.4	19.3	16.8	23.3	19.9	17.9	31.4	26.3	22.6				22.8	19.6	16.6							21.4	18.4	15.9				21.7	19.7	17.5
D	26	33.3	26.5	22.8	25.9	21.7	19.9							31.9	25.7	22.0				32.3	26.1	22.9	29.8	23.7	20.6	25.6	19.7	16.9	19.9	18.5	17.4	26.2	23.7	21.9				23.7	19.5	15.7							21.4	18.4	15.7				22.1	19.6	17.3
L	27	32.2	26.7	23.0	24.3	21.3	19.6							29.9	25.0	22.2				29.2	25.4	23.5	27.1	23.0	21.3	23.2	18.9	17.1	18.6	17.9	17.3	24.4	23.2	22.6				23.8	19.3	16.9							21.1	17.6	15.9				21.6	19.4	17.9
M	28	34.3	27.2	23.1	27.4	21.8	19.1							33.2	25.3	21.2	30.6	26.3	22.2	32.4	26.6	22.7	29.0	24.2	21.5	23.8	19.6	17.0	23.9	20.1	16.9	31.2	26.2	22.5				23.8	19.9	17.1	21.0	17.6	15.1	21.5	18.4	15.8				22.0	19.9	18.2
M	29	26.9	24.2	22.6	21.7	19.7	18.1							29.2	24.3	21.5	27.0	23.2	21.2	30.2	25.2	23.0	25.6	23.0	21.9	20.1	18.1	16.8	19.3	18.0	16.7	27.5	25.2	23.2				20.1	18.3	16.7	17.6	16.1	14.9	19.1	17.0	15.1				20.9	19.4	18.6
J	30	31.6	26.0	22.2	24.7	20.4	18.0							31.0	24.8	21.3	28.1	23.9	21.0	31.0	25.9	23.1	27.0	23.1	21.3	22.2	18.2	16.0	21.4	18.9	17.2	29.6	24.9	23.0				21.8	18.5	16.4	18.6	16.6	15.1	20.3	17.0	15.0				21.2	19.7	18.9
V	31	36.3	27.2	23.1	26.3	22.2	19.2							31.9	25.1	22.0	29.8	24.6	21.4	31.2	25.9	23.5	28.7	23.4	21.3	24.1	19.4	16.6	24.8	21.0	19.0	31.8	27.0	22.5				24.3	18.8	17.2	22.5	18.0	15.4	23.8	18.7	15.9				22.2	19.9	18.1

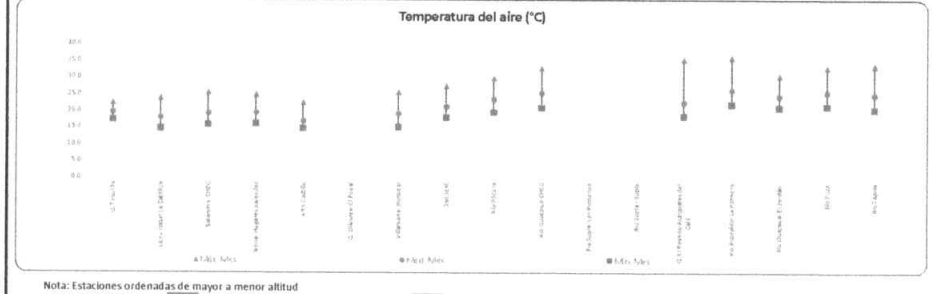

Nota: Estaciones ordenadas de mayor a menor altitud

CONVENCIONES Temperatura máxima en el mes por estación. Temperatura mínima en el mes por estación. Valores en rojo están incompletos y/o presentan fallas

Altitud	Estaciones	Máx. Mes	Med. Mes	Mín. Mes
2314	Q. Tesorito	22.4	19.6	17.2
2156	Liceo Isabel La Católica	23.8	17.9	14.5
2078	Salamina- CHEC	25.6	19.2	15.7
2053	Neira- Hogares Juveniles	24.8	19.3	16.0
2220	Alto Castillo	22.5	16.8	14.6
2002	Q. Olivares- El Popal			
1790	Villamaría- Hospital	25.6	19.1	15.0
1728	San José	27.4	21.3	17.9
1718	Río Pácora	29.8	23.6	19.6
1612	Río Guacaica-CHEC	32.9	25.5	21.0
1239	Río Supía- Los Piononos			
1183	Río Supía - Supía			
1131	Q. El Rosario-Autopistas	35.4	22.6	18.4
1016	Río Risaralda- La Palmera	36.1	26.4	22.0
929	Río Guacaica- El Jordán	30.6	24.5	21.0
840	Río Pozo	32.1	25.6	21.5
825	Río Tapias	33.6	24.9	20.4

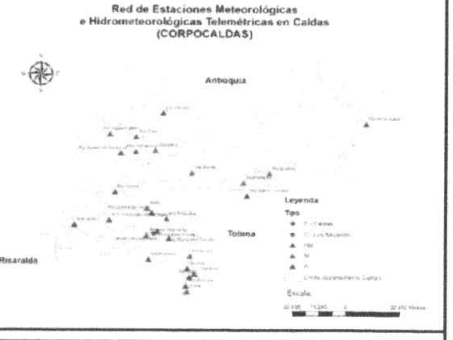

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · Corpocaldas · Alcaldía de Manizales · GOBIERNO DE CALDAS · emas by VEOLIA · chec Grupo epm · VIVO CUENCA · Grupo de trabajo académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental · Grupo de Ambientes Inteligentes Adaptativos

CDIAC · GEOPORTAL
