INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN

FECHA: 27 de septiembre de 2024

OBJETIVO: Aunar esfuerzos entre el Municipio de San Jerónimo Antioquia y la Junta de Acción Comunal Vereda Los Alticos, para realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las vías terciarias de la vereda.


INTRODUCCION

Este proyecto se desarrolla en el municipio de San Jerónimo en el Departamento de Antioquia, en la vía de la vereda Los Alticos. La cual tiene una distancia aproximada desde la cabecera municipal de 7 km.

El objeto del proyecto es *"Aunar esfuerzos entre el Municipio de San Jerónimo Antioquia y la Junta de Acción Comunal Vereda Los Alticos, para realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las vías terciarias de la vereda.*", donde se tiene actividades que comprende Suministro y riego de materiales tipo afirmado según norma INVIAS. En la cual se intervinieron 180 metros lineales de uno de los puntos más críticos.

Ya que la vía de la vereda, actualmente, cuenta con varios tramos en mal estado, donde no es segura para el tránsito de vehículos, por tal motivo se requiere la intervención inmediata con maquinaria amarilla y volquetas para mejorar las condiciones de la capa de rodadura, realizar limpieza de derrumbes en la vía, limpieza de obras y cunetas.

Longitud de la vía terciaria:
Km 0+00.00 hasta el Km 3+100.
Georreferencia Inicial (6°28'28.69" N -75°41'52.81" O)
Georreferencia Final (6°28'52.55" N -75°40' 40.55" O)

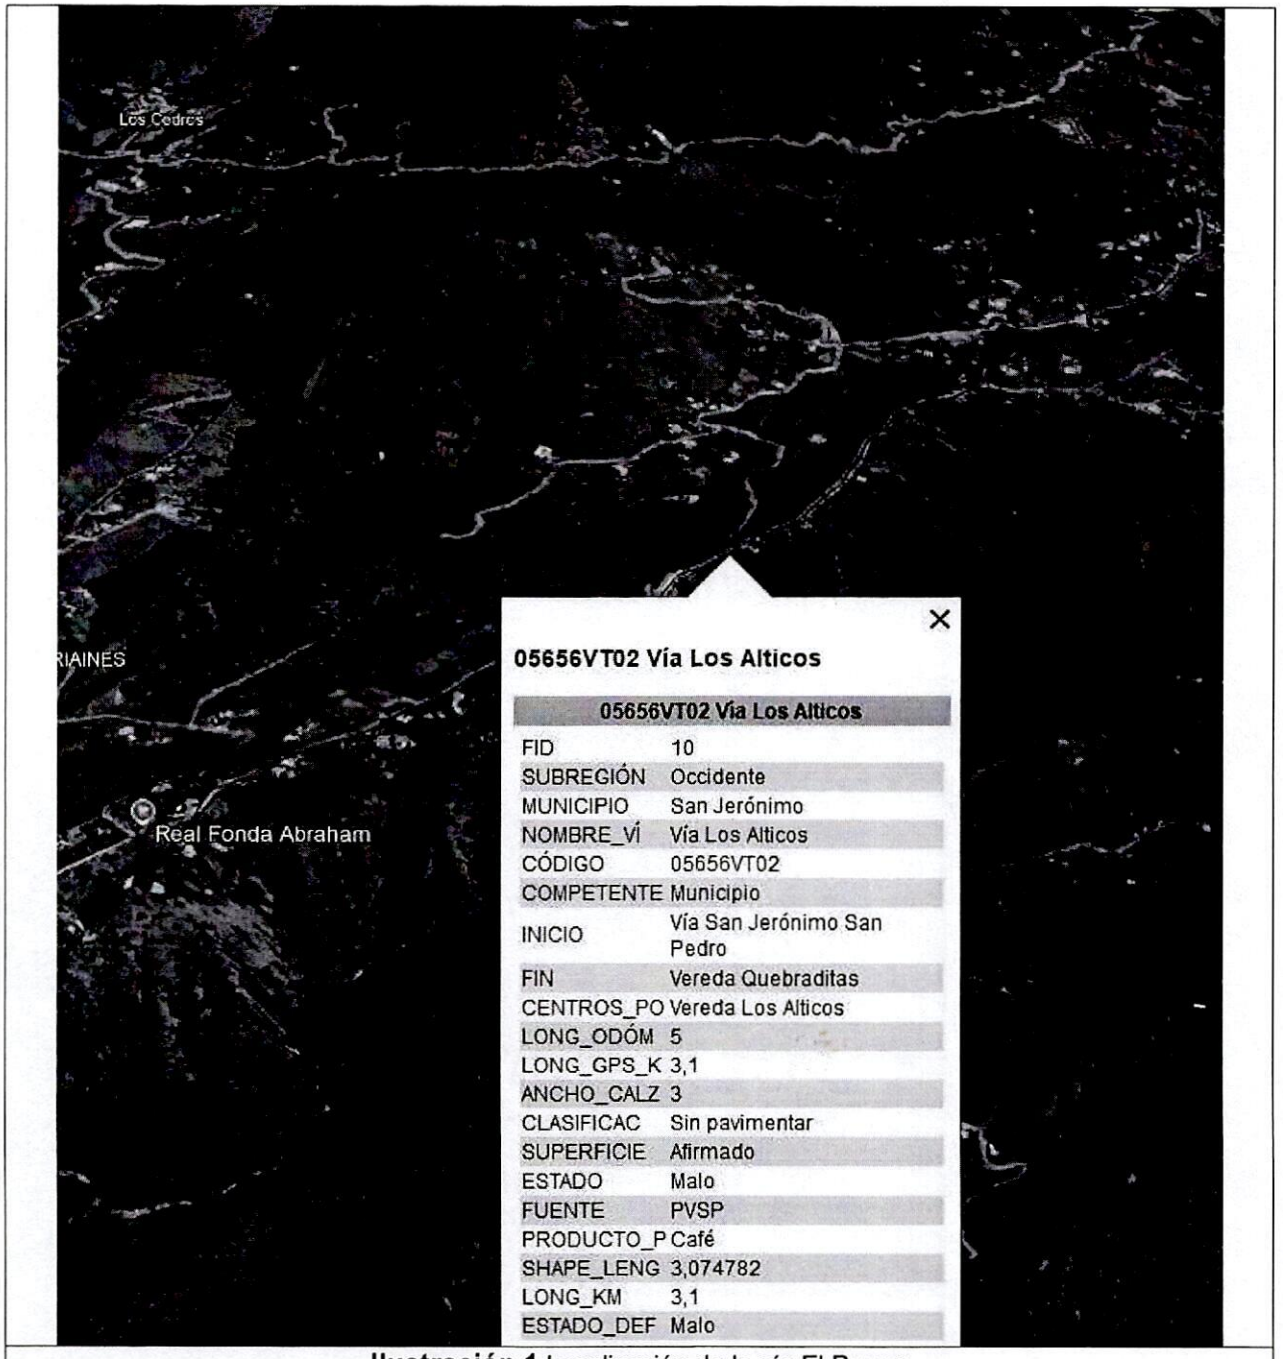

05656VT02 Vía Los Alticos	
FID	10
SUBREGIÓN	Occidente
MUNICIPIO	San Jerónimo
NOMBRE_VÍ	Vía Los Alticos
CÓDIGO	05656VT02
COMPETENTE	Municipio
INICIO	Vía San Jerónimo San Pedro
FIN	Vereda Quebraditas
CENTROS_PO	Vereda Los Alticos
LONG_ODÓM	5
LONG_GPS_K	3,1
ANCHO_CALZ	3
CLASIFICAC	Sin pavimentar
SUPERFICIE	Afirmado
ESTADO	Malo
FUENTE	PVSP
PRODUCTO_P	Café
SHAPE_LENG	3,074782
LONG_KM	3,1
ESTADO_DEF	Malo

Ilustración 1 Localización de la vía El Ruano

2. FICHA INFORMATIVA

2.1 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: **CONVENIO SOLIDARIO 017 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

OBJETO: *"Aunar esfuerzos entre el Municipio de San Jerónimo Antioquia y la Junta de Acción Comunal Vereda Los Alticos, para realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las vías terciarias de la vereda".*

CONTRATISTAS: **JAC VEREDA LOS ALTICOS**

SUPERVISIÓN: CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Tabla 1 Ficha del contrato de obra.

Fecha de inicio	04/09/2024	Fecha de suspensión	N/A
Fecha de terminación	03/11/2024	Fecha de reinicio	N/A
Tiempo transcurrido	23 días	**OBSERVACION:** Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo	
Plazo total del contrato	2 mes		
% de avance obra desde el acta de inicio hasta corte	100%		
Se firma cnvenio solidario el dia 02 de septiembre de 2024.			

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Tabla 2 Aportes

Valor del convenio solidario	$10.350.000
Aporte de la entidad estatal	$9.000.000
Aporte de las JAC	$ 1.350.000

3. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

3.1 MANENIMIENTO.

En esta actividad se garantiza el suministro del material tipo afirmado, desde la mina hasta su lugar de destino, donde se esparcira en los puntos de la via con mayor afectacion, desde el km 0+000 hasta el Km 3+100. Que tiene de longitud la via terciaria de la vereda Los Alticos. La actividad incluye también la disposición o eliminación de todos los materiales o residuos vegetales provenientes de la citada operación, sin utilizar medios dañinos contra el medio ambiente, tales como la quema total o parcial de las áreas o desechos y el derrumbamiento de los taludes destruyendo la cobertura vegetal. Los desechos se trasladan y acopian en un sitio adecuado según las instrucciones del encargado de la supervisión.

A continuación se mostrara algunas fotos de la actividad realizada.

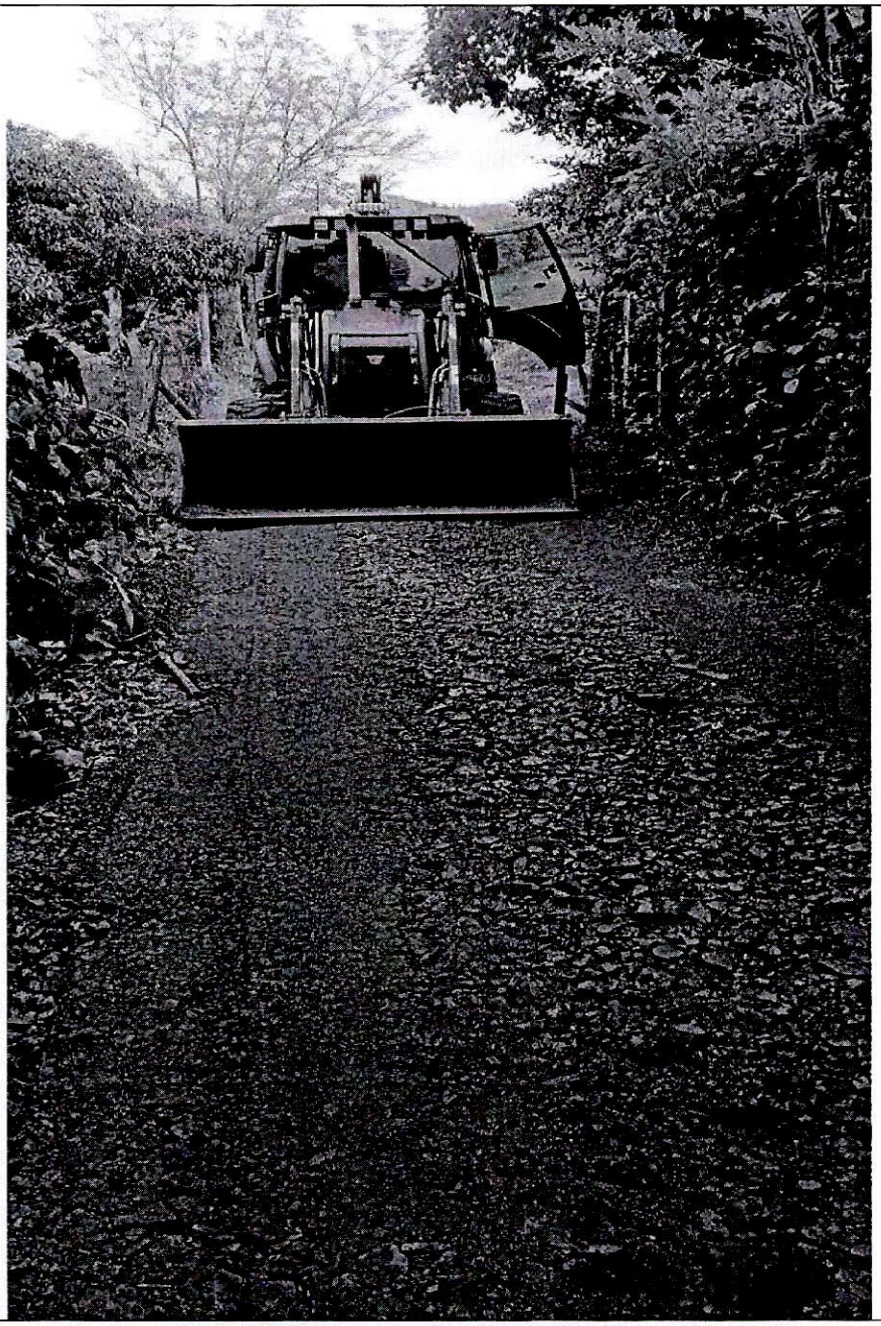


Foto 1: Intervención mantenimiento de vía.

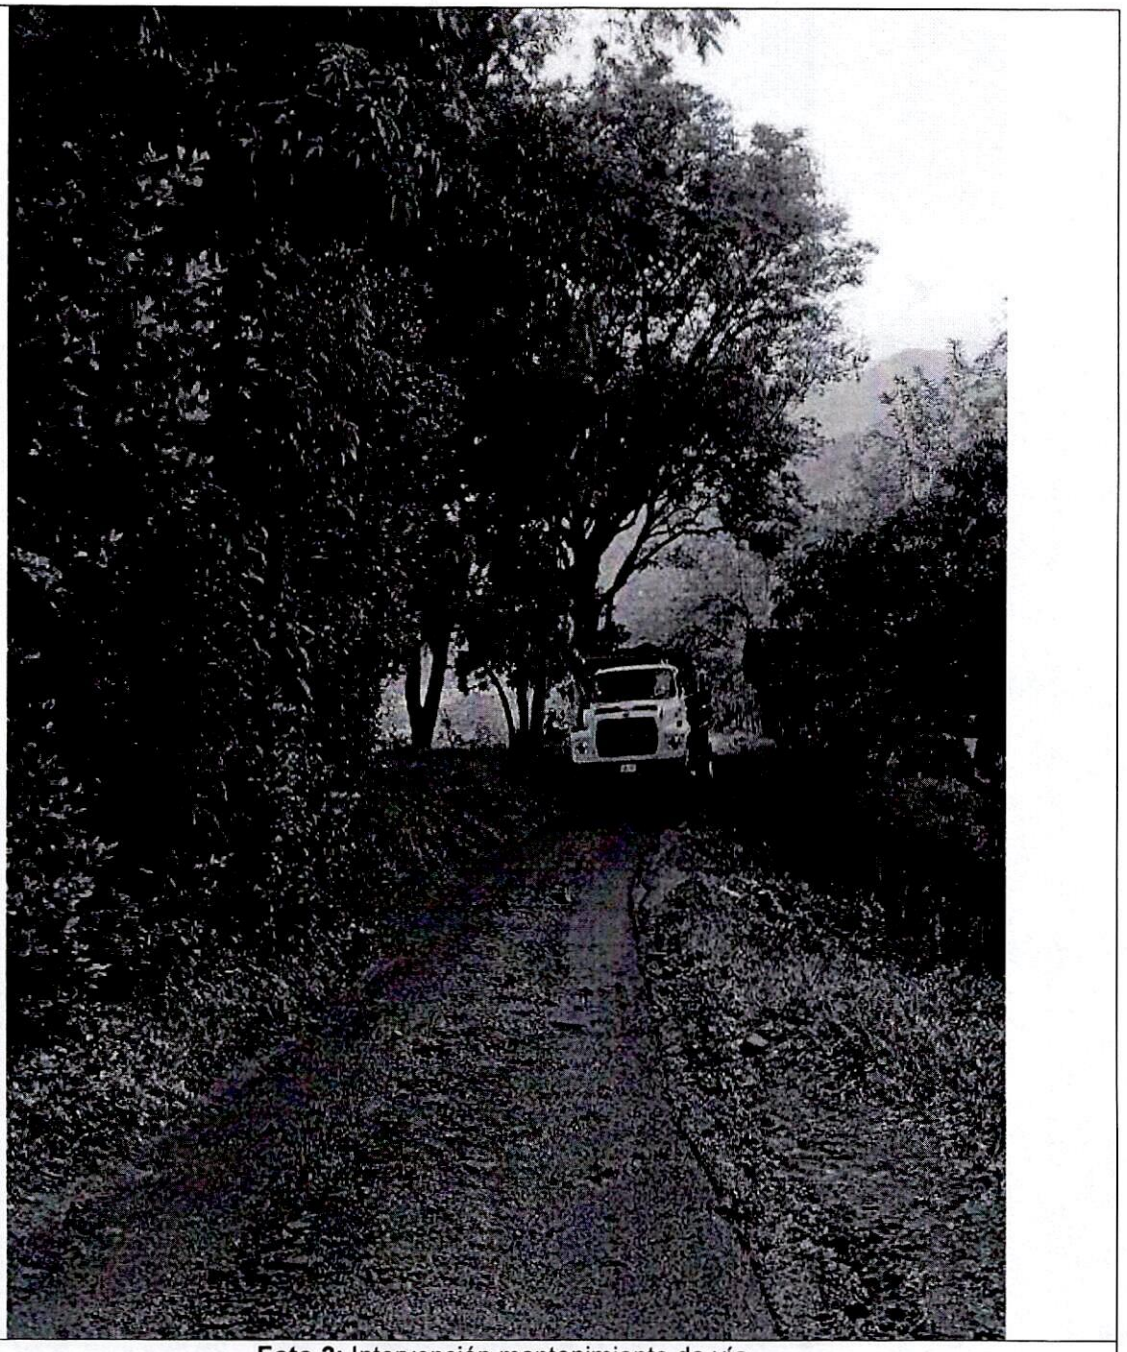


Foto 2: Intervención mantenimiento de vía.

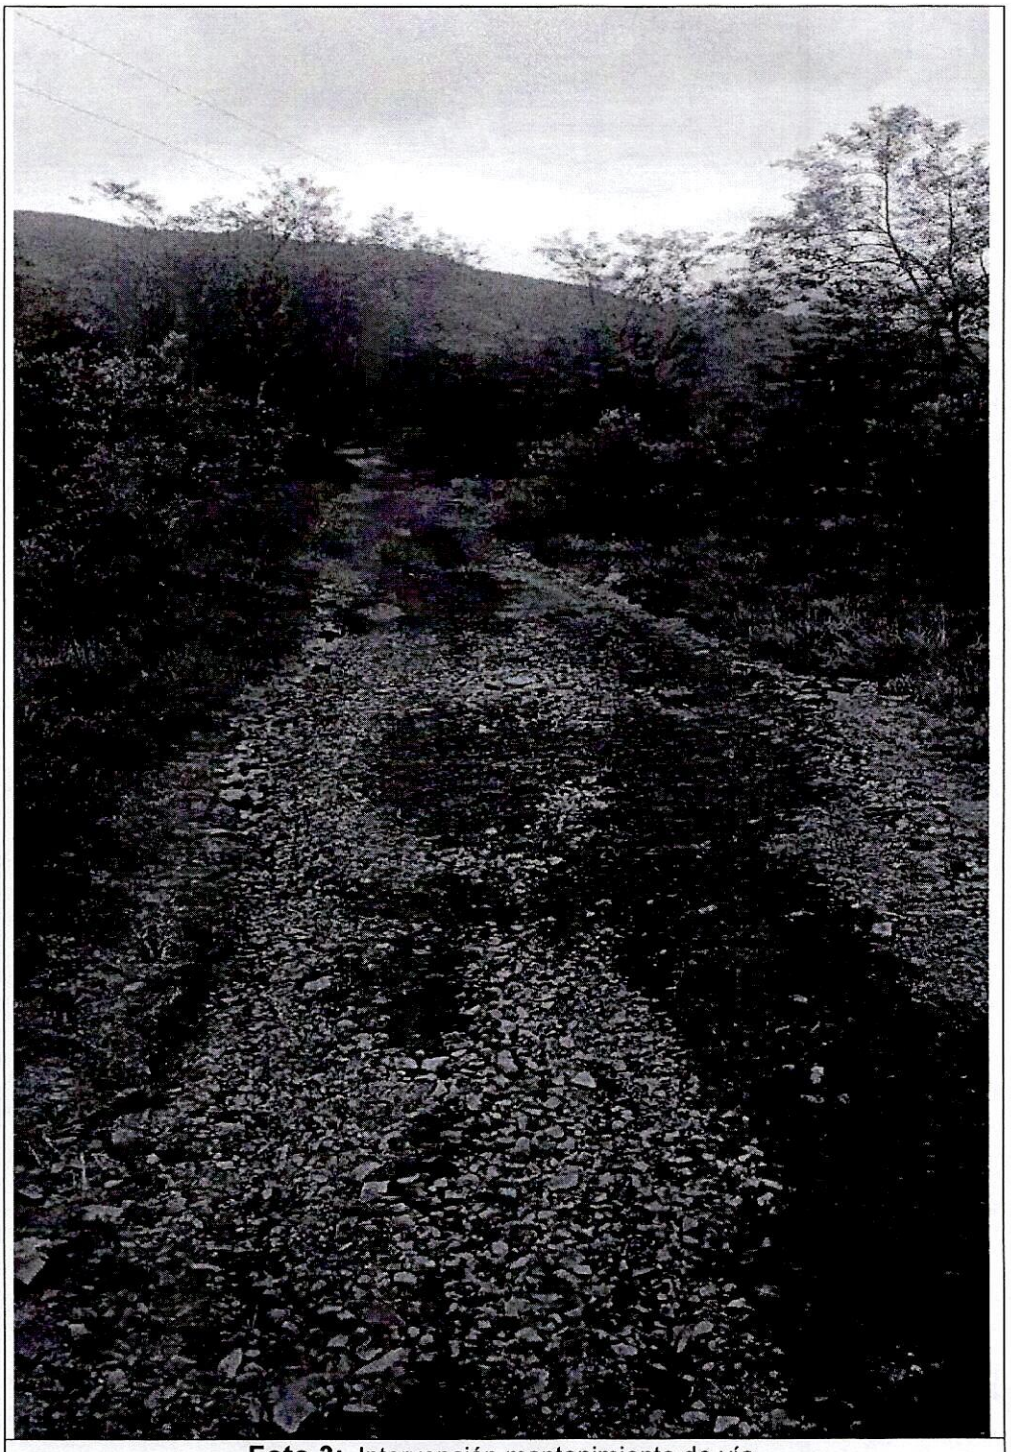


Foto 3: Intervención mantenimiento de vía.

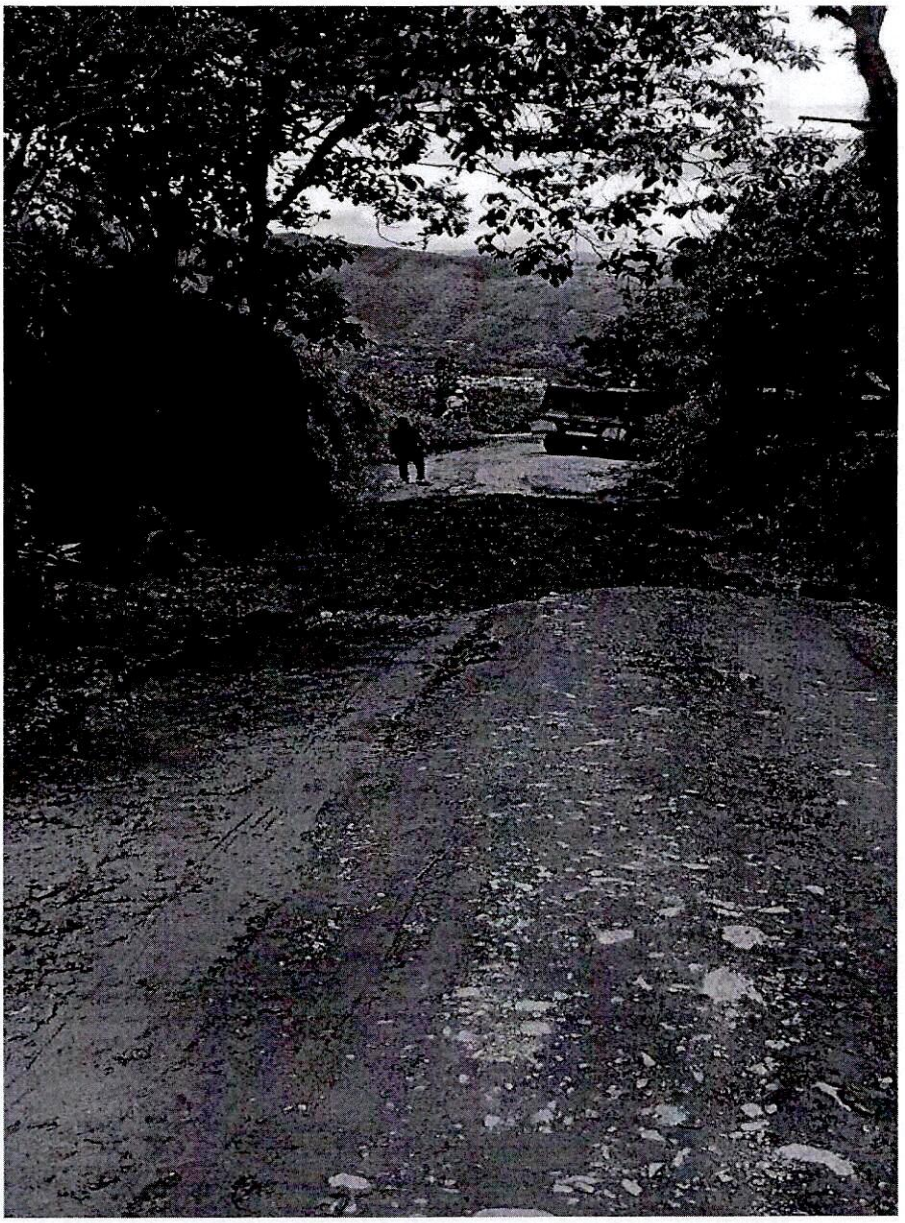


Foto 4: Intervención mantenimiento de vía.

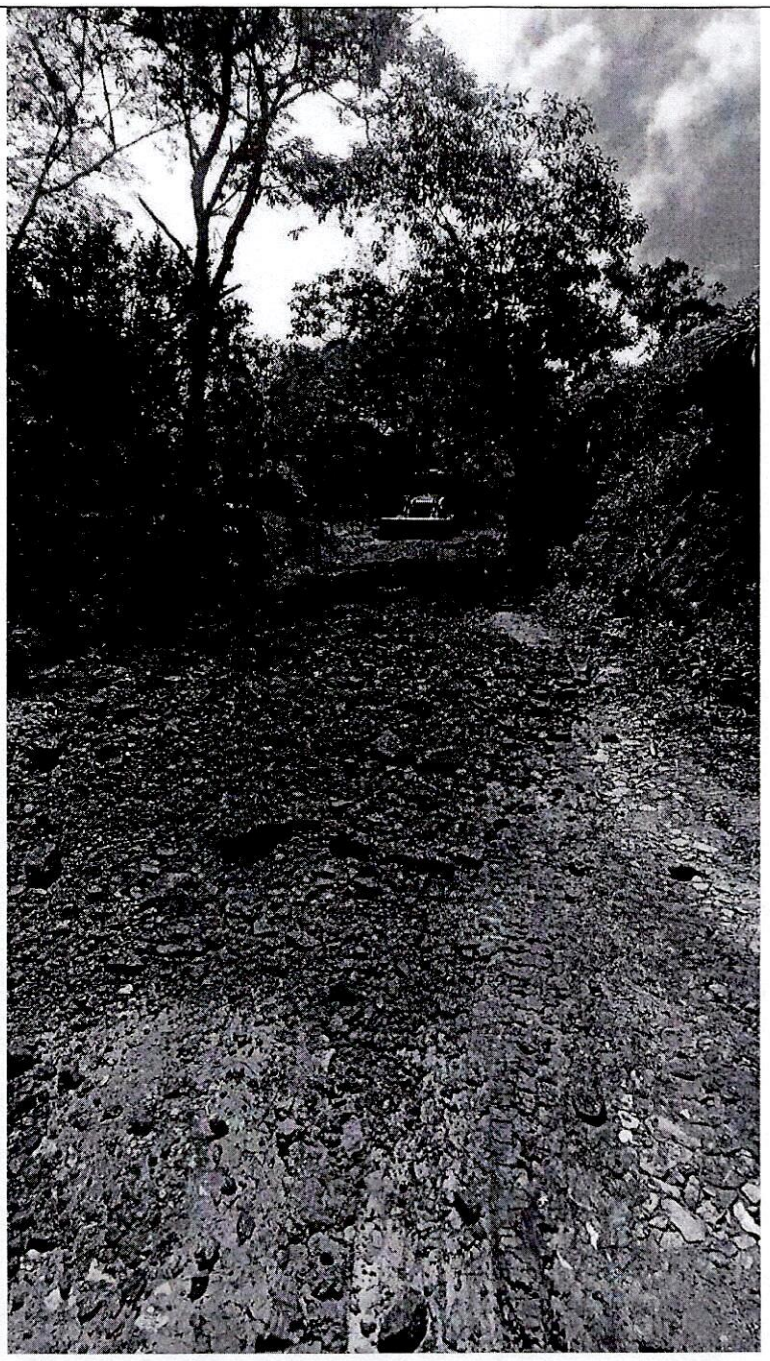


Foto 5: Intervención mantenimiento de vía.

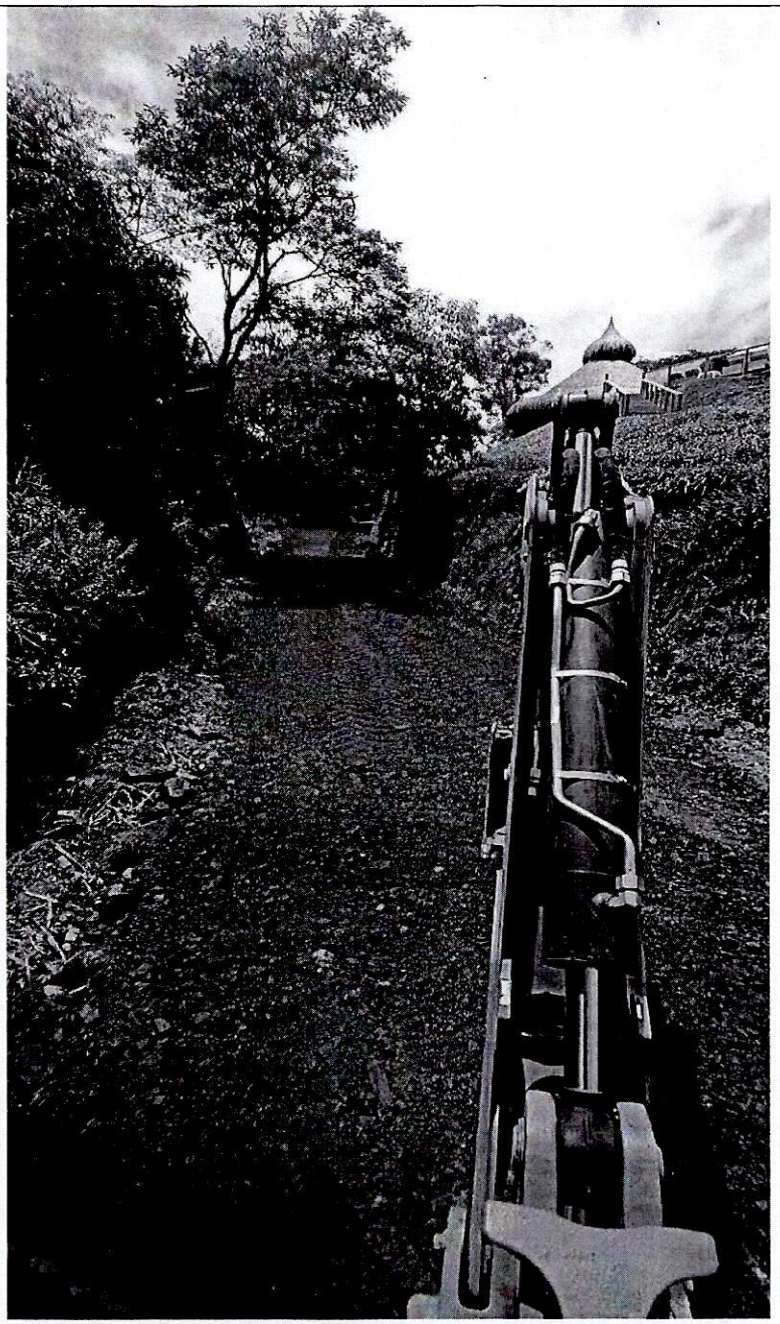


Foto 6: Intervención mantenimiento de vía.

4.1 Memoria de cantidades

Tabla 5 Cantidades iniciales.

PRESUPUESTO INICIAL					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**
1	Suministro de sitio y riego de materiales tipo afirmado según norma INVIAS	m^3	90	$ 100.000	$ 9.000.000
2	Mano de obra	m	180	$ 7.500	$ 1.350.000
		TOTAL			$ 10.350.000

CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA
Secretario de Planeación.
Municipio de San Jerónimo, Departamento de Antioquia

CONVENIO DE SOLIDARIDAD No. 017 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE – 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA COMUNIDAD

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALTICOS
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Municipio de San Jerónimo Antioquia y la Junta de Acción Comunal Vereda Los Alticos, para realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las vías terciarias de la vereda.

Yo, JUAN DE JESUS AL VAREZ TOBÓN, representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALTICOS con NIT.811.039.465-2 , como vocera y representante de la comunidad, hago constancia del cumplimiento de las obligaciones del objeto del convenio, el cual fue ejecutado a entera satisfacción.

Para constancia se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el día 27 del mes de septiembre de 2024.

JUAN DE JESUS ALVAREZ TOBÓN
Representante legal, JAC Los Alticos.
