
INFORME SEMANAL



Comentario: Inicio de mortero en el área de acceso a la terraza cumpliendo con las pendientes requeridas



Comentario: Se procede con el mortero en el área de acceso a la terraza cumpliendo con las pendientes requeridas

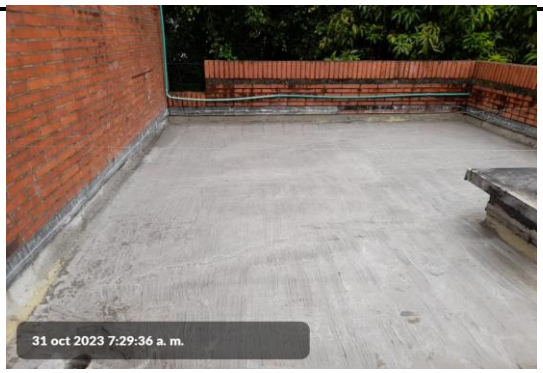


Comentario: Inicia con el mortero en el área de acceso lado derecho a la terraza cumpliendo con las pendientes requeridas






Comentario: Se inicia con la instalación de los cielos en fibra y la instalación de las lamparas incluyendo el balance de cargas del tablero electrico.

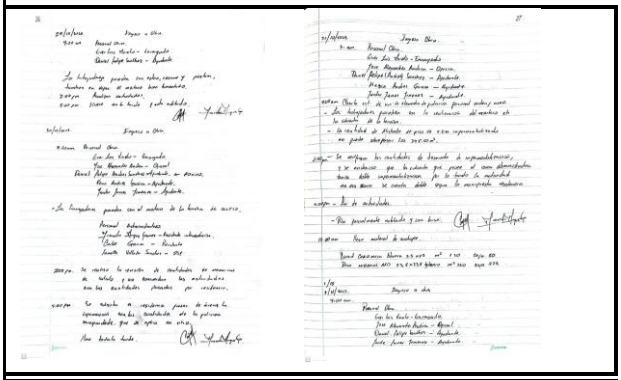

BITÁCORA

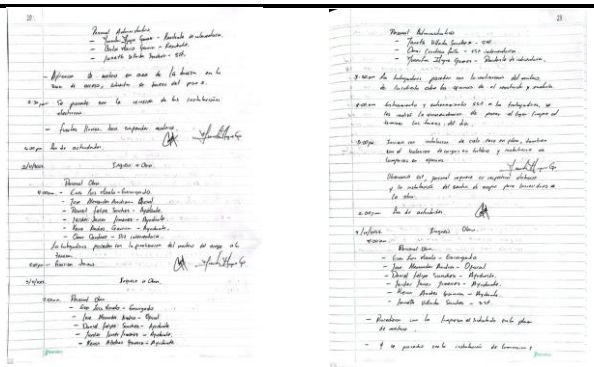

BITÁCORA

INFORME SEMANAL




Comentario: Inicio de instalación de enchape sobre mortero con pendiente hacia la bajante.




Comentario: Se verifico las piezas de enchape instaladas para que cumplan con la pendiente requerida.




Comentario: Instalación de enchape sobre mortero con pendiente hacia la bajante sobre cubierta acorde a las pendientes marcadas

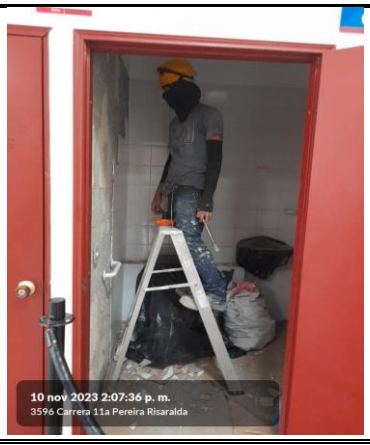

Comentario: Desmonte de enchape de baño hombres atención al público.

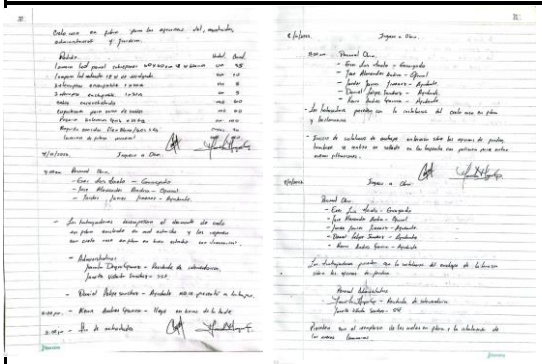

BITÁCORA

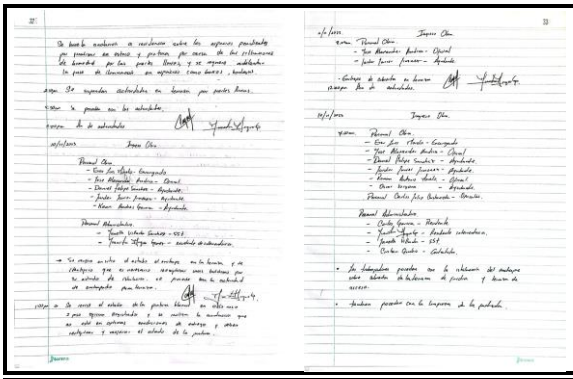

BITÁCORA
