ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_CALI - VALLE DEL CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	OBRA							
1	**PRELIMINARES**							$28,572,189.35
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2				$ 9,238.00		
1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	M2	1005.00	1,004.93	1,004.93	$ 8,067.00	$8,106,802.58	
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	721.00	721.00	721.00	$ 13,513.00	$9,742,832.46	
1.38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M				$ 34,758.00		
1.39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M				$ 42,677.00		
1.40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M				$ 30,799.00		
1.41	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	M				$ 12,194.00		
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	5.00			$ 431,350.00		
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	50.00	25.49	25.49	$ 13,513.00	$344,492.31	
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	125.00	98.00	98.00	$ 26,919.00	$2,638,062.00	
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL	UN/DIA	180.00	60.00	60.00	$ 129,000.00	$7,740,000.00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**							$13,762,665.00
2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	5.00	5.00	5.00	$ 873,853.00	$4,369,265.00	
2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	M	5.00			$ 734,994.00		
2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	20.00			$ 128,203.00		
2.19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	10.00			$ 102,508.00		
2.21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	UN	20.00			$ 210,108.00		
2.22	MANTENIMIENTO DE MUEBLE	M	40.00	40.00		$ 234,835.00	$9,393,400.00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**							
3.02	BARANDA TUBO REDONDO	M	92.76			$ 115,530.00		
3.08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	30.00			$ 313,550.00		
3.09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	M2	163.00			$ 270,738.00		
3.13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	UN	20.00			$ 223,880.00		
3.15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	M2	20.00			$ 344,470.00		
3.19	REJILLA DE PISO 30CM	M2				$ 105,213.00		
3.20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	28.08			$ 183,294.00		
4	**CIELORRASOS**							
4.02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	M2	190.00			$ 117,172.00		
6	**CUBIERTAS**							
6.12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	M2				$ 27,275.00		
6.21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M	110.00			$ 36,342.00		
7	**ENCHAPE MUROS**							$9,112,789.39
7.03	RESANE	M2	563.25	563.25	563.25	$ 16,179.00	$9,112,789.39	
7.04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	M2				$ 7,537.18		
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							$10,015,992.00
10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	1727.00	504.00	504.00	$ 19,873.00	$10,015,992.00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**							$29,066,273.06
11.06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	M2	721.00	721.00	721.00	$ 40,314.00	$29,066,273.06	
12	**MAMPOSTERÍA**							

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_CALI - VALLE DEL CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
12.01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M				$ 50,613.00		
13	**PINTURAS**							**$43,741,610.05**
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	1700.00	1,863.25		$ 23,476.00	$43,741,610.05	
14	**PISOS**							**$38,393,345.50**
14.10	PISO GRANITO MARMOL	M2		53.66		$ 179,699.00	$9,642,869.13	
14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	721.00	721.00	721.00	$ 39,876.00	$28,750,476.37	
14.19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	M	135.00			$ 41,340.00		
15	**RED ELÉCTRICA**							
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN				$ 165,249.00		
16	**RED HIDRÁULICA**							
16.22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN				$ 435,073.00		
16.25	MOTOBOMBA 2,0 HP	UN	1.00			$ 885,073.00		
16.29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN				$ 550,763.00		
16.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	M				$ 1,074,289.00		
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	26.00			$ 281,763.00		
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	6.00			$ 70,830.00		
17	**RED SANITARIA**							
17.19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	80.00			$ 17,440.00		
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M	60.00			$ 28,143.00		
17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1.00			$ 646,975.00		
17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	17.00			$ 419,874.00		
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**							**$874,026.00**
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	3.00	2.00	2.00	$ 437,013.00	$874,026.00	
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	100.00			$ 16,324.00		
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	50.00			$ 38,256.00		
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	46.41			$ 171,059.00		
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	4.00			$ 521,758.00		
20	**NO PREVISTOS**							
NP-01	IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALIUMINIO 3MM	m2	1,005.00			$ 87,757.00		
NP-02	CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 0.90X30MTS- PALOMAS	ml	263.10			$ 68,743.00		
NP-03	ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES	M2	721.00			$ 143,223.00		
NP-04	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR DE 15A 110V	UND	20.00			$ 30,890.00		
NP-05	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	184.34			$ 16,176.86		
NP-06	Desmonte de cieloraso	m2	190.00			$ 6,716.92		
NP-07	Desmonte aparato sanitario y lavamanos	u	19.00			$ 23,756.18		
NP-08	Pintura koraza sobre superficie lisa 2 manos	m2	191.79			$ 15,321.32		
	TOTAL COSTO DIRECTO							**$173,538,890.35**
	ADMINISTRACIÓN	%	23%					$ 39,913,944.78
	IMPREVISTOS	%	1%					$ 1,735,388.90
	UTILIDADES	%	5%					$ 8,676,944.52
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19%					$ 1,648,619.46
	VALOR TOTAL OBRA							**$225,513,788.01**

VALOR TOTAL ORIP CALI - VALLE DEL CAUCA	$ 751,712,626.70

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_CALI - VALLE DEL CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73
VALOR ADICIÓN N°1	
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$225,513,788.01		30.00%	**$225,513,788.01**			**$225,513,788.01**	**$ 526,198,838.69**
2								
3								
4								
5								
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FRAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
Representante Legal
INTERVENTORIA

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº		1674 DE 2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS	NIT / C.C.	800205914-1
PLAZO	CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DIAS		FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA	31/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA	30/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.089.847.608,73	TOTAL ADICIONES		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.089.847.608,73

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (I3 ORIP)

CUADRO RESUMEN AGRUPACION 1

No	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	PACIFICO	VALLE	CALI
2		VALLE	SEVILLA
3		CAUCA	EL BORDO
4		CHOCO	ISTMINA
5	ANDINA	RISARALDA	PEREIRA
6		ANTIOQUIA	FRONTINO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FACTURA / CUENTA DE COBRO

FECHA DD-MM-AA	NÚMERO DE ACTA PARCIAL	No DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR	% TOTAL DE EJECUCION
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DECALI - VALLE	FVE-3765	PAGO PRIMER 30% CALI - VALLE	$ 225.513.788,01	$ -	$ 225.513.788,01	10,79%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE SEVILLA - VALLE	FVE-3767	PAGO PRIMER 30% SEVILLA - VALLE	$ 74.138.284,20	$ -	$ 74.138.284,20	3,55%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE EL BORDO - CAUCA	FVE-3768	PAGO PRIMER 30% EL BORDO - CAUCA	$ 63.728.057,39	$ -	$ 63.728.057,40	3,05%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE ISTMINA - CHOCO	FVE-3829	PAGO PRIMER30% ISTMINA - CHOCO	$ 66.721.683,61	$ -	$ 66.721.683,61	3,19%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE PEREIRA - RISARALDA	FVE-3825	PAGO PRIMER 30% PEREIRA - R4ISARALDA	$ 132.847.170,57	$ -	$ 132.847.170,57	6,36%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE FRONTINO - ANTIOQUIA	FVE-3824	PAGO PRIMER 30% FRONTINO - ANTIOQUIA	$ 64.005.298,84	$ -	$ 64.005.298,84	3,06%
		TOTALES		$ **626.954.282,62**	$0,00	**$626.954.282,62**	30,00%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CALIDAD DE INTERVENTOR/ DEL CONTRATO DE OBRA No 1674 DE 2023 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA 4° FORMA DE PAGO.
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN	1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 2. Copia de Acta de Recibop Parcial No 1 firmada por el contratista, la interventorioa y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría. 4. Copia del RUT contratista de obra. 5. Copia del Contrato de obra. 6. Copia del acta de inicio. 7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 8. Copias planillas de seguridad social. 9. Certificación bancada no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancada donde se debe consignar los dineros correspondientes. 10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisordel contrato de interventoría. 11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obray obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría. 12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS 27 (VEINTI SIETE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoria
TOTALL INC SAS BIC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Entre los suscritos, **WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la **SNR**, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución No. **10989** del 14 de septiembre de 2022, con la cual es se le delegó la Ordenación del Gasto, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra **TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9,** representado legalmente por **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** identificado con **C.C. No. 79553539,** designado por Documento Privado No. 1 del 10 de junio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de agosto de 2022 con el No. 02865410 del Libro IX, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **Contrato de Interventoría**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma Transaccional del **SECOP II** y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideración a lo siguiente: **1).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **2).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. **3).** Que previamente se realizó el **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 002 DE 2023,** cuyo objeto es: **"CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)". 4).** Que en el mencionado proceso se recibieron 4 propuestas de los siguientes interesados:

Referencia de oferta	Entidad
snrRAM	CONSORCIO NIORAM
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS CPM 002 DE 2023	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR
GRUCOING - SUPERNOTARIADO	GRUCOING S.A.S.
Oferta al proceso CPM 002 DE 2023 por TOTALL INC SAS BIC	TOTALL INC SAS BIC

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

5). Que conforme a lo anterior y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, dando el siguiente resultado:

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
1	CONSORCIO NIORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84.30
2	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que, como se evidencia en el Informe de Evaluación Definitivo se presenta un empate entre los proponentes

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que el Comité Técnico evaluador procedió a dar aplicación a los criterios de desempate señalados en el numeral 5.14 del Pliego de Condiciones Definitivo dando como resultado el siguiente orden de elegibilidad:

CRITERIOS DE DESEMPATE		
CERTIFICADOS	TOTALL INC SAS BIC	GRUCOING SAS
1.Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes e servicios extranjeros.	Servicios Nacionales	Servicios Nacionales
2.Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	SI	SI
3. Preferir la propuesta presentada por proponente que acredite en las condiciones establecidas en la Ley que por lo menos el 15 % de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 361 de 1997.	SI	SI
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobreviviencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.	SI	SI
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.	SI	NO
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	NO	NO
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las siguientes condiciones.	NO	NO
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales, o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
10. Preferir a oferente que acredite su acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) este conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual o sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.	SI	NO
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.	SI	NO

Que, una vez establecido lo anterior y teniendo en cuenta el numeral 5.12 del pliego de condiciones definitivo - MODO DE ADJUDICACIÓN - el comité evaluador en Comité de Contratación de fecha 6 de julio de 2023, recomendó al Secretario General y Ordenador del Gasto de la Superintendencia de Notariado y Registro, adjudicar el proceso **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 02 DE 2023.** cuyo objeto es "*CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O*

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)." de la siguiente manera:

AGRUPACIÓN 1
ADJUDICATARIO: TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351 9

AGRUPACIÓN 2
ADJUDICATARIO: GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9

6). Que conforme a lo anterior, resultó ganador de la **AGRUPACIÓN No. 1** el proponente **TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351-9** con **100** puntos y quien oferto un precio de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89),** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **7).** Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas. **CLÁUSULA PRIMERA: - A) OBJETO:** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 1". **B) ALCANCE DEL OBJETO:** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, según corresponda. La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.

El objetivo de la Interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuéstales, contables y financieros en el desarrollo del contrato. La Interventoría debe asumir una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos específicos de la Interventoría serán entre otros:

- **Absolver:** En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la Interventoría es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicación entre las partes.

- **Colaborar:** Teniendo en cuenta que la Interventoría y el Contratista conforman un equipo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista.

- **Controlar:** Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, control, verificación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidación.

- **Exigir:** La Interventora tiene la obligación de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

- **Prevenir:** El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.

- **Solicitar:** Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecución del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoría podrá implicar la modificación del contrato. Esta acción también se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

- **Verificar:** Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

- **Ley 1474 de 2011**

Artículo 84: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.

PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

- Ley 80 de 1993

ARTÍCULO 53. De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría.

CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: A) VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **B) PLAZO DEL CONTRATO:** El término de ejecución del presente contrato será el relacionado en el cuadro siguiente sin que exceda el **31 de diciembre de 2023.** Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo.

AGRUPACION	PLAZO DE EJECUCION
Agrupación 1	Cinco Meses

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El plazo de ejecución del contrato de obra por agrupación está programado de acuerdo al cuadro antes expuesto y los tiempos serán contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con la interventoría y la entidad, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II. **Parágrafo 1:** La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual debe ser firmada en compañía de la supervisión del contrato. **Parágrafo 2:** El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras, deben estar contemplados en los costos de la propuesta económica del oferente. **Parágrafo 3:** La INTERVENTORIA a las obras se realizará en una (1) etapa de acuerdo con las especificaciones de construcción y el presupuesto publicado por la entidad **CLÁUSULA TERCERA: - CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:** Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C-1209-0800-13-0-1209004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la vigencia 2023, según CDP No. 55723 del 10 de mayo de 2023, expedido por el responsable de presupuesto. **CLÁUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO**: La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el 100% del valor del contrato así:

PAGOS – ACTA PARCIAL 1

El primer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 30%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor de contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2

El segundo pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 60%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

TERCER PAGO –ACTA PARCIAL 3

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El tercer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 90%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

CUARTO PAGO-PAGO FINAL

Se efectuará el pago final del 10% del valor ejecutado del contrato restante, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Copia del Acta de recibo final firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoria
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuerta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y e visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Entregar Informe de intervenoria en medio magnético con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación de la obra.
13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificación).
14. Entregar Bitácora de obra escaneada en medio magnético.
15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los resultados obtenidos.
16. Entregar Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social.
17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.
18. Entregar planos record en medio magnético y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
19. Entregar memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
20. Entregar el Manual de operación y funcionamiento con los respectivos catálogos.
21. Entregar el Manual de mantenimiento
22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios públicos en aquellas oficinas que se cuente con las conexiones.
23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecución de las obras.
24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificación de calibración de los equipos utilizados.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Nota: La entidad no realizara adición en dinero, teniendo en cuenta que la interventoría contratada tiene un fin específico el cual es controlar obras desde el inicio hasta su culminación. En caso de ser necesario solo se adicionará en valor el contrato de interventoría proporcionalmente al valor adicionado en el contrato de obra y siempre y cuando haya disponibilidad de recursos. **Liquidación del contrato:** La liquidación del contrato se efectuará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes al recibo a satisfacción de las obras por parte de la interventoría y la supervisión del contrato y contempladas dentro del objeto contractual y su alcance. **CLÁUSULA QUINTA: - LUGAR DE EJECUCION:** Las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la ejecución de las obras son las siguientes:

AGRUPACION 1

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Frontino	Antioquia	Andina	Carrera 32 No. 30 - 34	$38.098.394,60
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Pereira	Risaralda	Andina	Avenida 30 de Agosto No. 37 - 24	$79.075.700,38
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Cali	Valle del cauca	Pacifico	Calle 3 a Norte No. 16 - 34	$134.235.550,23
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Sevilla	Valle del cauca	Pacifico	Calle 48 No. 49 - 31	$44.129.958,25
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
El Bordo	Cauca	Pacifico	Calle 6 No 6-54	$37.933.498,23

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Istmina	Choco	Pacifico	Carrera 5 A No. 25 - 18	$39.715.411,93

CLÁUSULA SEXTA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones: **1).** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2).** Está debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **3).** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **4).** Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **CLÁUSULA SÉPTIMA:- RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del objeto establecido en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA:- OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, El contratista se obliga para con la Superintendencia a: EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los Estudios Previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecución.
2. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.
3. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato o quien haga las veces.
4. Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de LA SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.
5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.
6. Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.
7. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.
8. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor de la entidad.
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
10. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
11. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
13. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.
14. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
16. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta.
17. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de interventoría, que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el supervisor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del supervisor.
18. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
19. Desarrollar la interventoría a las obras de manera que se evite a toda costa afectación a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algún inconveniente, el contratista será el responsable de solucionarlo.
20. La Interventoría debe verificar que el contratista implemente un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecución de las obras por motivo de lluvias, así como llevar el registro diario en bitácora del estado del clima.
21. La interventoría debe solicitar al contratista las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y así verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.
22. Todos los empleados a cargo del interventor y contratista deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo que se encuentren en la obra.
23. La interventoría verificara cada vez que entre un nuevo trabajador, que el mismo cuente con todos las afiliaciones de Ley.

CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a desarrollar las siguientes obligaciones específicas:

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA

1. Verificar y aprobar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y las que se establezcan conjuntamente con la visita adelantada previo al inicio de la ejecución de las obras y presentar un informe a la SUPERINTENDENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al mismo.
3. Suscribir las actas de mayores y menores cantidades y obra no prevista que sean necesarias, de modo que cada actividad no prevista y mayor cantidad de obra sea aprobada antes de su ejecución.
4. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones, así mismo verificará la calidad de los materiales utilizados por el contratista.
5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.
6. Revisar y dar el visto bueno en caso de haber cambios en la ejecución del contrato, previo visto bueno del Supervisor del contrato.
7. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
8. Realizar seguimiento detallado de la información contenida en los documentos enunciados, presentando un informe semanal a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el cumplimiento del cuadro de rendimientos, programaciones y todo lo relacionado en la correcta ejecución y avance del contrato, en caso de incumplimiento por parte del contratista deberá informarlo por escrito a la entidad y en caso de que afecte la normal ejecución del contrato sugerir los procedimientos sancionatorios que correspondan.
9. Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a os análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos y los respectivos análisis de precios unitarios. En caso de que la SUPERINTENDENCIA presente observaciones a los APU de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar as correcciones del caso.
10. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigicos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.
11. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual. conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Velar por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra.
13. Exigir al constructor cuando sea necesaria la realización de ensayos y pruebas.
14. Vigilar que el constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que considere oportuno.
15. Completar o introducir en caso de que sea necesario modificaciones al proyecto el interventor realizará los planos y especificaciones pendientes y cuidará en todo momento de que el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados.
16. Presentar informes mensuales a la Entidad donde se muestre el avance del contrato en donde se enuncie las conclusiones y recomendaciones. Cualquier variación al contrato previa su realización deberá ser consultada y aprobada por la Entidad contratante.
17. Revisar la bitácora de la obra, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución de las obras, todas las bitácoras serán administrada por la interventoría, y se enviará diariamente copia digital al supervisor del contrato, dicha bitácora será diligencia en el formato entregado por la entidad. De todos los trabajos el interventor dejará constancia escrita.
18. Presentar documentos necesarios para garantizar la realización de la interventoría de acuerdo con los protocolos Bioseguridad.
19. El Interventor Debe verificar que el contratista realice la entrega y socialización del **Manual de Mantenimiento** de las obras ejecutadas.
20. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

B. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

1. Solicitar a la SUPERINTEDENCIA la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.
2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
3. Revisar y aprobar el Cronograma y el flujo de fondos del contratista y remitirlos a la Superintendencia.
4. Velar por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado.
5. Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales.
6. Autorizar la contratación de la mano de obra de los diferentes capítulos del presupuesto y supervisará la administración de los subcontratos.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

7. La Interventoría estará pendiente que todos los trabajadores contratos cuenten con la capacitación y experiencia en acabados de obra, esto con el fin de desempeñar ls labores que conlleva este tipo de intervenciones.
8. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la ley.
9. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los presupuestos, especificaciones y contrato de construcción.
10. Verificar que la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
11. Estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras.
12. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la SUPERINTENDENCIA.
13. Programar y coordinar con el contratista y con la SUPERINTENDENCIA las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.
14. Elaborar con el contratista de la obra las actas de iniciación y las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, las cuales no deberán sobrepasar el valor de la obra, debidamente justificadas, cambio de especificaciones, entregas parciales, liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar, en coordinación con el contratista. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por la Secretaria General.
15. Legalizar las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, mensualmente ante la Supervisión, cuando se requiera, de acuerdo con el avance del contrato.
16. Mantener actualizada la documentación de los contratos.
17. Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales.
18. Cumplir con la entrega de los informes ejecutivos semanales, informes mensuales y finales requeridos por la SUPERINTEDENCIA en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato.
19. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

20. Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.

21. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.

22. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto a la SUPERINTEDENCIA para la resolución final de las mismas.

23. Suspender si es necesario el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión.

24. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además, elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la SUPERINTEDENCIA para su aprobación con una antelación mínima de 10 días a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas técnica, jurídica y económicamente.

25. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato

26. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

27. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

28. Realizar la interventoría de acuerdo con la Resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021 ANEXO – MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA y las que la modifiquen, adicionen o deroguen, de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se adopta el manual interno de Supervisión e interventoría de los Contratos que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro.

29. Presentar los informes y documentos necesarios para realizar la interventoría de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia y los formatos entregados por la supervisión del contrato.

30. Enviar en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), si el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor con el fin de informar a la Dirección de Contratación, para que se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados y este remitirlos a la Secretaría General. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

31. Elaborar el acta de terminación del contrato y el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de 15 días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la SUPERINTEDENCIA para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
32. Verificar que el contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
33. Revisar, aprobar y vigilar los Planes de Seguridad, higiene, y salud ocupacional de acuerdo con las Normas técnicas vigentes, presentado por el contratista y remitirlo aprobado a la supervisión.
34. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.
35. Llevar acabo lo establecido en la resolución 682 del 24 de abril de 2020 con relación al PAPSO.
36. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

C. INTERVENTORÍA FINANCIERA

Realizar el seguimiento a la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir, con el fin de tener herramientas para realizar las recomendaciones y ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de las obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de ejecución del contrato.

La interventoría deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios para realizar los pagos y realizar la revisión de los mismos, realizando y suscribiendo las certificaciones que correspondan.

D. INTERVENTORÍA LEGAL

Revisión de los documentos del contratista de obra, tales como, Contrato de obra, Pliegos de condiciones y en general de los documentos que hacen parte del contrato. Lo anterior, con el objeto de que sean conocidas las condiciones y obligaciones del contratista de obra y el personal vinculado y responsable de la ejecución del contrato.

Se debe mantener un estricto control y seguimiento a las garantías suscritas por el contratista, haciendo énfasis en la vigencia de las mismas, en concordancia con lo establecido en el contrato

de obra. Se revisará e informará a la Entidad oportunamente de las condiciones y vencimiento de las mismas.

Así mismo realizar la verificación del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que utilice el contratista en la ejecución de las obras.

De igual manera, realizar el seguimiento legal a la ejecución del contrato y asegurarse de que el contrato se cumpla en todos sus términos y condiciones. Esto incluye la revisión de los plazos de ejecución, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos legales.

Debe además realizar los informes, reportes y conceptos jurídicos y/o Legales que La Entidad solicite al Interventor, en relación con la ejecución del contrato. También debe informar a las partes sobre cualquier problema o incumplimiento detectado y proponer soluciones para corregirlos.

E. INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La interventoría deberá efectuar el seguimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por ellos mismos, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se deberá atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, entre otras.

Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigación (Ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y demás normas que amplíen o modifiquen la materia).

F. CONTROL DE COSTOS

Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua confrontación de este con las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que inciden en los costos se procura mantener una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados, una idea de las razones y de las medidas correctivas que se puedan tomar.

En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, sea necesario ejecutar otros ítems no

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos - del respectivo manual de Interventoría, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaría de obras.

En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información al Supervisor designado por la SNR, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la interventora del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prorrogas por retrasos en el cronograma.

Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993.

G. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Consiste en controlar la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de los de las actividades contratadas. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de las obras.

Indica las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas.

Las visitas serán programadas conjuntamente, con el contratista de obra, interventoría y la entidad.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Hacer seguimiento constante a la programación de la obra.

Llevar a cabo lo establecido en la resolución 682 de 24 de abril de 2020 con relación al (PAPSO).

H. RECOMENDACIONES

Liquidación del contrato de interventoría

El Supervisor procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

Inspección final de la obra

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra, 10 días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

Manual de Mantenimiento de obras ejecutadas

El Interventor deberá solicitar al contratista la entrega y socialización de un manual de mantenimiento de las obras ejecutadas, así cada oficina será responsable del cuidado de las obras ejecutadas

I. CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO

La Interventoría designará Ingenieros y/o Arquitectos, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al municipio que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, según resolución vigente.

La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del contratista.

El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesión en el territorio nacional.

El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada interventoría.

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños del proyecto, la normatividad vigente y demás obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoría que garanticen la correcta ejecución del proyecto.

Insumos.
La SNR entregará al **Interventor:**
Copia del Contrato de obra suscrito con el Contratista, así como los estudios y los documentos previos que lo soportan.

Productos
El interventor deberá solicitar al contratista:

- Hojas de vida del personal profesional.
- Relación del equipo mínimo obligatorio.
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
- Programa de Obra y flujo de inversiones
- Plan de manejo de tránsito- PMT.
- Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y escombreras que utilizará durante la Etapa de Construcción, así como también los permisos que sean necesarios utilizar.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Plan de manejo ambiental
- Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

J. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS:

Objetivo:

El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el **Contratista,** corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el **Contrato de Obra.**

Materiales:

El **Interventor** realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada por el **Contratista** cumple con los requerimientos contenidos en el **Contrato de Obra.**

Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos, acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el **Contratista.** En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el **Contratista** e **Interventoría,** primaran para efectos de la comprobación de las **Metas Físicas** y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta última.

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados (de existir) y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del **Proyecto** por parte del **Interventor,** éste deberá solicitar al **Contratista** los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el **Contrato de Obra,** o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Para adelantar dicha labor el **Interventor** deberá contar, entre otros y como mínimo, con los siguientes insumos:

- Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
- Realización y/o Revisión de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra.
- Visita de inspección a sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos fabricados fuera del área del proyecto.

Productos:

Los productos resultantes de este proceso, corresponderán a:

- Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoría.
- Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
- Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad, cuando sea necesario.
- Presentar informes de inspección a las instalaciones de fabricación
- Notificar al Contratista y a la Alcaldía respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos realizados.
- Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra
- Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

K. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo:

Verificar los procesos constructivos empleados por el **Contratista,** la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la **Programación de Obra y flujo de inversiones** y **Cronograma de Metas Físicas** entregados por el Contratista.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Reuniones semanales entre contratista e interventoría, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría interno de la SNR según resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021.

- Informes de Inspectoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoría.

- Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.

- Registro fotográfico y fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción del proyecto (antes - durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.

CLÁUSULA DÉCIMA: - OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA:
La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Aprobar la Garantía única del Contrato.
2. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
3. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.
4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
5. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor.
6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, por el Ordenador del Gasto exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
7. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.
8. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.
9. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.
10. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
12. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.
13. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.
14. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
15. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II.
16. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.
18. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar.
19. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.
20. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.
21. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.
22. Contratar un interventor para la vigilancia y verificación de la correcta ejecución del objeto del presente contrato
23. Las demás inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de Supervisión.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - SUPERVISION Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: A) SUPERVISOR: La supervisión, vigilancia en la ejecución y cumplimiento estricto del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Infraestructura de la SNR O quien haga sus veces o de quien designe el ordenador del gasto. **B) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 1).** Velar por

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

la correcta y oportuna ejecución del contrato. **2).** Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes de supervisión del contrato, así como actas y demás documentos que soporten la ejecución y seguimiento del contrato. **3).** Informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. **4).** Informar con la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, así como estado de las obligaciones económicas y del término de ejecución. **5).** Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecución del contrato. **6).** Verificar que el **CONTRATISTA** haya subido en la Plataforma Transaccional del SECOP II, todos los documentos requeridos para la legalización del contrato y los informes y soportes exigidos durante la ejecución del mismo. **7).** Allegar a la Dirección de Contratación original del acta de inicio dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación del acto administrativo de supervisión. **8)** Las demás que legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la **Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021**, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA**: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - CESIÓN:** Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia, al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PARÁGRAFO. -** Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes será la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecución del contrato, el Contratista preste sus servicios en otras partes del territorio nacional. **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: -EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y la **SUPERINTENDENCIA**, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogación diferente a los honorarios aquí pactados. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA:** El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal,

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: **A)** Estudios y documentos previos. **B)** Documento soportes del contrato. **C)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **D)** Registro Presupuestal. **E)** Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. **F)** Actas, informes y demás documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. **G)** Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. **H).** Modificaciones transaccionales que se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. **I).** Propuesta del oferente **SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS. CLÁUSULA VIGÉSIMA: - GARANTIAS:** Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

a) **De cumplimiento** cuyo valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).
b) **De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales** del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015)

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a publicar en la PLATAFORMA SECOP II el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados y notificar a la SNR de su publicación para su posterior aprobación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete a publicar en la PLATAFORMA SECOP II, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - PENAL PECUNIARIA: a.)** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a **LA SUPERINTENDENCIA** a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. **b.)** Igualmente, frente al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - MULTAS: a)**. con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. **b)**. La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. **c).** La imposición de multas no impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. **d).** El contratista autoriza a **la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar. **CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA TERCERA: - CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la póliza de garantía dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del **SECOP II** por la **SUPERINTENDENCIA. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.** El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del **SECOP II.** Para su ejecución requerirá: **1).** Expedición del Registro presupuestal; **2).** Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II. **3).** Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalización requerirá, **4).** Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes señalados.

Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda – Ordenador del Gasto.
Revisó y Aprobó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor de Despacho.
Revisó: Héctor Iván Suárez Betancur – Dirección de Contratación.
Proyectó: Daniel Palacios – Abogado de la Dirección de Contratación. Daniel Palacios

ACTA DE INICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1707 de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TOTALL INC SAS BIC
NIT: 901.620.351-9

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Oficinas de Instrumentos Públicos de Frontino Antioquia, Pereira Risaralda, Cali Valle del Cauca, Sevilla Valle del Cauca, EL Bordo Cauca, Istmina Choco.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $373.103.235.89
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 362623 del 13 de julio de 2023

El día 31 de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron **ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI** en su calidad de supervisor del contrato y **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** en su calidad de contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato de interventoría No. 1707 de 2023.**

Objeto: CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACION 1

Se firma en Bogotá D.C., para los fines pertinentes el día 31 de Julio de 2023.

Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Supervisor
Profesional Universitario
Grupo de Infraestructura

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Interventor
C.C. 79.553.539

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO							X											230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(5)**																						$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$63,500		$0	$0		$2,846,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,813,600	$11,100	$0	$1,824,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$7,300	$0	$1,212,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$2,000	$0	$322,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$1,800	$0	$289,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$63,500	$400	$0	$63,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$63,500	$400	$0	$63,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$484,800	$3,100	$0	$487,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$2,000	$0	$322,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$500	$0	$72,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**5**	**$2,846,700**	**$17,500**	**$0**	**$2,864,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																														
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Total			**Afiliados(5)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$465,200	$500	$0	$465,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$465,200	$500	$0	$465,700
TOTAL				**5**	**$465,200**	**$500**	**$0**	**$465,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649890	3	CONSORCIO TIG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	228499304	9457375884	E	2023/10/23	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,891,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,528,000	$0	$0	$2,528,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$864,000	$0	$0	$864,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$632,000	$0	$0	$632,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$416,000	$0	$0	$416,000
TOTAL				**7**	**$4,891,800**	**$0**	**$0**	**$4,891,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																			0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT	X																	230201	6	$300,000	$48,000	EPS005	6	$300,000	$12,000	CCF22	6	$300,000	$12,000	14-4	6	$300,000	0.522%	$1,600	6	$0	$0	Si	$73,600
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA	X																	231001	25	$1,250,000	$200,000	EPS017	25	$1,250,000	$50,000	CCF22	25	$1,250,000	$50,000	14-4	25	$1,250,000	0.522%	$6,600	25	$0	$0	Si	$306,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA	X																	230301	10	$666,667	$106,700	EPS018	10	$666,667	$26,700	CCF22	10	$666,667	$26,700	14-4	10	$666,667	6.960%	$46,500	10	$0	$0	Si	$206,600
5	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO	X																	231001	5	$391,667	$62,700	EPS002	5	$391,667	$15,700	CCF22	5	$391,667	$15,700	14-4	5	$391,667	6.960%	$27,300	5	$0	$0	Si	$121,400
6	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total			**Afiliados(6)**																				$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$865,400	$0	$0	$865,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$262,700	$0	$0	$262,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$554,700	$0	$0	$554,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$48,000	$0	$0	$48,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$283,000	$0	$0	$283,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$283,000	$0	$0	$283,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$262,800	$0	$0	$262,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$50,000	$0	$0	$50,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$26,700	$0	$0	$26,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,700	$0	$0	$15,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$12,000	$0	$0	$12,000
TOTAL				**6**	**$1,674,000**	**$0**	**$0**	**$1,674,000**

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 07:13:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8909576336

Fecha limite de pago: 2023-12-20

GUARDADA 04/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMENQUE				
Documento	CC11807075	**Dirección**	CR 49 # 25 56		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2692788		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11807075	GUERRERO PALOMEQUE DAVID ANTONIO	59	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 7.100	$ 343.800

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																								$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT		X															X		23020 1	5	$250,000	$40,000	EPS005	5	$250,000	$10,000	CCF22	5	$272,917	$11,000	14-4	5	$250,000	0.522%	$1,400	5	$0	$0	Si	$62,400
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
4	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO	X																		23030 1	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$52,800	CCF22	22	$1,320,000	$52,800	14-4	22	$1,320,000	6.960%	$91,900	22	$0	$0	Si	$408,700
5	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	72261222	FERRIGNO RIVAS MAURY JAVIER	X	X															X		23100 1	9	$750,000	$120,000	EPS037	9	$750,000	$30,000	CCF22	9	$781,250	$31,300	14-4	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$233,500
7	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	X																		25-14	14	$793,334	$127,000	EPS037	14	$793,334	$31,800	CCF22	14	$793,334	$31,800	14-4	14	$793,334	6.960%	$55,300	14	$0	$0	Si	$245,900
8	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
9	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																			23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
10	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA	X																		23020 1	25	$1,333,334	$213,400	EPS017	25	$1,333,334	$53,400	CCF22	25	$1,333,334	$53,400	14-4	25	$1,333,334	6.960%	$92,900	25	$0	$0	Si	$413,100
Total			**Afiliados(10)**																					$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,095,600	$0	$0	$2,095,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$736,000	$0	$0	$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$127,000	$0	$0	$127,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$979,200	$0	$0	$979,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$253,400	$0	$0	$253,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$805,400	$0	$0	$805,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$805,400	$0	$0	$805,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$572,700	$0	$0	$572,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$572,700	$0	$0	$572,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$570,400	$0	$0	$570,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$113,400	$0	$0	$113,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$61,800	$0	$0	$61,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$0	$0	$94,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$62,800	$0	$0	$62,800
TOTAL				**10**	**$4,044,100**	**$0**	**$0**	**$4,044,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS		R																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
6	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
7	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
8	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	25	$966,667	6.960%	$67,300	0	$0	$0	No	$67,300
Total			**Afiliados(8)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$591,900	$0	$0	$591,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$591,900	$0	$0	$591,900
TOTAL				**8**	**$591,900**	**$0**	**$0**	**$591,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
6	CC	1070821027	CORREA IZQUIERDO MANUEL VICENTE	X																	23020 1	20	$773,334	$123,800	EPSIC3	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
7	CC	1123314923	GERMAN PATIÑO JULY VANESSA	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
8	CC	1006846598	GONZALEZ GASCA JESUS ALEXIS	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
9	CC	5250677	PABON DIAZ ALCIDES MILCIADES	X																	23030 1	20	$773,334	$123,800	ESSC18	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
10	CC	1121712338	SUAREZ GASCA EVER HERNAN	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
Total			**Afiliados(10)**																				$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,469,800	$0	$0	$2,469,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$0	$0	$1,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$852,400	$0	$0	$852,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$411,800	$0	$0	$411,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$349,200	$0	$0	$349,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$349,200	$0	$0	$349,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$649,100	$0	$0	$649,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$31,000	$0	$0	$31,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$133,300	$0	$0	$133,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**10**	**$4,117,200**	**$0**	**$0**	**$4,117,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
3	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO																			23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
6	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
7	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES		X																X	23030 1	21	$1,960,000	$313,600	EPS008	21	$1,960,000	$78,400	CCF22	21	$2,391,667	$95,700	14-4	21	$1,960,000	6.960%	$136,500	21	$0	$0	Si	$624,200
8	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA		X																X	23020 1	15	$800,000	$128,000	EPS017	15	$800,000	$32,000	CCF22	15	$888,889	$35,600	14-4	15	$800,000	6.960%	$55,700	15	$0	$0	Si	$251,300
Total			**Afiliados(8)**																					$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,937,600	$5,700	$0	$1,943,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,000	$1,800	$0	$617,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,000	$800	$0	$272,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$921,600	$2,700	$0	$924,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$128,000	$400	$0	$128,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				8	$530,800	$1,900	$0	$532,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$78,400	$300	$0	$78,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,000	$300	$0	$92,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$68,000	$200	$0	$68,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$300	$0	$80,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$300	$0	$94,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$72,000	$300	$0	$72,300
TOTAL				**8**	**$3,772,800**	**$11,500**	**$0**	**$3,784,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
5	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total			**Afiliados(7)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
TOTAL				**7**	**$610,100**	**$1,800**	**$0**	**$611,900**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1

LUGAR DE EJECUCION: CALI -VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA N°	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2.089.847.608,73
		ADICION	$ -
		VALOR TOTAL	$ 2.089.847.608,73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	TOTALLINC		

A LOS 31 DIAS DE JULIO DEL 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR DE OBRAY FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ EN CALIDAD DE CONTRATISTA DE OBRA , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 58.146.081,00**				**$ 2.826.495,00**	**$ 21.445.093,00**	**$ 0,00**		**$ 34.367.483,00**
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	250,00	$ 9.238,00	$ 2.309.500,00		250,00			$ 2.309.500,00		0,00	
1,17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	M2	1220,00	$ 8.067,00	$ 9.841.740,00		215,00			$ 1.734.405,00		1005,00	8.107.335,00
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	721,00	$ 13.513,00	$ 9.742.873,00				$ 0,00	$ 0,00		721,00	9.742.873,00
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	153,00	$ 34.758,00	$ 5.317.974,00		153,00			$ 5.317.974,00		0,00	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	153,00	$ 42.677,00	$ 6.529.581,00		153,00			$ 6.529.581,00		0,00	
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	153,00	$ 30.799,00	$ 4.712.247,00		153,00			$ 4.712.247,00		0,00	
1,41	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	M	69,00	$ 12.194,00	$ 841.386,00		69,00			$ 841.386,00		0,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	5,00	$ 431.350,00	$ 2.156.750,00					$ 0,00		5,00	2.156.750,00
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	50,00	$ 13.513,00	$ 675.650,00					$ 0,00		50,00	675.650,00
1,67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	20,00	$ 26.919,00	$ 538.380,00	105,00			$ 2.826.495,00	$ 0,00		125,00	3.364.875,00
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL	UN/DIA	120,00	$ 129.000,00	$ 15.480.000,00				$ 0,00	$ 0,00		80,00	10.320.000,00
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**				**$ 26.837.782,00**				**$ 0,00**	**$ 1.608.847,00**	**$ 0,00**	0,00	**$ 17.950.447,00**
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	6,00	$ 873.853,00	$ 5.243.118,00		1,00			$ 873.853,00		5,00	4.369.265,00
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	M	6,00	$ 734.994,00	$ 4.409.964,00		1,00			$ 734.994,00		5,00	3.674.970,00
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	20,00	$ 128.203,00	$ 2.564.060,00					$ 0,00		4,00	512.812,00
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	10,00	$ 102.508,00	$ 1.025.080,00					$ 0,00		10,00	
2,21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	UN	20,00	$ 210.108,00	$ 4.202.160,00					$ 0,00		20,00	

2,22	MANTENIMIENTO DE MUEBLE	M	40,00	$ 234.835,00	$ 9.393.400,00					$ 0,00		40,00	9.393.400,00
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**				############				**$ 8.015.188,32**	**$ 107.447.300,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**
3,02	BARANDA TUBO REDONDO	M	60,00	$ 115.530,00	$ 6.931.800,00	32,76			$ 3.784.762,80	$ 0,00			0,00
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	230,00	$ 313.550,00	$ 72.116.500,00		200,00		$ 0,00	$ 62.710.000,00			0,00
3,09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	M2	230,00	$ 270.738,00	$ 62.269.740,00		130,00		$ 0,00	$ 35.195.940,00			0,00
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	UN	20,00	$ 223.880,00	$ 4.477.600,00		18,00		$ 0,00	$ 4.029.840,00			0,00
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	M2	20,00	$ 344.470,00	$ 6.889.400,00		16,00		$ 0,00	$ 5.511.520,00			0,00
3,19	REJILLA DE PISO 30CM	M2	30,00	$ 105.213,00	$ 3.156.390,00				$ 0,00	$ 0,00			0,00
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	5,00	$ 183.294,00	$ 916.470,00	23,08			$ 4.230.425,52	$ 0,00			0,00
4	**CIELORRASOS**				**$ 10.545.480,00**				**$ 11.717.200,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	M2	90,00	$ 117.172,00	$ 10.545.480,00	100,00			$ 11.717.200,00				0,00
6	**CUBIERTAS**				**$ 30.727.120,00**				**$ 0,00**	**$ 26.729.500,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**
6,12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	M2	980,00	$ 27.275,00	$ 26.729.500,00		980,00			$ 26.729.500,00			
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M	110,00	$ 36.342,00	$ 3.997.620,00					$ 0,00			0,00
7	**ENCHAPE MUROS**				**$ 4.276.918,65**				**$ 3.235.800,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 7.512.718,65**
7,03	RESANE	M2	264,35	$ 16.179,00	$ 4.276.918,65	200,00			$ 3.235.800,00			464,35	7.512.718,65
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	M2		$ 7.537,18		20,00							
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**				**$ 24.384.171,00**				**$ 9.936.500,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 9.936.500,00**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	1227,00	$ 19.873,00	$ 24.384.171,00	500,00			$ 9.936.500,00			500,00	9.936.500,00
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**				**$ 29.066.394,00**				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**
11,06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	M2	721,00	$ 40.314,00	$ 29.066.394,00					$ 0,00			0,00
12	**MAMPOSTERÍA**				**$ 4.049.040,00**				**$ 0,00**	**$ 4.049.040,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M	80,00	$ 50.613,00	$ 4.049.040,00		80,00			$ 4.049.040,00		0,00	0,00
13	**PINTURAS**				**$ 28.171.200,00**				**$ 23.476.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 35.214.000,00**
13,1	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	1200,00	$ 23.476,00	$ 28.171.200,00	1000,00			$ 23.476.000,00			1500,00	35.214.000,00
14	**PISOS**				############				**$ 0,00**	**$ 129.562.979,00**	**$ 0,00**		**$ 28.750.596,00**
14,10	PISO GRANITO MARMOL	M2	721,00	$ 179.699,00	$ 129.562.979,00		721,00			$ 129.562.979,00		0,00	0,00
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	721,00	$ 39.876,00	$ 28.750.596,00					$ 0,00		721,00	28.750.596,00
14,19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	M	135,00	$ 41.340,00	$ 5.580.900,00		135,00					0,00	0,00
15	**RED ELÉCTRICA**				**$ 165.249,00**				**$ 0,00**	**$ 165.249,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 165.249,00	$ 165.249,00		1,00			$ 165.249,00			
16	**RED HIDRÁULICA**				**$ 17.789.795,00**				**$ 0,00**	**$ 16.199.536,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**
16,22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	6,00	$ 435.073,00	$ 2.610.438,00		6,00			$ 2.610.438,00			0,00
16,25	MOTOBOMBA 2,0 HP	UN	2,00	$ 885.073,00	$ 1.770.146,00		1,00			$ 885.073,00			0,00
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1,00	$ 550.763,00	$ 550.763,00		1,00			$ 550.763,00			0,00
16,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	M	10,00	$ 1.074.289,00	$ 10.742.890,00		10,00			$ 10.742.890,00			0,00
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	6,00	$ 281.763,00	$ 1.690.578,00		4,00		$ 0,00	$ 1.127.052,00			0,00
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	6,00	$ 70.830,00	$ 424.980,00		4,00			$ 283.320,00			0,00
17	**RED SANITARIA**				**$ 8.769.243,00**				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 4.344.240,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	80,00	$ 17.440,00	$ 1.395.200,00	72,00						120,00	2.092.800,00

17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M	60,00	$ 28.143,00	$ 1.688.580,00	60,00						80,00	2.251.440,00
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1,00	$ 646.975,00	$ 646.975,00								0,00
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	12,00	$ 419.874,00	$ 5.038.488,00		11,00		$ 0,00				0,00
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**				**$ 14.882.119,19**				**$ 0,00**	**$ 0,00**			**$ 874.026,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	3,00	$ 437.013,00	$ 1.311.039,00							2,00	874.026,00
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	100,00	$ 16.324,00	$ 1.632.400,00								0,00
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	50,00	$ 38.256,00	$ 1.912.800,00								0,00
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	46,41	$ 171.059,00	$ 7.938.848,19	3,59							0,00
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	4,00	$ 521.758,00	$ 2.087.032,00								0,00
20	**NO PREVISTOS**										**$ 214.469.420,83**		**$ 229.012.895,07**
1,04	DESMONTE DE CIELORASO	M2	190,00	$ 6.716,92				190,00			$ 1.276.214,80	90,00	604.522,80
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	M2	2,00	$ 23.756,18				2,00			$ 47.512,36		0,00
1.20	DESMONTE DE PUERTA METALICA	U	3,00	$ 17.470,46				3,00			$ 52.411,38		0,00
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	U	20,00	$ 42.427,14				20,00			$ 848.542,80		0,00
1.43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	M2	721,00	$ 15.650,60		7,28		721,00			$ 11.284.082,60	721,00	11.284.082,60
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	184,34	$ 16.176,86				184,34			$ 2.982.042,37	184,34	2.982.042,37
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS	M2	500,00	$ 15.321,32				500,00			$ 7.660.660,00	300,00	4.596.396,00
16,21	LAVAMANO PARA DISCAPACITADO (ORIP-SEVILLA)	U	1,00	$ 843.845,66				1,00			$ 843.845,66		0,00
20.2	MANTENIMIENTO REJA METALICA(GRUPO 1)	M2	383,12	$ 24.867,00				383,12			$ 9.527.045,04		0,00
NP-01	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE	M2	1005,00	$ 87.757,00				1005,00			$ 88.195.785,00	1005,00	88.195.785,00
NP-02	CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 0.90X30MTS-PALOMAS	M2	263,10	$ 68.743,00				263,10			$ 18.086.283,30	263,10	18.086.283,30
NP-03	ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES	M2	721,00	$ 143.223,00				721,00			$ 103.263.783,00	721,00	103.263.783,00
NP-04	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR DE 15A 110V	U	20,00	$ 30.890,00				20,00			$ 617.800,00		0,00
NP-06	PINTURA PARA BARANDAS	M	450,00	$ 20.000,00				450,00			$ 9.000.000,00		0,00
PN-07	MATERAS Y MATAS	U	10,00	$ 300.000,00				10,00			$ 3.000.000,00		0,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 578.462.967,84**					**$ 59.207.183,32**	**$ 305.598.697,00**	**$ 214.469.420,83**		**$ 367.962.966,72**
	ADMINISTRACIÓN	**%**	**23,00%**	$ 133.046.482,60					$ 6.968.307,70	$ 70.287.700,31	$ 49.327.966,79		**$ 84.631.482,35**
	IMPREVISTOS	**%**	**1,00%**	$ 5.784.629,68					$ 302.969,90	$ 3.055.986,97	$ 2.144.694,21		**$ 3.679.629,67**
	UTILIDAD	**%**	**5,00%**	$ 28.923.148,39					$ 1.514.849,50	$ 15.279.934,85	$ 10.723.471,04		**$ 18.398.148,34**
	IVA SOBRE UTILIDAD	**%**	**19,00%**	$ 5.495.398,19					$ 287.821,41	$ 2.903.187,62	$ 2.037.459,50		**$ 3.495.648,18**
	COSTO TOTAL OBRA			**$ 751.712.626,70**					**$ 68.281.131,83**	**$ 397.125.506,75**	**$ 278.703.012,37**		**$ 478.167.875,26**
	VALOR TOTAL OBRA			**$ 751.712.626,70**							**$ 328.844.374,92**		**$ 478.167.875,26**
	SALDO POR AJUSTAR												**$ 273.544.751,44**


PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRATISTA



ARQ.FERNANDO JIMENEZ
INTERVENTORIA (SI APLICA)



ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. SUPERVISION

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 11
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Versión: 01
	FORMATO: JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

JUSTIFICACION ACTA No.1
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
LUGAR DE EJECUCION CALI

CONTRATO DE OBRA N°		1674	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$2,089,847,608.73
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	**OBJETO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)- AGRUPACION 1		
INTERVENTORIA:	TOTALLINC S.A.S			

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
			OBRA			
1	**PRELIMINARES**					
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	250.00			No aplica
1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	M2	1220.00	1005.00	82.38%	Menor cantidad instalada en sitio
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	721.00	721.00	100.00%	
1.38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	153.00			No aplica
1.39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	153.00			No aplica
1.4	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	153.00			No aplica
1.41	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	M	69.00			No aplica
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	5.00	5.00	100.00%	
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	50.00	50.00	100.00%	
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	20.00	125.00	625.00%	Mayor cantidad instalada en sitio
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL	UN/DIA	120.00	180.00	150.00%	Mayor cantidad instalada en sitio
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					
2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	6.00	5.00	83.33%	Menor cantidad instalada en sitio
2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	M	6.00	5.00	83.33%	Menor cantidad instalada en sitio
2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	20.00	20.00	100.00%	
2.19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	10.00	10.00	100.00%	
2.21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	UN	20.00	20.00	100.00%	
2.22	MANTENIMIENTO DE MUEBLE	M	40.00	40.00	100.00%	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
3.02	BARANDA TUBO REDONDO	M	60.00	92.76	154.60%	Mayor cantidad revisada en sitio
3.08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	230.00	30.00	13.04%	Menor cantidad instalada en sitio
3.09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	M2	230.00	163.00	70.87%	Menor cantidad instalada en sitio
3.13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	UN	20.00	20.00	100.00%	
3.15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	M2	20.00	20.00	100.00%	
3.19	REJILLA DE PISO 30CM	M2	30.00			No aplica
3.2	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	5.00	28.08	561.60%	Mayor cantidad instalada en sitio
4	**CIELORRASOS**					
4.02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	M2	90.00	190.00	211.11%	Mayor cantidad instalada en sitio
6	**CUBIERTAS**					
6.12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	M2	980.00			No aplica
6.21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M	110.00	110.00	100.00%	
7	**ENCHAPE MUROS**					
7.03	RESANE	M2	264.35	563.25	213.07%	Mayor cantidad instalada en sitio
7.04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	M2				
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					
10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	1227.00	1727.00	140.75%	Mayor cantidad instalada en sitio
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					
11.06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	M2	721.00	721.00	100.00%	
12	**MAMPOSTERÍA**					

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
			OBRA			
12.01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M	80.00			No aplica
13	**PINTURAS**					
13.1	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	1200.00	1700.00	141.67%	Mayor cantidad instalada en sitio
14	**PISOS**					
14.10	PISO GRANITO MARMOL	M2	721.00			No aplica
14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	721.00	721.00	100.00%	
14.19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	M	135.00	135.00	100.00%	
15	**RED ELÉCTRICA**					
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1.00			No aplica
16	**RED HIDRÁULICA**					
16.22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	6.00			No aplica
16.25	MOTOBOMBA 2,0 HP	UN	2.00	1.00	50.00%	Cantidad verificada en sitio
16.29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1.00			No aplica
16.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	M	10.00			No aplica
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	6.00	26.00	433.33%	Cantidad verificada en sitio
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	6.00	6.00	100.00%	
17	**RED SANITARIA**					
17.19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	80.00	80.00	100.00%	
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M	60.00	60.00	100.00%	
17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1.00	1.00	100.00%	
17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	12.00	17.00	141.67%	Mayor cantidad instalada en sitio
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	3.00	3.00	100.00%	
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	100.00	100.00	100.00%	
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	50.00	50.00	100.00%	
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	46.41	46.41	100.00%	
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	4.00	4.00	100.00%	
20	**NO PREVISTOS**					
NP-01	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALIUMINIO 3MM	m2		1005.00		Necesario para realizar reparacion de muros y enchape
NP-02	CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 0.90X30MTS- PALOMAS	ml		263.10		Solicitud para privacidad de espacios
NP-03	ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES	M2		721.00		Para mantenimiento de fachada
NP-04	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR DE 15A 110V	UND		20.00		Necesario para la ubicación de puestos de trabajo
NP-05	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2		184.34		Obras de urbanismo para evitar humedad por capilaridad
NP-06	Desmonte de cieloraso	m2		190.00		Para conduccion de aguas lluvias, evitando humedad en muros.
NP-07	Pintura koraza sobre superficie lisa 2 manos	m2		19.00		Estabilidad de la fachada en el tiempo
NP-08	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO			191.79		Necesario para realizar reparacion de pisos

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA: TOTALLINC

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR/ FUNCIONARIO

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO* | UNIDAD: *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
CUBIERTA	*CUBIERTA*	*1.00*	*33.700*	*29.82*						*1,004.93*

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PLAZOLETA	PRIMER PISO	1.00	19.330	28.97						559.99
Linea del lote		1.00		39.84	0.20					7.97
		8.00		27.53	0.07					15.42
		3.00		22.34	0.07					4.69
		16.00		7.47	0.07					8.37
		1.00		10.40	0.07					0.73
		4.00		4.34	0.07					1.22
		5.00		4.66	0.07					1.63
		4.00		5.13	0.07					1.44
		5.00		5.45	0.07					1.91
Rampa de ecceso P		1.00		93.77						93.77
Rampa discapacitados	Tramo N° 1	1.00		4.70	0.20					0.94
		1.00		5.15	0.35					1.80
		1.00		3.04	0.55					1.67
		1.00		5.50	0.32					1.76
		1.00		6.70	0.27					1.81
		1.00		6.70	0.30					2.01
		1.00		3.04	0.60					1.82
		1.00		5.50	0.30					1.65
		1.00		6.70	0.27					1.81
		1.00		6.70	0.30					2.01
		1.00		3.04	0.60					1.82
		1.00		5.50	0.32					1.76
		1.00		7.48	0.33					2.47
		2.00		1.50	0.18					0.54
		1.00		7.16	0.28					2.00
		2.00		1.50	0.16					0.48
		1.00		6.68	0.36					2.40
		2.00		1.50	0.18					0.54
		1.00		6.37	0.21					1.34
		2.00		1.50	0.17					0.51
										-7.28
									TOTAL	721.00

CROQUIS

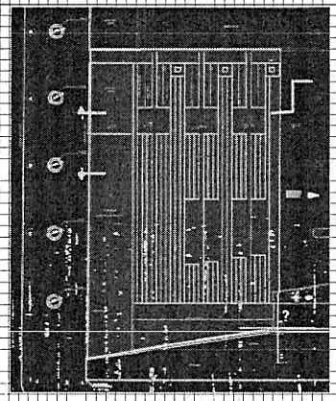

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *DEMOLICION ENCHAPE MURO* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
		1.00	2.900		0.56					1.62
		1.00	5.30		0.20					1.06
		0.50	5.30		0.36					0.95
		0.50	4.00		0.20					0.40
		0.50	6.80		0.40					1.36
		0.50	5.48		0.41					1.12
		1.00	1.32		0.41					0.54
		0.50	4.00		0.45					0.90
		1.00	3.00		0.58					1.74
		0.50	3.90		0.58					1.13
		1.00	2.84		0.60					1.70
		0.50	3.40		0.60					1.02
		1.00	7.48		0.36					2.69
		1.00	2.50		0.36					0.90
		1.00	7.16		0.30					2.15
		1.00	2.50		0.30					0.75
		1.00	6.70		0.35					2.35
		1.00	2.50		0.35					0.88
		1.00	6.40		0.25					1.60
		1.00	2.50		0.25					0.63
										-
										-
										-
									TOTAL	25.49

CROQUIS

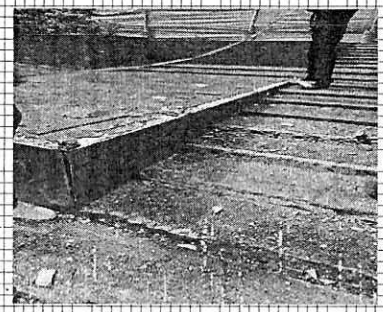

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROSA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA: DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No. | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL* | UNIDAD: *m3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
Viajes Volqueta 7m3		*14.00*				*7.00*				*98.00*

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: *ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL* | UNIDAD: *und/dia*

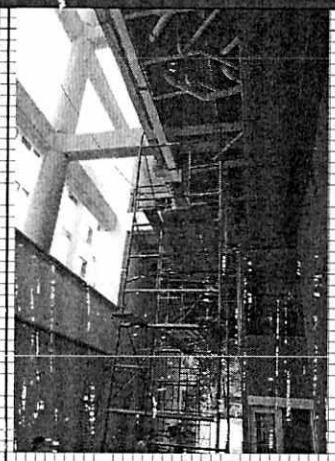DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				DIAS	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ANDAMIOS		*6.00*				*10.00*				*60.00*	

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA - DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM* UNIDAD *U*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
MUEBLE SUPERIOR COCINA	*COCINAS*	*5.00*								*5.00*

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: MANTENIMIENTO DE MUEBLE UNIDAD m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
MANTENIMIENTO DE MUEBLE	ARCHIVO		40.000							40.00
									TOTAL	40.00

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES, (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: 10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
	EXTERIOR LATERAL	2.00		17.00	6.00					204.00
	EXTERIOR FACHADA	1.00		30.00	10.00					300.00
									TOTAL	504.00

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9 UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PLAZOLETA	PRIMER PISO	1.00	19.330	28.97						559.99
Linea del lote		1.00		39.84	0.20					7.97
		8.00		27.53	0.07					15.42
		3.00		22.34	0.07					4.69
		16.00		7.47	0.07					8.37
		1.00		10.40	0.07					0.73
		4.00		4.34	0.07					1.22
		5.00		4.66	0.07					1.63
		4.00		5.13	0.07					1.44
		5.00		5.45	0.07					1.91
Rampa de acceso P		1.00		93.77						93.77
Rampa discapacitados	Tramo N° 1	1.00		4.70	0.20					0.94
		1.00		5.15	0.35					1.80
		1.00		3.04	0.55					1.67
		1.00		5.50	0.32					1.76
		1.00		6.70	0.27					1.31
		1.00		6.70	0.30					2.01
		1.00		3.04	0.60					1.82
		1.00		5.50	0.30					1.65
		1.00		6.70	0.27					1.81
		1.00		6.70	0.30					2.01
		1.00		3.04	0.60					1.82
		1.00		5.50	0.32					1.76
		1.00		7.48	0.33					2.47
		2.00		1.50	0.18					0.54
		1.00		7.10	0.28					2.00
		2.00		1.50	0.16					0.48
		1.00		6.63	0.36					2.40
		2.00		1.50	0.18					0.54
		1.00		6.37	0.21					1.34
		2.00		1.50	0.17					0.51
										-7.28
									TOTAL	721.00

CROQUIS

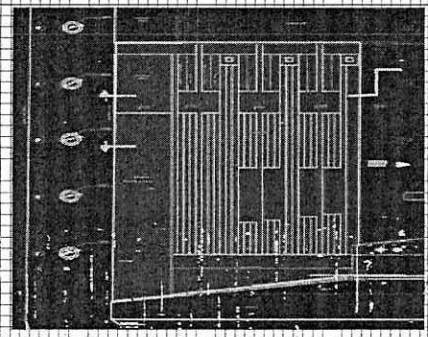

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PLAZOLETA	*PRIMER PISO*	*1.00*	*19.330*	*28.97*						*559.99*
Linea del lote		*1.00*		*39.84*	*0.20*					*7.97*
		8.00		*27.53*	*0.07*					*15.42*
		3.00		*22.34*	*0.07*					*4.69*
		16.00		*7.47*	*0.07*					*8.37*
		1.00		*10.40*	*0.07*					*0.73*
		4.00		*4.34*	*0.07*					*1.22*
		5.00		*4.66*	*0.07*					*1.63*
		4.00		*5.13*	*0.07*					*1.44*
		5.00		*5.45*	*0.07*					*1.91*
Rampa de acceso P		*1.00*		*93.77*						*93.77*
Rampa discapacitados	*Tramo N° 1*	*1.00*		*4.70*	*0.20*					*0.94*
		1.00		*5.15*	*0.35*					*1.80*
		1.00		*3.04*	*0.55*					*1.67*
		1.00		*5.50*	*0.32*					*1.76*
		1.00		*6.70*	*0.27*					*1.81*
		1.00		*6.70*	*0.30*					*2.01*
		1.00		*3.04*	*0.60*					*1.82*
		1.00		*5.50*	*0.30*					*1.65*
		1.00		*6.70*	*0.27*					*1.81*
		1.00		*6.70*	*0.30*					*2.01*
		1.00		*3.04*	*0.60*					*1.82*
		1.00		*5.50*	*0.32*					*1.76*
		1.00		*7.48*	*0.33*					*2.47*
		2.00		*1.50*	*0.18*					*0.54*
		1.00		*7.16*	*0.28*					*2.00*
		2.00		*1.50*	*0.16*					*0.48*
		1.00		*6.68*	*0.36*					*2.40*
		2.00		*1.50*	*0.18*					*0.54*
		1.00		*6.37*	*0.21*					*1.34*
		2.00		*1.50*	*0.17*					*0.51*
										-7.28
									TOTAL	*721.00*

CROQUIS

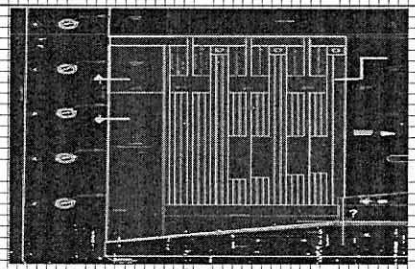

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier Levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *ASEO GENERAL DE OBRA* UNIDAD *GBL*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
	TERRAZA	*0.30*								*0.30*
	PALOMAS	*0.50*								*0.50*
	ASEO GENERAL	*1.20*								*1.20*
										-
										-
										-
										TOTAL *2.00*

CROQUIS

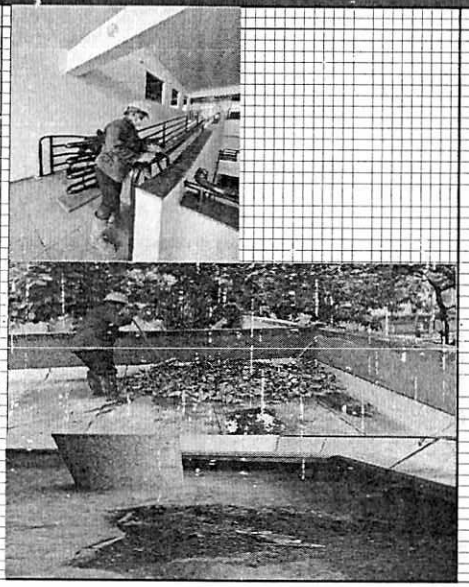

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud :: (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *7.03 RESANE* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
AUDITORIO	WC CABALLEROS	1.00		3.36	0.30					1.01
		1.00		1.95	0.30					0.59
		1.00		3.08	0.30					0.92
		1.00		1.41	0.30					0.42
		1.00		0.85	0.30					0.26
		1.00		0.13	2.30					0.30
		1.00		0.85	2.30					1.96
		1.00		1.02	2.30					2.35
	WC DAMAS	1.00		3.04	0.30					0.91
		1.00		2.45	0.30					0.74
		1.00		3.13	0.30					0.94
		1.00		1.69	0.30					0.51
		1.00		1.29	0.30					0.39
		1.00		0.13	2.30					0.30
		1.00		1.29	2.30					2.97
		1.00		1.21	2.30					2.78
AUDITORIO										-
	Foyer Auditorio	1.00		9.63	4.58					44.11
	Area de puertas	-3.00		1.00	2.00					-6.90
	banos de puerta	2.00		5.50	0.13					1.43
	Area de puertas	-1.00		1.53	2.90					-4.44
	banos de puerta	1.00		7.33	0.15					1.10
	Hall de escalera	1.00		2.45	4.20					10.29
		1.00		1.28	4.20					5.38
		1.00		0.88	4.20					3.70
	AREA DE FACHADA	1.00		4.35	0.46					2.00
		1.00		4.35	1.03					4.48
	AREA DE ACCESO AUDITORIO	1.00		3.43	4.58					15.71
		1.00		0.13	3.60					0.47
		1.00		0.21	3.60					0.76
		1.00		3.47	0.98					3.40
		1.00		2.73	4.58					12.50
		1.00		3.72	3.60					13.39
		1.00		1.02	3.60					3.67
									TOTAL	128.37

CROQUIS

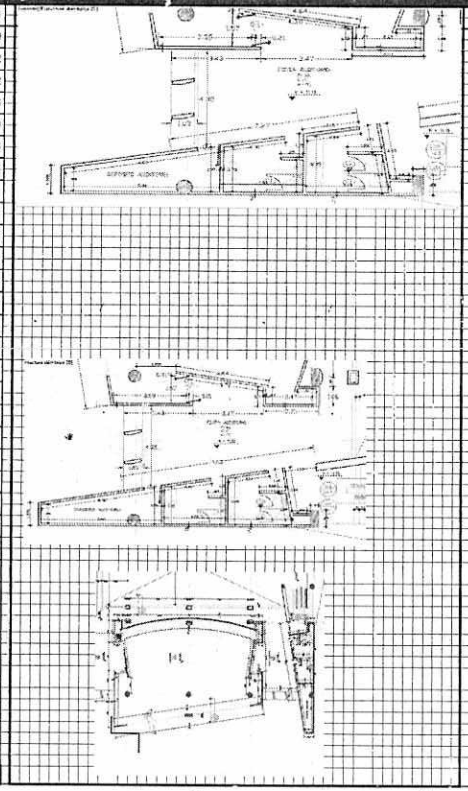

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No. DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *7.03 RESANE* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR										128.37
AUDITORIO										-
		1.00		3.59	3.00					10.77
		1.00		18.70	3.00					56.10
		1.00		6.51	3.00					19.53
		1.00		0.52	3.00					1.56
		1.00		0.13	3.00					0.39
		1.00		4.62	3.00					13.86
		1.00		0.13	3.00					0.39
		1.00		0.87	3.00					2.61
		1.00		2.47	3.00					7.41
		1.00		0.80	3.00					2.40
		1.00		0.96	3.00					2.88
		1.00		0.17	3.00					0.51
		1.00		0.13	3.00					0.39
		1.00		17.50	3.00					52.50
		1.00		0.13	3.00					0.39
		1.00		0.91	3.00					2.73
									TOTAL	302.79

CROQUIS

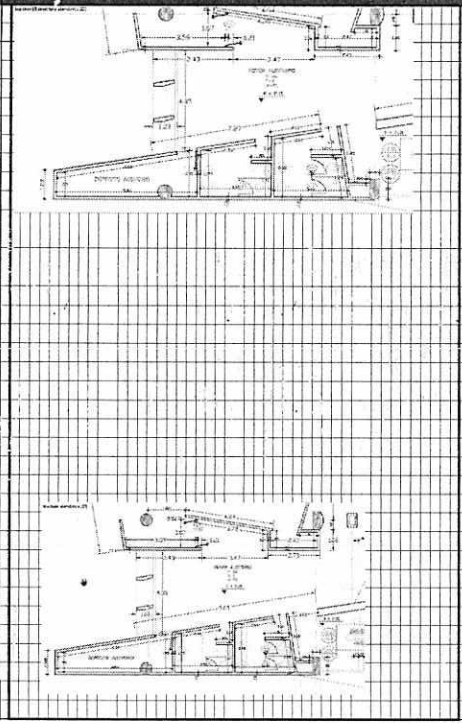

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROSA GAESAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No. DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *7.03 RESANE* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR										302.79
		1.00		0.80	3.00					2.40
		1.00		2.47	3.00					7.41
		1.00		0.87	3.00					2.61
		2.00		0.13	3.00					0.78
		1.00		4.64	3.00					13.92
		1.00		0.13	3.00					0.39
		1.00		0.51	3.00					1.53
										-
AREA DE CAFETERIA	FOYER AUDITORIO	1.00		2.73	4.55					12.42
		1.00		3.47	0.95					3.30
		1.00		3.43	4.55					15.61
		1.00		0.65	5.25					3.41
	ACCESO AL AUDITORIO	1.00		1.01	3.60					3.64
		1.00		3.72	3.60					13.39
		1.00		1.47	3.60					5.29
		1.00		0.20	3.60					0.72
		1.00		0.30	3.60					1.08
									TOTAL	390.68

CROQUIS

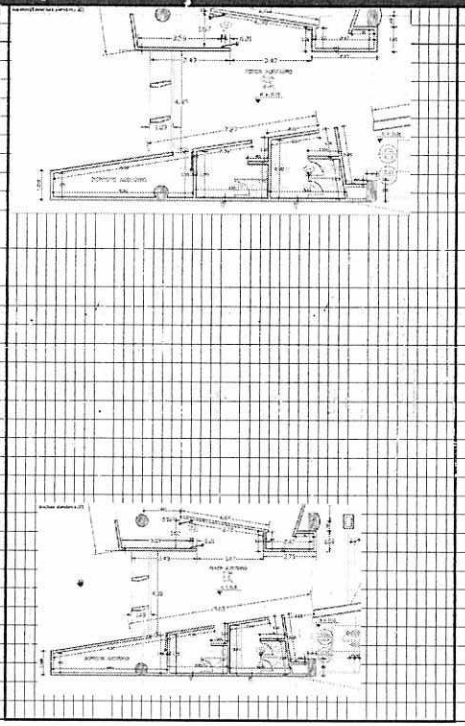

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un Area (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No. DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *7.03 RESANE* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR										390.68
	PLACA DE CUBIERTA					AREA m2				-
PLACA DE CUBIERTA	CIELO RASO	1.00				4.78				4.78
	ANTEPECHO DE FACHADA	1.00		13.30	0.46					6.12
		1.00		13.30	0.93					12.37
	COLUMNAS EN FACHADA	7.00		0.13	2.92					2.66
	PLAZOLETA CAFETERIA	1.00		1.18	5.50					6.49
		1.00		7.53	5.50					41.42
		1.00		0.42	5.50					2.31
										-
AREA DE CAFETERIA	ext bar cafeteria	1.00		4.60	1.13					5.20
		1.00		7.12	5.90					42.01
		1.00		4.43	5.80					25.69
	Menos (area de puerta)	-1.00		1.00	2.20					-2.20
	interior	1.00		6.90	2.50					17.25
		1.00		4.27	2.50					10.68
	Menos (area de puerta)	-1.00		1.00	2.20					-2.20
									TOTAL	563.25

CROQUIS

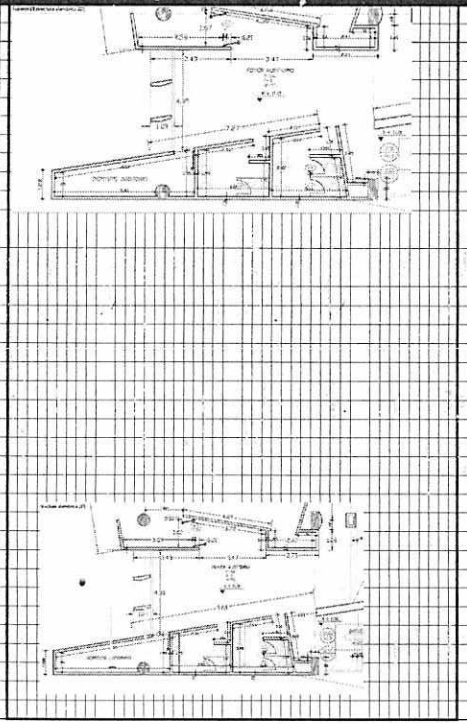

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
AUDITORIO	WC CABALLEROS	1.00		3.36	0.30					1.01
		1.00		1.95	0.30					0.59
		1.00		3.08	0.30					0.92
		1.00		1.41	0.30					0.42
		1.00		0.85	0.30					0.26
		1.00		0.13	2.30					0.30
		1.00		0.85	2.30					1.96
		1.00		1.02	2.30					2.35
	WC DAMAS	1.00		3.04	0.30					0.91
		1.00		2.45	0.30					0.74
		1.00		3.13	0.30					0.94
		1.00		1.69	0.30					0.51
		1.00		1.29	0.30					0.39
		1.00		0.13	2.30					0.30
		1.00		1.29	2.30					2.97
		1.00		1.21	2.30					2.78
AUDITORIO	Foyer Auditorio	1.00		9.63	4.58					44.11
	Area de puertas	-3.00		1.00	2.30					-6.90
	banos de puerta	2.00		5.50	0.13					1.43
	Area de puertas	-1.00		1.53	2.90					-4.44
	banos de puerta	1.00		7.33	0.15					1.10
	Hall de escalera	1.00		2.45	4.20					10.29
		1.00		1.28	4.20					5.38
		1.00		0.88	4.20					3.70
	AREA DE FACHADA	1.00		4.35	0.46					2.00
		1.00		4.35	1.03					4.48
	AREA DE ACCESO AUDITORIO	1.00		3.43	4.58					15.71
		1.00		0.13	3.60					0.47
		1.00		0.21	3.60					0.76
		1.00		3.47	0.98					3.40
		1.00		2.73	4.58					12.50
		1.00		3.72	3.60					13.39
		1.00		1.02	3.60					3.67
									TOTAL	128.37

CROQUIS

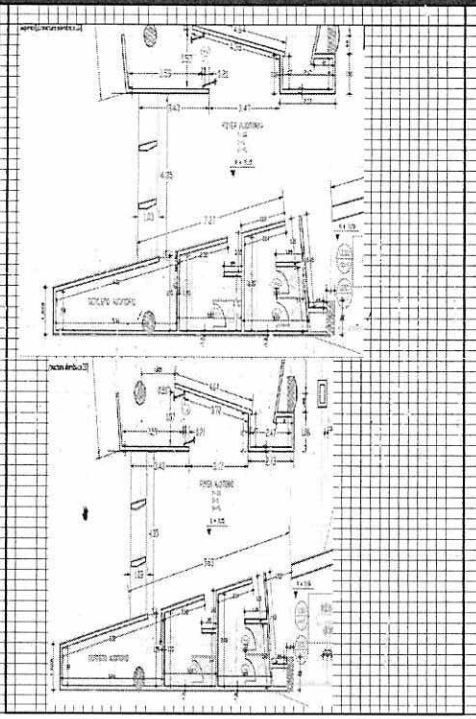

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No | DE


CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
ACUMULADO ANTERIOR										128.37	
AUDITORIO		1.00		3.59	3.00					10.77	
		1.00		18.70	3.00					56.10	
		1.00		6.51	3.00					19.53	
		1.00		0.52	3.00					1.56	
		1.00		0.13	3.00					0.39	
		1.00		4.62	3.00					13.36	
		1.00		0.13	3.00					0.39	
		1.00		0.87	3.00					2.61	
		1.00		2.47	3.00					7.41	
		1.00		0.80	3.00					2.40	
		1.00		0.96	3.00					2.88	
		1.00		0.17	3.00					0.51	
		1.00		0.13	3.00					0.39	
		1.00		17.50	3.00					52.50	
		1.00		0.13	3.00					0.39	
		1.00		0.91	3.00					2.73	
		1.00		0.80	3.00					2.40	
		1.00		2.47	3.00					7.41	
									TOTAL	312.60	

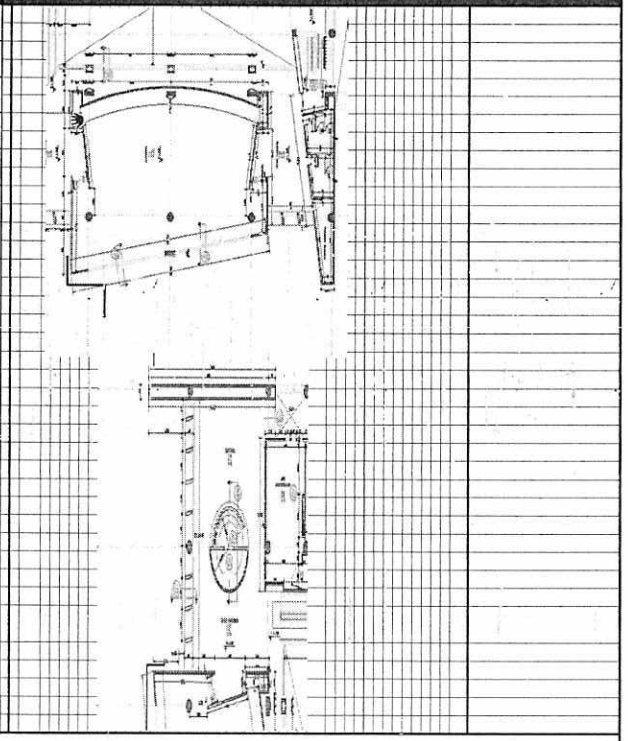

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRÁS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS - L	a	h	TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR										312.60
		1.00		0.87	3.00					2.61
		2.00		0.13	3.00					0.78
		1.00		4.64	3.00					13.92
		1.00		0.13	3.00					0.39
		1.00		0.51	3.00					1.53
AREA DE CAFETERIA	FOYER AUDITORIO	1.00		2.73	4.55					12.42
		1.00		3.47	0.95					3.30
		1.00		3.43	4.55					15.61
		1.00		0.65	5.25					3.41
	ACCESO AL AUDITORIO	1.00		1.01	3.60					3.64
		1.00		3.72	3.60					13.39
		1.00		1.47	3.60					5.29
		1.00		0.20	3.60					0.72
		1.00		0.30	3.60					1.08
	CIELO RASO	1.00				4.78				4.78
	ANTEPECHO DE FACHADA	1.00		13.30	0.46					6.12
		1.00		13.30	0.93					12.37
	COLUMNAS EN FACHADA	7.00		0.13	2.92					2.66
	PLAZOLETA CAFETERIA	1.00		1.18	5.50					6.49
									TOTAL	$ 423.10

CROQUIS

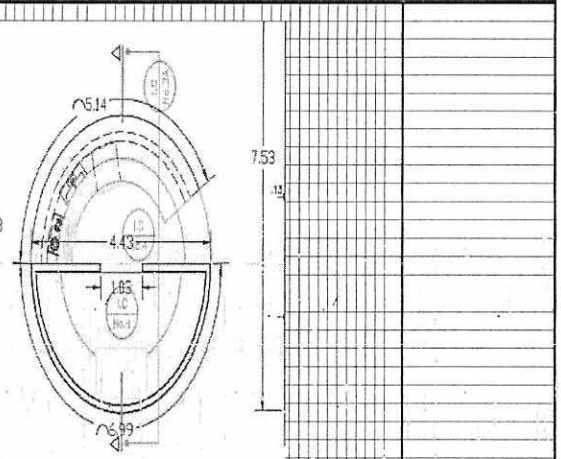

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (5-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una memoria.

Luisa A Lara M

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA – DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 – CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS – UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR										423.10
		1.00		7.53	5.50					41.42
		1.00		0.42	5.50					2.31
AREA DE CAFETERIA	ext bar cafeteria	1.00		4.60	1.13					5.20
		1.00		7.12	5.90					42.01
		1.00		4.43	5.80					25.69
	Menos (area de puerta)	-1.00		1.00	2.20					-2.20
	interior	1.00		6.90	2.50					17.25
		1.00		4.27	2.50					10.68
	Menos (area de puerta)	-1.00		1.00	2.20					-2.20
	VIGA	1.00	5.08		1.64					8.33
		1.00	1.13		4.70					5.31
	BARANDA QUE DA HACIA CAJAS	1.00	22.80		1.94					44.23
		1.00	11.90		2.17					25.82
	CIELO COMPLETO	1.00	25.45		12.70					323.22
TERCER PISO	BARANDA	1.00	2.08		0.67					1.39
		1.00	1.00		0.67					0.67
		1.00	2.20		2.25					4.95
									TOTAL	977.17

CROQUIS

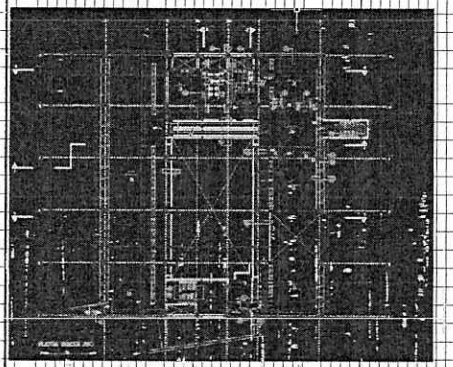

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-73747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
la guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR										977.17
		1.00	0.98		2.25					2.21
		1.00	6.80		0.67					4.56
		1.00	6.75		0.67					4.52
		1.00	1.94		0.67					1.30
		1.00	1.00		0 67					0.67
		1.00	1.14		0.67					0.76
		1.00	1.83		1.28					2.34
		1.00	6.75		1.28					8.64
		1.00	6.80		1.28					8.70
		1.00	1.00		1.28					1.28
	ANTES DE ESCALERA	1.00	2.95		0.67					1.98
		1.00	3.27		0.67					2.19
		1.00	3.74		3.72					13.91
		1.00	4.10		1.06					4.35
		1.00	0.530		1.45					0.77
		1.00	0.460		2.25					1.04
		1.00	2.780		2.25					6.26
	OFICINA 1 TERCER PISO	1.00	0.63		2.47					1.56
									TOTAL	1044.20

CROQUIS

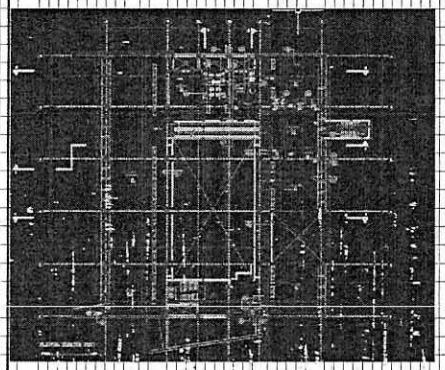

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No | DE


CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
ACUMULADO ANTERIOR										1044.20	
		1.00	6.00		0.50					3.00	
		2.00	1.81		0.88					3.19	
		1.00	1.81		0.12					0.22	
		2.00	1.81		0.50					1.81	
		1.00	1.81		0.12					0.22	
		1.00	1.00		0.12					0.12	
		2.00	4.00		0.88					7.04	
	MENOS VENTANA	-2.00	2.80		1.00					-5.60	
		1.00	2.47		1.70					4.20	
		1.00	2.47		6.30					15.56	
		1.00	2.47		0.72					1.78	
		1.00	0.65		0.30					0.20	
	OFICINA 2	1.00	2.00		2.50					5.00	
		1.00	6.00		2.50					15.00	
		2.00	6.00		2.50					30.00	
	MENOS PUERTA	-1.00	0.90		3.94					-3.55	
	MENOS VENTANA	-1.00	1.40		3.88					-13.83	
	CIELO	1.00	6.00		1.95					11.70	
									TOTAL	1120.24	

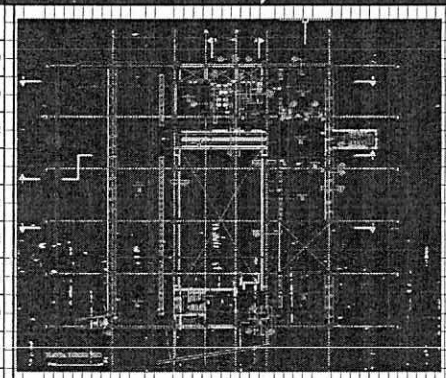

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR										1120.24
	OFICINA 3	1.00	6.00		2.47					14.82
		1.00	11.75		1.95					22.91
		1.00	7.30		2.47					18.03
		1.00	3.000		2.47					7.41
	MENOS PUERTA	-1.00	1.420		2.00					-2.84
	AFUERA OFICINA	1.00	1.47		2.24					3.29
		1.00	8.70		2.24					19.49
		1.00	3.40		2.24					7.62
TERCER PISO EJE 5		1.00	2.45		2.30					5.64
		1.00	0.86		2.30					1.98
		1.00	0.83		2.30					1.91
	ASCENSOR	1.00	4.02		2.30					9.25
	CIELO	1.00	0.87		0.13					0.11
		1.00	1.48		0.80					1.18
		1.00	3.51		2.30					8.07
	AFUERA COCINA	1.00	3.12		2.30					7.18
	MENOS EXTINTOR	-1.00	0.82		0.82					-0.67
	BAÑO	1.00	1.76		2.30					4.05
	SEPARACION BAÑOS	1.00	2.44		2.30					5.61
									TOTAL	1255.28

CROQUIS

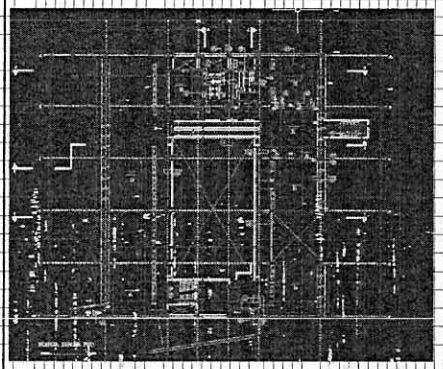

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por área, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR										1255.28
		1.00	15.00		0.80					12.00
		1.00	2.06		2.30					4.74
		1.00	1.47		2.30					3.38
		1.00	8.00		2.30					18.40
	MENOS VENTANA	-1.00	1.97		1.12					-2.21
		-1.00	1.44		1.56					-2.25
		-1.00	1.41		1.93					-2.72
	PARED VENTANA	1.00	6.00		2.30					13.80
	MENOS VENTANA	-1.00	2.460		1.30					-3.20
	BARANDA	1.00	29.490		0.67					19.76
	AFUERA OFICINA	1.00	6.730		2.30					15.48
	MENOS EXTINTOR	*-1.00*	*0.82*		*0.82*					*-0.67*
	ASCENSOR	*1.00*	*0.94*		*2.30*					*2.16*
		1.00	*0.95*		*0.34*					*0.32*
	BARANDA PUNTO FIJO	*1.00*	*5.41*		*0.67*					*3.62*
	OFICINA 12	*1.00*	*2.72*		*2.50*					*6.80*
	MENOS PUERTA	*-1.00*	*0.66*		*2.00*					*-1.32*
		1.00	*6.20*		*2.50*					*15.50*
		1.00	*1.01*		*2.50*					*2.53*
									TOTAL	1361.40

CROQUIS

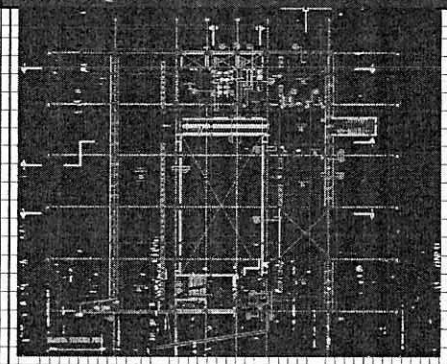

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 23 | MES 11 | AÑO 2023 | HOJA No | DE

CONTRATO No. 1674-2023 | CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR										1361.40
	C	1.00	6.20		2.50					15.50
	CIELO	1.00	7.12		1.95					13.88
	OFICINA 4	1.00	6.75		2.50					16.88
		1.00	1.80		2.50					4.50
		1.00	1.43		0.26					0.37
		1.00	6.75		2.50					16.88
		1.00	0.80		2.00					1.60
		1.00	1.45		0.78					1.13
		1.00	7.20		1.95					14.04
	REGISTRADOR	2.00	0.76		2.50					3.80
		1.00	1.19		2.50					2.98
		1.00	0.68		0.28					0.19
		1.00	6.20		2.50					15.50
		1.00	1.20		2.50					3.00
		1.00	0.680		0.28					0.19
		2.00	0.740		2.50					3.70
		1.00	1.460		0.28					0.41
		1.00	3.33		2.50					8.33
	MENOS PUERTAS	-2.00	0.60		2.00					-2.40
									TOTAL	1481.87

CROQUIS

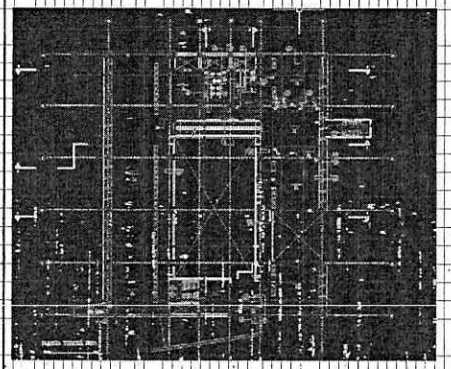

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 23 MES 11 AÑO 2023 HOJA No DE


CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULÁ DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINÁS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
ACUMULADO ANTERIOR										1481.87	
	CUARTO	1.00	4.87		2.50					12.18	
	CUARTO	1.00	3.60		2.50					9.00	
	CIELO	1.00	6.30		1.95					12.29	
	OFICINA 7	1.00	6.80		2.50					17.00	
		1.00	1.46		0.49					0.72	
		1.00	3.65		2.50					9.13	
	MENOS PUERTA	-11.00	1.42		2.00					-31.24	
		1.00	7.75		2.50					19.38	
		1.00	2.50		2.50					6.25	
		1.00	4.60		0.32					1.47	
	MURO BARANDA QUE DA A CAJAS	1.00	21.35		2.00					42.70	
PISO 2	ASCENSOR DERECHO	1.00	0.97		2.50					2.43	
		1.00	1.00		0.33					0.33	
		1.00	1.55		0.65					1.01	
		1.00	1.89		2.50					4.73	
		1.00	4.97		2.50					12.43	
		1.00	0.82		0.82					0.67	
		1.00	3.24		0.67					2.17	
		2.00	7.000		6.83					95.62	
									TOTAL	1700	

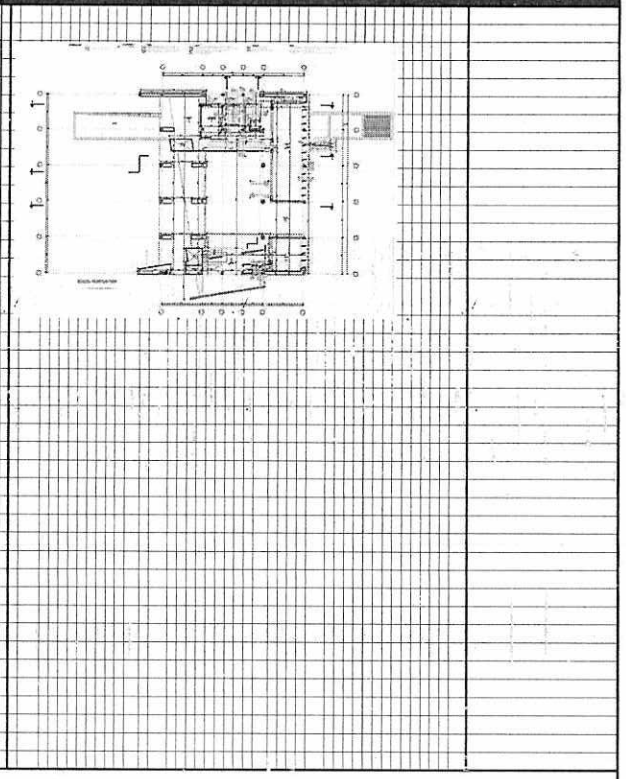

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en anáiisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
MATRICULA No. 76202-368677
RESIDENTE DE OBRA / CONTRATISTA

ARQ. DIDIER MONTERROZA CASSAS
MATRICULA No. A08192002-78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_EL BORDO - CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	OBRA							
1	**PRELIMINARES**							$11,043,670.73
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	20.00	11.37	11.37	$ 6,716.92	$76,371.38	
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2				$ 9,238.46		
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	4.00	4.00	4.00	$ 23,756.18	$95,024.72	
1,09	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	UN				$ 26,874.54		
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	6.00			$ 17,401.86		
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	25.00	11.37	11.37	$ 10,793.72	$122,724.60	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	UN	1.00			$ 96,282.06		
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	M2	22.00			$ 17,646.86		
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN				$ 17,470.46		
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	UN	2.00	2.00	2.00	$ 21,458.08	$42,916.16	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	UN	7.00	2.00	2.00	$ 19,965.54	$39,931.08	
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	30.00			$ 8,367.24		
1,27	DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	M	15.00			$ 6,197.52		
1,29	DESMONTE DE VIDRIO	M2				$ 4,487.42		
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN				$ 27,452.74		
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	30.00			$ 9,642.22		
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	60.05	58.03	58.03	$ 13,513.22	$784,104.59	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M				$ 34,758.64		
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M				$ 42,677.04		
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	2.00			$ 30,799.44		
1,41	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	M	15.00			$ 12,194.14		
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	M2	10.00			$ 18,606.28		
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	M2	60.05	58.03	58.03	$ 15,650.60	$908,126.07	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	30.00	51.72		$ 13,513.22	$698,903.74	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	M2	35.00	17.58	17.58	$ 18,316.20	$321,998.80	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	M2	2.00			$ 29,981.14		
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	80.00			$ 11,295.48		
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	M	36.00			$ 5,920.18		
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	8.00			$ 23,241.68		
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	UN				$ 84,822.92		
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN				$ 118,668.20		
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	1.00	1.00	$ 431,350.92	$431,350.92	
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	M3	24.00	24.00	24.00	$ 60,966.78	$1,463,202.72	
1,62	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL ROCOSO O CONGLOMERADO (H<=1,5M)	M3	24.00	24.00		$ 62,286.84	$1,494,884.16	
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	7.00	7.00	7.00	$ 201,949.58	$1,413,647.06	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	30.00	18.15	18.15	$ 13,513.22	$245,264.94	
1,67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	60.00	60.00		$ 26,919.62	$1,615,177.20	
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	10.00	10.00	10.00	$ 129,004.26	$1,290,042.60	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**							

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_EL BORDO - CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	1.00			$ 873,853.00		
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	M	1.00			$ 734,994.00		
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN				$ 528,023.02		
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN				$ 174,950.58		
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	4.00			$ 128,203.60		
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	5.00			$ 102,508.00		
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**							**$370,013.27**
3,01	BARANDA TUBO CUADRADO	M	12.00			$ 119,456.12		
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	4.00			$ 221,192.86		
3,17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	M2				$ 1,175,903.96		
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	1.64	1.64	1.64	$ 225,480.36	$370,013.27	
4	**CIELORRASOS**							
4,04	CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	M2	20.00			$ 82,613.02		
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**							**$5,053,993.62**
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	M2	87.30	87.30		$ 34,477.38	$3,009,875.27	
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	51.53	51.53	51.53	$ 39,672.36	$2,044,118.35	
6	**CUBIERTAS**							
6,13	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m				$ 54,224.38		
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	30.00			$ 48,633.48		
6,18	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	m	20.00			$ 82,794.32		
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	20.00			$ 75,023.90		
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	60.00			$ 36,342.32		
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	30.00			$ 86,307.62		
6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS	un	2.00			$ 3,352,317.36		
7	**ENCHAPE MUROS**							**$6,805,174.19**
7,03	RESANE	M2	131.49	131.49	131.49	$ 16,179.80	$2,127,481.90	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	M2	35.00			$ 7,537.18		
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	66.60	66.60	66.60	$ 70,235.62	$4,677,692.29	
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	M2	4.00			$ 72,073.12		
8	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**							**$13,576,722.61**
8,03	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	M	77.60	77.60	77.60	$ 94,476.90	$7,331,407.44	
8,04	MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM	M	8.30			$ 66,163.72		
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	M2	35.58	35.58	35.58	$ 153,756.12	$5,470,796.51	
8,06	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	M2	35.58	35.58	35.58	$ 21,767.76	$774,518.67	
9	**ESTRUCTURA EN MADERA**							
9,01	ESCALERAS EN MADERA	M2	6.00			$ 604,611.98		
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							**$1,125,427.56**
10,01	GRANIPLAS	M2	127.00			$ 25,252.64		
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	M2	73.46	73.46	73.46	$ 15,321.32	$1,125,427.56	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**							

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_EL BORDO - CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
11,06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	M2	30.00			$ 40,314.26		
12	**MAMPOSTERÍA**							**$10,483,943.59**
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M	30.00	7.00	7.00	$ 50,613.08	$354,291.56	
12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2	81.68	81.68	81.68	$ 124,023.90	$10,129,652.03	
12,12	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	M2	3.00			$ 194,400.64		
13	**PINTURAS**							**$581,498.74**
13,01	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M	10.00			$ 14,654.92		
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	262.98	24.77		$ 23,476.88	$581,498.74	
14	**PISOS**							
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	65.00			$ 72,512.16		
14,12	POYO COCINA 55X10CM	M	3.00			$ 81,882.92		
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	82.11			$ 39,876.20		
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	56.00			$ 28,144.62		
15	**RED ELÉCTRICA**							
15,07	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	7.00			$ 186,557.70		
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	7.00			$ 114,139.62		
15,31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	7.00			$ 121,761.08		
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UN	7.00			$ 127,087.38		
15,33	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC	UN	7.00			$ 121,315.18		
15,34	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	UN	7.00			$ 10,045.98		
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	UN	7.00			$ 127,670.48		
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1.00			$ 165,249.56		
16	**RED HIDRÁULICA**							
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	5.00			$ 33,309.22		
16,08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	1.00			$ 31,716.72		
16,09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	1.00			$ 32,364.50		
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	UN	1.00			$ 35,522.06		
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	1.00			$ 33,045.60		
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	4.00			$ 74,141.90		
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	4.00			$ 208,731.18		
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1.00			$ 843,845.66		
16,22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00			$ 435,073.94		
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UN				$ 519,324.54		
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	1.00			$ 153,045.62		
16,27	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	UN	2.00			$ 1,306,031.30		
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1.00			$ 550,763.92		
16,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	UN	6.00			$ 1,074,289.72		
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	4.00			$ 281,763.72		
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	4.00			$ 70,830.48		
17	**RED SANITARIA**							

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_EL BORDO - CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
17,02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN	2.00			$ 720,808.62		
17,06	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6"	M	12.00			$ 79,916.06		
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	30.00			$ 17,440.08		
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1.00			$ 646,975.42		
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	2.00			$ 419,874.14		
18	**URBANISMO**							
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	M2	20.00			$ 81,577.16		
18,02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	M	24.00			$ 37,593.78		
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2	10.00			$ 125,922.16		
18,04	SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM	M	15.00			$ 55,042.68		
18,05	BASE GRANULAR B-200	M3	4.03			$ 138,977.72		
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**							
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	1.00			$ 437,013.36		
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00			$ 1,475,861.38		
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	50.00			$ 16,324.84		
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	5.00			$ 38,256.26		
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	1.00			$ 171,059.00		
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	1.00			$ 521,758.86		
	NO PREVISTOS							
NP-01	BARANDA TUBO REDONDO (Tres hilos)	M	3.00			$ 115,530.24		
NP-02	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	137.00			$ 36,512.27		
NP-03	REJA TIPO BANCO	M2				$ 113,640.80		
NP-04	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M	13.00			$ 55,176.94		
NP-05	ESTUCO EXTERIOR	M2	137.00			$ 17,616.40		
NP-06	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M	17.50			$ 106,364.30		
NP-07	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M	28.70			$ 97,983.34		
NP-08	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	M2	137.00			$ 19,625.48		
NP-09	PISO GRES 30,5X30,5CM	M2	82.00			$ 65,957.84		
NP-10	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN	1.00			$ 277,537.96		
NP-11	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2	13.00			$ 133,048.90		
NP-12	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	17.55			$ 16,176.86		
NP-13	ZAPATA EN CONCRETO 3000 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.32			$ 1,439,608.14		
NP-14	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	UND	4.00			$ 223,880.02		
NP-15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	M2	7.20			$ 344,470.00		
	TOTAL COSTO DIRECTO							**$49,040,444.32**
	ADMINISTRACIÓN	%	23%					$ 11,279,302.19
	IMPREVISTOS	%	1%					$ 490,404.44
	UTILIDADES	%	5%					$ 2,452,022.22
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19%					$ 465,884.22
	VALOR TOTAL OBRA							**$63,728,057.40**

VALOR TOTAL ORIP EL BORDO - CAUCA	$ 212,426,858.00

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_EL BORDO - CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
BALANCE PRESUPUESTAL								

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73
VALOR ADICIÓN N°1	
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$63,728,057.40		30.00%	$63,728,057.40			$63,728,057.40	$ 148,698,800.60
2								
3								
4								
5								
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FRAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
Representante Legal
INTERVENTORIA

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº		1674 DE 2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS	NIT / C.C.	800205914-1
PLAZO	CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DIAS		FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA	31/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA	30/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.089.847.608,73	TOTAL ADICIONES		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.089.847.608,73

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (I3 ORIP)

CUADRO RESUMEN AGRUPACION 1

No	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	PACIFICO	VALLE	CALI
2		VALLE	SEVILLA
3		CAUCA	EL BORDO
4		CHOCO	ISTMINA
5	ANDINA	RISARALDA	PEREIRA
6		ANTIOQUIA	FRONTINO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FACTURA / CUENTA DE COBRO

FECHA DD-MM-AA	NÚMERO DE ACTA PARCIAL	No DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR	% TOTAL DE EJECUCION
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DECALI - VALLE	FVE-3765	PAGO PRIMER 30% CALI - VALLE	$ 225.513.788,01	$ -	$ 225.513.788,01	10,79%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE SEVILLA - VALLE	FVE-3767	PAGO PRIMER 30% SEVILLA - VALLE	$ 74.138.284,20	$ -	$ 74.138.284,20	3,55%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE EL BORDO - CAUCA	FVE-3768	PAGO PRIMER 30% EL BORDO - CAUCA	$ 63.728.057,39	$ -	$ 63.728.057,40	3,05%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE ISTMINA - CHOCO	FVE-3829	PAGO PRIMER30% ISTMINA - CHOCO	$ 66.721.683,61	$ -	$ 66.721.683,61	3,19%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE PEREIRA - RISARALDA	FVE-3825	PAGO PRIMER 30% PEREIRA - R4ISARALDA	$ 132.847.170,57	$ -	$ 132.847.170,57	6,36%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE FRONTINO - ANTIOQUIA	FVE-3824	PAGO PRIMER 30% FRONTINO - ANTIOQUIA	$ 64.005.298,84	$ -	$ 64.005.298,84	3,06%
		TOTALES		$ **626.954.282,62**	$0,00	**$626.954.282,62**	30,00%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CALIDAD DE INTERVENTOR/ DEL CONTRATO DE OBRA No 1674 DE 2023 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA 4° FORMA DE PAGO.
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN	1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 2. Copia de Acta de Recibop Parcial No 1 firmada por el contratista, la interventorioa y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría. 4. Copia del RUT contratista de obra. 5. Copia del Contrato de obra. 6. Copia del acta de inicio. 7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 8. Copias planillas de seguridad social. 9. Certificación bancada no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancada donde se debe consignar los dineros correspondientes. 10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisordel contrato de interventoría. 11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obray obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría. 12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS 27 (VEINTI SIETE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoria
TOTALL INC SAS BIC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Entre los suscritos, **WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la **SNR**, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución No. **10989** del 14 de septiembre de 2022, con la cual es se le delegó la Ordenación del Gasto, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra **TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9,** representado legalmente por **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** identificado con **C.C. No. 79553539,** designado por Documento Privado No. 1 del 10 de junio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de agosto de 2022 con el No. 02865410 del Libro IX, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **Contrato de Interventoría**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma Transaccional del **SECOP II** y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideración a lo siguiente: **1).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **2).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. **3).** Que previamente se realizó el **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 002 DE 2023,** cuyo objeto es: **"CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)". 4).** Que en el mencionado proceso se recibieron 4 propuestas de los siguientes interesados:

Referencia de oferta	Entidad
snrRAM	CONSORCIO NIORAM
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS CPM 002 DE 2023	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR
GRUCOING - SUPERNOTARIADO	GRUCOING S.A.S.
Oferta al proceso CPM 002 DE 2023 por TOTALL INC SAS BIC	TOTALL INC SAS BIC

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

5). Que conforme a lo anterior y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, dando el siguiente resultado:

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
1	CONSORCIO NIORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84.30
2	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que, como se evidencia en el Informe de Evaluación Definitivo se presenta un empate entre los proponentes

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que el Comité Técnico evaluador procedió a dar aplicación a los criterios de desempate señalados en el numeral 5.14 del Pliego de Condiciones Definitivo dando como resultado el siguiente orden de elegibilidad:

CRITERIOS DE DESEMPATE		
CERTIFICADOS	TOTALL INC SAS BIC	GRUCOING SAS
1.Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes e servicios extranjeros.	Servicios Nacionales	Servicios Nacionales
2.Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	SI	SI
3. Preferir la propuesta presentada por proponente que acredite en las condiciones establecidas en la Ley que por lo menos el 15 % de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 361 de 1997.	SI	SI
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobreviviencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.	SI	SI
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.	SI	NO
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	NO	NO
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las siguientes condiciones.	NO	NO
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales, o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
10. Preferir a oferente que acredite su acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) este conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual o sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.	SI	NO
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.	SI	NO

Que, una vez establecido lo anterior y teniendo en cuenta el numeral 5.12 del pliego de condiciones definitivo - MODO DE ADJUDICACIÓN - el comité evaluador en Comité de Contratación de fecha 6 de julio de 2023, recomendó al Secretario General y Ordenador del Gasto de la Superintendencia de Notariado y Registro, adjudicar el proceso **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 02 DE 2023.** cuyo objeto es "*CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O*

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)." de la siguiente manera:

AGRUPACIÓN 1
ADJUDICATARIO: TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351 9

AGRUPACIÓN 2
ADJUDICATARIO: GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9

6). Que conforme a lo anterior, resultó ganador de la **AGRUPACIÓN No. 1** el proponente **TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351-9** con **100** puntos y quien oferto un precio de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89),** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **7).** Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas. **CLÁUSULA PRIMERA: - A) OBJETO:** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 1". **B) ALCANCE DEL OBJETO:** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, según corresponda. La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.

El objetivo de la Interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuéstales, contables y financieros en el desarrollo del contrato. La Interventoría debe asumir una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos específicos de la Interventoría serán entre otros:

- **Absolver:** En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la Interventoría es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicación entre las partes.

- **Colaborar:** Teniendo en cuenta que la Interventoría y el Contratista conforman un equipo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista.

- **Controlar:** Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, control, verificación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidación.

- **Exigir:** La Interventora tiene la obligación de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

- **Prevenir:** El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.

- **Solicitar:** Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecución del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoría podrá implicar la modificación del contrato. Esta acción también se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

- **Verificar:** Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

- **Ley 1474 de 2011**

Artículo 84: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.

PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

- Ley 80 de 1993

ARTÍCULO 53. De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría.

CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: A) VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **B) PLAZO DEL CONTRATO:** El término de ejecución del presente contrato será el relacionado en el cuadro siguiente sin que exceda el **31 de diciembre de 2023.** Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo.

AGRUPACION	PLAZO DE EJECUCION
Agrupación 1	Cinco Meses

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El plazo de ejecución del contrato de obra por agrupación está programado de acuerdo al cuadro antes expuesto y los tiempos serán contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con la interventoría y la entidad, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II. **Parágrafo 1:** La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual debe ser firmada en compañía de la supervisión del contrato. **Parágrafo 2:** El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras, deben estar contemplados en los costos de la propuesta económica del oferente. **Parágrafo 3:** La INTERVENTORIA a las obras se realizará en una (1) etapa de acuerdo con las especificaciones de construcción y el presupuesto publicado por la entidad **CLÁUSULA TERCERA: - CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:** Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C-1209-0800-13-0-1209004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la vigencia 2023, según CDP No. 55723 del 10 de mayo de 2023, expedido por el responsable de presupuesto. **CLÁUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO**: La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el 100% del valor del contrato así:

PAGOS – ACTA PARCIAL 1

El primer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 30%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor de contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2

El segundo pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 60%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

TERCER PAGO –ACTA PARCIAL 3

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El tercer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 90%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

CUARTO PAGO-PAGO FINAL

Se efectuará el pago final del 10% del valor ejecutado del contrato restante, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Copia del Acta de recibo final firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoria
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuerta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y e visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Entregar Informe de intervenoria en medio magnético con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación de la obra.
13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificación).
14. Entregar Bitácora de obra escaneada en medio magnético.
15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los resultados obtenidos.
16. Entregar Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social.
17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.
18. Entregar planos record en medio magnético y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
19. Entregar memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
20. Entregar el Manual de operación y funcionamiento con los respectivos catálogos.
21. Entregar el Manual de mantenimiento
22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios públicos en aquellas oficinas que se cuente con las conexiones.
23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecución de las obras.
24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificación de calibración de los equipos utilizados.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Nota: La entidad no realizara adición en dinero, teniendo en cuenta que la interventoría contratada tiene un fin específico el cual es controlar obras desde el inicio hasta su culminación. En caso de ser necesario solo se adicionará en valor el contrato de interventoría proporcionalmente al valor adicionado en el contrato de obra y siempre y cuando haya disponibilidad de recursos. **Liquidación del contrato:** La liquidación del contrato se efectuará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes al recibo a satisfacción de las obras por parte de la interventoría y la supervisión del contrato y contempladas dentro del objeto contractual y su alcance. **CLÁUSULA QUINTA: - LUGAR DE EJECUCION:** Las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la ejecución de las obras son las siguientes:

AGRUPACION 1

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Frontino	Antioquia	Andina	Carrera 32 No. 30 - 34	$38.098.394,60
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Pereira	Risaralda	Andina	Avenida 30 de Agosto No. 37 - 24	$79.075.700,38
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Cali	Valle del cauca	Pacifico	Calle 3 a Norte No. 16 - 34	$134.235.550,23
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Sevilla	Valle del cauca	Pacifico	Calle 48 No. 49 - 31	$44.129.958,25
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
El Bordo	Cauca	Pacifico	Calle 6 No 6-54	$37.933.498,23

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Istmina	Choco	Pacifico	Carrera 5 A No. 25 - 18	$39.715.411,93

CLÁUSULA SEXTA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones: **1).** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2).** Está debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **3).** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **4).** Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **CLÁUSULA SÉPTIMA:- RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del objeto establecido en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA:- OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, El contratista se obliga para con la Superintendencia a: EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los Estudios Previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecución.
2. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.
3. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato o quien haga las veces.
4. Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de LA SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.
5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.
6. Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.
7. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.
8. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor de la entidad.
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
10. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
11. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
13. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.
14. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
16. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta.
17. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de interventoría, que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el supervisor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del supervisor.
18. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
19. Desarrollar la interventoría a las obras de manera que se evite a toda costa afectación a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algún inconveniente, el contratista será el responsable de solucionarlo.
20. La Interventoría debe verificar que el contratista implemente un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecución de las obras por motivo de lluvias, así como llevar el registro diario en bitácora del estado del clima.
21. La interventoría debe solicitar al contratista las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y así verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.
22. Todos los empleados a cargo del interventor y contratista deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo que se encuentren en la obra.
23. La interventoría verificara cada vez que entre un nuevo trabajador, que el mismo cuente con todos las afiliaciones de Ley.

CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a desarrollar las siguientes obligaciones específicas:

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA

1. Verificar y aprobar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y las que se establezcan conjuntamente con la visita adelantada previo al inicio de la ejecución de las obras y presentar un informe a la SUPERINTENDENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al mismo.
3. Suscribir las actas de mayores y menores cantidades y obra no prevista que sean necesarias, de modo que cada actividad no prevista y mayor cantidad de obra sea aprobada antes de su ejecución.
4. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones, así mismo verificará la calidad de los materiales utilizados por el contratista.
5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.
6. Revisar y dar el visto bueno en caso de haber cambios en la ejecución del contrato, previo visto bueno del Supervisor del contrato.
7. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
8. Realizar seguimiento detallado de la información contenida en los documentos enunciados, presentando un informe semanal a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el cumplimiento del cuadro de rendimientos, programaciones y todo lo relacionado en la correcta ejecución y avance del contrato, en caso de incumplimiento por parte del contratista deberá informarlo por escrito a la entidad y en caso de que afecte la normal ejecución del contrato sugerir los procedimientos sancionatorios que correspondan.
9. Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a os análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos y los respectivos análisis de precios unitarios. En caso de que la SUPERINTENDENCIA presente observaciones a los APU de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar as correcciones del caso.
10. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigicos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.
11. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual. conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Velar por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra.
13. Exigir al constructor cuando sea necesaria la realización de ensayos y pruebas.
14. Vigilar que el constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que considere oportuno.
15. Completar o introducir en caso de que sea necesario modificaciones al proyecto el interventor realizará los planos y especificaciones pendientes y cuidará en todo momento de que el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados.
16. Presentar informes mensuales a la Entidad donde se muestre el avance del contrato en donde se enuncie las conclusiones y recomendaciones. Cualquier variación al contrato previa su realización deberá ser consultada y aprobada por la Entidad contratante.
17. Revisar la bitácora de la obra, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución de las obras, todas las bitácoras serán administrada por la interventoría, y se enviará diariamente copia digital al supervisor del contrato, dicha bitácora será diligencia en el formato entregado por la entidad. De todos los trabajos el interventor dejará constancia escrita.
18. Presentar documentos necesarios para garantizar la realización de la interventoría de acuerdo con los protocolos Bioseguridad.
19. El Interventor Debe verificar que el contratista realice la entrega y socialización del **Manual de Mantenimiento** de las obras ejecutadas.
20. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

B. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

1. Solicitar a la SUPERINTEDENCIA la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.
2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
3. Revisar y aprobar el Cronograma y el flujo de fondos del contratista y remitirlos a la Superintendencia.
4. Velar por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado.
5. Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales.
6. Autorizar la contratación de la mano de obra de los diferentes capítulos del presupuesto y supervisará la administración de los subcontratos.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

7. La Interventoría estará pendiente que todos los trabajadores contratos cuenten con la capacitación y experiencia en acabados de obra, esto con el fin de desempeñar ls labores que conlleva este tipo de intervenciones.
8. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la ley.
9. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los presupuestos, especificaciones y contrato de construcción.
10. Verificar que la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
11. Estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras.
12. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la SUPERINTENDENCIA.
13. Programar y coordinar con el contratista y con la SUPERINTENDENCIA las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.
14. Elaborar con el contratista de la obra las actas de iniciación y las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, las cuales no deberán sobrepasar el valor de la obra, debidamente justificadas, cambio de especificaciones, entregas parciales, liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar, en coordinación con el contratista. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por la Secretaria General.
15. Legalizar las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, mensualmente ante la Supervisión, cuando se requiera, de acuerdo con el avance del contrato.
16. Mantener actualizada la documentación de los contratos.
17. Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales.
18. Cumplir con la entrega de los informes ejecutivos semanales, informes mensuales y finales requeridos por la SUPERINTEDENCIA en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato.
19. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

20. Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.

21. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.

22. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto a la SUPERINTEDENCIA para la resolución final de las mismas.

23. Suspender si es necesario el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión.

24. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además, elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la SUPERINTEDENCIA para su aprobación con una antelación mínima de 10 días a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas técnica, jurídica y económicamente.

25. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato

26. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

27. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

28. Realizar la interventoría de acuerdo con la Resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021 ANEXO – MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA y las que la modifiquen, adicionen o deroguen, de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se adopta el manual interno de Supervisión e interventoría de los Contratos que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro.

29. Presentar los informes y documentos necesarios para realizar la interventoría de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia y los formatos entregados por la supervisión del contrato.

30. Enviar en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), si el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor con el fin de informar a la Dirección de Contratación, para que se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados y este remitirlos a la Secretaría General. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

31. Elaborar el acta de terminación del contrato y el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de 15 días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la SUPERINTEDENCIA para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
32. Verificar que el contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
33. Revisar, aprobar y vigilar los Planes de Seguridad, higiene, y salud ocupacional de acuerdo con las Normas técnicas vigentes, presentado por el contratista y remitirlo aprobado a la supervisión.
34. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.
35. Llevar acabo lo establecido en la resolución 682 del 24 de abril de 2020 con relación al PAPSO.
36. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

C. INTERVENTORÍA FINANCIERA

Realizar el seguimiento a la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir, con el fin de tener herramientas para realizar las recomendaciones y ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de las obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de ejecución del contrato.

La interventoría deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios para realizar los pagos y realizar la revisión de los mismos, realizando y suscribiendo las certificaciones que correspondan.

D. INTERVENTORÍA LEGAL

Revisión de los documentos del contratista de obra, tales como, Contrato de obra, Pliegos de condiciones y en general de los documentos que hacen parte del contrato. Lo anterior, con el objeto de que sean conocidas las condiciones y obligaciones del contratista de obra y el personal vinculado y responsable de la ejecución del contrato.

Se debe mantener un estricto control y seguimiento a las garantías suscritas por el contratista, haciendo énfasis en la vigencia de las mismas, en concordancia con lo establecido en el contrato

de obra. Se revisará e informará a la Entidad oportunamente de las condiciones y vencimiento de las mismas.

Así mismo realizar la verificación del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que utilice el contratista en la ejecución de las obras.

De igual manera, realizar el seguimiento legal a la ejecución del contrato y asegurarse de que el contrato se cumpla en todos sus términos y condiciones. Esto incluye la revisión de los plazos de ejecución, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos legales.

Debe además realizar los informes, reportes y conceptos jurídicos y/o Legales que La Entidad solicite al Interventor, en relación con la ejecución del contrato. También debe informar a las partes sobre cualquier problema o incumplimiento detectado y proponer soluciones para corregirlos.

E. INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La interventoría deberá efectuar el seguimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por ellos mismos, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se deberá atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, entre otras.

Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigación (Ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y demás normas que amplíen o modifiquen la materia).

F. CONTROL DE COSTOS

Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua confrontación de este con las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que inciden en los costos se procura mantener una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados, una idea de las razones y de las medidas correctivas que se puedan tomar.

En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, sea necesario ejecutar otros ítems no

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos - del respectivo manual de Interventoría, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaría de obras.

En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información al Supervisor designado por la SNR, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la interventora del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prorrogas por retrasos en el cronograma.

Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993.

G. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Consiste en controlar la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de los de las actividades contratadas. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de las obras.

Indica las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas.

Las visitas serán programadas conjuntamente, con el contratista de obra, interventoría y la entidad.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Hacer seguimiento constante a la programación de la obra.

Llevar a cabo lo establecido en la resolución 682 de 24 de abril de 2020 con relación al (PAPSO).

H. RECOMENDACIONES

Liquidación del contrato de interventoría

El Supervisor procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

Inspección final de la obra

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra, 10 días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

Manual de Mantenimiento de obras ejecutadas

El Interventor deberá solicitar al contratista la entrega y socialización de un manual de mantenimiento de las obras ejecutadas, así cada oficina será responsable del cuidado de las obras ejecutadas

I. CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO

La Interventoría designará Ingenieros y/o Arquitectos, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al municipio que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, según resolución vigente.

La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del contratista.

El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesión en el territorio nacional.

El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada interventoría.

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños del proyecto, la normatividad vigente y demás obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoría que garanticen la correcta ejecución del proyecto.

Insumos.
La SNR entregará al **Interventor:**
Copia del Contrato de obra suscrito con el Contratista, así como los estudios y los documentos previos que lo soportan.

Productos
El interventor deberá solicitar al contratista:

- Hojas de vida del personal profesional.
- Relación del equipo mínimo obligatorio.
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
- Programa de Obra y flujo de inversiones
- Plan de manejo de tránsito- PMT.
- Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y escombreras que utilizará durante la Etapa de Construcción, así como también los permisos que sean necesarios utilizar.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Plan de manejo ambiental
- Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

J. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS:

Objetivo:

El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el **Contratista,** corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el **Contrato de Obra.**

Materiales:

El **Interventor** realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada por el **Contratista** cumple con los requerimientos contenidos en el **Contrato de Obra.**

Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos, acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el **Contratista.** En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el **Contratista** e **Interventoría,** primaran para efectos de la comprobación de las **Metas Físicas** y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta última.

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados (de existir) y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del **Proyecto** por parte del **Interventor,** éste deberá solicitar al **Contratista** los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el **Contrato de Obra,** o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Para adelantar dicha labor el **Interventor** deberá contar, entre otros y como mínimo, con los siguientes insumos:

- Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
- Realización y/o Revisión de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra.
- Visita de inspección a sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos fabricados fuera del área del proyecto.

Productos:

Los productos resultantes de este proceso, corresponderán a:

- Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoría.
- Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
- Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad, cuando sea necesario.
- Presentar informes de inspección a las instalaciones de fabricación
- Notificar al Contratista y a la Alcaldía respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos realizados.
- Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra
- Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

K. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo:

Verificar los procesos constructivos empleados por el **Contratista,** la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la **Programación de Obra y flujo de inversiones** y **Cronograma de Metas Físicas** entregados por el Contratista.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Reuniones semanales entre contratista e interventoría, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría interno de la SNR según resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021.

- Informes de Inspectoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoría.

- Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.

- Registro fotográfico y fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción del proyecto (antes - durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.

CLÁUSULA DÉCIMA: - OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA:
La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Aprobar la Garantía única del Contrato.
2. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
3. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.
4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
5. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor.
6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, por el Ordenador del Gasto exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
7. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.
8. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.
9. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.
10. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
12. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.
13. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.
14. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
15. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II.
16. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.
18. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar.
19. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.
20. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.
21. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.
22. Contratar un interventor para la vigilancia y verificación de la correcta ejecución del objeto del presente contrato
23. Las demás inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de Supervisión.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - SUPERVISION Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: A) SUPERVISOR: La supervisión, vigilancia en la ejecución y cumplimiento estricto del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Infraestructura de la SNR O quien haga sus veces o de quien designe el ordenador del gasto. **B) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 1).** Velar por

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

la correcta y oportuna ejecución del contrato. **2).** Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes de supervisión del contrato, así como actas y demás documentos que soporten la ejecución y seguimiento del contrato. **3).** Informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. **4).** Informar con la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, así como estado de las obligaciones económicas y del término de ejecución. **5).** Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecución del contrato. **6).** Verificar que el **CONTRATISTA** haya subido en la Plataforma Transaccional del SECOP II, todos los documentos requeridos para la legalización del contrato y los informes y soportes exigidos durante la ejecución del mismo. **7).** Allegar a la Dirección de Contratación original del acta de inicio dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación del acto administrativo de supervisión. **8)** Las demás que legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la **Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021**, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA**: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - CESIÓN:** Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia, al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PARÁGRAFO. -** Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes será la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecución del contrato, el Contratista preste sus servicios en otras partes del territorio nacional. **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: -EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y la **SUPERINTENDENCIA**, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogación diferente a los honorarios aquí pactados. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA:** El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal,

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: **A)** Estudios y documentos previos. **B)** Documento soportes del contrato. **C)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **D)** Registro Presupuestal. **E)** Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. **F)** Actas, informes y demás documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. **G)** Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. **H).** Modificaciones transaccionales que se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. **I).** Propuesta del oferente **SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS. CLÁUSULA VIGÉSIMA: - GARANTIAS:** Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

a) **De cumplimiento** cuyo valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).
b) **De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales** del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015)

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a publicar en la PLATAFORMA SECOP II el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados y notificar a la SNR de su publicación para su posterior aprobación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete a publicar en la PLATAFORMA SECOP II, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - PENAL PECUNIARIA: a.)** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a **LA SUPERINTENDENCIA** a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. **b.)** Igualmente, frente al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - MULTAS: a)**. con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. **b)**. La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. **c).** La imposición de multas no impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. **d).** El contratista autoriza a **la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar. **CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA TERCERA: - CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la póliza de garantía dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del **SECOP II** por la **SUPERINTENDENCIA. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.** El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del **SECOP II.** Para su ejecución requerirá: **1).** Expedición del Registro presupuestal; **2).** Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II. **3).** Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalización requerirá, **4).** Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes señalados.

Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda – Ordenador del Gasto.
Revisó y Aprobó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor de Despacho.
Revisó: Héctor Iván Suárez Betancur – Dirección de Contratación.
Proyectó: Daniel Palacios – Abogado de la Dirección de Contratación. Daniel Palacios

ACTA DE INICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1707 de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TOTALL INC SAS BIC
NIT: 901.620.351-9

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Oficinas de Instrumentos Públicos de Frontino Antioquia, Pereira Risaralda, Cali Valle del Cauca, Sevilla Valle del Cauca, EL Bordo Cauca, Istmina Choco.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $373.103.235.89
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 362623 del 13 de julio de 2023

El día 31 de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron **ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI** en su calidad de supervisor del contrato y **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** en su calidad de contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato de interventoría No. 1707 de 2023.**

Objeto: CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACION 1

Se firma en Bogotá D.C., para los fines pertinentes el día 31 de Julio de 2023.

Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Supervisor
Profesional Universitario
Grupo de Infraestructura

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Interventor
C.C. 79.553.539

Bogotá D.C, diciembre 21 de 2023

La suscrita Contadora de la empresa **TOTALL INC SAS BIC con NIT. 901.620.351-9**

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en los resultados de mi revisión, informo que la Compañía se encuentra debidamente afiliada a las entidades que administran los riesgos de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y que durante el periodo de seis meses, pagó cumplidamente los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal TOTALL INC SAS BIC


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.101.836

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8050610393E9E7760E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO							X											230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(5)**																						$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$63,500		$0	$0		$2,846,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,813,600	$11,100	$0	$1,824,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$7,300	$0	$1,212,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$2,000	$0	$322,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$1,800	$0	$289,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$63,500	$400	$0	$63,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$63,500	$400	$0	$63,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$484,800	$3,100	$0	$487,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$2,000	$0	$322,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$500	$0	$72,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**5**	**$2,846,700**	**$17,500**	**$0**	**$2,864,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																														
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Total			**Afiliados(5)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$465,200	$500	$0	$465,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$465,200	$500	$0	$465,700
TOTAL				**5**	**$465,200**	**$500**	**$0**	**$465,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649890	3	CONSORCIO TIG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	228499304	9457375884	E	2023/10/23	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,891,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,528,000	$0	$0	$2,528,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$864,000	$0	$0	$864,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$632,000	$0	$0	$632,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$416,000	$0	$0	$416,000
TOTAL				**7**	**$4,891,800**	**$0**	**$0**	**$4,891,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																			0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT	X																	230201	6	$300,000	$48,000	EPS005	6	$300,000	$12,000	CCF22	6	$300,000	$12,000	14-4	6	$300,000	0.522%	$1,600	6	$0	$0	Si	$73,600
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA	X																	231001	25	$1,250,000	$200,000	EPS017	25	$1,250,000	$50,000	CCF22	25	$1,250,000	$50,000	14-4	25	$1,250,000	0.522%	$6,600	25	$0	$0	Si	$306,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA	X																	230301	10	$666,667	$106,700	EPS018	10	$666,667	$26,700	CCF22	10	$666,667	$26,700	14-4	10	$666,667	6.960%	$46,500	10	$0	$0	Si	$206,600
5	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO	X																	231001	5	$391,667	$62,700	EPS002	5	$391,667	$15,700	CCF22	5	$391,667	$15,700	14-4	5	$391,667	6.960%	$27,300	5	$0	$0	Si	$121,400
6	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total			**Afiliados(6)**																				$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$865,400	$0	$0	$865,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$262,700	$0	$0	$262,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$554,700	$0	$0	$554,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$48,000	$0	$0	$48,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$283,000	$0	$0	$283,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$283,000	$0	$0	$283,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$262,800	$0	$0	$262,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$50,000	$0	$0	$50,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$26,700	$0	$0	$26,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,700	$0	$0	$15,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$12,000	$0	$0	$12,000
TOTAL				**6**	**$1,674,000**	**$0**	**$0**	**$1,674,000**

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 07:13:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8909576336

Fecha limite de pago: 2023-12-20

GUARDADA 04/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMENQUE				
Documento	CC11807075	**Dirección**	CR 49 # 25 56		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2692788		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11807075	GUERRERO PALOMEQUE DAVID ANTONIO	59	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 7.100	$ 343.800

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																								$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT		X															X		23020 1	5	$250,000	$40,000	EPS005	5	$250,000	$10,000	CCF22	5	$272,917	$11,000	14-4	5	$250,000	0.522%	$1,400	5	$0	$0	Si	$62,400
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
4	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO	X																		23030 1	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$52,800	CCF22	22	$1,320,000	$52,800	14-4	22	$1,320,000	6.960%	$91,900	22	$0	$0	Si	$408,700
5	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	72261222	FERRIGNO RIVAS MAURY JAVIER	X	X															X		23100 1	9	$750,000	$120,000	EPS037	9	$750,000	$30,000	CCF22	9	$781,250	$31,300	14-4	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$233,500
7	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	X																		25-14	14	$793,334	$127,000	EPS037	14	$793,334	$31,800	CCF22	14	$793,334	$31,800	14-4	14	$793,334	6.960%	$55,300	14	$0	$0	Si	$245,900
8	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
9	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																			23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
10	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA	X																		23020 1	25	$1,333,334	$213,400	EPS017	25	$1,333,334	$53,400	CCF22	25	$1,333,334	$53,400	14-4	25	$1,333,334	6.960%	$92,900	25	$0	$0	Si	$413,100
Total			**Afiliados(10)**																					$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,095,600	$0	$0	$2,095,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$736,000	$0	$0	$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$127,000	$0	$0	$127,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$979,200	$0	$0	$979,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$253,400	$0	$0	$253,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$805,400	$0	$0	$805,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$805,400	$0	$0	$805,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$572,700	$0	$0	$572,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$572,700	$0	$0	$572,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$570,400	$0	$0	$570,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$113,400	$0	$0	$113,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$61,800	$0	$0	$61,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$0	$0	$94,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$62,800	$0	$0	$62,800
TOTAL				**10**	**$4,044,100**	**$0**	**$0**	**$4,044,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS		R																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
6	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
7	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
8	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	25	$966,667	6.960%	$67,300	0	$0	$0	No	$67,300
Total			**Afiliados(8)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$591,900	$0	$0	$591,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$591,900	$0	$0	$591,900
TOTAL				8	$591,900	$0	$0	$591,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
6	CC	1070821027	CORREA IZQUIERDO MANUEL VICENTE	X																	23020 1	20	$773,334	$123,800	EPSIC3	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
7	CC	1123314923	GERMAN PATIÑO JULY VANESSA	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
8	CC	1006846598	GONZALEZ GASCA JESUS ALEXIS	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
9	CC	5250677	PABON DIAZ ALCIDES MILCIADES	X																	23030 1	20	$773,334	$123,800	ESSC18	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
10	CC	1121712338	SUAREZ GASCA EVER HERNAN	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
Total			**Afiliados(10)**																				$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,469,800	$0	$0	$2,469,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$0	$0	$1,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$852,400	$0	$0	$852,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$411,800	$0	$0	$411,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$349,200	$0	$0	$349,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$349,200	$0	$0	$349,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$649,100	$0	$0	$649,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$31,000	$0	$0	$31,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$133,300	$0	$0	$133,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**10**	**$4,117,200**	**$0**	**$0**	**$4,117,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
3	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO																			23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
6	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
7	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES		X																X	23030 1	21	$1,960,000	$313,600	EPS008	21	$1,960,000	$78,400	CCF22	21	$2,391,667	$95,700	14-4	21	$1,960,000	6.960%	$136,500	21	$0	$0	Si	$624,200
8	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA		X																X	23020 1	15	$800,000	$128,000	EPS017	15	$800,000	$32,000	CCF22	15	$888,889	$35,600	14-4	15	$800,000	6.960%	$55,700	15	$0	$0	Si	$251,300
Total			**Afiliados(8)**																					$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,937,600	$5,700	$0	$1,943,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,000	$1,800	$0	$617,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,000	$800	$0	$272,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$921,600	$2,700	$0	$924,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$128,000	$400	$0	$128,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				8	$530,800	$1,900	$0	$532,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$78,400	$300	$0	$78,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,000	$300	$0	$92,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$68,000	$200	$0	$68,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$300	$0	$80,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$300	$0	$94,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$72,000	$300	$0	$72,300
TOTAL				**8**	**$3,772,800**	**$11,500**	**$0**	**$3,784,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
5	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total			**Afiliados(7)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
TOTAL				**7**	**$610,100**	**$1,800**	**$0**	**$611,900**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 30 - 11 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1

LUGAR DE EJECUCION: EL BORDO-CAUCA

CONTRATO DE OBRA N°	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2.089.847.608,73
		ADICION	$ -
		VALOR TOTAL	$ 2.089.847.608,73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	TOTALLINC		

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES				$ 20.451.983,00				$ 2.378.674,58	$ 10.274.054,76	$ 0,00		$ 12.556.603,40	
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	20,00	$ 6.716,92	$ 134.338,00	0,00	8,63		$ 0,00	$ 57.967,02	$ 0,00	11,37	$ 76.371,38	
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	10,00	$ 9.238,46	$ 92.385,00	0,00	10,00		$ 0,00	$ 92.384,60	$ 0,00	0,00	$ 0,00	No aplica, se verrifico en sitio
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	3,00	$ 23.756,18	$ 71.269,00	1,00	0,00		$ 23.756,18	$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 95.024,72	
1,09	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA	UN	2,00	$ 26.874,54	$ 53.749,00	0,00	2,00		$ 0,00	$ 53.749,08	$ 0,00	0,00	$ 0,00	No aplica, se verrifico en sitio
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	6,00	$ 17.401,86	$ 104.411,00	0,00	2,00		$ 0,00	$ 34.803,72	$ 0,00	4,00	$ 69.607,44	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	25,00	$ 10.793,72	$ 269.843,00	0,00	25,00		$ 0,00	$ 269.843,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 96.282,06	$ 96.282,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 96.282,06	$ 0,00	0,00	$ 0,00	Demolicion muro concreteo (1,55x3,79+3,02) y la losa (11,37m2)
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	M2	22,00	$ 17.646,86	$ 388.231,00	0,00	22,00		$ 0,00	$ 388.230,92	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN	5,00	$ 17.470,46	$ 87.352,00	0,00	5,00		$ 0,00	$ 87.352,30	$ 0,00	0,00	$ 0,00	No aplica, se verrifico en sitio
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	UN	2,00	$ 21.458,08	$ 42.916,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 42.916,16	Baños ok
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	UN	7,00	$ 19.965,54	$ 139.759,00	0,00	5,00		$ 0,00	$ 99.827,70	$ 0,00	2,00	$ 39.931,08	pregunta a guido, 2 marcos del baño
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	30,00	$ 8.367,24	$ 251.017,00	0,00	25,00		$ 0,00	$ 209.181,00	$ 0,00	5,00	$ 41.836,20	cocina
1,27	DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	M	15,00	$ 6.197,52	$ 92.963,00	0,00	13,00		$ 0,00	$ 80.567,76	$ 0,00	2,00	$ 12.395,04	
1,29	DESMONTE DE VIDRIO	M2	8,00	$ 4.487,42	$ 35.899,00	0,00	8,00		$ 0,00	$ 35.899,36	$ 0,00	0,00	$ 0,00	No aplica, se verrifico en sitio
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	2,00	$ 27.452,74	$ 54.905,00	0,00	2,00		$ 0,00	$ 54.905,48	$ 0,00	0,00	$ 0,00	No aplica, se verrifico en sitio
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	30,00	$ 9.642,22	$ 289.267,00	0,00	10,60		$ 0,00	$ 102.207,53	$ 0,00	19,40	$ 187.059,07	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	25,00	$ 13.513,22	$ 337.831,00	33,03	0,00		$ 446.341,66	$ 0,00	$ 0,00	58,03	$ 784.172,16	rectificarla en campo
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	6,00	$ 34.758,64	$ 208.552,00	0,00	6,00		$ 0,00	$ 208.551,84	$ 0,00	0,00	$ 0,00	No aplica, se verrifico en sitio
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	6,00	$ 42.677,04	$ 256.062,00	0,00	6,00		$ 0,00	$ 256.062,24	$ 0,00	0,00	$ 0,00	No aplica, se verrifico en sitio
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	2,00	$ 30.799,44	$ 61.599,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 30.799,44	$ 0,00	1,00	$ 30.799,44	
1,41	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	M	15,00	$ 12.194,14	$ 182.912,00	0,00	7,00		$ 0,00	$ 85.358,98	$ 0,00	8,00	$ 97.553,12	medir en campo pero no es necesidad, mejor realizar la cuneta de la via
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	M2	10,00	$ 18.606,28	$ 186.063,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	10,00	$ 186.062,80	
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	M2	25,00	$ 15.650,60	$ 391.265,00	33,03	0,00		$ 516.939,32	$ 0,00	$ 0,00	58,03	$ 908.204,32	MEDIR EN CAMPO
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	30,00	$ 13.513,22	$ 405.397,00	21,72	0,00		$ 293.507,14	$ 0,00	$ 0,00	51,72	$ 698.903,74	MEDIR EN CAMPO
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	M2	35,00	$ 18.316,20	$ 641.067,00	29,09	0,00		$ 532.818,26	$ 0,00	$ 0,00	64,09	$ 1.173.885,26	chequear cantidad de baño, Se aumenta el tanque y losa(3,70x3,00x1,55h), + RAMPA()
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	M2	2,00	$ 29.981,14	$ 59.962,00	0,00	0,96		$ 0,00	$ 28.781,89	$ 0,00	1,04	$ 31.180,39	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	80,00	$ 11.295,48	$ 903.638,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	80,00	$ 903.638,40	MENOS CANTIDAD, ELECTRICO
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	M	36,00	$ 5.920,18	$ 213.126,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	36,00	$ 213.126,48	MEDIR EN CAMPO
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	8,00	$ 23.241,68	$ 185.933,00	0,00	2,00		$ 0,00	$ 46.483,36	$ 0,00	6,00	$ 139.450,08	SOLO INSTALACION

1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	UN	1,00	$ 84.822,92	$ 84.823,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 84.822,92	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**No aplica, se verrifico en sitio**
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	2,00	$ 118.668,20	$ 237.336,00	0,00	2,00		$ 0,00	$ 237.336,40	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**No aplica, se verrifico en sitio**
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	1,00	$ 431.350,92	$ 431.351,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 431.350,92	
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	M3	65,00	$ 60.966,78	$ 3.962.841,00	0,00	35,00		$ 0,00	$ 2.133.837,30	$ 0,00	30,00	$ 1.829.003,40	**chequear cantidad**
1,62	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL ROCOSO O CONGLOMERADO (H<=1,5M)	M3	65,00	$ 62.286,84	$ 4.048.645,00	0,00	65,00		$ 0,00	$ 4.048.644,60	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	7,00	$ 201.949,58	$ 1.413.647,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.413.647,06	**COCINA - MEDIR**
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	30,00	$ 13.513,22	$ 405.397,00	0,00	11,85		$ 0,00	$ 160.131,66	$ 0,00	18,15	$ 245.264,94	**CHEQUEAR CANTIDAD**
1,67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	39,00	$ 26.919,62	$ 1.049.865,00	21,00	0,00		$ 565.312,02	$ 0,00	$ 0,00	60,00	$ 1.615.177,20	**CHEQUEAR CANTIDAD**
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	20,00	$ 129.004,26	$ 2.580.085,00	0,00	10,00		$ 0,00	$ 1.290.042,60	$ 0,00	10,00	$ 1.290.042,60	**CHEQUEAR**
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**				**$ 4.204.887,00**				**$ 410.032,00**	**$ 3.228.525,60**	**$ 0,00**		**$ 1.386.393,00**	
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	1,00	$ 873.853,00	$ 873.853,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 873.853,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	M	1,00	$ 734.994,00	$ 734.994,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 734.994,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	3,00	$ 528.023,02	$ 1.584.069,00	0,00	3,00		$ 0,00	$ 1.584.069,06	$ 0,00	0,00	$ 0,00	QUITAR Y PONER EN COLD ROLLED
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	3,00	$ 174.950,58	$ 524.852,00	0,00	3,00		$ 0,00	$ 524.851,74	$ 0,00	0,00	$ 0,00	QUITAR Y PONER PUERTA METALICA EN COLD ROLLED
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	3,00	$ 128.203,60	$ 384.611,00	0,00	3,00		$ 0,00	$ 384.610,80	$ 0,00	0,00	$ 0,00	DONDE?
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	1,00	$ 102.508,00	$ 102.508,00	4,00	0,00		$ 410.032,00	$ 0,00	$ 0,00	5,00	$ 512.540,00	cantidad verificada en sitio acorde al proyecto
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 26.963.725,00**				**$ 391.816,07**	**$ 24.939.046,31**	**$ 0,00**		**$ 2.416.495,64**	
3,01	BARANDA TUBO CUADRADO	M	12,00	$ 119.456,12	$ 1.433.473,00	3,28	0,00		$ 391.816,07	$ 0,00	$ 0,00	15,28	$ 1.825.289,51	**HAY BARANDA EN NP**
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	4,00	$ 221.192,86	$ 884.771,00	0,00	3,00		$ 0,00	$ 663.578,58	$ 0,00	1,00	$ 221.192,86	**PATIO INTERNO**
3,17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	M2	20,00	$ 1.175.903,96	$ 23.518.079,00	0,00	20,00		$ 0,00	$ 23.518.079,20	$ 0,00	0,00	$ 0,00	No aplica, se verrifico en sitio
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	5,00	$ 225.480,36	$ 1.127.402,00	0,00	3,36		$ 0,00	$ 757.388,53	$ 0,00	1,64	$ 370.013,27	CHEQUEAR BAÑOS Y CUARTO
4	**CIELORRASOS**				**$ 1.652.260,00**				**$ 939.310,04**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 2.591.570,44**	
4,04	CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	M2	20,00	$ 82.613,02	$ 1.652.260,00	11,37	0,00		$ 939.310,04	$ 0,00	$ 0,00	31,37	$ 2.591.570,44	**BATERIAS SANITARIAS Y COCINA, CHEQUEAR**
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**				**$ 1.629.406,00**				**$ 3.769.360,62**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 5.398.767,42**	
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	M2	30,00	$ 34.477,38	$ 1.034.321,00	67,30	0,00		$ 2.320.327,67	$ 0,00	$ 0,00	97,30	$ 3.354.649,07	**CHEQUEAR CAN, MUROS INTERNOS**
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	15,00	$ 39.672,36	$ 595.085,00	36,53	0,00		$ 1.449.032,95	$ 0,00	$ 0,00	51,53	$ 2.044.118,35	**CHEQUEAR CAN, MUROS EXTERNOS**
6	**CUBIERTAS**				**$ 18.544.446,00**				**$ 0,00**	**$ 14.814.269,08**	**$ 0,00**		**$ 3.730.176,84**	
6,13	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	30,00	$ 54.224,38	$ 1.626.731,00	0,00	30,00		$ 0,00	$ 1.626.731,40	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**No aplica, se verrifico en sitio**
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	30,00	$ 48.633,48	$ 1.459.004,00	0,00	13,10		$ 0,00	$ 637.098,59	$ 0,00	16,90	$ 821.905,81	**BATERIAS Y EXISTENTE**
6,18	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	m	30,00	$ 82.794,32	$ 2.483.830,00	0,00	30,00		$ 0,00	$ 2.483.829,60	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**NO VA**
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	20,00	$ 75.023,90	$ 1.500.478,00	0,00	10,30		$ 0,00	$ 772.746,17	$ 0,00	9,70	$ 727.731,83	**BATERIASA SANITARIAS**
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	60,00	$ 36.342,32	$ 2.180.539,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	60,00	$ 2.180.539,20	**PRECUNTA A GUIDO**
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	30,00	$ 86.307,62	$ 2.589.229,00	0,00	30,00		$ 0,00	$ 2.589.228,60	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**NP CUBIERTA SANITARIA Y RAMPA**
6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS	un	2,00	$ 3.352.317,36	$ 6.704.635,00	0,00	2,00		$ 0,00	$ 6.704.634,72	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**NO VA**
7	**ENCHAPE MUROS**				**$ 6.248.147,00**				**$ 1.476.159,30**	**$ 2.184.273,00**	**$ 0,00**		**$ 5.540.034,08**	
7,03	RESANE	M2	135,00	$ 16.179,80	$ 2.184.273,00	0,00	135,00		$ 0,00	$ 2.184.273,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	M2	35,00	$ 7.537,18	$ 263.801,00	31,60	0,00		$ 238.174,89	$ 0,00	$ 0,00	66,60	$ 501.976,19	**CHEQUEAR**
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	50,00	$ 70.235,62	$ 3.511.781,00	16,60	0,00		$ 1.165.911,29	$ 0,00	$ 0,00	66,60	$ 4.677.692,29	**CHEQUEAR**
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	M2	4,00	$ 72.073,12	$ 288.292,00	1,00	0,00		$ 72.073,12	$ 0,00	$ 0,00	5,00	$ 360.365,60	
8	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				**$ 17.657.620,00**				**$ 0,00**	**$ 4.081.073,31**	**$ 0,00**		**$ 13.576.547,09**	
8,03	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	M	80,00	$ 94.476,90	$ 7.558.152,00	0,00	2,40		$ 0,00	$ 226.744,56	$ 0,00	77,60	$ 7.331.407,44	**CHEQUEAR**
8,04	MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM	M	20,00	$ 66.163,72	$ 1.323.274,00	0,00	20,00		$ 0,00	$ 1.323.274,40	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**PREGUNTAR GUIDO**
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	M2	50,00	$ 153.756,12	$ 7.687.806,00	0,00	14,42		$ 0,00	$ 2.217.163,25	$ 0,00	35,58	$ 5.470.642,75	**CHEQUEAR**
8,06	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	M2	50,00	$ 21.767,76	$ 1.088.388,00	0,00	14,42		$ 0,00	$ 313.891,10	$ 0,00	35,58	$ 774.496,90	**CHEQUEAR**
9	**ESTRUCTURA EN MADERA**				**$ 3.627.672,00**				**$ 0,00**	**$ 3.627.671,88**	**$ 0,00**		**$ 0,00**	
9,01	ESCALERAS EN MADERA	M2	6,00	$ 604.611,98	$ 3.627.672,00	0,00	6,00		$ 0,00	$ 3.627.671,88	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**NP TIPO GATO**
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**				**$ 4.247.536,00**				**$ 3.101.190,40**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 7.348.726,00**	

10,01	GRANIPLAS	M2	150,00	$ 25.252,64	$ 3.787.896,00	50,00	0,00		$ 1.262.632,00	$ 0,00	$ 0,00	200,00	$ 5.050.528,00	**CHEQUEAR**
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2	M2	30,00	$ 15.321,32	$ 459.640,00	120,00	0,00		$ 1.838.558,40	$ 0,00	$ 0,00	150,00	$ 2.298.198,00	**CHEQUEAR**
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**				**$ 1.209.428,00**				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 1.209.427,80**	
11,06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	M2	30,00	$ 40.314,26	$ 1.209.428,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	30,00	$ 1.209.427,80	**COLINDANTE**
12	**MAMPOSTERÍA**				**$ 10.659.243,00**				**$ 1.572.623,05**	**$ 1.164.100,84**	**$ 0,00**		**$ 11.067.765,63**	
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M	30,00	$ 50.613,08	$ 1.518.392,00	0,00	23,00		$ 0,00	$ 1.164.100,84	$ 0,00	7,00	$ 354.291,56	**CHEQUEAR**
12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2	69,00	$ 124.023,90	$ 8.557.649,00	12,68	0,00		$ 1.572.623,05	$ 0,00	$ 0,00	81,68	$ 10.130.272,15	**CHEQUEAR**
12,12	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	M2	3,00	$ 194.400,64	$ 583.202,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 583.201,92	
13	**PINTURAS**				**$ 2.400.329,00**				**$ 3.920.169,42**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 6.320.499,10**	
13,01	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M	10,00	$ 14.654,92	$ 146.549,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	10,00	$ 146.549,20	**COLUMNAS FILOS**
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	96,00	$ 23.476,88	$ 2.253.780,00	166,98	0,00		$ 3.920.169,42	$ 0,00	$ 0,00	262,98	$ 6.173.949,90	**OFICINAS**
14	**PISOS**				**$ 7.930.705,00**				**$ 1.798.815,38**	**$ 302.375,71**	**$ 0,00**		**$ 9.427.144,55**	
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	65,00	$ 72.512,16	$ 4.713.290,00	0,00	4,17		$ 0,00	$ 302.375,71	$ 0,00	60,83	$ 4.410.914,69	**CHEQUEAR**
14,12	POYO COCINA 55X10CM	M	3,00	$ 81.882,92	$ 245.649,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 245.648,76	**CHEQUEAR**
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	35,00	$ 39.876,20	$ 1.395.667,00	45,11	0,00		$ 1.798.815,38	$ 0,00	$ 0,00	80,11	$ 3.194.482,38	**CHEQUEAR**
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	56,00	$ 28.144,62	$ 1.576.099,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	56,00	$ 1.576.098,72	**CHEQUEAR**
15	**RED ELÉCTRICA**				**$ 5.825.292,00**				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 5.825.291,50**	
15,07	LUMINARIA LED 120X30CM DE	UN	7,00	$ 186.557,70	$ 1.305.904,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.305.903,90	**CHEQUEAR - NP TUBERIA 1/2" CONDIUT**
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	7,00	$ 114.139,62	$ 798.977,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 798.977,34	
15,31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	7,00	$ 121.761,08	$ 852.328,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 852.327,56	
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UN	7,00	$ 127.087,38	$ 889.612,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 889.611,66	
15,33	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC	UN	7,00	$ 121.315,18	$ 849.206,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 849.206,26	
15,34	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	UN	7,00	$ 10.045,98	$ 70.322,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 70.321,86	
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	UN	7,00	$ 127.670,48	$ 893.693,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 893.693,36	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 165.249,56	$ 165.250,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 165.249,56	
16	**RED HIDRÁULICA**				**$ 17.012.984,00**				**$ 66.091,20**	**$ 4.188.346,54**	**$ 0,00**		**$ 12.890.725,96**	
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	5,00	$ 33.309,22	$ 166.546,00	0,00	2,00		$ 0,00	$ 66.618,44	$ 0,00	3,00	$ 99.927,66	
16,08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	1,00	$ 31.716,72	$ 31.717,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 31.716,72	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
16,09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	1,00	$ 32.364,50	$ 32.365,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 32.364,50	
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	UN	1,00	$ 35.522,06	$ 35.522,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 35.522,06	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	1,00	$ 33.045,60	$ 33.046,00	2,00	0,00		$ 66.091,20	$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 99.136,80	
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	4,00	$ 74.141,90	$ 296.568,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 296.567,60	
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	4,00	$ 208.731,18	$ 834.925,00	0,00	2,00		$ 0,00	$ 417.462,36	$ 0,00	2,00	$ 417.462,36	
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1,00	$ 843.845,66	$ 843.846,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 843.845,66	
16,22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 435.073,94	$ 435.074,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 435.073,94	
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 519.324,54	$ 519.325,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 519.324,54	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**No aplica, se verrifico en sitio**
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	1,00	$ 153.045,62	$ 153.046,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 153.045,62	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
16,27	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	UN	4,00	$ 1.306.031,30	$ 5.224.125,00	0,00	2,00		$ 0,00	$ 2.612.062,60	$ 0,00	2,00	$ 2.612.062,60	
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1,00	$ 550.763,92	$ 550.764,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 550.763,92	
16,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	UN	6,00	$ 1.074.289,72	$ 6.445.738,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	6,00	$ 6.445.738,32	**CHEQUEAR**
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	4,00	$ 281.763,72	$ 1.127.055,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 281.763,72	$ 0,00	3,00	$ 845.291,16	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	4,00	$ 70.830,48	$ 283.322,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 70.830,48	$ 0,00	3,00	$ 212.491,44	
17	**RED SANITARIA**				**$ 4.410.535,00**				**$ 0,00**	**$ 1.679.801,34**	**$ 0,00**		**$ 2.730.734,72**	
17,02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN	2,00	$ 720.808,62	$ 1.441.617,00	0,00	1,00		$ 0,00	$ 720.808,62	$ 0,00	1,00	$ 720.808,62	
17,06	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6"	M	12,00	$ 79.916,06	$ 958.993,00	0,00	12,00		$ 0,00	$ 958.992,72	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**TUBERIA SANITARIA SANITARIA 4" - 2" - 3"**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	30,00	$ 17.440,08	$ 523.202,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	30,00	$ 523.202,40	**CHEQUEAR**
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1,00	$ 646.975,42	$ 646.975,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 646.975,42	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	2,00	$ 419.874,14	$ 839.748,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 839.748,28	
18	**URBANISMO**				**$ 5.178.736,00**				**$ 0,00**	**$ 818.494,04**	**$ 0,00**		**$ 4.360.241,89**	
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	M2	20,00	$ 81.577,16	$ 1.631.543,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	20,00	$ 1.631.543,20	**GUIDO**
18,02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	M	24,00	$ 37.593,78	$ 902.251,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	24,00	$ 902.250,72	**FACHADA PRINCIPAL - CANTIDAD MENOR**
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2	10,00	$ 125.922,16	$ 1.259.222,00	0,00	6,50		$ 0,00	$ 818.494,04	$ 0,00	3,50	$ 440.727,56	**BATERIAS**
18,04	SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM	M	15,00	$ 55.042,68	$ 825.640,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	15,00	$ 825.640,20	**GUIDO**
18,05	BASE GRANULAR B-200	M3	4,03	$ 138.977,72	$ 560.080,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,03	$ 560.080,21	**GUIDO**
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**				**$ 3.613.215,00**				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 3.613.215,90**	
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	1,00	$ 437.013,36	$ 437.013,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 437.013,36	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1,00	$ 1.475.861,38	$ 1.475.861,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.475.861,38	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	50,00	$ 16.324,84	$ 816.242,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	50,00	$ 816.242,00	**CHEQUEAR**

19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	5,00	$ 38.256,26	$ 191.281,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	5,00	$ 191.281,30	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	1,00	$ 171.059,00	$ 171.059,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 171.059,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	1,00	$ 521.758,86	$ 521.759,00	0,00	0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 521.758,86	
	NO PREVISTOS				**$ 0,00**				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 23.582.338,43**		**$ 15.140.610,96**	
NP-01	BARANDA TUBO REDONDO (Tres hilos)	M		$ 115.530,24	$ 0,00			3,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 346.590,72	0,00	$ 0,00	TUBULAR
NP-02	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO	UN		$ 37.040,08	$ 0,00			137,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.074.490,96	0,00	$ 0,00	Arreglo en fachada
NP-03	REJA TIPO BANCO	M2		$ 113.640,80	$ 0,00			5,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 568.204,00	0,00	$ 0,00	QUITAR
NP-04	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M		$ 55.176,94	$ 0,00			30,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.655.308,20	25,00	$ 1.379.423,50	BATERIAS SANITARIAS Y COCINA, CHEQUEAR
NP-05	ESTUCO EXTERIOR	M2		$ 17.616,40	$ 0,00			137,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.413.447,02	137,00	$ 2.413.447,02	CHEQUEAR
NP-06	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M		$ 106.364,30	$ 0,00			30,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.190.929,00	17,50	$ 1.861.375,25	Construccion de bateria sanitaria
NP-07	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M		$ 97.983,34	$ 0,00			28,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.801.316,93	33,12	$ 3.245.208,22	NP VIGA DE CIMENTACION
NP-08	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	M2		$ 19.625,48	$ 0,00			137,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.688.690,76	0,00	$ 0,00	YA EXISTE
NP-09	PISO GRES 30,5X30,5CM	M2		$ 65.957,84	$ 0,00			43,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.836.187,23	82,00	$ 5.408.543,09	FACHADA PRINCIPAL - CANTIDAD MENOR
NP-10	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN		$ 277.537,96	$ 0,00			1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.537,96	3,00	$ 832.613,88	Toma resistente a la humedad de baños
NP-11	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2		$ 133.048,90	$ 0,00			13,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.729.635,65	0,00	$ 0,00	Mejorar la accesibilidad
	LONA	M2		$ 16.176,86								57,87	$ 936.232,54	CHEQUEAR
NP-12	ZAPATAS	M3		$ 450.000,00								1,33	$ 597.348,00	CHEQUEAR
NP-13	3,13 MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	UND		$ 223.880,00								4,00	$ 895.520,00	CHEQUEAR
NP-13	2,15 PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 15	M1		$ 344.469,00								7,20	$ 2.480.176,80	CHEQUEAR
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 163.468.149,00**				**$ 19.824.242,00**	**$ 71.302.032,00**	**$ 23.582.338,00**		**$ 132.040.249,26**	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS												**$ 39.546.053,00**	
	ADMINISTRACIÓN	**%**	**23,0%**		$ 37.597.674,00				$ 4.559.576,00	$ 16.399.467,00	$ 5.423.938,00		$ 30.369.257,00	
	IMPREVISTOS	**%**	**1,0%**		$ 1.634.681,00				$ 198.242,00	$ 713.020,00	$ 235.823,00		$ 1.320.402,00	
	UTILIDAD	**%**	**5,0%**		$ 8.173.407,00				$ 991.212,00	$ 3.565.102,00	$ 1.179.117,00		$ 6.602.012,00	
	IVA SOBRE UTILIDAD	**%**	**19,0%**		$ 1.552.947,00				$ 188.330,00	$ 677.369,00	$ 224.032,00		$ 1.254.382,00	
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 212.426.858,00**				**$ 25.761.604,00**	**$ 92.656.990,00**	**$ 30.645.248,00**		**$ 171.586.302,26**	**PORCENTAJE**
	VALOR TOTAL OBRA			**$**	**212.426.858,00**						**-$ 36.250.138,00**		**$ 171.586.302,26**	
	SALDO POR AJUSTAR												**-$ 40.840.555,74**	

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRATISTA

ARQ.FERNANDO JIMENEZ
INTERVENTORIA (SI APLICA)

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. SUPERVISION

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 11
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Versión: 01
	FORMATO: JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

JUSTIFICACION ACTA No.1
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
LUGAR DE EJECUCION EL BORDO

CONTRATO DE OBRA N°		1674	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$2,089,847,608.73
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	**OBJETO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)- AGRUPACION 1		
INTERVENTORIA:	TOTALLINC S.A.S			

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR. CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
1	**PRELIMINARES**					
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	20.00	20.00	100%	
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	10.00			No aplica
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	3.00	4.00	133%	Mayor cantidad instalada en sitio
1,09	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	UN	2.00			No aplica
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	6.00	6.00	100%	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	25.00	25.00	100%	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	UN	1.00	1.00	100%	
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	M2	22.00	22.00	100%	
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN	5.00			No aplica
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	UN	2.00	2.00	100%	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	UN	7.00	7.00	100%	
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	30.00	30.00	100%	
1,27	DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	M	15.00	15.00	100%	
1,29	DESMONTE DE VIDRIO	M2	8.00			No aplica
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	2.00			No aplica
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	30.00	30.00	100%	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	25.00	60.05	240%	Mayor cantidad instalada en sitio
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	6.00			No aplica
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	6.00			No aplica
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	2.00	2.00	100%	
1,41	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	M	15.00	15.00	100%	
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	M2	10.00	10.00	100%	
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	M2	25.00	60.05	240%	Mayor cantidad instalada en sitio
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	30.00	30.00	100%	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	M2	35.00	35.00	100%	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	M2	2.00	2.00	100%	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	80.00	80.00	100%	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	M	36.00	36.00	100%	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	8.00	8.00	100%	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	UN	1.00			No aplica
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	2.00			No aplica
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	1.00	100%	
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	M3	65.00	24.00	37%	Menor cantidad instalada en sitio
1,62	EXCAVACION MANUAL MATERIAL ROCOSO O CONGLOMERADO (H<=1,5M)	M3	65.00	24.00	37%	No aplica
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	7.00	7.00	100%	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	30.00	30.00	100%	
1,67	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	39.00	60.00	154%	Mayor cantidad instalada en sitio
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	20.00	10.00	50%	Menor cantidad instalada en sitio
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	1.00	1.00	100%	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	M	1.00	1.00	100%	
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	3.00			No aplica
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	3.00			No aplica
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	3.00	4.00	133%	Mayor cantidad instalada en sitio
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	1.00	5.00	500%	Mayor cantidad instalada en sitio
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
3,01	BARANDA TUBO CUADRADO	M	12.00	12.00	100%	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
			OBRA			
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	4.00	4.00	100%	
3,17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	M2	20.00			No aplica
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	5.00	1.64	33%	Menor cantidad instalada en sitio
4	**CIELORRASOS**					
4,04	CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	M2	20.00	20.00	100%	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	M2	30.00	87.30	291%	Mayor cantidad instalada en sitio
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	15.00	51.53	344%	Mayor cantidad instalada en sitio
6	**CUBIERTAS**					
6,13	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	30.00			No aplica
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	30.00	30.00	100%	
6,18	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	m	30.00	20.00	67%	Menor cantidad instalada en sitio
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	20.00	20.00	100%	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	60.00	60.00	100%	
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	30.00	30.00	100%	
6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS	un	2.00	2.00	100%	
7	**ENCHAPE MUROS**					
7,03	RESANE	M2	135.00	131.49	97%	No aplica
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	M2	35.00	35.00	100%	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	50.00	66.60	133%	Mayor cantidad instalada en sitio
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	M2	4.00	4.00	100%	
8	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**					
8,03	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	M	80.00	77.60	97%	Menor cantidad instalada en sitio
8,04	MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM	M	20.00	8.30	42%	Menor cantidad instalada en sitio
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	M2	50.00	35.58	71%	Menor cantidad instalada en sitio
8,06	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	M2	50.00	35.58	71%	Menor cantidad instalada en sitio
9	**ESTRUCTURA EN MADERA**					
9,01	ESCALERAS EN MADERA	M2	6.00	6.00	100%	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					
10,01	GRANIPLAS	M2	150.00	127.00	85%	Menor cantidad instalada en sitio
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	M2	30.00	73.46	245%	Mayor cantidad instalada en sitio
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					
11,06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	M2	30.00	30.00	100%	
12	**MAMPOSTERÍA**					
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M	30.00	30.00	100%	
12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2	69.00	81.68	118%	Mayor cantidad instalada en sitio
12,12	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	M2	3.00	3.00	100%	
13	**PINTURAS**					
13,01	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M	10.00	10.00	100%	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	96.00	262.98	274%	Mayor cantidad instalada en sitio
14	**PISOS**					
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	65.00	65.00	100%	
14,12	POYO COCINA 55X10CM	M	3.00	3.00	100%	
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	35.00	82.11	235%	Mayor cantidad instalada en sitio
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	56.00	56.00	100%	
15	**RED ELÉCTRICA**					
15,07	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	7.00	7.00	100%	
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	7.00	7.00	100%	
15,31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	7.00	7.00	100%	
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UN	7.00	7.00	100%	
15,33	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC	UN	7.00	7.00	100%	
15,34	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	UN	7.00	7.00	100%	
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	UN	7.00	7.00	100%	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1.00	1.00	100%	
16	**RED HIDRÁULICA**					
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	5.00	5.00	100%	
16,08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	1.00	1.00	100%	
16,09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	1.00	1.00	100%	
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	UN	1.00	1.00	100%	
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	1.00	1.00	100%	
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	4.00	4.00	100%	
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	4.00	4.00	100%	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
			OBRA			
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1.00	1.00	100%	
16,22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	1.00	100%	
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00			No aplica
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	1.00	1.00	100%	
16,27	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	UN	4.00	2.00	50%	Menor cantidad instalada en sitio
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1.00	1.00	100%	
16,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	UN	6.00	6.00	100%	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	4.00	4.00	100%	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	4.00	4.00	100%	
17	**RED SANITARIA**					
17,02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN	2.00	2.00	100%	
17,06	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6"	M	12.00	12.00	100%	
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	30.00	30.00	100%	
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1.00	1.00	100%	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	2.00	2.00	100%	
18	**URBANISMO**					
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	M2	20.00	20.00	100%	
18,02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	M	24.00	24.00	100%	
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2	10.00	10.00	100%	Menor cantidad instalada en sitio
18,04	SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM	M	15.00	15.00	100%	
18,05	BASE GRANULAR B-200	M3	4.03	4.03	100%	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	1.00	1.00	100%	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00	1.00	100%	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	50.00	50.00	100%	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	5.00	5.00	100%	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	1.00	1.00	100%	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	1.00	1.00	100%	
	NO PREVISTOS					
NP-01	BARANDA TUBO REDONDO (Tres hilos)	M		3.00		Baranda necesaria para delimitación de espacios
NP-02	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2		137.00		Cantidad necesaria para evitar las filtraciones de agua
NP-03	REJA TIPO BANCO	M2				
NP-04	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M		13.00		Necesario cambio por deterioro de la cubierta existente
NP-05	ESTUCO EXTERIOR	M2		137.00		Necesario para garantizar el acabado de las fachadas
NP-06	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M		17.50		Necesario para estabilidad de los muros
NP-07	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M		28.70		Necesario para estabilidad de los muros
NP-08	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	M2		137.00		Necesario para protección de muros exteriores
NP-09	PISO GRES 30,5X30,5CM	M2		82.00		Piso instalado en el interior por deterioro del existente
NP-10	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN		1.00		Muro en baño para los lavamanos
NP-11	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2		13.00		Necesario para garantizar el ingreso de personas con movilidad reducida
NP-12	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2		17.55		Utilizado para que la Orip continuara en servicio
NP-13	ZAPATA EN CONCRETO 3000 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		1.32		Necesario para estruturas nuevas
NP-14	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	UND		4.00		Mecesario para puerta de baño
NP-15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	M2		7.20		Puerta de seguridad necesaria

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA: TOTALLINC

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR/ FUNCIONARIO

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	*ANTIGUOS BAÑOS*	*4,00*								*4,00*
										-
										-
										-
								TOTAL		*4,00*

CROQUIS

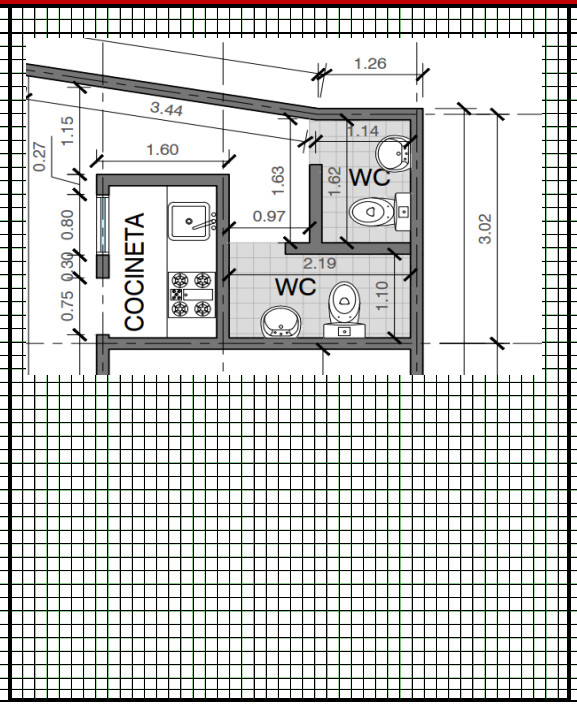

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
		Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*DESMONTE DE PUERTA EN MADERA*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	*ANTIGUOS BAÑOS*	*2,00*								*2,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	*2,00*

CROQUIS

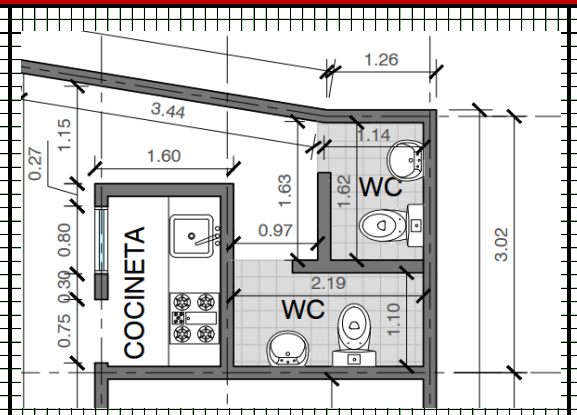

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
		Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ACABADO DE PISO	*PATIO INTERNO*		*8,55*	*3,73*						*31,89*
	CORREDOR		*5,40*	*1,31*						*7,07*
	BATERIAS SANITARIAS		*3,79*	*3,00*						*11,37*

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE


CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	
ITEM:	*DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ACABADO DE PISO	*PATIO INTERNO*		*8,55*	*3,73*						*31,89*
	CORREDOR		*5,40*	*1,31*						*7,07*
	BATERIAS SANITARIAS		*3,79*	*3,00*						*11,37*
										-
										-
										-
									TOTAL	*50,34*

CROQUIS

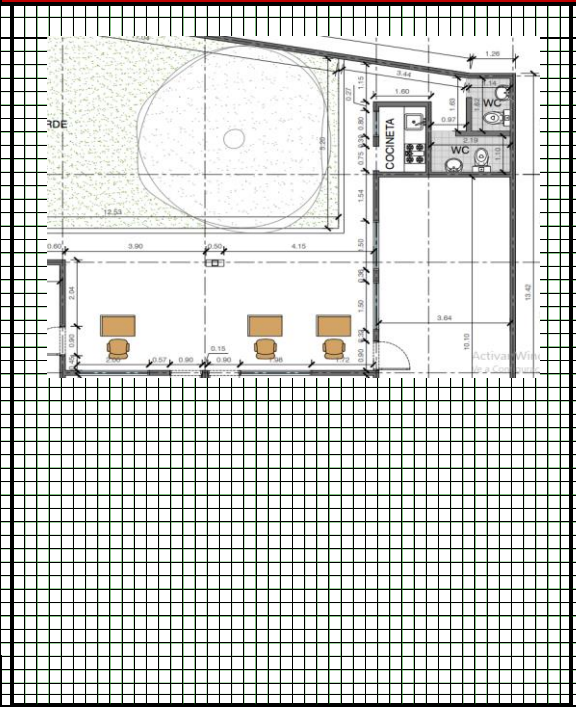

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*DEMOLICION PAÑETE MURO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION PAÑETE MURO	*ANTIGUAS BATERIAS SANITARIAS*	*2,00*	*3,790*		*3,07*					*23,27*
			3,00		*3,07*					*9,21*

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*DEMOLICION DE MURO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION DE MURO	*BAÑO HOMBRE*	*1,00*	*1,37*		*2,25*					*3,08*
	BAÑO MUJER	*1,00*	*1,30*		*2,25*					*2,93*
	COCINA	*1,00*	*2,16*		*2,25*					*4,86*
		1,00	*1,51*		*2,25*					*3,40*
		1,00	*1,03*		*2,25*					*2,32*
	TANQUE	*2,00*	*3,00*	*3,70*						
			13,40		*1,55*					*20,77*
	LOSA		*3,00*	*3,70*						*22,20*
	MURO RAMPA		*1,34*	*0,45*						*0,60*
										-
										-
										-
									TOTAL	***60,16***

CROQUIS

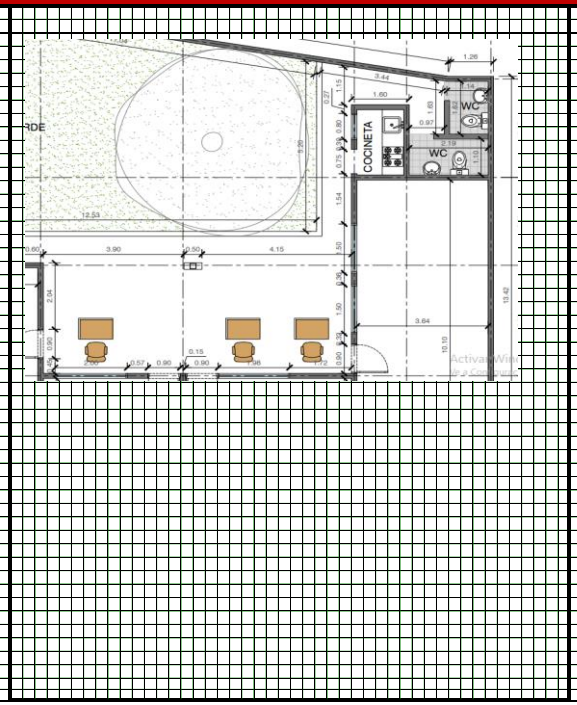

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE PINTURA	*OFICINAS*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS

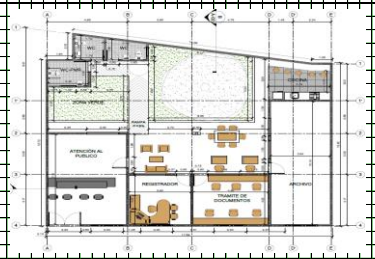



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)*	UNIDAD	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VIAJES VOLQUETA 6M3	*PATIO INTERNO*		*12,58*	*4,94*	*0,60*	*37,29*				*37,29*
	DESCUENTO DE MURO		*1,64*	*2,02*	*0,60*	*-1,99*				*-1,99*
	VIGAS DE CIMENTACIÓN		*9,73*	*0,40*	*0,20*	*0,78*				*0,78*
										-
	ZAPATAS		*0,58*	*0,82*	*0,60*	*0,29*				*0,29*
			0,58	*0,82*	*0,60*	*0,29*				*0,29*
			0,70	*0,58*	*0,60*	*0,24*				*0,24*
			0,60	*0,63*	*0,60*	*0,23*				*0,23*
			0,63	*1,12*	*0,60*	*0,42*				*0,42*
			0,78	*0,73*	*0,60*	*0,34*				*0,34*
			0,63	*0,60*	*0,60*	*0,23*				*0,23*
										-
										-
										-
									TOTAL	***38,11***

CROQUIS



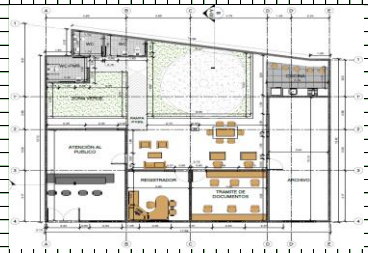

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO*	UNIDAD	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	*ANTIGUAS BATERIAS SANITARIAS*		*1,030*	*1,60*	*0,20*	*0,33*				*0,33*
			2,93	*2,19*	*0,20*	*1,28*				*1,28*
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,61*

CROQUIS

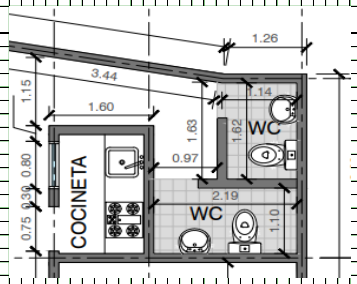

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*DEMOLICION ENCHAPE MURO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION ENCHAPE MURO	*ANTIGUAS BATERIAS SANITARIAS*	*2,00*	*3,790*		*2,55*					*19,33*
			3,00		*2,55*					*7,65*
										-
										-
										-
								TOTAL		*26,98*

CROQUIS

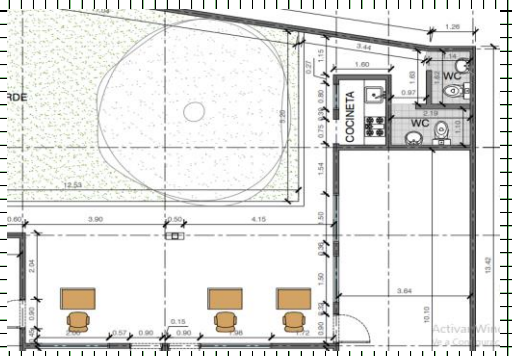

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL*	UNIDAD	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VIAJES VOLQUETA 6M3	*PATIO INTERNO*		*12,58*	*4,94*	*0,60*	*37,29*				*37,29*
	DESCUENTO DE MURO		*1,64*	*2,02*	*0,60*	*-1,99*				*-1,99*
	VIGAS DE CIMENTACIÓN		*9,73*	*0,40*	*0,20*	*0,78*				*0,78*
										-
	ZAPATAS		*0,58*	*0,82*	*0,60*	*0,29*				*0,29*
			0,58	*0,82*	*0,60*	*0,29*				*0,29*
			0,70	*0,58*	*0,60*	*0,24*				*0,24*
			0,60	*0,63*	*0,60*	*0,23*				*0,23*
			0,63	*1,12*	*0,60*	*0,42*				*0,42*
			0,78	*0,73*	*0,60*	*0,34*				*0,34*
			0,63	*0,60*	*0,60*	*0,23*				*0,23*
DEMOLICION DE MURO	*BAÑO HOMBRE*		*1,37*	*0,15*	*2,25*					*0,46*
	BAÑO MUJER		*1,30*	*0,15*	*2,25*					*0,44*
	COCINA		*2,16*	*0,15*	*2,25*					*0,73*
			1,51	*0,15*	*2,25*					*0,51*
			1,03	*0,15*	*2,25*					*0,35*
	TANQUE	*2,00*	*3,00*	*3,70*						-
			13,40	*0,15*	*1,55*					*3,12*
	LOSA		*3,00*	*3,70*	*0,10*					*1,11*
	MURO RAMPA		*1,34*	*0,45*	*0,10*					*0,06*
PATIO INTERNO		*8,55*	*3,73*		*0,05*					*1,59*
CORREDOR		*5,40*	*1,31*		*0,05*					*0,35*
BATERIAS SANITARIAS		*3,79*	*3,00*		*0,20*					*2,27*
									TOTAL	***49,11***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	
ITEM:	*ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL*	UNIDAD	*UND/DIA*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M3	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	*PATIO*	*10,00*								*10,00*
										-
										-
									TOTAL	*10,00*

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PAÑETE MUROS 1:3*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PAÑETE DE MURO 1:3	*ANTIGUAS BATERIAS SANITARIAS*	*2,00*	*3,790*		*2,55*	*19,33*				*19,33*
			3,00		*2,55*	*7,65*				*7,65*
	BATERIAS SANITARIAS									
	OFICINA SUPERVISORA	*2,00*	*2,45*		*2,40*	*11,76*				*11,76*
		2,00	*2,11*		*2,40*	*10,13*				*10,13*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,89*	*2,20*	*-1,96*				*-1,96*
	BAÑO DISCAPACITADOS	*2,00*	*2,45*		*2,40*	*11,76*				*11,76*
		2,00	*2,06*		*2,40*	*9,89*				*9,89*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,90*	*2,20*	*-1,98*				*-1,98*
	BAÑO HOMBRES	*2,00*	*1,69*		*2,40*	*8,11*				*8,11*
		2,00	*1,68*		*2,40*	*8,06*				*8,06*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	BAÑO MUJERES	*2,00*	*1,70*		*2,40*	*8,16*				*8,16*
		2,00	*2,50*		*2,40*	*12,00*				*12,00*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	DUCHA	*2,00*	*1,15*		*2,40*	*5,52*				*5,52*
		2,00	*1,43*		*2,40*	*6,86*				*6,86*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,68*	*2,20*	*-1,50*				*-1,50*
PAÑETE DE MURO 1:3	*COCINA*	*2,00*	*3,790*		*2,55*					*19,33*
			3,00		*2,55*					*7,65*
									TOTAL	*137,26*

CROQUIS

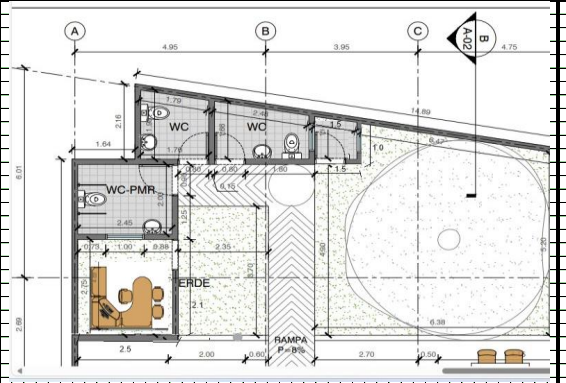

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PAÑETE MURO IMPERMEABILIZADO 1:3	*PATIO INTERIOR*									
	MURO		*6,20*		*3,73*	*23,13*				*23,13*
			4,35		*1,00*	*4,35*				*4,35*
			1,76		*0,50*	*0,88*				*0,88*
	BATERIAS SANITARIAS									-
	OFICINA Y DISCAPACITADOS		*4,50*		*2,40*	*10,80*				*10,80*
			2,60		*2,40*	*6,24*				*6,24*
	DESCUENTO DE PUERTAS	*2,00*		*0,89*	*2,20*	*-3,92*				*-3,92*
	BAÑO MUJERES Y DUCHA		*5,19*		*2,40*	*12,46*				*12,46*
			1,00		*2,40*	*2,40*				*2,40*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
				0,68	*2,20*	*-1,50*				*-1,50*
										-
										-
										-
									TOTAL	*53,08*

CROQUIS

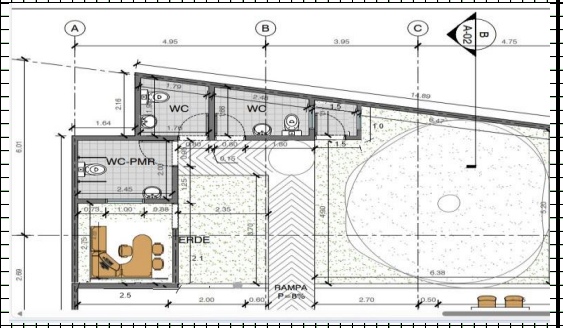

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*CERÁMICA FORMATO 25X35CM*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ENCHAPESDE MURO	*BATERIAS SANITARIAS*									
	BAÑO DISCAPACITADOS	*2,00*	*2,45*		*2,40*	*11,76*				*11,76*
		2,00	*2,06*		*2,40*	*9,89*				*9,89*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,90*	*2,20*	*-1,98*				*-1,98*
	BAÑO HOMBRES	*2,00*	*1,69*		*2,40*	*8,11*				*8,11*
		2,00	*1,68*		*2,40*	*8,06*				*8,06*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	BAÑO MUJERES	*2,00*	*1,70*		*2,40*	*8,16*				*8,16*
		2,00	*2,50*		*2,40*	*12,00*				*12,00*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	DUCHA	*2,00*	*1,15*		*2,40*	*5,52*				*5,52*
		2,00	*1,43*		*2,40*	*6,86*				*6,86*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,68*	*2,20*	*-1,50*				*-1,50*
	COCINA		*3,21*		*1,60*	*5,14*				*5,14*
			0,60		*1,60*	*0,96*				*0,96*
									TOTAL	***69,47***

CROQUIS

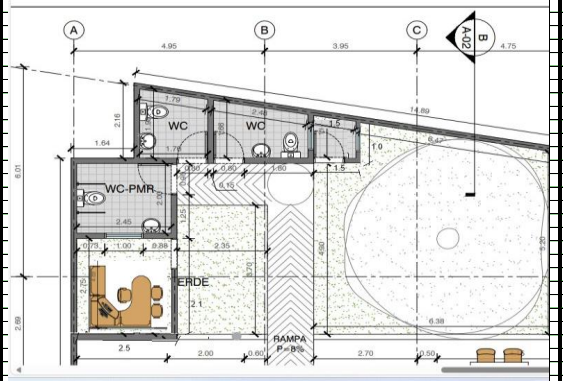

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC **SUPERVISOR SNR**

ITEM: *VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM* **UNIDAD** *M*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				ML	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VIGAS CONFINAMIENTO	***BATERIAS SANITARIAS***									
	OFICINA Y BAÑO DISCAPACITADOS	*2,00*	*4,50*			*9,00*				*9,00*
		3,00	*2,60*			*7,80*				*7,80*
	BAÑO DE MUJERES Y DUCHA	*1,00*	*6,00*			*6,00*				*6,00*
		1,00	*6,10*			*6,10*				*6,10*
		1,00	*2,13*			*2,13*				*2,13*
		1,00	*1,70*			*1,70*				*1,70*
		1,00	*1,19*			*1,19*				*1,19*
		1,00	*1,00*			*1,00*				*1,00*
	VIGAS DE CIMENTACIÓN		*9,73*			*9,73*				*9,73*
									TOTAL	*44,65*

CROQUIS

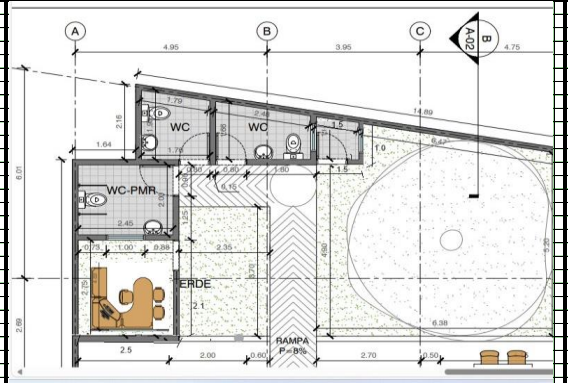

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	**1674-2023**	**CONTRATISTA**	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	**TOTALL INC SAS BIC**	**SUPERVISOR SNR**	
ITEM:	***PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM***	**UNIDAD**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				M2	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PLACA DE CONTRAPISO	***BATERIAS SANITARIAS - BLOQUELON***		*5,040*	*2,60*		*13,10*				*13,10*
	BATERIAS SANITARIAS		*6,160*	*1,70*		*10,47*				*10,47*
	COCINA		*1,030*	*1,60*		*1,65*				*1,65*
			2,93	*2,19*		*6,42*				*6,42*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MALLA ELECTROSOLDADA	***BATERIAS SANITARIAS - BLOQUELON***		*5,040*	*2,60*		*13,10*				*13,10*
	BATERIAS SANITARIAS		*6,160*	*1,70*		*10,47*				*10,47*
	COCINA		*1,030*	*1,60*		*1,65*				*1,65*
			2,93	*2,19*		*6,42*				*6,42*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*31,64*

CROQUIS

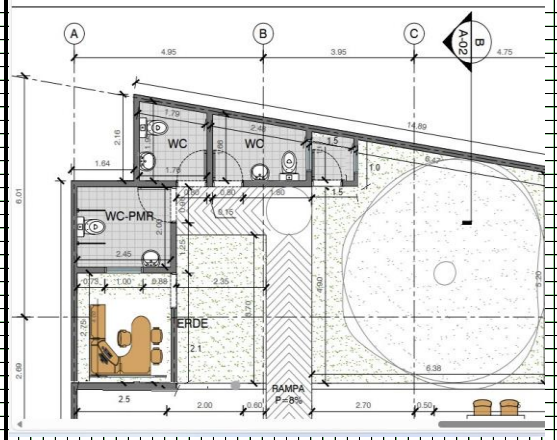

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PINTURA EXTERIOR	*FACHADA*		*17,60*		*3,50*					*61,60*
	GRADAS		*2,91*		*1,30*					*3,78*
	VOLADIZO		*17,60*	*0,60*						*10,56*
										-
										-
										-
									TOTAL	*75,94*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO*	UNIDAD	*M*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MURO EN LADRILLO	*BATERIAS SANITARIAS*									
	OFICINA SUPERVISORA	*2,00*	*2,45*		*2,20*	*10,78*				*10,78*
		2,00	*2,11*		*2,20*	*9,28*				*9,28*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,89*	*2,20*	*-1,96*				*-1,96*
	BAÑO DISCAPACITADOS	*2,00*	*2,45*		*2,20*	*10,78*				*10,78*
		2,00	*2,06*		*2,20*	*9,06*				*9,06*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,90*	*2,20*	*-1,98*				*-1,98*
	BAÑO HOMBRES	*2,00*	*1,69*		*2,20*	*7,44*				*7,44*
		2,00	*1,68*		*2,20*	*7,39*				*7,39*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	BAÑO MUJERES	*2,00*	*1,70*		*2,20*	*7,48*				*7,48*
		2,00	*2,50*		*2,20*	*11,00*				*11,00*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,80*	*2,20*	*-1,76*				*-1,76*
	DUCHA	*2,00*	*1,15*		*2,20*	*5,06*				*5,06*
		2,00	*1,43*		*2,20*	*6,29*				*6,29*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,68*	*2,20*	*-1,50*				*-1,50*
									TOTAL	***75,61***

CROQUIS

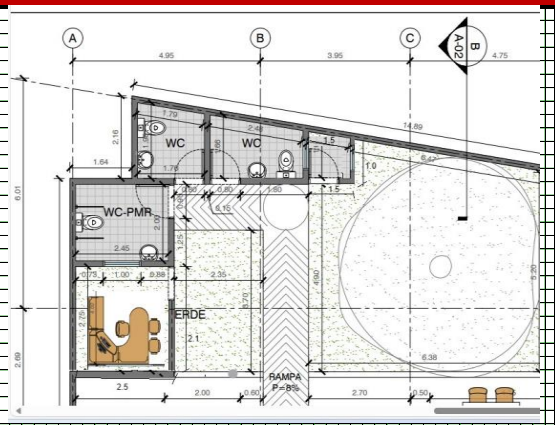

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC **SUPERVISOR SNR**

ITEM: *VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS* **UNIDAD** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	*SALA ATENCION AL PUBLICO*	*2,00*	*4,80*		*2,78*					*26,69*
		2,00	*7,41*		*2,78*					*41,20*
	DESCUENTO DE PUERTAS		*2,10*		*2,00*					*-4,20*
			0,90		*2,00*					*-1,80*
	OFICINA 1	*2,00*	*3,80*		*2,83*					*21,51*
		2,00	*4,02*		*2,83*					*22,75*
	DESCUENTO DE VENTANAS		*2,00*		*1,47*					*-2,94*
	DESCUENTO DE PUERTAS		*0,90*		*2,00*					*-1,80*
	OFICINA 2	*2,00*	*4,60*		*2,83*					*26,04*
		2,00	*4,02*		*2,83*					*22,75*
	DESCUENTO DE VENTANAS		*2,00*		*1,47*					*-2,94*
	DESCUENTO DE PUERTAS		*0,90*		*2,00*					*-1,80*
	ARCHIVO	*2,00*	*10,10*		*2,83*					*57,17*
		2,00	*3,64*		*2,83*					*20,60*
	DESCUENTO DE VENTANAS	*2,00*	*2,00*		*1,47*					*-5,88*
	DESCUENTO DE PUERTAS		*0,90*		*2,00*					*-1,80*
PINTURA	*COCINA*	*2,00*	*3,790*		*2,50*					*18,95*
			3,00		*2,50*					*7,50*
	OFICINA SUPERVISORA	*2,00*	*2,45*		*2,40*	*11,76*				*11,76*
		2,00	*2,11*		*2,40*	*10,13*				*10,13*
	DESCUENTO DE PUERTA			*0,89*	*2,20*	*-1,96*				*-1,96*
									TOTAL	***261,93***

CROQUIS

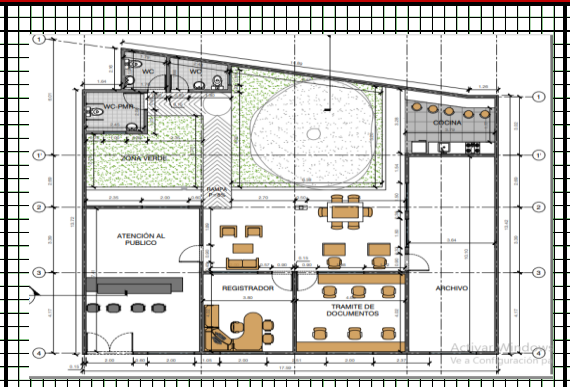

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
		Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No. 1674-2023 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC **SUPERVISOR SNR**

ITEM: *PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE* **UNIDAD** *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	*BATERIAS SANITARIAS*									-
	DISCAPACITADOS		*2,45*	*2,06*						*5,05*
	HOMBRES		*1,69*	*1,68*						*2,84*
	MUJERES		*2,50*	*1,60*						*4,00*
	DUCHA		*1,00*	*1,43*						*1,43*
	OFICINA		*2,45*	*2,12*						*5,19*
	PATIO INTERNO		*8,55*	*3,73*						*31,89*
	CORREDOR		*5,40*	*1,31*						*7,07*
	BATERIAS SANITARIAS		*3,79*	*3,00*						*11,37*
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*68,85*

CROQUIS

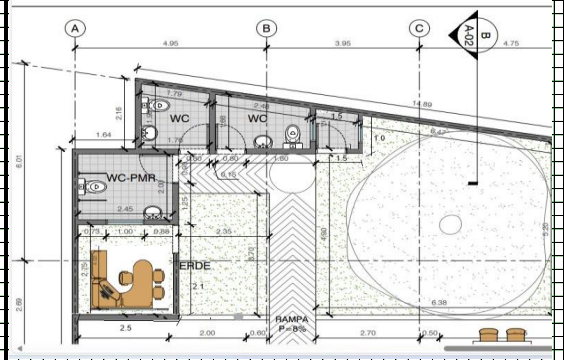

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ALISTADO DE PISO	*PATIO INTERNO*		*8,55*	*3,73*						*31,89*
	CORREDOR		*5,40*	*1,31*						*7,07*
	COCINA		*3,79*	*3,00*						*11,37*
										-
	BATERIAS SANITARIAS									-
	DISCAPACITADOS		*2,45*	*2,06*						*5,05*
	HOMBRES		*1,69*	*1,68*						*2,84*
	MUJERES		*2,50*	*1,60*						*4,00*
	DUCHA		*1,00*	*1,43*						*1,43*
	OFICINA		*2,45*	*2,12*						*5,19*
										-
										-
										-
									TOTAL	***68,85***

CROQUIS

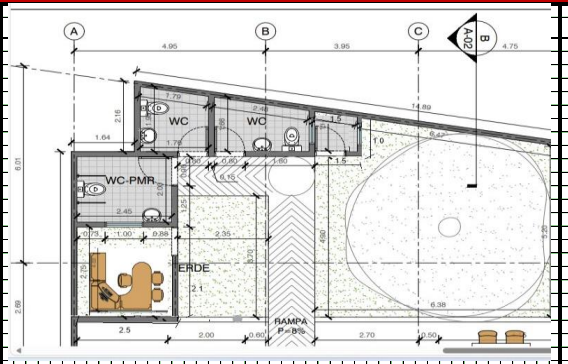

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	***BAÑOS***	*3,00*								*3,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***3,00***

CROQUIS

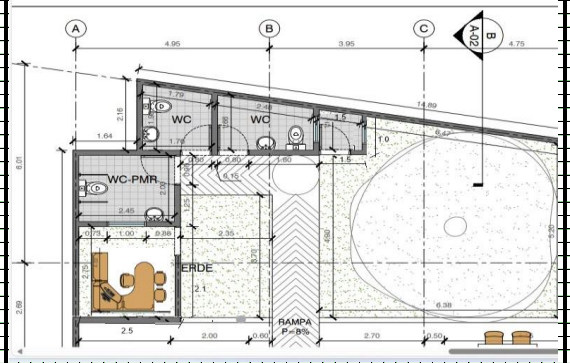

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DUCHA		*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE


CONTRATO No.	**1674-2023**	**CONTRATISTA**	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	**TOTALL INC SAS BIC**	**SUPERVISOR SNR**	
ITEM:	***PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS***	**UNIDAD**	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS		*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS

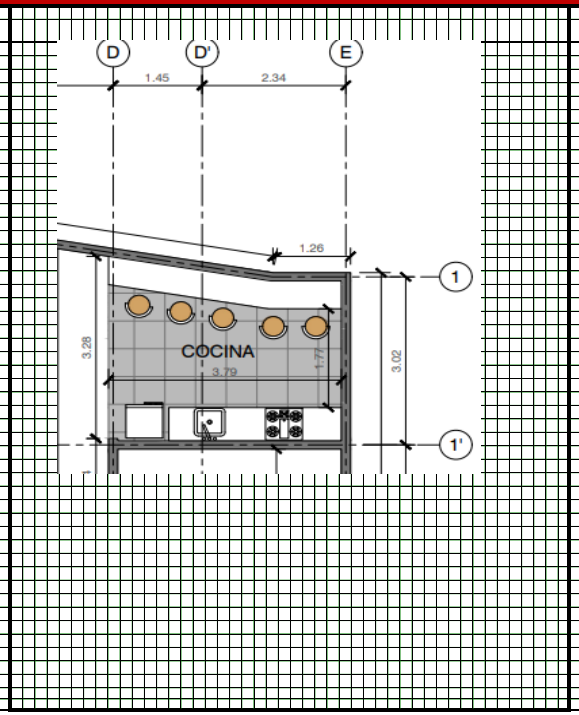

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ POLO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	***BAÑOS***	*3,00*								*3,00*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	
ITEM:	*CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM		*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023	HOJA No		DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS*	UNIDAD	*M*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS			*6,0*							*6,00*
										-
										-
										-

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_FRONTINO - ANTIOQUIA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	OBRA							
1.00	**PRELIMINARES**							**$5,548,947.74**
1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	174.53	174.53	174.53	$ 6,716.92	$1,172,321.51	
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	m²				$ 9,238.46		
1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	29.00	29.00	29.00	$ 17,401.86	$504,653.94	
1.11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	211.09	211.09	211.09	$ 10,793.72	$2,278,403.18	
1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	28.00	28.00	28.00	$ 8,067.36	$225,881.11	
1.21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	6.00	6.00	6.00	$ 21,458.08	$128,748.48	
1.22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	4.00			$ 19,965.54		
1.38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m				$ 34,758.64		
1.39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m				$ 42,677.04		
1.45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²				$ 18,316.20		
1.52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	2.00			$ 84,822.92		
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1.00	1.00	1.00	$ 431,350.92	$431,350.92	
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	30.00	30.00	30.00	$ 26,919.62	$807,588.60	
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	2.00			$ 129,004.26		
2.00	**CARPINTERÍA EN MADERA**							**$2,821,739.48**
2.13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	4.00	4.00	4.00	$ 441,423.36	$1,765,693.44	
2.14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	2.00	2.00	2.00	$ 528,023.02	$1,056,046.04	
4.00	**CIELORRASOS**							**$4,685,545.39**
4.01	CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM	m²	16.00	14.87	14.87	$ 315,111.16	$4,685,545.39	
4.02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	158.00			$ 117,172.72		
5.00	**CONCRETO Y MORTEROS**							**$16,162,290.75**
5.02	PAÑETE MUROS 1:3	m²	429.00	402.43	402.43	$ 34,477.38	$13,874,607.91	
5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	58.54	57.66	57.66	$ 39,672.36	$2,287,682.84	
6.00	**CUBIERTAS**							**$4,786,909.67**
6.02	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	m				$ 59,118.50		
6.06	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²				$ 39,027.52		
6.09	CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL	m				$ 42,871.08		
6.14	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE BARRO NATURAL	m				$ 86,829.96		
6.16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	318.00			$ 55,176.94		
6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	9.00	6.00	6.00	$ 48,633.48	$291,800.88	
6.19	CANAL EN LÁMINA LIMAHOYA	m	12.00	12.00	12.00	$ 83,135.36	$997,624.32	
6.20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	9.90	9.90	9.90	$ 75,023.90	$742,736.61	
6.21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	75.80	75.80	75.80	$ 36,342.32	$2,754,747.86	
7.00	**ENCHAPE MUROS**							**$5,419,475.39**
7.01	ESTUCO EXTERIOR	m²	15.00	15.00	15.00	$ 16,329.74	$244,946.10	
7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	429.00	339.54	339.54	$ 15,239.98	$5,174,529.29	
10.00	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							**$596,202.60**
10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	30.00	30.00	30.00	$ 19,873.42	$596,202.60	
10.05	PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]	m²	72.05			$ 17,166.66		
11.00	**IMPERMEABILIZACIÓN**							**$1,831,173.12**
11.04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	48.00	48.00	48.00	$ 38,149.44	$1,831,173.12	
13.00	**PINTURAS**							
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	429.00			$ 23,476.88		

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_FRONTINO - ANTIOQUIA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
15.00	**RED ELÉCTRICA**							**$7,401,504.88**
15.10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	44.00	44.00	44.00	$ 168,216.02	$7,401,504.88	
15.13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	2.00			$ 85,400.14		
15.29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	un	2.00			$ 184,109.66		
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1.00			$ 165,249.56		
16.00	**RED HIDRÁULICA**							
16.13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3.00			$ 130,869.20		
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un				$ 96,282.06		
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	3.00			$ 281,763.72		
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	3.00			$ 70,830.48		
17.00	**RED SANITARIA**							
17.19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	10.00			$ 17,440.08		
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	15.00			$ 28,143.64		
19.00	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**							
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1.00			$ 437,013.36		
19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un				$ 1,475,861.38		
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20.00			$ 16,324.84		
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	10.00			$ 38,256.26		
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1.00			$ 171,059.00		
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un				$ 521,758.86		
20.00	**ADICIONALES**							
20.20	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	8.00			$ 251,259.26		
21.00	**NO PREVISTOS**							
NP-01	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	M2	214.93			$ 129,741.48		
NP-02	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	UN	1.00			$ 1,484,045.95		
NP-03	CABALLETE UPVC E=2,2 MM Caballete Forte Blanco 0.6X0.94mt 2mm UPVC	M	21.00			$ 117,759.90		
NP-04	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M				$ 47,184.85		
NP-05	ESCALERA TIPO GATO	UN	3.30			$ 140,776.28		
NP-06	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00			$ 1,531,065.43		
NP-07	POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	16.80			$ 103,808.25		
NP-08	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERÍA CONUDUIT EMT 1 1/2"	M	40.00			$ 47,834.68		
NP-09	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUERVERÍA CONUDUIT EMT 1"	M	20.00			$ 43,319.05		
NP-10	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	UND	47.00			$ 37,437.40		
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	150.00			$ 27,537.67		
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X4AWG + 4AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	145.00			$ 58,373.68		
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 14AWG.	M	70.00			$ 8,935.23		
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 12AWG.	M	25.00			$ 9,941.69		
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 10AWG.	M	160.00			$ 11,400.03		
NP-16	SALIDA TOMACORRIENTE	UND	4.00			$ 64,856.35		
NP-17	PUNTOS AIRES ACONDIONADOS DUCTERIA EMT 1"	M	35.00			$ 69,205.43		
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el	UND	3.00			$ 60,850.16		

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_FRONTINO - ANTIOQUIA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
NP-19	MANTENIMIENTO SISITEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE Y CONECTIVIDAD	UND	1.00			$ 137,027.05		
TOTAL COSTO DIRECTO								**$49,253,789.02**
	ADMINISTRACIÓN	%	23%					$ 11,328,371.48
	IMPREVISTOS	%	1%					$ 492,537.89
	UTILIDADES	%	5%					$ 2,462,689.45
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19%					$ 467,911.00
VALOR TOTAL OBRA								**$64,005,298.84**

VALOR TOTAL ORIP FRONTINO - ANTIOQUIA	**$ 213,350,996.12**

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73
VALOR ADICIÓN N°1	
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$64,005,298.84		30.00%	**$64,005,298.84**			**$64,005,298.84**	**$ 149,345,697.28**
2								
3								
4								
5								
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
Representante Legal
INTERVENTORIA

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº		1674 DE 2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS	NIT / C.C.	800205914-1
PLAZO	CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DIAS		FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA	31/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA	30/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.089.847.608,73	TOTAL ADICIONES		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.089.847.608,73

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (I3 ORIP)

CUADRO RESUMEN AGRUPACION 1

No	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	PACIFICO	VALLE	CALI
2		VALLE	SEVILLA
3		CAUCA	EL BORDO
4		CHOCO	ISTMINA
5	ANDINA	RISARALDA	PEREIRA
6		ANTIOQUIA	FRONTINO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FACTURA / CUENTA DE COBRO

FECHA DD-MM-AA	NÚMERO DE ACTA PARCIAL	No DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR	% TOTAL DE EJECUCION
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DECALI - VALLE	FVE-3765	PAGO PRIMER 30% CALI - VALLE	$ 225.513.788,01	$ -	$ 225.513.788,01	10,79%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE SEVILLA - VALLE	FVE-3767	PAGO PRIMER 30% SEVILLA - VALLE	$ 74.138.284,20	$ -	$ 74.138.284,20	3,55%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE EL BORDO - CAUCA	FVE-3768	PAGO PRIMER 30% EL BORDO - CAUCA	$ 63.728.057,39	$ -	$ 63.728.057,40	3,05%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE ISTMINA - CHOCO	FVE-3829	PAGO PRIMER30% ISTMINA - CHOCO	$ 66.721.683,61	$ -	$ 66.721.683,61	3,19%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE PEREIRA - RISARALDA	FVE-3825	PAGO PRIMER 30% PEREIRA - R4ISARALDA	$ 132.847.170,57	$ -	$ 132.847.170,57	6,36%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE FRONTINO - ANTIOQUIA	FVE-3824	PAGO PRIMER 30% FRONTINO - ANTIOQUIA	$ 64.005.298,84	$ -	$ 64.005.298,84	3,06%
		TOTALES		$ **626.954.282,62**	$0,00	**$626.954.282,62**	30,00%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CALIDAD DE INTERVENTOR/ DEL CONTRATO DE OBRA No 1674 DE 2023 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA 4° FORMA DE PAGO.
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN	1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 2. Copia de Acta de Recibop Parcial No 1 firmada por el contratista, la interventorioa y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría. 4. Copia del RUT contratista de obra. 5. Copia del Contrato de obra. 6. Copia del acta de inicio. 7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 8. Copias planillas de seguridad social. 9. Certificación bancada no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancada donde se debe consignar los dineros correspondientes. 10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisordel contrato de interventoría. 11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obray obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría. 12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS 27 (VEINTI SIETE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoria
TOTALL INC SAS BIC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Entre los suscritos, **WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la **SNR**, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución No. **10989** del 14 de septiembre de 2022, con la cual es se le delegó la Ordenación del Gasto, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra **TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9,** representado legalmente por **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** identificado con **C.C. No. 79553539,** designado por Documento Privado No. 1 del 10 de junio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de agosto de 2022 con el No. 02865410 del Libro IX, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **Contrato de Interventoría**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma Transaccional del **SECOP II** y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideración a lo siguiente: **1).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **2).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. **3).** Que previamente se realizó el **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 002 DE 2023,** cuyo objeto es: **"CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)". 4).** Que en el mencionado proceso se recibieron 4 propuestas de los siguientes interesados:

Referencia de oferta	Entidad
snrRAM	CONSORCIO NIORAM
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS CPM 002 DE 2023	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR
GRUCOING - SUPERNOTARIADO	GRUCOING S.A.S.
Oferta al proceso CPM 002 DE 2023 por TOTALL INC SAS BIC	TOTALL INC SAS BIC

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

5). Que conforme a lo anterior y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, dando el siguiente resultado:

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
1	CONSORCIO NIORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84.30
2	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que, como se evidencia en el Informe de Evaluación Definitivo se presenta un empate entre los proponentes

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que el Comité Técnico evaluador procedió a dar aplicación a los criterios de desempate señalados en el numeral 5.14 del Pliego de Condiciones Definitivo dando como resultado el siguiente orden de elegibilidad:

CRITERIOS DE DESEMPATE		
CERTIFICADOS	TOTALL INC SAS BIC	GRUCOING SAS
1.Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes e servicios extranjeros.	Servicios Nacionales	Servicios Nacionales
2.Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	SI	SI
3. Preferir la propuesta presentada por proponente que acredite en las condiciones establecidas en la Ley que por lo menos el 15 % de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 361 de 1997.	SI	SI
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobreviviencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.	SI	SI
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.	SI	NO
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	NO	NO
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las siguientes condiciones.	NO	NO
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales, o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
10. Preferir a oferente que acredite su acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) este conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual o sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.	SI	NO
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.	SI	NO

Que, una vez establecido lo anterior y teniendo en cuenta el numeral 5.12 del pliego de condiciones definitivo - MODO DE ADJUDICACIÓN - el comité evaluador en Comité de Contratación de fecha 6 de julio de 2023, recomendó al Secretario General y Ordenador del Gasto de la Superintendencia de Notariado y Registro, adjudicar el proceso **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 02 DE 2023.** cuyo objeto es "*CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O*

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)." de la siguiente manera:

AGRUPACIÓN 1
ADJUDICATARIO: TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351 9

AGRUPACIÓN 2
ADJUDICATARIO: GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9

6). Que conforme a lo anterior, resultó ganador de la **AGRUPACIÓN No. 1** el proponente **TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351-9** con **100** puntos y quien oferto un precio de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89),** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **7).** Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas. **CLÁUSULA PRIMERA: - A) OBJETO:** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 1". **B) ALCANCE DEL OBJETO:** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, según corresponda. La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.

El objetivo de la Interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuéstales, contables y financieros en el desarrollo del contrato. La Interventoría debe asumir una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos específicos de la Interventoría serán entre otros:

- **Absolver:** En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la Interventoría es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicación entre las partes.

- **Colaborar:** Teniendo en cuenta que la Interventoría y el Contratista conforman un equipo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista.

- **Controlar:** Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, control, verificación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidación.

- **Exigir:** La Interventora tiene la obligación de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

- **Prevenir:** El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.

- **Solicitar:** Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecución del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoría podrá implicar la modificación del contrato. Esta acción también se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

- **Verificar:** Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

- **Ley 1474 de 2011**

Artículo 84: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.

PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

- Ley 80 de 1993

ARTÍCULO 53. De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría.

CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: A) VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **B) PLAZO DEL CONTRATO:** El término de ejecución del presente contrato será el relacionado en el cuadro siguiente sin que exceda el **31 de diciembre de 2023.** Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo.

AGRUPACION	PLAZO DE EJECUCION
Agrupación 1	Cinco Meses

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El plazo de ejecución del contrato de obra por agrupación está programado de acuerdo al cuadro antes expuesto y los tiempos serán contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con la interventoría y la entidad, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II. **Parágrafo 1:** La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual debe ser firmada en compañía de la supervisión del contrato. **Parágrafo 2:** El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras, deben estar contemplados en los costos de la propuesta económica del oferente. **Parágrafo 3:** La INTERVENTORIA a las obras se realizará en una (1) etapa de acuerdo con las especificaciones de construcción y el presupuesto publicado por la entidad **CLÁUSULA TERCERA: - CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:** Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C-1209-0800-13-0-1209004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la vigencia 2023, según CDP No. 55723 del 10 de mayo de 2023, expedido por el responsable de presupuesto. **CLÁUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO**: La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el 100% del valor del contrato así:

PAGOS – ACTA PARCIAL 1

El primer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 30%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor de contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2

El segundo pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 60%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

TERCER PAGO –ACTA PARCIAL 3

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El tercer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 90%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

CUARTO PAGO-PAGO FINAL

Se efectuará el pago final del 10% del valor ejecutado del contrato restante, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Copia del Acta de recibo final firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoria
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuerta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y e visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Entregar Informe de intervenoria en medio magnético con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación de la obra.
13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificación).
14. Entregar Bitácora de obra escaneada en medio magnético.
15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los resultados obtenidos.
16. Entregar Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social.
17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.
18. Entregar planos record en medio magnético y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
19. Entregar memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
20. Entregar el Manual de operación y funcionamiento con los respectivos catálogos.
21. Entregar el Manual de mantenimiento
22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios públicos en aquellas oficinas que se cuente con las conexiones.
23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecución de las obras.
24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificación de calibración de los equipos utilizados.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Nota: La entidad no realizara adición en dinero, teniendo en cuenta que la interventoría contratada tiene un fin específico el cual es controlar obras desde el inicio hasta su culminación. En caso de ser necesario solo se adicionará en valor el contrato de interventoría proporcionalmente al valor adicionado en el contrato de obra y siempre y cuando haya disponibilidad de recursos. **Liquidación del contrato:** La liquidación del contrato se efectuará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes al recibo a satisfacción de las obras por parte de la interventoría y la supervisión del contrato y contempladas dentro del objeto contractual y su alcance. **CLÁUSULA QUINTA: - LUGAR DE EJECUCION:** Las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la ejecución de las obras son las siguientes:

AGRUPACION 1

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Frontino	Antioquia	Andina	Carrera 32 No. 30 - 34	$38.098.394,60
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Pereira	Risaralda	Andina	Avenida 30 de Agosto No. 37 - 24	$79.075.700,38
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Cali	Valle del cauca	Pacifico	Calle 3 a Norte No. 16 - 34	$134.235.550,23
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Sevilla	Valle del cauca	Pacifico	Calle 48 No. 49 - 31	$44.129.958,25
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
El Bordo	Cauca	Pacifico	Calle 6 No 6-54	$37.933.498,23

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Istmina	Choco	Pacifico	Carrera 5 A No. 25 - 18	$39.715.411,93

CLÁUSULA SEXTA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones: **1).** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2).** Está debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **3).** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **4).** Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **CLÁUSULA SÉPTIMA:- RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del objeto establecido en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA:- OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, El contratista se obliga para con la Superintendencia a: EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los Estudios Previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecución.
2. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.
3. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato o quien haga las veces.
4. Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de LA SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.
5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.
6. Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.
7. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.
8. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor de la entidad.
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
10. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
11. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
13. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.
14. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
16. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta.
17. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de interventoría, que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el supervisor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del supervisor.
18. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
19. Desarrollar la interventoría a las obras de manera que se evite a toda costa afectación a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algún inconveniente, el contratista será el responsable de solucionarlo.
20. La Interventoría debe verificar que el contratista implemente un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecución de las obras por motivo de lluvias, así como llevar el registro diario en bitácora del estado del clima.
21. La interventoría debe solicitar al contratista las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y así verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.
22. Todos los empleados a cargo del interventor y contratista deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo que se encuentren en la obra.
23. La interventoría verificara cada vez que entre un nuevo trabajador, que el mismo cuente con todos las afiliaciones de Ley.

CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a desarrollar las siguientes obligaciones específicas:

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA

1. Verificar y aprobar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y las que se establezcan conjuntamente con la visita adelantada previo al inicio de la ejecución de las obras y presentar un informe a la SUPERINTENDENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al mismo.
3. Suscribir las actas de mayores y menores cantidades y obra no prevista que sean necesarias, de modo que cada actividad no prevista y mayor cantidad de obra sea aprobada antes de su ejecución.
4. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones, así mismo verificará la calidad de los materiales utilizados por el contratista.
5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.
6. Revisar y dar el visto bueno en caso de haber cambios en la ejecución del contrato, previo visto bueno del Supervisor del contrato.
7. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
8. Realizar seguimiento detallado de la información contenida en los documentos enunciados, presentando un informe semanal a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el cumplimiento del cuadro de rendimientos, programaciones y todo lo relacionado en la correcta ejecución y avance del contrato, en caso de incumplimiento por parte del contratista deberá informarlo por escrito a la entidad y en caso de que afecte la normal ejecución del contrato sugerir los procedimientos sancionatorios que correspondan.
9. Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a os análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos y los respectivos análisis de precios unitarios. En caso de que la SUPERINTENDENCIA presente observaciones a los APU de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar as correcciones del caso.
10. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigicos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.
11. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual. conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Velar por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra.
13. Exigir al constructor cuando sea necesaria la realización de ensayos y pruebas.
14. Vigilar que el constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que considere oportuno.
15. Completar o introducir en caso de que sea necesario modificaciones al proyecto el interventor realizará los planos y especificaciones pendientes y cuidará en todo momento de que el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados.
16. Presentar informes mensuales a la Entidad donde se muestre el avance del contrato en donde se enuncie las conclusiones y recomendaciones. Cualquier variación al contrato previa su realización deberá ser consultada y aprobada por la Entidad contratante.
17. Revisar la bitácora de la obra, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución de las obras, todas las bitácoras serán administrada por la interventoría, y se enviará diariamente copia digital al supervisor del contrato, dicha bitácora será diligencia en el formato entregado por la entidad. De todos los trabajos el interventor dejará constancia escrita.
18. Presentar documentos necesarios para garantizar la realización de la interventoría de acuerdo con los protocolos Bioseguridad.
19. El Interventor Debe verificar que el contratista realice la entrega y socialización del **Manual de Mantenimiento** de las obras ejecutadas.
20. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

B. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

1. Solicitar a la SUPERINTEDENCIA la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.
2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
3. Revisar y aprobar el Cronograma y el flujo de fondos del contratista y remitirlos a la Superintendencia.
4. Velar por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado.
5. Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales.
6. Autorizar la contratación de la mano de obra de los diferentes capítulos del presupuesto y supervisará la administración de los subcontratos.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

7. La Interventoría estará pendiente que todos los trabajadores contratos cuenten con la capacitación y experiencia en acabados de obra, esto con el fin de desempeñar ls labores que conlleva este tipo de intervenciones.
8. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la ley.
9. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los presupuestos, especificaciones y contrato de construcción.
10. Verificar que la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
11. Estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras.
12. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la SUPERINTENDENCIA.
13. Programar y coordinar con el contratista y con la SUPERINTENDENCIA las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.
14. Elaborar con el contratista de la obra las actas de iniciación y las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, las cuales no deberán sobrepasar el valor de la obra, debidamente justificadas, cambio de especificaciones, entregas parciales, liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar, en coordinación con el contratista. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por la Secretaria General.
15. Legalizar las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, mensualmente ante la Supervisión, cuando se requiera, de acuerdo con el avance del contrato.
16. Mantener actualizada la documentación de los contratos.
17. Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales.
18. Cumplir con la entrega de los informes ejecutivos semanales, informes mensuales y finales requeridos por la SUPERINTEDENCIA en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato.
19. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

20. Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.

21. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.

22. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto a la SUPERINTEDENCIA para la resolución final de las mismas.

23. Suspender si es necesario el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión.

24. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además, elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la SUPERINTEDENCIA para su aprobación con una antelación mínima de 10 días a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas técnica, jurídica y económicamente.

25. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato

26. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

27. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

28. Realizar la interventoría de acuerdo con la Resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021 ANEXO – MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA y las que la modifiquen, adicionen o deroguen, de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se adopta el manual interno de Supervisión e interventoría de los Contratos que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro.

29. Presentar los informes y documentos necesarios para realizar la interventoría de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia y los formatos entregados por la supervisión del contrato.

30. Enviar en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), si el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor con el fin de informar a la Dirección de Contratación, para que se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados y este remitirlos a la Secretaría General. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

31. Elaborar el acta de terminación del contrato y el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de 15 días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la SUPERINTEDENCIA para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
32. Verificar que el contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
33. Revisar, aprobar y vigilar los Planes de Seguridad, higiene, y salud ocupacional de acuerdo con las Normas técnicas vigentes, presentado por el contratista y remitirlo aprobado a la supervisión.
34. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.
35. Llevar acabo lo establecido en la resolución 682 del 24 de abril de 2020 con relación al PAPSO.
36. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

C. INTERVENTORÍA FINANCIERA

Realizar el seguimiento a la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir, con el fin de tener herramientas para realizar las recomendaciones y ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de las obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de ejecución del contrato.

La interventoría deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios para realizar los pagos y realizar la revisión de los mismos, realizando y suscribiendo las certificaciones que correspondan.

D. INTERVENTORÍA LEGAL

Revisión de los documentos del contratista de obra, tales como, Contrato de obra, Pliegos de condiciones y en general de los documentos que hacen parte del contrato. Lo anterior, con el objeto de que sean conocidas las condiciones y obligaciones del contratista de obra y el personal vinculado y responsable de la ejecución del contrato.

Se debe mantener un estricto control y seguimiento a las garantías suscritas por el contratista, haciendo énfasis en la vigencia de las mismas, en concordancia con lo establecido en el contrato

de obra. Se revisará e informará a la Entidad oportunamente de las condiciones y vencimiento de las mismas.

Así mismo realizar la verificación del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que utilice el contratista en la ejecución de las obras.

De igual manera, realizar el seguimiento legal a la ejecución del contrato y asegurarse de que el contrato se cumpla en todos sus términos y condiciones. Esto incluye la revisión de los plazos de ejecución, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos legales.

Debe además realizar los informes, reportes y conceptos jurídicos y/o Legales que La Entidad solicite al Interventor, en relación con la ejecución del contrato. También debe informar a las partes sobre cualquier problema o incumplimiento detectado y proponer soluciones para corregirlos.

E. INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La interventoría deberá efectuar el seguimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por ellos mismos, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se deberá atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, entre otras.

Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigación (Ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y demás normas que amplíen o modifiquen la materia).

F. CONTROL DE COSTOS

Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua confrontación de este con las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que inciden en los costos se procura mantener una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados, una idea de las razones y de las medidas correctivas que se puedan tomar.

En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, sea necesario ejecutar otros ítems no

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos - del respectivo manual de Interventoría, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaría de obras.

En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información al Supervisor designado por la SNR, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la interventora del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prorrogas por retrasos en el cronograma.

Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993.

G. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Consiste en controlar la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de los de las actividades contratadas. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de las obras.

Indica las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas.

Las visitas serán programadas conjuntamente, con el contratista de obra, interventoría y la entidad.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Hacer seguimiento constante a la programación de la obra.

Llevar a cabo lo establecido en la resolución 682 de 24 de abril de 2020 con relación al (PAPSO).

H. RECOMENDACIONES

Liquidación del contrato de interventoría

El Supervisor procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

Inspección final de la obra

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra, 10 días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

Manual de Mantenimiento de obras ejecutadas

El Interventor deberá solicitar al contratista la entrega y socialización de un manual de mantenimiento de las obras ejecutadas, así cada oficina será responsable del cuidado de las obras ejecutadas

I. CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO

La Interventoría designará Ingenieros y/o Arquitectos, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al municipio que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, según resolución vigente.

La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del contratista.

El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesión en el territorio nacional.

El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada interventoría.

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños del proyecto, la normatividad vigente y demás obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoría que garanticen la correcta ejecución del proyecto.

Insumos.
La SNR entregará al **Interventor:**
Copia del Contrato de obra suscrito con el Contratista, así como los estudios y los documentos previos que lo soportan.

Productos
El interventor deberá solicitar al contratista:

- Hojas de vida del personal profesional.
- Relación del equipo mínimo obligatorio.
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
- Programa de Obra y flujo de inversiones
- Plan de manejo de tránsito- PMT.
- Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y escombreras que utilizará durante la Etapa de Construcción, así como también los permisos que sean necesarios utilizar.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Plan de manejo ambiental
- Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

J. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS:

Objetivo:

El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el **Contratista,** corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el **Contrato de Obra.**

Materiales:

El **Interventor** realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada por el **Contratista** cumple con los requerimientos contenidos en el **Contrato de Obra.**

Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos, acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el **Contratista.** En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el **Contratista** e **Interventoría,** primaran para efectos de la comprobación de las **Metas Físicas** y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta última.

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados (de existir) y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del **Proyecto** por parte del **Interventor,** éste deberá solicitar al **Contratista** los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el **Contrato de Obra,** o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Para adelantar dicha labor el **Interventor** deberá contar, entre otros y como mínimo, con los siguientes insumos:

- Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
- Realización y/o Revisión de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra.
- Visita de inspección a sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos fabricados fuera del área del proyecto.

Productos:

Los productos resultantes de este proceso, corresponderán a:

- Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoría.
- Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
- Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad, cuando sea necesario.
- Presentar informes de inspección a las instalaciones de fabricación
- Notificar al Contratista y a la Alcaldía respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos realizados.
- Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra
- Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

K. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo:

Verificar los procesos constructivos empleados por el **Contratista,** la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la **Programación de Obra y flujo de inversiones** y **Cronograma de Metas Físicas** entregados por el Contratista.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Reuniones semanales entre contratista e interventoría, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría interno de la SNR según resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021.

- Informes de Inspectoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoría.

- Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.

- Registro fotográfico y fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción del proyecto (antes - durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.

CLÁUSULA DÉCIMA: - OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA:
La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Aprobar la Garantía única del Contrato.
2. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
3. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.
4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
5. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor.
6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, por el Ordenador del Gasto exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
7. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.
8. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.
9. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.
10. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
12. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.
13. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.
14. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
15. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II.
16. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.
18. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar.
19. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.
20. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.
21. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.
22. Contratar un interventor para la vigilancia y verificación de la correcta ejecución del objeto del presente contrato
23. Las demás inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de Supervisión.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - SUPERVISION Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: A) SUPERVISOR: La supervisión, vigilancia en la ejecución y cumplimiento estricto del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Infraestructura de la SNR O quien haga sus veces o de quien designe el ordenador del gasto. **B) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 1).** Velar por

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

la correcta y oportuna ejecución del contrato. **2).** Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes de supervisión del contrato, así como actas y demás documentos que soporten la ejecución y seguimiento del contrato. **3).** Informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. **4).** Informar con la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, así como estado de las obligaciones económicas y del término de ejecución. **5).** Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecución del contrato. **6).** Verificar que el **CONTRATISTA** haya subido en la Plataforma Transaccional del SECOP II, todos los documentos requeridos para la legalización del contrato y los informes y soportes exigidos durante la ejecución del mismo. **7).** Allegar a la Dirección de Contratación original del acta de inicio dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación del acto administrativo de supervisión. **8)** Las demás que legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la **Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021**, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA**: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - CESIÓN:** Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia, al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PARÁGRAFO. -** Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes será la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecución del contrato, el Contratista preste sus servicios en otras partes del territorio nacional. **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: -EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y la **SUPERINTENDENCIA**, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogación diferente a los honorarios aquí pactados. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA:** El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal,

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: **A)** Estudios y documentos previos. **B)** Documento soportes del contrato. **C)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **D)** Registro Presupuestal. **E)** Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. **F)** Actas, informes y demás documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. **G)** Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. **H).** Modificaciones transaccionales que se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. **I).** Propuesta del oferente **SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS. CLÁUSULA VIGÉSIMA: - GARANTIAS:** Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

a) **De cumplimiento** cuyo valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).
b) **De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales** del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015)

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a publicar en la PLATAFORMA SECOP II el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados y notificar a la SNR de su publicación para su posterior aprobación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete a publicar en la PLATAFORMA SECOP II, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - PENAL PECUNIARIA: a.)** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a **LA SUPERINTENDENCIA** a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. **b.)** Igualmente, frente al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - MULTAS: a)**. con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. **b)**. La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. **c).** La imposición de multas no impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. **d).** El contratista autoriza a **la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar. **CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA TERCERA: - CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la póliza de garantía dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del **SECOP II** por la **SUPERINTENDENCIA. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.** El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del **SECOP II.** Para su ejecución requerirá: **1).** Expedición del Registro presupuestal; **2).** Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II. **3).** Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalización requerirá, **4).** Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes señalados.

Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda – Ordenador del Gasto.
Revisó y Aprobó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor de Despacho.
Revisó: Héctor Iván Suárez Betancur – Dirección de Contratación.
Proyectó: Daniel Palacios – Abogado de la Dirección de Contratación. Daniel Palacios

ACTA DE INICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1707 de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TOTALL INC SAS BIC
NIT: 901.620.351-9

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Oficinas de Instrumentos Públicos de Frontino Antioquia, Pereira Risaralda, Cali Valle del Cauca, Sevilla Valle del Cauca, EL Bordo Cauca, Istmina Choco.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $373.103.235.89
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 362623 del 13 de julio de 2023

El día 31 de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron **ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI** en su calidad de supervisor del contrato y **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** en su calidad de contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato de interventoría No. 1707 de 2023.**

Objeto: CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACION 1

Se firma en Bogotá D.C., para los fines pertinentes el día 31 de Julio de 2023.

Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Supervisor
Profesional Universitario
Grupo de Infraestructura

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Interventor
C.C. 79.553.539

Bogotá D.C, diciembre 21 de 2023

La suscrita Contadora de la empresa **TOTALL INC SAS BIC con NIT. 901.620.351-9**

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en los resultados de mi revisión, informo que la Compañía se encuentra debidamente afiliada a las entidades que administran los riesgos de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y que durante el periodo de seis meses, pagó cumplidamente los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal TOTALL INC SAS BIC


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.101.836

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8050610393E9E7760E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO							X											230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(5)**																						$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$63,500		$0	$0		$2,846,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,813,600	$11,100	$0	$1,824,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$7,300	$0	$1,212,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$2,000	$0	$322,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$1,800	$0	$289,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$63,500	$400	$0	$63,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$63,500	$400	$0	$63,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$484,800	$3,100	$0	$487,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$2,000	$0	$322,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$500	$0	$72,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**5**	**$2,846,700**	**$17,500**	**$0**	**$2,864,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																														
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Total			**Afiliados(5)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$465,200	$500	$0	$465,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$465,200	$500	$0	$465,700
TOTAL				**5**	**$465,200**	**$500**	**$0**	**$465,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649890	3	CONSORCIO TIG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	228499304	9457375884	E	2023/10/23	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,891,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,528,000	$0	$0	$2,528,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$864,000	$0	$0	$864,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$632,000	$0	$0	$632,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$416,000	$0	$0	$416,000
TOTAL				**7**	**$4,891,800**	**$0**	**$0**	**$4,891,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																			0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT	X																	230201	6	$300,000	$48,000	EPS005	6	$300,000	$12,000	CCF22	6	$300,000	$12,000	14-4	6	$300,000	0.522%	$1,600	6	$0	$0	Si	$73,600
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA	X																	231001	25	$1,250,000	$200,000	EPS017	25	$1,250,000	$50,000	CCF22	25	$1,250,000	$50,000	14-4	25	$1,250,000	0.522%	$6,600	25	$0	$0	Si	$306,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA	X																	230301	10	$666,667	$106,700	EPS018	10	$666,667	$26,700	CCF22	10	$666,667	$26,700	14-4	10	$666,667	6.960%	$46,500	10	$0	$0	Si	$206,600
5	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO	X																	231001	5	$391,667	$62,700	EPS002	5	$391,667	$15,700	CCF22	5	$391,667	$15,700	14-4	5	$391,667	6.960%	$27,300	5	$0	$0	Si	$121,400
6	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total			**Afiliados(6)**																				$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$865,400	$0	$0	$865,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$262,700	$0	$0	$262,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$554,700	$0	$0	$554,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$48,000	$0	$0	$48,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$283,000	$0	$0	$283,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$283,000	$0	$0	$283,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$262,800	$0	$0	$262,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$50,000	$0	$0	$50,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$26,700	$0	$0	$26,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,700	$0	$0	$15,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$12,000	$0	$0	$12,000
TOTAL				**6**	**$1,674,000**	**$0**	**$0**	**$1,674,000**

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 07:13:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8909576336

Fecha limite de pago: 2023-12-20

GUARDADA 04/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMENQUE				
Documento	CC11807075	**Dirección**	CR 49 # 25 56		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2692788		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11807075	GUERRERO PALOMEQUE DAVID ANTONIO	59	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 7.100	$ 343.800

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																								$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT		X															X		23020 1	5	$250,000	$40,000	EPS005	5	$250,000	$10,000	CCF22	5	$272,917	$11,000	14-4	5	$250,000	0.522%	$1,400	5	$0	$0	Si	$62,400
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
4	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO	X																		23030 1	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$52,800	CCF22	22	$1,320,000	$52,800	14-4	22	$1,320,000	6.960%	$91,900	22	$0	$0	Si	$408,700
5	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	72261222	FERRIGNO RIVAS MAURY JAVIER	X	X															X		23100 1	9	$750,000	$120,000	EPS037	9	$750,000	$30,000	CCF22	9	$781,250	$31,300	14-4	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$233,500
7	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	X																		25-14	14	$793,334	$127,000	EPS037	14	$793,334	$31,800	CCF22	14	$793,334	$31,800	14-4	14	$793,334	6.960%	$55,300	14	$0	$0	Si	$245,900
8	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
9	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																			23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
10	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA	X																		23020 1	25	$1,333,334	$213,400	EPS017	25	$1,333,334	$53,400	CCF22	25	$1,333,334	$53,400	14-4	25	$1,333,334	6.960%	$92,900	25	$0	$0	Si	$413,100
Total			**Afiliados(10)**																					$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,095,600	$0	$0	$2,095,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$736,000	$0	$0	$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$127,000	$0	$0	$127,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$979,200	$0	$0	$979,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$253,400	$0	$0	$253,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$805,400	$0	$0	$805,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$805,400	$0	$0	$805,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$572,700	$0	$0	$572,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$572,700	$0	$0	$572,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$570,400	$0	$0	$570,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$113,400	$0	$0	$113,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$61,800	$0	$0	$61,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$0	$0	$94,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$62,800	$0	$0	$62,800
TOTAL				**10**	**$4,044,100**	**$0**	**$0**	**$4,044,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS		R																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
6	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
7	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
8	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	25	$966,667	6.960%	$67,300	0	$0	$0	No	$67,300
Total			**Afiliados(8)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$591,900	$0	$0	$591,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$591,900	$0	$0	$591,900
TOTAL				8	$591,900	$0	$0	$591,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
6	CC	1070821027	CORREA IZQUIERDO MANUEL VICENTE	X																	23020 1	20	$773,334	$123,800	EPSIC3	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
7	CC	1123314923	GERMAN PATIÑO JULY VANESSA	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
8	CC	1006846598	GONZALEZ GASCA JESUS ALEXIS	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
9	CC	5250677	PABON DIAZ ALCIDES MILCIADES	X																	23030 1	20	$773,334	$123,800	ESSC18	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
10	CC	1121712338	SUAREZ GASCA EVER HERNAN	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
Total			**Afiliados(10)**																				$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,469,800	$0	$0	$2,469,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$0	$0	$1,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$852,400	$0	$0	$852,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$411,800	$0	$0	$411,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$349,200	$0	$0	$349,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$349,200	$0	$0	$349,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$649,100	$0	$0	$649,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$31,000	$0	$0	$31,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$133,300	$0	$0	$133,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**10**	**$4,117,200**	**$0**	**$0**	**$4,117,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
3	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO																			23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
6	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
7	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES		X																X	23030 1	21	$1,960,000	$313,600	EPS008	21	$1,960,000	$78,400	CCF22	21	$2,391,667	$95,700	14-4	21	$1,960,000	6.960%	$136,500	21	$0	$0	Si	$624,200
8	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA		X																X	23020 1	15	$800,000	$128,000	EPS017	15	$800,000	$32,000	CCF22	15	$888,889	$35,600	14-4	15	$800,000	6.960%	$55,700	15	$0	$0	Si	$251,300
Total			**Afiliados(8)**																					$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,937,600	$5,700	$0	$1,943,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,000	$1,800	$0	$617,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,000	$800	$0	$272,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$921,600	$2,700	$0	$924,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$128,000	$400	$0	$128,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				8	$530,800	$1,900	$0	$532,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$78,400	$300	$0	$78,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,000	$300	$0	$92,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$68,000	$200	$0	$68,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$300	$0	$80,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$300	$0	$94,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$72,000	$300	$0	$72,300
TOTAL				**8**	**$3,772,800**	**$11,500**	**$0**	**$3,784,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
5	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total			**Afiliados(7)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
TOTAL				**7**	**$610,100**	**$1,800**	**$0**	**$611,900**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 2

23 de noviembre de 2023

LUGAR DE EJECUCION: FRONTINIO -ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA N°	**No. 1674 DE 2023**	**VALOR:**	**$2,089,847,608.73**
		ADICION	**$0.00**
		VALOR TOTAL	**$2,089,847,608.73**
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**	**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	**TOTALLINC**		

A LOS 31 DIAS DE JULIO DEL 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR DE OBRAY FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ EN CALIDAD DE CONTRATISTA DE OBRA , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			REAL		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO INCREMENTADO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANT	VALOR TOTAL	
1.00	**PRELIMINARES**				**$ 10,573,962.03**				**$ 60,318.02**	**$ 4,631,753.70**	**$ 0.00**		**$ 6,002,526.34**	
1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	381.94	$ 6,716.92	$ 2,565,460.42	0.00	207.41		$ 0.00	$ 1,393,156.38	$ 0.00	174.53	$ 1,172,304.05	
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	m²	3.43	$ 9,238.46	$ 31,687.92	0.00	3.43		$ 0.00	$ 31,687.92	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	28.00	$ 17,401.86	$ 487,252.08	1.00	0.00		$ 17,401.86	$ 0.00	$ 0.00	29.00	$ 504,653.94	
1.11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	330.00	$ 10,793.72	$ 3,561,927.60	0.00	123.91		$ 0.00	$ 1,337,449.85	$ 0.00	206.09	$ 2,224,477.75	
1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	28.00	$ 8,067.36	$ 225,886.08	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	28.00	$ 225,886.08	
1.21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	4.00	$ 21,458.08	$ 85,832.32	2.00	0.00		$ 42,916.16	$ 0.00	$ 0.00	6.00	$ 128,748.48	
1.22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	4.00	$ 19,965.54	$ 79,862.16	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4.00	$ 79,862.16	
1.38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	1.50	$ 34,758.64	$ 52,137.96	0.00	1.50		$ 0.00	$ 52,137.96	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
1.39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	2.60	$ 42,677.04	$ 110,960.30	0.00	2.60		$ 0.00	$ 110,960.30	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
1.45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	1.60	$ 18,316.20	$ 29,305.92	0.00	1.60		$ 0.00	$ 29,305.92	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
1.52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	2.00	$ 84,822.92	$ 169,645.84	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 169,645.84	
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1.00	$ 431,350.92	$ 431,350.92	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 431,350.92	
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	30.00	$ 26,919.62	$ 807,588.60	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	30.00	$ 807,588.60	
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	15.00	$ 129,004.26	$ 1,935,063.90	0.00	13.00		$ 0.00	$ 1,677,055.38	$ 0.00	2.00	$ 258,008.52	
2.00	**CARPINTERÍA EN MADERA**				**$ 2,735,139.82**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**$ 2,735,139.82**	
2.13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	5.00	$ 441,423.36	$ 2,207,116.80	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	5.00	$ 2,207,116.80	
2.14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	1.00	$ 528,023.02	$ 528,023.02	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 528,023.02	
4.00	**CIELORRASOS**				**$ 50,856,312.08**				**$ 3.00**	**$ 27,301,243.76**	**$ 0.00**		**$ 23,555,068.32**	
4.01	CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM	m²	16.00	$ 315,111.16	$ 5,041,778.56	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	16.00	$ 5,041,778.56	
4.02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	391.00	$ 117,172.72	$ 45,814,533.52	0.00	233.00		$ 0.00	$ 27,301,243.76	$ 0.00	158.00	$ 18,513,289.76	
5.00	**CONCRETO Y MORTEROS**				**$ 19,290,795.30**				**$ 1,132,249.15**	**$ 3,309,828.48**	**$ 0.00**		**$ 17,113,215.97**	
5.02	PAÑETE MUROS 1:3	m²	525.00	$ 34,477.38	$ 18,100,624.50	0.00	96.00		$ 0.00	$ 3,309,828.48	$ 0.00	429.00	$ 14,790,796.02	

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			REAL		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO INCREMENTADO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANT	VALOR TOTAL	
5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	30.00	$ 39,672.36	$ 1,190,170.80	28.54	0.00		$ 1,132,249.15	$ 0.00	$ 0.00	58.54	$ 2,322,419.95	
6.00	**CUBIERTAS**				**$ 44,043,785.09**				**$ 11,281,720.02**	**$ 32,900,466.07**	**$ 0.00**		**$ 22,425,039.04**	
6.02	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	m	28.00	$ 59,118.50	$ 1,655,318.00	0.00	28.00		$ 0.00	$ 1,655,318.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
6.06	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	330.00	$ 39,027.52	$ 12,879,081.60	0.00	330.00		$ 0.00	$ 12,879,081.60	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
6.09	CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL	m	21.00	$ 42,871.08	$ 900,292.68	0.00	21.00		$ 0.00	$ 900,292.68	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
6.14	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE BARRO NATURAL	m	200.00	$ 86,829.96	$ 17,365,992.00	0.00	200.00		$ 0.00	$ 17,365,992.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
6.16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	120.00	$ 55,176.94	$ 6,621,232.80	198.00	0.00		$ 10,925,034.12	$ 0.00	$ 0.00	318.00	$ 17,546,266.92	
6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	6.00	$ 48,633.48	$ 291,800.88	3.00	0.00		$ 145,900.44	$ 0.00	$ 0.00	9.00	$ 437,701.32	
6.19	CANAL EN LÁMINA LIMAHOYA	m	11.35	$ 83,135.36	$ 943,586.34	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	11.35	$ 943,586.34	
6.20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	11.23	$ 75,023.90	$ 842,518.40	0.00	1.33		$ 0.00	$ 99,781.79	$ 0.00	9.90	$ 742,736.61	
6.21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	70.00	$ 36,342.32	$ 2,543,962.40	5.80	0.00		$ 210,785.46	$ 0.00	$ 0.00	75.80	$ 2,754,747.86	
7.00	**ENCHAPE MUROS**				**$ 8,245,935.60**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**$ 244,946.10**	
7.01	ESTUCO EXTERIOR	m²	15.00	$ 16,329.74	$ 244,946.10	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	15.00	$ 244,946.10	
7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	525.00	$ 15,239.98	$ 8,000,989.50	0.00	96.00		$ 0.00	$ 1,463,038.08	$ 0.00	429.00	$ 6,537,951.42	
10.00	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**				**$ 767,869.20**				**$ 999,547.25**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**$ 1,767,416.45**	
10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	30.00	$ 19,873.42	$ 596,202.60	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	30.00	$ 596,202.60	
10.05	PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]	m²	10.00	$ 17,166.66	$ 171,666.60	58.23	0.00		$ 999,547.25	$ 0.00	$ 0.00	68.23	$ 1,171,213.85	
11.00	**IMPERMEABILIZACIÓN**				**$ 1,831,173.12**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**$ 1,831,173.12**	
11.04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	48.00	$ 38,149.44	$ 1,831,173.12	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	48.00	$ 1,831,173.12	
13.00	**PINTURAS**				**$ 12,325,362.00**				**$ 0.00**	**$ 2,253,780.48**	**$ 0.00**		**$ 10,071,581.52**	
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	525.00	$ 23,476.88	$ 12,325,362.00	0.00	96.00		$ 0.00	$ 2,253,780.48	$ 0.00	429.00	$ 10,071,581.52	
15.00	**RED ELÉCTRICA**				**$ 8,105,774.04**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**$ 8,105,774.04**	
15.10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	44.00	$ 168,216.02	$ 7,401,504.88	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	44.00	$ 7,401,504.88	
15.13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	2.00	$ 85,400.14	$ 170,800.28	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 170,800.28	
15.29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	un	2.00	$ 184,109.66	$ 368,219.32	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 368,219.32	
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1.00	$ 165,249.56	$ 165,249.56	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 165,249.56	
16.00	**RED HIDRÁULICA**				**$ 1,546,672.26**				**$ 0.00**	**$ 96,282.06**	**$ 0.00**		**$ 1,450,390.20**	
16.13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3.00	$ 130,869.20	$ 392,607.60	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3.00	$ 392,607.60	
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1.00	$ 96,282.06	$ 96,282.06	0.00	1.00		$ 0.00	$ 96,282.06	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	3.00	$ 281,763.72	$ 845,291.16	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3.00	$ 845,291.16	
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	3.00	$ 70,830.48	$ 212,491.44	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3.00	$ 212,491.44	
17.00	**RED SANITARIA**				**$ 596,555.40**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**$ 596,555.40**	
17.19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	10.00	$ 17,440.08	$ 174,400.80	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	10.00	$ 174,400.80	
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	15.00	$ 28,143.64	$ 422,154.60	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	15.00	$ 422,154.60	
19.00	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**				**$ 3,008,701.92**				**$ 306,050.08**	**$ 1,997,620.24**	**$ 0.00**		**$ 1,317,131.76**	
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1.00	$ 437,013.36	$ 437,013.36	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 437,013.36	
19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1.00	$ 1,475,861.38	$ 1,475,861.38	0.00	1.00		$ 0.00	$ 1,475,861.38	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20.00	$ 16,324.84	$ 326,496.80	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	20.00	$ 326,496.80	
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	2.00	$ 38,256.26	$ 76,512.52	8.00	0.00		$ 306,050.08	$ 0.00	$ 0.00	10.00	$ 382,562.60	
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1.00	$ 171,059.00	$ 171,059.00	0.00	0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 171,059.00	
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1.00	$ 521,758.86	$ 521,758.86	0.00	1.00		$ 0.00	$ 521,758.86	$ 0.00	0.00	$ 0.00	No aplica, se verrifico en sitio

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			REAL		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO INCREMENTADO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANT	VALOR TOTAL	
20.00	**ADICIONALES**				**$ 251,259.26**				**$ 1,758,814.82**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**$ 2,010,074.08**	
20.20	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	1.00	$ 251,259.26	$ 251,259.26	7.00	0.00		$ 1,758,814.82	$ 0.00	$ 0.00	8.00	$ 2,010,074.08	
21.00	**NO PREVISTOS**				**$ 0.00**				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 35,581,946.72**		**$ 35,581,946.72**	
NP-01	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	M2		$ 129,741.48				214.93			$ 27,885,337.07	214.93	$ 27,885,337.07	Para evitar filtraciones a las oficinas
NP-02	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	UN		$ 1,484,045.95				1.00			$ 1,484,045.95	1.00	$ 1,484,045.95	Para almacenamiento de agua potable
NP-03	CABALLETE UPVC E=2,2 MM Caballete Forte Blanco 0.6X0.94mt 2mm UPVC	M		$ 117,759.90				21.00			$ 2,472,957.90	21.00	$ 2,472,957.90	Para acabado de cubierta
NP-04	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M		$ 47,184.85				0.00			$ 0.00	0.00	$ 0.00	Para desague de cubierta
NP-05	ESCALERA TIPO GATO	UN		$ 140,776.28				3.30			$ 464,561.74	3.30	$ 464,561.74	Para accesibilidad al tanque
NP-06	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN		$ 1,531,065.43				1.00			$ 1,531,065.43	1.00	$ 1,531,065.43	Letrero institucional
NP-07	POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2		$ 103,808.25				16.80			$ 1,743,978.63	16.80	$ 1,743,978.63	Para iluminacion natural
NP-08	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERÍA CONUDUIT EMT 1 1/2"	M		$ 47,834.68				40.00			$ 1,913,387.28	40.00	$ 1,913,387.28	Necesario para las instalaciones eléctricas
NP-09	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUERVERÍA CONUDUIT EMT 1"	M		$ 43,319.05				20.00			$ 866,380.94	20.00	$ 866,380.94	Necesario para las instalaciones eléctricas
NP-10	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	UND		$ 37,437.40				47.00			$ 1,759,557.99	47.00	$ 1,759,557.99	Salidas para iluminacion del proyecto
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M		$ 27,537.67				150.00			$ 4,130,650.44	150.00	$ 4,130,650.44	Acometida sustituida por deterioro de las existentes
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X4AWG + 4AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M		$ 58,373.68				145.00			$ 8,464,184.31	145.00	$ 8,464,184.31	Acometida sustituida por deterioro de las existentes
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 14AWG.	M		$ 8,935.23				70.00			$ 625,465.99	70.00	$ 625,465.99	Para puesta a tierra del proyecto
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 12AWG.	M		$ 9,941.69				105.00			$ 1,043,877.28	25.00	$ 248,542.21	Para puesta a tierra del proyecto
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 10AWG.	M		$ 11,400.03				160.00			$ 1,824,004.54	160.00	$ 1,824,004.54	Acometida para aires acondicionados
NP-16	SALIDA TOMACORRIENTE	UND		$ 64,856.35				4.00			$ 259,425.40	4.00	$ 259,425.40	Salidas necesrias para los puestos de trabajo
NP-17	PUNTOS AIRES ACONDIONADOS DUCTERIA EMT 1"	M		$ 69,205.43				35.00			$ 2,422,190.17	35.00	$ 2,422,190.17	Tubería para las acometidas eléctricas de los aires
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND		$ 60,850.16				3.00			$ 182,550.48	3.00	$ 182,550.48	Breaker necesarios para el proyecto
NP-19	MANTENIMIENTO SISITEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE Y CONECTIVIDAD	UND		$ 137,027.05				1.00			$ 137,027.05	1.00	$ 137,027.05	Revisión y puesta en funcionamiento
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 164,179,297.12**				**$ 15,538,702.34**	**$ 73,954,012.87**	**$ 59,210,648.60**		**$ 164,179,297.12**	
	ADMINISTRACIÓN	**%**	**23.00%**		$ 37,761,238.00				$ 3,573,901.54	$ 17,009,422.96	$ 13,618,449.18		$ 37,761,238.00	
	IMPREVISTOS	**%**	**1.00%**		$ 1,641,793.00				$ 155,387.02	$ 739,540.13	$ 592,106.49		$ 1,641,793.00	
	UTILIDAD	**%**	**5.00%**		$ 8,208,965.00				$ 776,935.12	$ 3,697,700.64	$ 2,960,532.43		$ 8,208,965.00	
	IVA SOBRE UTILIDAD	**%**	**19.00%**		$ 1,559,703.00				$ 147,617.67	$ 702,563.12	$ 562,501.16		$ 1,559,703.00	
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 213,350,996.12**				**$ 20,192,543.69**	**$ 96,103,239.73**	**$ 76,944,237.86**		**$ 213,350,996.12**	
	VALOR TOTAL OBRA			**$**	**213,350,996.12**						**$ 1.033.541.83**		**$ 213.350.996.12**	
	SALDO POR AJUSTAR												**$ 0.00**	

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRATISTA

ARQ.FERNANDO JIMENEZ
INTERVENTORIA (SI APLICA)

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. SUPERVISION

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 11
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Versión: 01
	FORMATO: JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

JUSTIFICACIÓN ACTA No.1
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
LUGAR DE EJECUCION: FRONTINIO

CONTRATO DE OBRA N°	1674 DE 2023	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$2,089,847,608.73
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**OBJETO**: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRPACION N°1	
INTERVENTORIA:	TOTALLINC SAS		

A LOS 23 DIAS DE NOVIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR DE OBRAY FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ EN CALIDAD DE CONTRATISTA DE OBRA , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
1.00	**PRELIMINARES**					
1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	381.94	174.53	45.70%	Menor cantidad confirmada en sitio
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	m²	3.43			No aplica
1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	28.00	29.00	103.57%	Mayor cantidad instalada en sitio
1.11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	330.00	211.09	63.97%	Menor cantidad confirmada en sitio
1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	28.00	28.00	100.00%	
1.21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	4.00	6.00	150.00%	Mayor cantidad instalada en sitio
1.22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	4.00	4.00	100.00%	
1.38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	1.50			No aplica
1.39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	2.60			No aplica
1.45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	1.60			No aplica
1.52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	2.00	2.00	100.00%	
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%	
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	30.00	30.00	100.00%	
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	un/día	15.00	2.00	13.33%	
2.00	**CARPINTERÍA EN MADERA**					
2.13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	5.00	4.00	80.00%	Manro cantidad por medidas
2.14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	1.00	2.00	200.00%	Mayor cantidad necesaria en sitio
4.00	**CIELORRASOS**					
4.01	CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM	m²	16.00	16.00	100.00%	
4.02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	391.00	158.00	40.41%	Menor cantidad confirmada en sitio
5.00	**CONCRETO Y MORTEROS**					
5.02	PAÑETE MUROS 1:3	m²	525.00	429.00	81.71%	Menor cantidad confirmada en sitio
5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	30.00	58.54	195.13%	Mayor cantidad instalada en sitio
6.00	**CUBIERTAS**					
6.02	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	m	28.00			No aplica
6.06	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	330.00			No aplica
6.09	CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL	m	21.00			No aplica
6.14	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE BARRO NATURAL	m	200.00			No aplica
6.16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	120.00	318.00	265.00%	Mayor cantidad instalada en sitio
6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	6.00	9.00	150.00%	Mayor cantidad instalada en sitio
6.19	CANAL EN LÁMINA LIMAHOYA	m	11.35	12.00	105.73%	Mayor cantidad confirmada en sitio
6.20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	11.23	9.90	88.16%	Menor cantidad confirmada en sitio
6.21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	70.00	75.80	108.29%	Mayor cantidad instalada en sitio
7.00	**ENCHAPE MUROS**					
7.01	ESTUCO EXTERIOR	m²	15.00	15.00	100.00%	
7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	525.00	429.00	81.71%	Menor cantidad confirmada en sitio
10.00	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					
10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	30.00	30.00	100.00%	
10.05	PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]	m²	10.00	72.05	720.49%	Mayor cantidad instalada en sitio
11.00	**IMPERMEABILIZACIÓN**					
11.04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	48.00	48.00	100.00%	
13.00	**PINTURAS**					
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	525.00	429.00	81.71%	Menor cantidad confirmada en sitio
15.00	**RED ELÉCTRICA**					

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
15.10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	44.00	44.00	100.00%	
15.13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	2.00	2.00	100.00%	
15.29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	un	2.00	2.00	100.00%	
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1.00	1.00	100.00%	
16.00	**RED HIDRÁULICA**					
16.13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3.00	3.00	100.00%	
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1.00			No aplica
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	3.00	3.00	100.00%	
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	3.00	3.00	100.00%	
17.00	**RED SANITARIA**					
17.19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	10.00	10.00	100.00%	
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	15.00	15.00	100.00%	
19.00	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%	
19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1.00			No aplica
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20.00	20.00	100.00%	
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	2.00	10.00	500.00%	Mayor cantidad instalada en sitio
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1.00	1.00	100.00%	
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1.00			No aplica
20.00	**ADICIONALES**					
20.20	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	1.00	8.00	800.00%	Mayor cantidad instalada en sitio
21.00	**NO PREVISTOS**					
NP-01	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	M2		214.93		Para evitar filtraciones a las oficinas
NP-02	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	UN		1.00		Para almacenamiento de agua potable
NP-03	CABALLETE UPVC E=2,2 MM Caballete Forte Blanco 0.6X0.94mt 2mm UPVC	M		21.00		Para acabado de cubierta
NP-04	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M				Para desague de cubierta
NP-05	ESCALERA TIPO GATO	UN		3.30		Para accesibilidad al tanque
NP-06	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN		1.00		Letrero institucional
NP-07	POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2		16.80		Para iluminacion natural
NP-08	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERÍA CONUDUIT EMT 1 1/2"	M		40.00		Necesario para las instalaciones eléctricas
NP-09	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUERVERÍA CONUDUIT EMT 1"	M		20.00		Necesario para las instalaciones eléctricas
NP-10	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	UND		47.00		Salidas para iluminacion del proyecto
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M		140.55		Acometida sustituida por deterioro de las existentes
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X4AWG + 4AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M		145.00		Acometida sustituida por deterioro de las existentes
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 14AWG.	M		70.00		Para puesta a tierra del proyecto
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 12AWG.	M		25.00		Para puesta a tierra del proyecto
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 10AWG.	M		160.00		Acometida para aires acondicionados
NP-16	SALIDA TOMACORRIENTE	UND		4.00		Salidas necesrias para los puestos de trabajo
NP-17	PUNTOS AIRES ACONDIONADOS DUCTERIA EMT 1"	M		35.00		Tubería para las acometidas eléctricas de los aires
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada	UND		3.00		Breaker necesarios para el proyecto
NP-19	MANTENIMIENTO SISITEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE Y CONECTIVIDAD	UND		1.00		Revisión y puesta en funcionamiento

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA. SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

ARQ.FERNANDO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA: TOTALLINC

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR/ FUNCIONARIO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674 CONTRATISTA soluciones integrales union sas


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA totall inc sas bic SUPERVISOR SNR alfonzo rene sanchez

ITEM: *1.04* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
desmonte cieloraso	*oficina registrador*		*4.950*	*2.83*						*14.01*
	baño registrador		*1.95*	*1.69*						*3.30*
	atencion al publico		*7.28*	*3.70*						*26.94*
	cuarto locker		*1.95*	*1.42*						*2.77*
	oficina funcionarios		*7.28*	*2.42*						*17.62*
	corredor patio luminacion		*2.96*	*1.30*						*3.85*
	corredor patio luminacion		*7.28*	*1.15*						*8.37*
	corredor patio luminacion		*2.96*	*1.30*						*3.85*
	archivo principal		*7.20*	*2.83*						*20.38*
	corredor baños		*7.20*	*1.75*						*12.60*
	baño funcionarios 1		*1.25*	*1.80*						*2.25*
	baño funcionarios 2		*1.25*	*1.80*						*2.25*
	cocina		*2.49*	*1.80*						*4.48*
	cuarto aseo		*1.44*	*1.80*						*2.59*
	archivo auxiliar		*3.44*	*6.70*						*23.05*
	cuarto insumo de aseo		*4.10*	*2.45*						*10.05*
	cuarto del servidor		*4.10*	*2.45*						*10.05*
	corredor patio		*4.10*	*1.50*						*6.15*
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*174.53*

CROQUIS

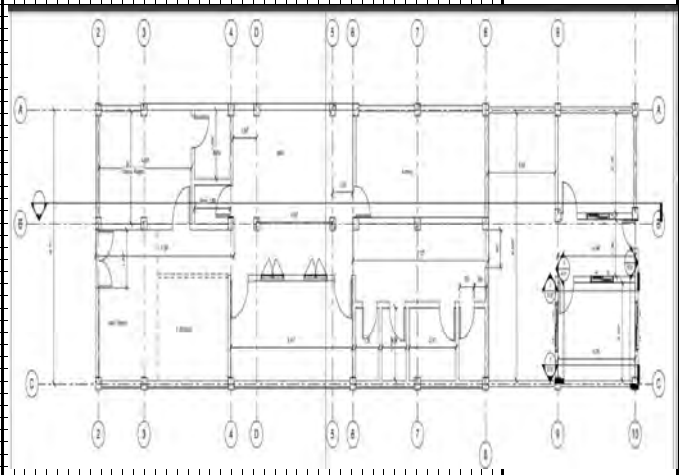

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID A GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674 **CONTRATISTA** soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA totall inc sas bic **SUPERVISOR SNR** alfonzo rene sanchez

ITEM: *1.1* **UNIDAD** *und*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
desmonte lamaparas luminarias	*oficina registrador*	*4.00*								*4.00*
	baño registrador									-
	atencion al publico	*4.00*								*4.00*
	cuarto locker	*1.00*								*1.00*
	oficina funcionarios	*4.00*								*4.00*
	corredor patio luminacion	*1.00*								*1.00*
	corredor patio luminacion	*1.00*								*1.00*
	corredor patio luminacion	*1.00*								*1.00*
	archivo principal	*2.00*								*2.00*
	corredor baños	*2.00*								*2.00*
	baño funcionarios 1									-
	baño funcionarios 2									-
	cocina									-
	cuarto aseo									-
	archivo auxiliar	*4.00*								*4.00*
	cuarto insumo de aseo	*2.00*								*2.00*
	cuarto del servidor	*2.00*								*2.00*
	corredor patio	*1.00*								*1.00*
										-
										-
										-
									TOTAL	***29.00***

CROQUIS

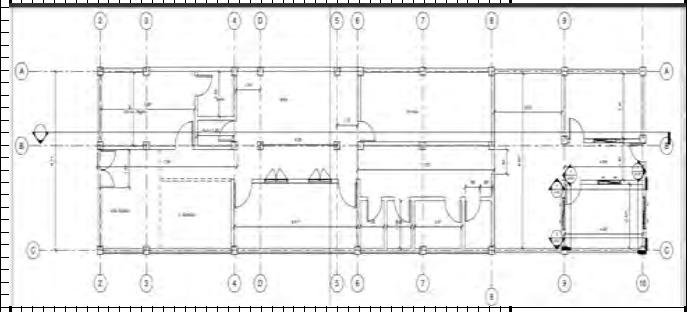

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	*1.11*	UNIDAD	*m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
desmonte cubierta	*cubierta upvc atencion al publico archivos y cuarto insumos de aseo servidor*		*26.0*	*6.95*						*180.70*
	oficina funcionarios		*4.10*	*3.90*						*15.99*
	cuarto planta electrica		*3.24*	*2.90*						*9.40*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										TOTAL *211.09*

CROQUIS

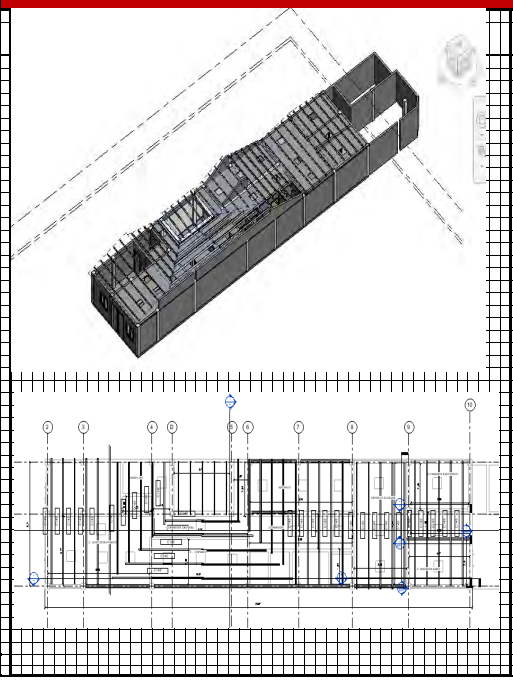

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	1.17	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
desmonte impermeabilicacion manto asfaltico			23.809	1.18						28.00
										-
										-
										-
									TOTAL	28.00

CROQUIS

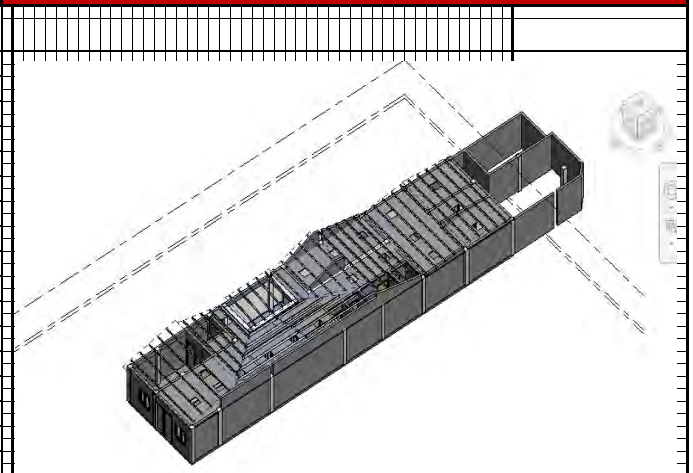

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	1.21	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
desmonte puerta en madera	oficna funcionario	1.00								1.00
	cocineta	1.00								1.00
	cuarto de aseo	1.00								1.00
	cuarto de insumos	1.00								1.00
	baños funcionarios	2.00								2.00
										-
										-
										-
						TOTAL				6.00

CROQUIS

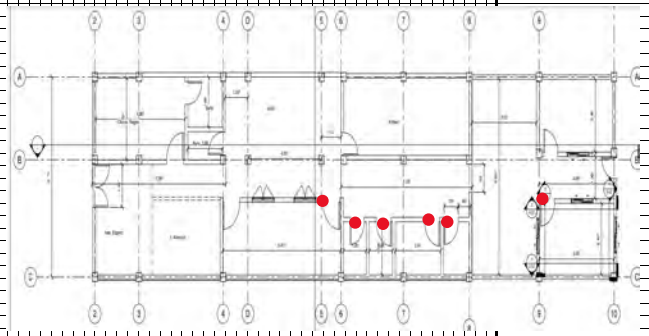

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	1.57	UNIDAD	glb

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
proteccion mobiliario	orip	1.00								1.00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	1.00

CROQUIS

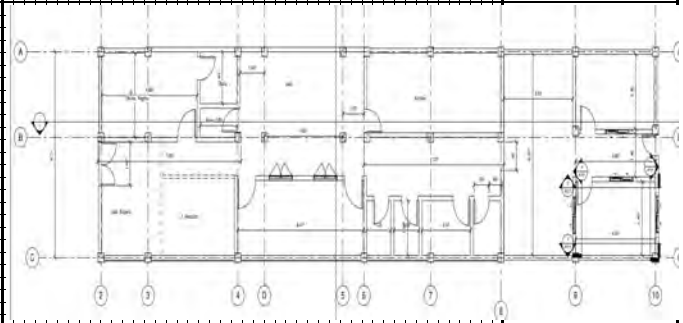

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	1.67	UNIDAD	m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
disposición final residuos construccion	*orip*	*30.00*								*30.00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										TOTAL **30.00**

CROQUIS

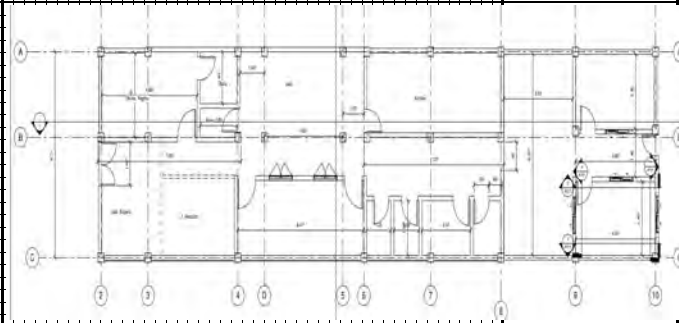

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	2.13	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
puertas de madera	*baño funcionarios*	*2.00*								*2.00*
	cocineta	*1.00*								*1.00*
	cuarto de aseo	*1.00*								*1.00*
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*4.00*

CROQUIS

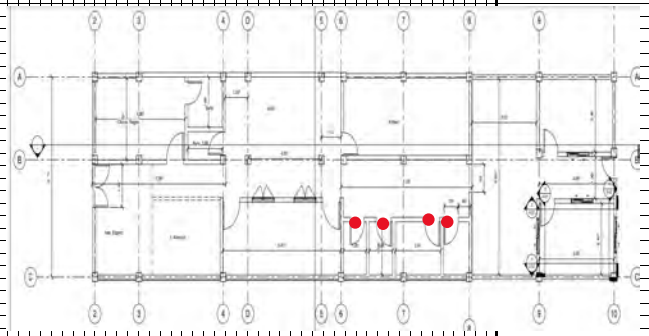

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE


CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	*2.14*	UNIDAD	*und*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
puertas de madera	*oficina funcionario*	*1.00*								*1.00*
	cuarto de insumo	*1.00*								*1.00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
								TOTAL		*2.00*

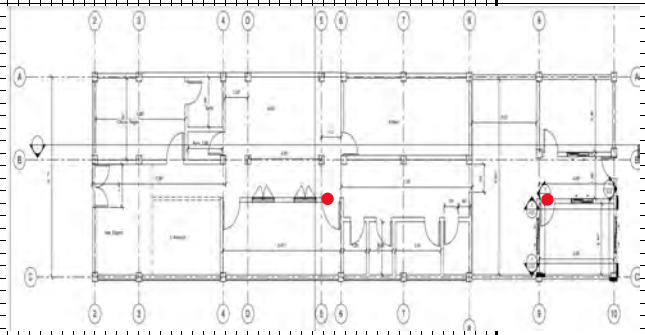

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

David Antonio Guerrero Palomeque

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674 **CONTRATISTA** soluciones integrales union sas

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA totall inc sas bic **SUPERVISOR SNR** alfonzo rene sanchez

ITEM: *4.01* **UNIDAD** *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
desmonte cieloraso	***baño registrador***		*1.95*	*1.69*						*3.30*
	baño funcionarios 1		*1.25*	*1.80*						*2.25*
	baño funcionarios 2		*1.25*	*1.80*						*2.25*
	cocina		*2.49*	*1.80*						*4.48*
	cuarto aseo		*1.44*	*1.80*						*2.59*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas


OBJETO: OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
pañete muros 1:3	*atencion al publico*	*19.66*	*7.28*		*2.70*					*19.66*
		19.66	*7.28*		*2.70*		*0.88*		*2.00*	*17.90*
		9.59	*3.55*		*2.70*		*0.97*		*2.00*	*7.65*
		9.59	*3.55*		*2.70*		*1.20*		*1.50*	*7.75*
		-					*1.30*		*2.20*	*-2.86*
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										
									TOTAL	*50.12*

CROQUIS

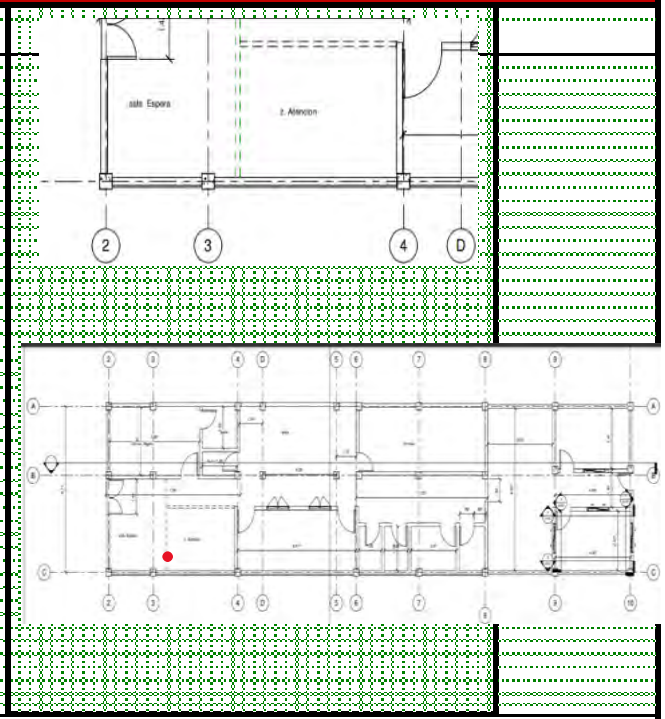

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
pañete muros 1:3	patio luminacion	10.67	3.95		2.70					10.67
		-								-
		-					0.70		2.00	-1.40
		-					0.90		2.00	-1.80
		19.66	7.25		2.70		0.85		2.00	17.90
		-					1.20		1.50	-1.80
		-					1.20		1.50	-1.80
		-					0.88		2.00	-1.76
		10.67	3.95		2.70		0.97		2.00	8.73
		-					0.88		2.00	-1.76
		-					1.20		1.50	-1.80
		19.66	7.25		2.70					19.66
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										50.12
									TOTAL	94.94

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada, o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria

CONTRATISTA

David Antonio Guerrero Palomeque

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
pañete muros 1:3	cuarto locker	3.83	1.42		2.70					3.83
		5.27	1.95		2.70					5.27
		5.27	1.95		2.70					5.27
		3.83	1.42		2.70		0.70		2.00	2.43
		-					0.60		1.20	-0.72
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										94.94
									TOTAL	111.02

CROQUIS

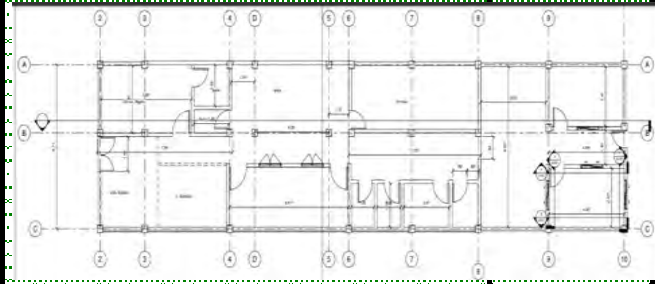

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO

INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
pañete muros 1:3	oficina funcionarios	19.66	7.28		2.70					19.66	
		6.62	2.45		2.70					6.62	
		6.62	2.45		2.70					6.62	
		19.66	7.28		2.70		0.88		2.00	17.90	
		-					0.88		2.00	-1.76	
		-					1.20		1.50	-1.80	
		-					1.20		1.50	-1.80	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
		-								-	
ACUMULADO ANTERIOR										111.02	
									TOTAL	156.44	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
pañete muros 1:3	*archivo principal*	*19.44*	*7.20*		*2.70*					*19.44*
		19.44	*7.20*		*2.70*					*19.44*
		7.64	*2.83*		*2.70*		*0.80*		*2.00*	*6.04*
		-					*1.20*		*1.53*	*-1.84*
		7.64	*2.83*		*2.70*		*1.20*		*1.35*	*6.02*
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										*156.44*
									TOTAL	**205.55**

CROQUIS

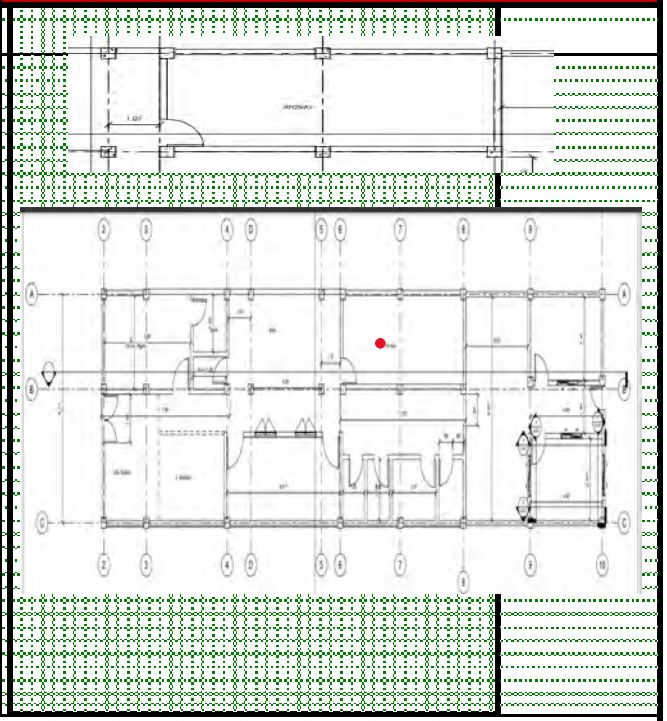

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
pañete muros 1:3	*corredor baños*	*19.44*	*7.20*		*2.70*					*19.44*
		19.44	*7.20*		*2.70*		*0.70*		*2.00*	*18.04*
		-					*0.70*		*2.00*	*-1.40*
		-					*0.70*		*1.20*	*-0.84*
		-					*0.80*		*2.00*	*-1.60*
		-					*0.70*		*2.00*	*-1.40*
		4.73	*1.75*		*2.70*		*0.97*		*2.00*	*2.75*
		4.73	*1.75*		*2.70*		*0.97*		*2.00*	*2.75*
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										*205.55*
									TOTAL	*243.36*

CROQUIS

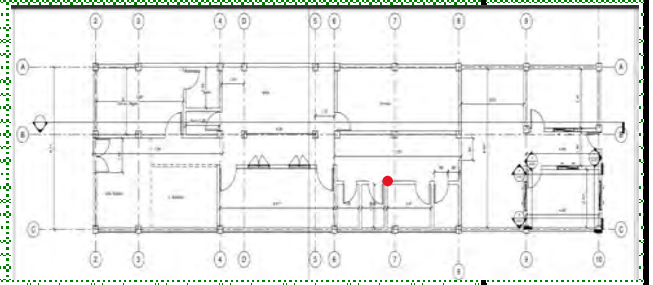

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

RUBEN HERNANDEZ
CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
pañete muros 1:3	*archivo auxiliar*	*18.09*	*6.70*		*2.70*		*0.66*		*0.76*	*17.55*
		-					*0.97*		*2.00*	*-1.94*
		-					*1.20*		*1.20*	*-1.44*
		18.09	*6.70*		*2.70*		*1.20*		*1.20*	*16.65*
		-					*1.40*		*2.00*	*-2.80*
		-					*1.20*		*1.20*	*-1.44*
		9.29	*3.44*		*2.70*					*9.29*
		9.29	*3.44*		*2.70*					*9.29*
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										*243.36*
									TOTAL	**288.55**

CROQUIS

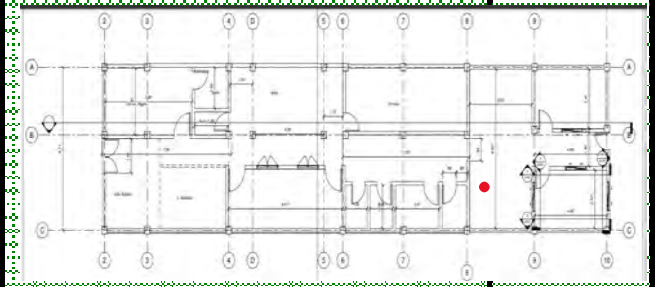

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

RUBEN HERNANDEZ
CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
pañete muros 1:3	*cuarto insumos*	*11.07*	*4.10*		*2.70*					*11.07*
		11.07	*4.10*		*2.70*		*0.88*		*2.00*	*9.31*
		-					*1.20*		*1.20*	*-1.44*
		6.75	*2.50*		*2.70*		*1.20*		*1.20*	*5.31*
		6.75	*2.50*		*2.70*		*1.20*		*1.20*	*5.31*
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										*288.55*
									TOTAL	**318.11**

CROQUIS

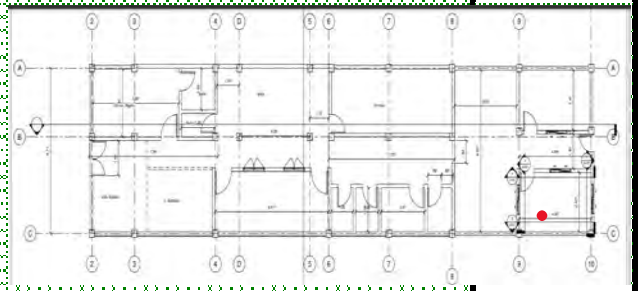

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	VANOS L	a	h	TOTAL
pañete muros 1:3	*cuarto servidor*	*11.07*	*4.10*		*2.70*					*11.07*
		11.07	*4.10*		*2.70*		*0.88*		*2.00*	*9.31*
		-					*1.20*		*1.20*	*-1.44*
		6.75	*2.50*		*2.70*		*1.20*		*1.20*	*5.31*
		6.75	*2.50*		*2.70*		*1.20*		*1.20*	*5.31*
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										*318.11*
									TOTAL	*347.67*

CROQUIS

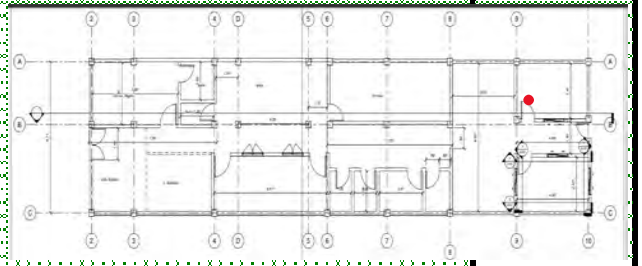

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas


OBJETO: OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
pañete muros 1:3	corredor patio	11.07	4.10		2.70		0.88		2.00	9.31
		-					1.20		1.20	-1.44
		11.07	4.10		2.70		0.88		2.00	9.31
		-					1.20		1.20	-1.44
		3.78	1.40		2.70		1.40		2.00	0.98
		3.78	1.40		2.70		1.40		2.00	0.98
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										347.67
									TOTAL	365.37

CROQUIS

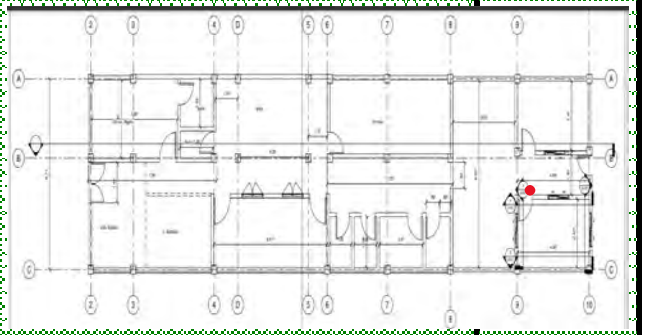

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 5.02	PAÑETE MUROS 1:3	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
pañete muros 1:3	*oficina registrador*	*13.37*	*4.95*		*2.70*					*13.37*
		13.37	*4.95*		*2.70*		*0.88*		*2.00*	*11.61*
		7.64	*2.83*		*2.70*		*0.70*		*2.00*	*6.24*
		7.64	*2.83*		*2.70*		*1.20*		*1.50*	*5.84*
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
ACUMULADO ANTERIOR										*365.37*
									TOTAL	*402.43*

CROQUIS

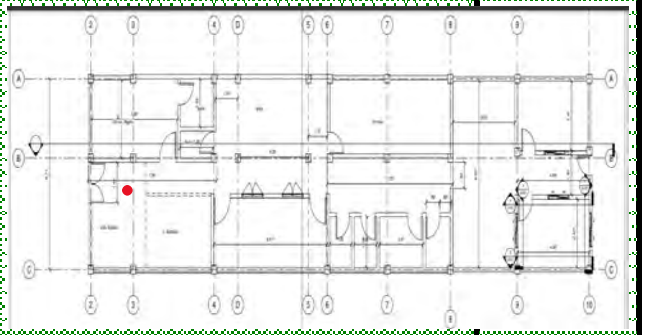

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

RUBEN HERNANDEZ
CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA

SUPERVSION

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674 CONTRATISTA soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA totall inc sas bic SUPERVISOR SNR alfonzo rene sanchez

ITEM: 5.03 UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
pañete muros 1:3 impermeabilizado	patio	13.12	4.330		3.03					13.12
		12.12	4.00		3.03					12.12
		9.43	3.25		2.90		0.80		1.95	7.87
		7.83	2.70		2.90		0.60		0.60	7.47
		3.18	1.05		3.03					3.18
		20.37	6.70		3.04		1.20		1.20	18.93
							1.20		1.20	-1.44
							1.40		2.00	-2.80
		0.66	1.10		0.60					0.66
		0.66	1.10		0.60					0.66
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	57.66

CROQUIS

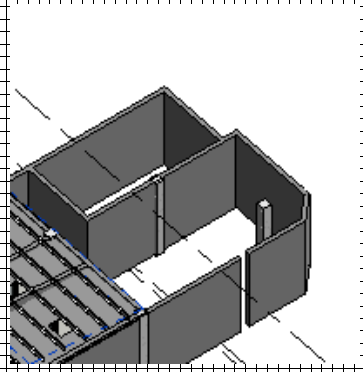

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674 CONTRATISTA soluciones integrales union sas

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA totall inc sas bic SUPERVISOR SNR alfonzo rene sanchez

ITEM: 6.17 UNIDAD m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
bajante aguas lluvias pvc 4"	patio	6.00	6.000							6.00
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
										-
										-
		-								-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE


CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez
ITEM:	6.19	UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
canal en lamina limahoya	atencion al publico y patio luminacion		6.000							6.00
	area baños funcionarios 1 patio luminacion		6.00							6.00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
								TOTAL		12.00

CROQUIS

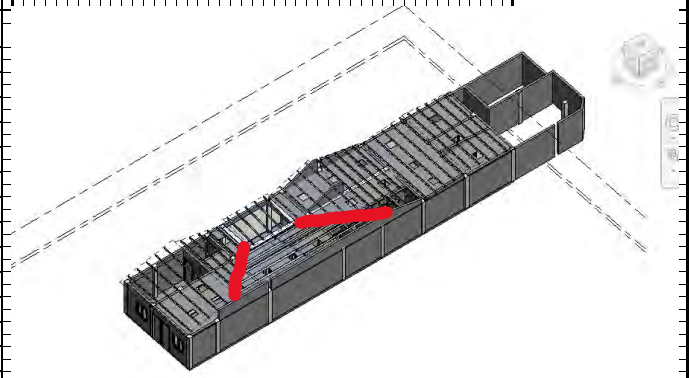

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	6.20	UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
canal en lamina calibre 22	*patio cubierta cuarto de insumos y servidor*		*6.700*							*6.70*
	cuarto de planta		*3.20*							*3.20*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***9.90***

CROQUIS

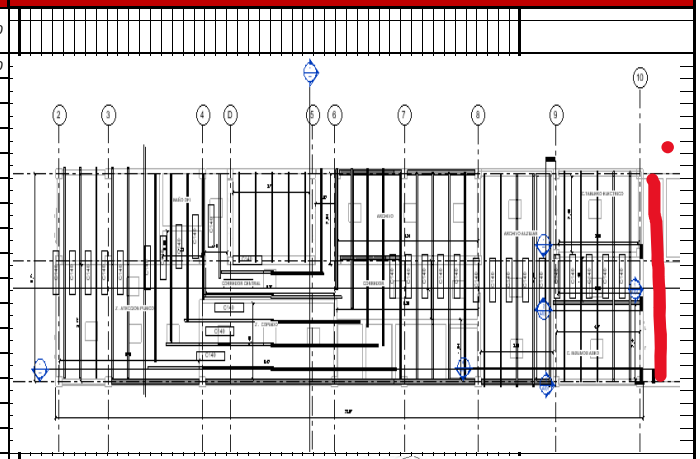

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

David Antonio Guevara Palomeque

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	6.21	UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
flanche lamina galvanizada calibre 22	*cubierta oficina*		*70*							*70.00*
	cubierta plata electrica		*5.80*							*5.80*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*75.80*

CROQUIS

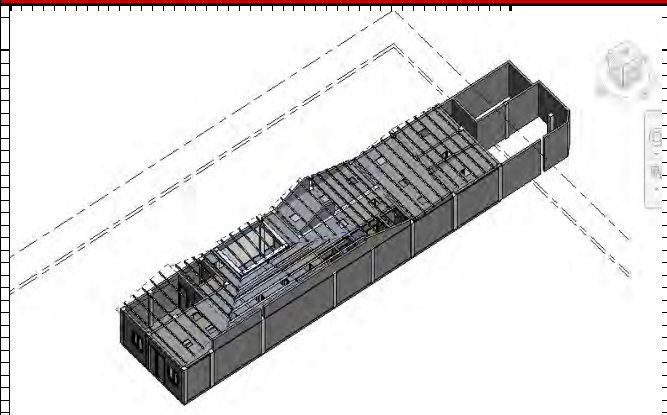

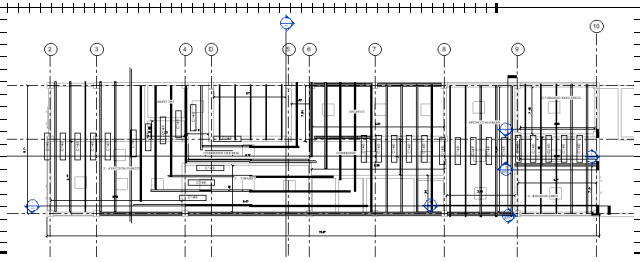

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	7.01	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
estuco exterior	fachada	15.00	7.5		2.00					15.00
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
										-
										-
		-								-
		-								-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
							TOTAL			15.00

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

DAVID ANTONIO GUERRERO
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco plastico interior	atencion al publico	19.66	7.28		2.70					19.66
		19.66	7.28		2.70		0.88		2.00	17.90
		9.59	3.55		2.70		0.97		2.00	7.65
		9.59	3.55		2.70		1.20		1.50	7.79
		-					1.30		2.20	-2.86
		-								-
		-								-
		-								-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco plastico interior	cuarto locker	3.83	1.42		2.70					3.83
		5.27	1.95		2.70					5.27
		5.27	1.95		2.70					5.27
		3.83	1.42		2.70		0.70		2.00	2.43
		-					0.60		1.20	-0.72
		-								-
		-								-
		-								-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco plastico interior	oficina funcionarios	19.66	7.28		2.70					19.66
		6.62	2.45		2.70					6.62
		6.62	2.45		2.70					6.62
		19.66	7.28		2.70		0.88		2.00	17.90
		-					0.88		2.00	-1.76
		-					1.20		1.50	-1.80
		-					1.20		1.50	-1.80
		-								-
		-								-
		-								-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco plastico interior	patio luminacion	10.67	3.95		2.70					10.67
		-								-
		-					0.70		2.00	-1.40
		-					0.90		2.00	-1.80
		19.66	7.28		2.70		0.88		2.00	17.90
		-					1.20		1.50	-1.80
		-					1.20		1.50	-1.80
		-					0.88		2.00	-1.76
		10.67	3.95		2.70		0.97		2.00	8.73
		-					0.88		2.00	-1.76
		-					1.20		1.50	-1.80
		19.66	7.28		2.70					19.66
	colomnas	2.88	2.40		1.20					2.88
		2.88	2.40		1.20					2.88
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
									VIENE DEL CIRCUITO ANTERIOR	111.62
									TOTAL	162.20

CROQUIS

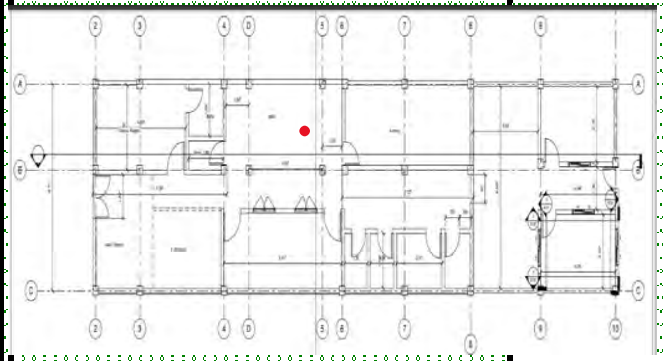

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada, o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria

CONTRATISTA

David Antonio Guerrero Palomeque

INTERVENTORIA

SUPERVSION

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco platico interior	archivo principal	19.44	7.20		2.70					19.44
		19.44	7.20		2.70					19.44
		7.64	2.83		2.70		0.80		2.00	6.04
		-					1.20		1.53	-1.84
		7.64	2.83		2.70		1.20		1.35	6.02
		-								-
		-								-
		-								-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco plastico interior	corredor baños	19.44	7.20		2.70					19.44
		19.44	7.20		2.70		0.70		2.00	18.04
		-					0.70		2.00	-1.40
		-					0.70		1.20	-0.84
		-					0.80		2.00	-1.60
		-					0.70		2.00	-1.40
		4.73	1.75		2.70		0.97		2.00	2.79
		4.73	1.75		2.70		0.97		2.00	2.79
		-								-
		-								-
		-								-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco plastico interior	archivo auxiliar	18.09	6.70		2.70		0.66		0.76	17.59
		-					0.97		2.00	-1.94
		-					1.20		1.20	-1.44
		18.09	6.70		2.70		1.20		1.20	16.65
		-					1.40		2.00	-2.80
		-					1.20		1.20	-1.44
		9.29	3.44		2.70					9.29
		9.29	3.44		2.70					9.29
		-								-
		-								-
		-								-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas

OBJETO: OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
estuco plastico interior	cuarto insumos	11.07	4.10		2.70					11.07
		11.07	4.10		2.70		0.80		2.00	9.31
		-					1.20		1.20	-1.44
		6.75	2.50		2.70		1.20		1.20	5.31
		6.75	2.50		2.70		1.20		1.20	5.31
		-								-
		-								-
		-								-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco plastico interior	oficina registrador	13.37	4.95		2.70					13.37
		13.37	4.95		2.70		0.88		2.00	
		3.70	1.37		2.70		0.70		2.00	2.30
		7.64	2.83		2.70		1.20		1.50	
										-
		-								-
		-								-
		-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco plastico interior	cuarto servidor	11.07	4.10		2.70					
		11.07	4.10		2.70		0.88		2.00	
		-					1.20		1.20	
		6.75	2.50		2.70		1.20		1.20	
		6.75	2.50		2.70		1.20		1.20	
		-								-
		-								-
		-								-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	servicion integrales union sas
OBJETO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC S.A.S	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ
ITEM: 7.02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
estuco plastico interior	corredor patio	11.07	4.10		2.70		0.88		2.00	
		-					1.20		1.20	
		11.07	4.10		2.70		0.88		2.00	
		-					1.20		1.20	
		3.76	1.40		2.70		1.40		2.00	
		3.76	1.40		2.70		1.40		2.00	
		-								-
		-								-
		-								-

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	10.02	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
estuco exterior	fachada	30.00	7.5		4.00					30.00
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
		-								-
										-
										-
		-								-
		-								-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
							TOTAL			30.00

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

David Antonio Guerrero Palomeque

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674	CONTRATISTA	soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	totall inc sas bic	SUPERVISOR SNR	alfonzo rene sanchez

ITEM:	*11.04*	UNIDAD	*m*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
monocapa manto asfaltico vigacanal	*vigacanal entrada oficina EJE 2*	*15.00*								*15.00*
	vigacanal patio luminacion eje d 5 y b	*18.00*								*18.00*
	vigacanal archivos EJE 8	*15.00*								*15.00*
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*48.00*

CROQUIS

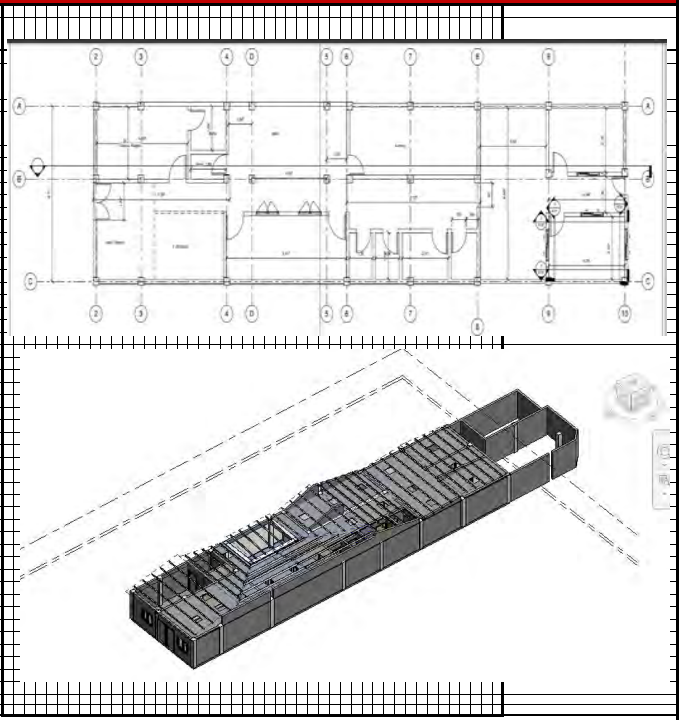

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

David Antonio Guerrero Palomeque

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	12	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674 CONTRATISTA soluciones integrales union sas


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA totall inc sas bic SUPERVISOR SNR alfonzo rene sanchez

ITEM: *15.10* UNIDAD *und*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
luminaria led 60 x 60 techo modulado	*oficina registrador*	*4.00*								*4.00*
	baño registrador	*1.00*								*1.00*
	atencion al publico	*5.00*								*5.00*
	cuarto locker	*1.00*								*1.00*
	oficina funcionarios	*5.00*								*5.00*
	corredor patio luminacion	*4.00*								*4.00*
	archivo principal	*6.00*								*6.00*
	corredor baños	*3.00*								*3.00*
	baño funcionarios 1	*1.00*								*1.00*
	baño funcionarios 2	*1.00*								*1.00*
	cocina	*1.00*								*1.00*
	cuarto aseo	*1.00*								*1.00*
	archivo auxiliar	*6.00*								*6.00*
	cuarto insumo de aseo	*2.00*								*2.00*
	cuarto del servidor	*2.00*								*2.00*
	corredor patio	*1.00*								*1.00*
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*44.00*

CROQUIS

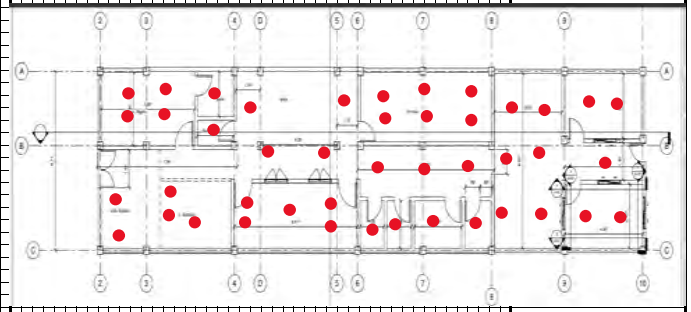

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

David Antonio Gutierrez Palomeque

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_ISTMINA - CHOCO .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	OBRA							
1.00	**PRELIMINARES**							**$11,166,631.61**
1.01	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	UN	2.00	2.00	2.00	$ 52,117.97	$104,235.94	
1.02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	M	50.00	50.00	50.00	$ 7,345.30	$367,265.00	
1.03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	UN	5.00	5.00	5.00	$ 17,137.85	$85,689.25	
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2				$ 11,086.15		
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	7.00	7.00	7.00	$ 28,507.42	$199,551.94	
1.18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	M2	15.00	15.00	15.00	$ 21,176.23	$317,643.45	
1.21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	UN	7.00	7.00	7.00	$ 25,749.70	$180,247.90	
1.22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	UN	7.00	7.00	7.00	$ 23,958.65	$167,710.55	
1.26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	50.00	50.00	50.00	$ 10,040.69	$502,034.50	
1.27	DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	M	30.00	30.00	30.00	$ 7,437.02	$223,110.60	
1.29	DESMONTE DE VIDRIO	M2	8.00	8.00	8.00	$ 5,384.90	$43,079.20	
1.33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	2.00	2.00	2.00	$ 50,912.57	$101,825.14	
1.34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2				$ 20,964.55		
1.35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	5.00	2.00	2.00	$ 32,943.29	$65,886.58	
1.36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	60.00			$ 11,570.66		
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	157.00	30.00	30.00	$ 16,215.86	$486,475.80	
1.38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M				$ 41,710.37		
1.39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M				$ 51,212.45		
1.40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	12.00	12.00	12.00	$ 36,959.33	$443,511.96	
1.44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	50.00	50.00	50.00	$ 16,215.86	$810,793.00	
1.45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	M2	30.00	30.00	30.00	$ 21,979.44	$659,383.20	
1.46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	M2	2.00	2.00	2.00	$ 35,977.37	$71,954.74	
1.47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	80.00	80.00	80.00	$ 13,554.58	$1,084,366.40	
1.49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	M2	30.00	30.00	30.00	$ 23,153.09	$694,592.70	
1.50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	M	110.00	77.00	77.00	$ 7,104.22	$547,024.94	
1.51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	9.00			$ 27,890.02		
1.52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	UN				$ 101,787.50		
1.56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	5.00			$ 142,401.84		
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	1.00	1.00	$ 517,621.10	$517,621.10	
1.58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	M2	210.00			$ 19,547.47		
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	60.00	60.00	60.00	$ 16,215.86	$972,951.60	
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	78.00	78.00	78.00	$ 32,303.54	$2,519,676.12	
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	KG	250.00			$ 1,901.59		
1.69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	KG	100.00			$ 1,879.25		
1.73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2				$ 19,412.23		
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	20.00			$ 154,805.11		
2.00	**CARPINTERÍA EN MADERA**							
2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	1.00			$ 1,048,623.91		

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_ISTMINA - CHOCO .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	M	1.00			$ 881,992.94		
2.14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	8.00			$ 633,627.62		
2.16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	8.00			$ 209,940.70		
2.17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	M2	2.00			$ 99,489.60		
2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	1.00			$ 153,844.32		
3.00	**CARPINTERÍA METÁLICA**							**$1,061,725.72**
3.01	BARANDA TUBO CUADRADO	M	12.00			$ 143,347.34		
3.08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	15.00			$ 376,260.02		
3.14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	4.00	4.00	4.00	$ 265,431.43	$1,061,725.72	
3.19	REJILLA DE PISO 30CM	M2	5.00			$ 126,256.54		
3.20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2				$ 219,953.16		
4.00	**CIELORRASOS**							**$7,562,667.80**
4.01	CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM	M2	25.00	20.00	20.00	$ 378,133.39	$7,562,667.80	
5.00	**CONCRETO Y MORTEROS**							**$3,434,508.20**
5.02	PAÑETE MUROS 1:3	M2	60.00	60.00	60.00	$ 41,372.86	$2,482,371.60	
5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	20.00	20.00	20.00	$ 47,606.83	$952,136.60	
6.00	**CUBIERTAS**							
6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	M	60.00			$ 58,360.18		
6.18	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	M				$ 99,353.18		
6.20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	M	20.00			$ 90,028.68		
6.21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M				$ 43,610.78		
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS	UN				$ 4,022,780.83		
7.00	**ENCHAPE MUROS**							**$7,104,404.00**
7.04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	M2	40.00	40.00	40.00	$ 9,044.62	$361,784.80	
7.05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	88.00	80.00	80.00	$ 84,282.74	$6,742,619.20	
7.07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	M2	4.00			$ 86,487.74		
9.00	**ESTRUCTURA EN MADERA**							
9.01	ESCALERAS EN MADERA	M2				$ 725,534.38		
10.00	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							**$1,235,813.25**
10.01	GRANIPLAS	M2	93.43	40.78	40.78	$ 30,303.17	$1,235,813.25	
10.04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	M2	20.00			$ 18,385.58		
10.06	LAVADO FACHADA	M2	35.00			$ 16,527.50		
11.00	**IMPERMEABILIZACIÓN**							
11.05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	M	20.00			$ 26,565.84		
11.06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	M2	14.00			$ 48,377.11		
12.00	**MAMPOSTERÍA**							**$11,351,130.68**
12.01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M				$ 60,735.70		
12.09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2	70.00	70.00	70.00	$ 148,828.68	$10,418,007.60	
12.12	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	M2	4.00	4.00	4.00	$ 233,280.77	$933,123.08	

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_ISTMINA - CHOCO .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
13.00	**PINTURAS**							
13.01	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M	12.00			$ 17,585.90		
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	185.00			$ 28,172.26		
14.00	**PISOS**							
14.05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	185.79			$ 87,014.59		
14.12	POYO COCINA 55X10CM	M	4.00			$ 98,259.50		
14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	40.00			$ 47,851.44		
14.16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	85.00			$ 33,773.54		
15.00	**RED ELÉCTRICA**							**$5,747,140.33**
15.10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	UN	7.00			$ 201,859.22		
15.30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	10.00	10.00	10.00	$ 136,967.54	$1,369,675.40	
15.31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	10.00	10.00	10.00	$ 146,113.30	$1,461,133.00	
15.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UN	10.00	10.00	10.00	$ 152,504.86	$1,525,048.60	
15.33	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC	UN	10.00			$ 145,578.22		
15.34	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	UN	10.00	10.00	10.00	$ 12,055.18	$120,551.80	
15.35	CAMBIO SALIDA TOMA	UN	7.00	7.00	7.00	$ 153,204.58	$1,072,432.06	
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1.00	1.00	1.00	$ 198,299.47	$198,299.47	
16.00	**RED HIDRÁULICA**							**$699,020.27**
16.07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	5.00	5.00	5.00	$ 39,971.06	$199,855.30	
16.08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	1.00	1.00	1.00	$ 38,060.06	$38,060.06	
16.09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	1.00	1.00	1.00	$ 38,837.40	$38,837.40	
16.10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	UN	1.00	1.00	1.00	$ 42,626.47	$42,626.47	
16.11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	1.00	1.00	1.00	$ 39,654.72	$39,654.72	
16.18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	4.00			$ 88,970.28		
16.19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	3.00			$ 250,477.42		
16.21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1.00			$ 1,012,614.79		
16.22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00			$ 522,088.73		
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1.00			$ 115,538.47		
16.24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00			$ 623,189.45		
16.25	MOTOBOMBA 2,0 HP	UN	1.00			$ 1,062,087.94		
16.26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	1.00			$ 183,654.74		
16.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	M	3.80			$ 1,289,147.66		
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	4.00			$ 338,116.46		
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	4.00	4.00	4.00	$ 84,996.58	$339,986.32	
17.00	**RED SANITARIA**							**$1,981,077.88**
17.02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN	2.00	2.00	2.00	$ 864,970.34	$1,729,940.68	
17.06	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6"	M				$ 95,899.27		
17.19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	30.00	12.00	12.00	$ 20,928.10	$251,137.20	
17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1.00			$ 776,370.50		
17.29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	1.00			$ 1,433,669.83		

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_ISTMINA - CHOCO .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
18.00	**URBANISMO**							
18.03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2				$ 151,106.59		
19.00	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**							
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	1.00			$ 524,416.03		
19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00			$ 1,771,033.66		
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	20.00			$ 19,589.81		
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	1.00			$ 45,907.51		
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	1.00			$ 205,270.80		
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	1.00			$ 626,110.63		
20.00	**NO PREVISTOS**							
NP-01	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	12.00			$ 95,532.68		
NP-02	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M	31.89			$ 47,184.85		
NP-03	ESCALERA TIPO GATO	M	4.00			$ 140,776.28		
NP-04	ALISTADO DE PISO 4CM	M2	127.00			$ 40,021.72		
NP-05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposicion final)	M3	10.50			$ 49,088.89		
NP-06	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	10.50			$ 169,084.25		
NP-07	TUBERIA SANITARIA DE 2"(incluye accesorios)	ML	25.00			$ 28,941.36		
NP-08	TUBERIA SANITARIA DE 3" (incluye accesorios)	ML	10.00			$ 42,885.69		
NP-09	TUBERIA SANITARIA DE 4" (incluye accesorios)	ML	22.00			$ 44,547.51		
NP-10	PUNTOS DESAGUES 3"	UND	1.00			$ 74,875.72		
NP-11	PUNTOS DESAGUES 4"	UND	4.00			$ 96,540.49		
NP-12	RED SUMINSTRIO DE 1/2" (incluye accesorios)	ML	20.00			$ 12,427.38		
NP-13	REGISTRO RED WHITE 3/4" (incluye accesorios)	UND	5.00			$ 61,733.14		
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE DIMENSIONES 20X20 CMS	UND	5.00			$ 27,854.44		
NP-15	SUMINISTRO SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UND	3.00			$ 419,874.14		
NP-16	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (incluye recarga gas refrigerante R-401 o el que corresponda, punta agua, punto electrico, tuberia cobre hasta 3m	UN	1.00			$ 468,339.85		
NP-17	ACABDOS EN MUROS ESTUCO PLASTICO	M2	62.00			$ 33,784.93		
NP-18	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	157.00			$ 13,011.07		
NP-19	Suministro e instalcion de puerta corrediza 1,50*2,10 (ALUMINIO ANONISADO Y PANELES EN VIDRIO, INCLUYE INSTALACION, TODOS LOS ACCESORIOS)	M2	3.15			$ 857,794.29		
NP-20	Suministro e instalación de salida lógica para voz y datos sencillo categoria 6A. Incluye: Jack RJ-45 color azul (Autoponchable), tapa abatible para protección al polvo, faceplate sencillo, canaleta plastica y caja con tapa.	UND	4.00			$ 173,819.37		
NP-21	SUMINISTRO SANITARIO ALONGADO TIPO CORONA Y ACOPLE	UND	1.00			$ 980,312.48		
NP-22	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=15CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	30.00			$ 149,412.95		
NP-23	Suministro, transporte e instalación de canaleta plastica (20 x 8) cm con división. Incluye: tapa tornillo, elementos de fijación en pared y demás accesorios para su correcta instalación	ML	10.00			$ 127,262.80		
NP-24	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	UND	4.00			$ 178,950.55		
NP-25	TUBERÍA PVCP 3/4"	ML	25.00			$ 15,133.16		

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_ISTMINA - CHOCO .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
NP-26	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE TERMINALES RJ45 Y MARCACION	ML	70.00			$ 12,457.93		
NP-27	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	UND	4.00			$ 97,819.34		
TOTAL COSTO DIRECTO								$51,344,119.74
		ADMINISTRACIÓN	%	0.23				$ 11,809,147.54
		IMPREVISTOS	%	0.01				$ 513,441.20
		UTILIDADES	%	0.05				$ 2,567,205.99
		IVA SOBRE UTILIDADES	%	0.19				$ 487,769.14
VALOR TOTAL OBRA								$66,721,683.60

VALOR TOTAL ORIP ITSMINA - CHOCO	$ 222,405,612.00

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73
VALOR ADICIÓN N°1	
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$66,721,683.60		30.00%	$66,721,683.60			$66,721,683.60	$ 155,683,928.40
2								
3								
4								
5								
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FRAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
Representante Legal
INTERVENTORIA

ARQ. ALFONSO RENE SÁNCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

Escriba el texto aquí

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº		1674 DE 2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS	NIT / C.C.	800205914-1
PLAZO	CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DIAS		FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA	31/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA	30/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.089.847.608,73	TOTAL ADICIONES		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.089.847.608,73

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (I3 ORIP)

CUADRO RESUMEN AGRUPACION 1

No	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	PACIFICO	VALLE	CALI
2		VALLE	SEVILLA
3		CAUCA	EL BORDO
4		CHOCO	ISTMINA
5	ANDINA	RISARALDA	PEREIRA
6		ANTIOQUIA	FRONTINO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FACTURA / CUENTA DE COBRO

FECHA DD-MM-AA	NÚMERO DE ACTA PARCIAL	No DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR	% TOTAL DE EJECUCION
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DECALI - VALLE	FVE-3765	PAGO PRIMER 30% CALI - VALLE	$ 225.513.788,01	$ -	$ 225.513.788,01	10,79%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE SEVILLA - VALLE	FVE-3767	PAGO PRIMER 30% SEVILLA - VALLE	$ 74.138.284,20	$ -	$ 74.138.284,20	3,55%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE EL BORDO - CAUCA	FVE-3768	PAGO PRIMER 30% EL BORDO - CAUCA	$ 63.728.057,39	$ -	$ 63.728.057,40	3,05%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE ISTMINA - CHOCO	FVE-3829	PAGO PRIMER30% ISTMINA - CHOCO	$ 66.721.683,61	$ -	$ 66.721.683,61	3,19%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE PEREIRA - RISARALDA	FVE-3825	PAGO PRIMER 30% PEREIRA - R4ISARALDA	$ 132.847.170,57	$ -	$ 132.847.170,57	6,36%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE FRONTINO - ANTIOQUIA	FVE-3824	PAGO PRIMER 30% FRONTINO - ANTIOQUIA	$ 64.005.298,84	$ -	$ 64.005.298,84	3,06%
		TOTALES		$ **626.954.282,62**	$0,00	**$626.954.282,62**	30,00%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CALIDAD DE INTERVENTOR/ DEL CONTRATO DE OBRA No 1674 DE 2023 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA 4° FORMA DE PAGO.
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN	1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 2. Copia de Acta de Recibop Parcial No 1 firmada por el contratista, la interventorioa y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría. 4. Copia del RUT contratista de obra. 5. Copia del Contrato de obra. 6. Copia del acta de inicio. 7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 8. Copias planillas de seguridad social. 9. Certificación bancada no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancada donde se debe consignar los dineros correspondientes. 10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisordel contrato de interventoría. 11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obray obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría. 12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS 27 (VEINTI SIETE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoria
TOTALL INC SAS BIC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Entre los suscritos, **WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la **SNR**, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución No. **10989** del 14 de septiembre de 2022, con la cual es se le delegó la Ordenación del Gasto, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra **TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9,** representado legalmente por **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** identificado con **C.C. No. 79553539,** designado por Documento Privado No. 1 del 10 de junio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de agosto de 2022 con el No. 02865410 del Libro IX, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **Contrato de Interventoría**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma Transaccional del **SECOP II** y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideración a lo siguiente: **1).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **2).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. **3).** Que previamente se realizó el **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 002 DE 2023,** cuyo objeto es: **"CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)". 4).** Que en el mencionado proceso se recibieron 4 propuestas de los siguientes interesados:

Referencia de oferta	Entidad
snrRAM	CONSORCIO NIORAM
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS CPM 002 DE 2023	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR
GRUCOING - SUPERNOTARIADO	GRUCOING S.A.S.
Oferta al proceso CPM 002 DE 2023 por TOTALL INC SAS BIC	TOTALL INC SAS BIC

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

5). Que conforme a lo anterior y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, dando el siguiente resultado:

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
1	CONSORCIO NIORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84.30
2	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que, como se evidencia en el Informe de Evaluación Definitivo se presenta un empate entre los proponentes

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que el Comité Técnico evaluador procedió a dar aplicación a los criterios de desempate señalados en el numeral 5.14 del Pliego de Condiciones Definitivo dando como resultado el siguiente orden de elegibilidad:

CRITERIOS DE DESEMPATE		
CERTIFICADOS	TOTALL INC SAS BIC	GRUCOING SAS
1.Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes e servicios extranjeros.	Servicios Nacionales	Servicios Nacionales
2.Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	SI	SI
3. Preferir la propuesta presentada por proponente que acredite en las condiciones establecidas en la Ley que por lo menos el 15 % de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 361 de 1997.	SI	SI
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobreviviencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.	SI	SI
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.	SI	NO
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	NO	NO
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las siguientes condiciones.	NO	NO
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales, o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
10. Preferir a oferente que acredite su acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) este conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual o sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.	SI	NO
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.	SI	NO

Que, una vez establecido lo anterior y teniendo en cuenta el numeral 5.12 del pliego de condiciones definitivo - MODO DE ADJUDICACIÓN - el comité evaluador en Comité de Contratación de fecha 6 de julio de 2023, recomendó al Secretario General y Ordenador del Gasto de la Superintendencia de Notariado y Registro, adjudicar el proceso **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 02 DE 2023.** cuyo objeto es "*CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O*

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)." de la siguiente manera:

AGRUPACIÓN 1
ADJUDICATARIO: TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351 9

AGRUPACIÓN 2
ADJUDICATARIO: GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9

6). Que conforme a lo anterior, resultó ganador de la **AGRUPACIÓN No. 1** el proponente **TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351-9** con **100** puntos y quien oferto un precio de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89),** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **7).** Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas. **CLÁUSULA PRIMERA: - A) OBJETO:** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 1". **B) ALCANCE DEL OBJETO:** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, según corresponda. La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.

El objetivo de la Interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuéstales, contables y financieros en el desarrollo del contrato. La Interventoría debe asumir una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos específicos de la Interventoría serán entre otros:

- **Absolver:** En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la Interventoría es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicación entre las partes.

- **Colaborar:** Teniendo en cuenta que la Interventoría y el Contratista conforman un equipo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista.

- **Controlar:** Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, control, verificación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidación.

- **Exigir:** La Interventora tiene la obligación de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

- **Prevenir:** El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.

- **Solicitar:** Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecución del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoría podrá implicar la modificación del contrato. Esta acción también se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

- **Verificar:** Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

- **Ley 1474 de 2011**

Artículo 84: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.

PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

- Ley 80 de 1993

ARTÍCULO 53. De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría.

CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: A) VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **B) PLAZO DEL CONTRATO:** El término de ejecución del presente contrato será el relacionado en el cuadro siguiente sin que exceda el **31 de diciembre de 2023.** Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo.

AGRUPACION	PLAZO DE EJECUCION
Agrupación 1	Cinco Meses

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El plazo de ejecución del contrato de obra por agrupación está programado de acuerdo al cuadro antes expuesto y los tiempos serán contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con la interventoría y la entidad, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II. **Parágrafo 1:** La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual debe ser firmada en compañía de la supervisión del contrato. **Parágrafo 2:** El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras, deben estar contemplados en los costos de la propuesta económica del oferente. **Parágrafo 3:** La INTERVENTORIA a las obras se realizará en una (1) etapa de acuerdo con las especificaciones de construcción y el presupuesto publicado por la entidad **CLÁUSULA TERCERA: - CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:** Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C-1209-0800-13-0-1209004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la vigencia 2023, según CDP No. 55723 del 10 de mayo de 2023, expedido por el responsable de presupuesto. **CLÁUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO**: La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el 100% del valor del contrato así:

PAGOS – ACTA PARCIAL 1

El primer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 30%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor de contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2

El segundo pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 60%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

TERCER PAGO –ACTA PARCIAL 3

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El tercer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 90%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

CUARTO PAGO-PAGO FINAL

Se efectuará el pago final del 10% del valor ejecutado del contrato restante, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Copia del Acta de recibo final firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoria
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuerta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y e visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Entregar Informe de intervenoria en medio magnético con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación de la obra.
13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificación).
14. Entregar Bitácora de obra escaneada en medio magnético.
15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los resultados obtenidos.
16. Entregar Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social.
17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.
18. Entregar planos record en medio magnético y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
19. Entregar memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
20. Entregar el Manual de operación y funcionamiento con los respectivos catálogos.
21. Entregar el Manual de mantenimiento
22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios públicos en aquellas oficinas que se cuente con las conexiones.
23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecución de las obras.
24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificación de calibración de los equipos utilizados.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Nota: La entidad no realizara adición en dinero, teniendo en cuenta que la interventoría contratada tiene un fin específico el cual es controlar obras desde el inicio hasta su culminación. En caso de ser necesario solo se adicionará en valor el contrato de interventoría proporcionalmente al valor adicionado en el contrato de obra y siempre y cuando haya disponibilidad de recursos. **Liquidación del contrato:** La liquidación del contrato se efectuará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes al recibo a satisfacción de las obras por parte de la interventoría y la supervisión del contrato y contempladas dentro del objeto contractual y su alcance. **CLÁUSULA QUINTA: - LUGAR DE EJECUCION:** Las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la ejecución de las obras son las siguientes:

AGRUPACION 1

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Frontino	Antioquia	Andina	Carrera 32 No. 30 - 34	$38.098.394,60
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Pereira	Risaralda	Andina	Avenida 30 de Agosto No. 37 - 24	$79.075.700,38
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Cali	Valle del cauca	Pacifico	Calle 3 a Norte No. 16 - 34	$134.235.550,23
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Sevilla	Valle del cauca	Pacifico	Calle 48 No. 49 - 31	$44.129.958,25
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
El Bordo	Cauca	Pacifico	Calle 6 No 6-54	$37.933.498,23

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Istmina	Choco	Pacifico	Carrera 5 A No. 25 - 18	$39.715.411,93

CLÁUSULA SEXTA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones: **1).** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2).** Está debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **3).** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **4).** Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **CLÁUSULA SÉPTIMA:- RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del objeto establecido en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA:- OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, El contratista se obliga para con la Superintendencia a: EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los Estudios Previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecución.
2. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.
3. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato o quien haga las veces.
4. Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de LA SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.
5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.
6. Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.
7. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.
8. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor de la entidad.
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
10. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
11. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
13. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.
14. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
16. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta.
17. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de interventoría, que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el supervisor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del supervisor.
18. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
19. Desarrollar la interventoría a las obras de manera que se evite a toda costa afectación a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algún inconveniente, el contratista será el responsable de solucionarlo.
20. La Interventoría debe verificar que el contratista implemente un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecución de las obras por motivo de lluvias, así como llevar el registro diario en bitácora del estado del clima.
21. La interventoría debe solicitar al contratista las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y así verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.
22. Todos los empleados a cargo del interventor y contratista deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo que se encuentren en la obra.
23. La interventoría verificara cada vez que entre un nuevo trabajador, que el mismo cuente con todos las afiliaciones de Ley.

CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a desarrollar las siguientes obligaciones específicas:

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA

1. Verificar y aprobar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y las que se establezcan conjuntamente con la visita adelantada previo al inicio de la ejecución de las obras y presentar un informe a la SUPERINTENDENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al mismo.
3. Suscribir las actas de mayores y menores cantidades y obra no prevista que sean necesarias, de modo que cada actividad no prevista y mayor cantidad de obra sea aprobada antes de su ejecución.
4. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones, así mismo verificará la calidad de los materiales utilizados por el contratista.
5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.
6. Revisar y dar el visto bueno en caso de haber cambios en la ejecución del contrato, previo visto bueno del Supervisor del contrato.
7. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
8. Realizar seguimiento detallado de la información contenida en los documentos enunciados, presentando un informe semanal a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el cumplimiento del cuadro de rendimientos, programaciones y todo lo relacionado en la correcta ejecución y avance del contrato, en caso de incumplimiento por parte del contratista deberá informarlo por escrito a la entidad y en caso de que afecte la normal ejecución del contrato sugerir los procedimientos sancionatorios que correspondan.
9. Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a os análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos y los respectivos análisis de precios unitarios. En caso de que la SUPERINTENDENCIA presente observaciones a los APU de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar as correcciones del caso.
10. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigicos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.
11. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual. conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Velar por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra.
13. Exigir al constructor cuando sea necesaria la realización de ensayos y pruebas.
14. Vigilar que el constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que considere oportuno.
15. Completar o introducir en caso de que sea necesario modificaciones al proyecto el interventor realizará los planos y especificaciones pendientes y cuidará en todo momento de que el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados.
16. Presentar informes mensuales a la Entidad donde se muestre el avance del contrato en donde se enuncie las conclusiones y recomendaciones. Cualquier variación al contrato previa su realización deberá ser consultada y aprobada por la Entidad contratante.
17. Revisar la bitácora de la obra, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución de las obras, todas las bitácoras serán administrada por la interventoría, y se enviará diariamente copia digital al supervisor del contrato, dicha bitácora será diligencia en el formato entregado por la entidad. De todos los trabajos el interventor dejará constancia escrita.
18. Presentar documentos necesarios para garantizar la realización de la interventoría de acuerdo con los protocolos Bioseguridad.
19. El Interventor Debe verificar que el contratista realice la entrega y socialización del **Manual de Mantenimiento** de las obras ejecutadas.
20. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

B. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

1. Solicitar a la SUPERINTEDENCIA la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.
2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
3. Revisar y aprobar el Cronograma y el flujo de fondos del contratista y remitirlos a la Superintendencia.
4. Velar por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado.
5. Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales.
6. Autorizar la contratación de la mano de obra de los diferentes capítulos del presupuesto y supervisará la administración de los subcontratos.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

7. La Interventoría estará pendiente que todos los trabajadores contratos cuenten con la capacitación y experiencia en acabados de obra, esto con el fin de desempeñar ls labores que conlleva este tipo de intervenciones.
8. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la ley.
9. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los presupuestos, especificaciones y contrato de construcción.
10. Verificar que la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
11. Estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras.
12. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la SUPERINTENDENCIA.
13. Programar y coordinar con el contratista y con la SUPERINTENDENCIA las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.
14. Elaborar con el contratista de la obra las actas de iniciación y las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, las cuales no deberán sobrepasar el valor de la obra, debidamente justificadas, cambio de especificaciones, entregas parciales, liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar, en coordinación con el contratista. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por la Secretaria General.
15. Legalizar las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, mensualmente ante la Supervisión, cuando se requiera, de acuerdo con el avance del contrato.
16. Mantener actualizada la documentación de los contratos.
17. Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales.
18. Cumplir con la entrega de los informes ejecutivos semanales, informes mensuales y finales requeridos por la SUPERINTEDENCIA en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato.
19. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

20. Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.

21. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.

22. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto a la SUPERINTEDENCIA para la resolución final de las mismas.

23. Suspender si es necesario el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión.

24. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además, elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la SUPERINTEDENCIA para su aprobación con una antelación mínima de 10 días a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas técnica, jurídica y económicamente.

25. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato

26. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

27. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

28. Realizar la interventoría de acuerdo con la Resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021 ANEXO – MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA y las que la modifiquen, adicionen o deroguen, de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se adopta el manual interno de Supervisión e interventoría de los Contratos que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro.

29. Presentar los informes y documentos necesarios para realizar la interventoría de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia y los formatos entregados por la supervisión del contrato.

30. Enviar en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), si el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor con el fin de informar a la Dirección de Contratación, para que se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados y este remitirlos a la Secretaría General. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

31. Elaborar el acta de terminación del contrato y el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de 15 días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la SUPERINTEDENCIA para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
32. Verificar que el contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
33. Revisar, aprobar y vigilar los Planes de Seguridad, higiene, y salud ocupacional de acuerdo con las Normas técnicas vigentes, presentado por el contratista y remitirlo aprobado a la supervisión.
34. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.
35. Llevar acabo lo establecido en la resolución 682 del 24 de abril de 2020 con relación al PAPSO.
36. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

C. INTERVENTORÍA FINANCIERA

Realizar el seguimiento a la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir, con el fin de tener herramientas para realizar las recomendaciones y ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de las obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de ejecución del contrato.

La interventoría deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios para realizar los pagos y realizar la revisión de los mismos, realizando y suscribiendo las certificaciones que correspondan.

D. INTERVENTORÍA LEGAL

Revisión de los documentos del contratista de obra, tales como, Contrato de obra, Pliegos de condiciones y en general de los documentos que hacen parte del contrato. Lo anterior, con el objeto de que sean conocidas las condiciones y obligaciones del contratista de obra y el personal vinculado y responsable de la ejecución del contrato.

Se debe mantener un estricto control y seguimiento a las garantías suscritas por el contratista, haciendo énfasis en la vigencia de las mismas, en concordancia con lo establecido en el contrato

de obra. Se revisará e informará a la Entidad oportunamente de las condiciones y vencimiento de las mismas.

Así mismo realizar la verificación del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que utilice el contratista en la ejecución de las obras.

De igual manera, realizar el seguimiento legal a la ejecución del contrato y asegurarse de que el contrato se cumpla en todos sus términos y condiciones. Esto incluye la revisión de los plazos de ejecución, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos legales.

Debe además realizar los informes, reportes y conceptos jurídicos y/o Legales que La Entidad solicite al Interventor, en relación con la ejecución del contrato. También debe informar a las partes sobre cualquier problema o incumplimiento detectado y proponer soluciones para corregirlos.

E. INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La interventoría deberá efectuar el seguimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por ellos mismos, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se deberá atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, entre otras.

Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigación (Ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y demás normas que amplíen o modifiquen la materia).

F. CONTROL DE COSTOS

Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua confrontación de este con las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que inciden en los costos se procura mantener una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados, una idea de las razones y de las medidas correctivas que se puedan tomar.

En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, sea necesario ejecutar otros ítems no

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos - del respectivo manual de Interventoría, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaría de obras.

En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información al Supervisor designado por la SNR, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la interventora del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prorrogas por retrasos en el cronograma.

Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993.

G. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Consiste en controlar la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de los de las actividades contratadas. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de las obras.

Indica las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas.

Las visitas serán programadas conjuntamente, con el contratista de obra, interventoría y la entidad.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Hacer seguimiento constante a la programación de la obra.

Llevar a cabo lo establecido en la resolución 682 de 24 de abril de 2020 con relación al (PAPSO).

H. RECOMENDACIONES

Liquidación del contrato de interventoría

El Supervisor procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

Inspección final de la obra

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra, 10 días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

Manual de Mantenimiento de obras ejecutadas

El Interventor deberá solicitar al contratista la entrega y socialización de un manual de mantenimiento de las obras ejecutadas, así cada oficina será responsable del cuidado de las obras ejecutadas

I. CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO

La Interventoría designará Ingenieros y/o Arquitectos, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al municipio que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, según resolución vigente.

La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del contratista.

El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesión en el territorio nacional.

El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada interventoría.

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños del proyecto, la normatividad vigente y demás obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoría que garanticen la correcta ejecución del proyecto.

Insumos.
La SNR entregará al **Interventor:**
Copia del Contrato de obra suscrito con el Contratista, así como los estudios y los documentos previos que lo soportan.

Productos
El interventor deberá solicitar al contratista:

- Hojas de vida del personal profesional.
- Relación del equipo mínimo obligatorio.
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
- Programa de Obra y flujo de inversiones
- Plan de manejo de tránsito- PMT.
- Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y escombreras que utilizará durante la Etapa de Construcción, así como también los permisos que sean necesarios utilizar.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Plan de manejo ambiental
- Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

J. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS:

Objetivo:

El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el **Contratista,** corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el **Contrato de Obra.**

Materiales:

El **Interventor** realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada por el **Contratista** cumple con los requerimientos contenidos en el **Contrato de Obra.**

Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos, acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el **Contratista.** En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el **Contratista** e **Interventoría,** primaran para efectos de la comprobación de las **Metas Físicas** y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta última.

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados (de existir) y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del **Proyecto** por parte del **Interventor,** éste deberá solicitar al **Contratista** los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el **Contrato de Obra,** o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Para adelantar dicha labor el **Interventor** deberá contar, entre otros y como mínimo, con los siguientes insumos:

- Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
- Realización y/o Revisión de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra.
- Visita de inspección a sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos fabricados fuera del área del proyecto.

Productos:

Los productos resultantes de este proceso, corresponderán a:

- Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoría.
- Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
- Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad, cuando sea necesario.
- Presentar informes de inspección a las instalaciones de fabricación
- Notificar al Contratista y a la Alcaldía respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos realizados.
- Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra
- Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

K. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo:

Verificar los procesos constructivos empleados por el **Contratista,** la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la **Programación de Obra y flujo de inversiones** y **Cronograma de Metas Físicas** entregados por el Contratista.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Reuniones semanales entre contratista e interventoría, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría interno de la SNR según resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021.

- Informes de Inspectoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoría.

- Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.

- Registro fotográfico y fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción del proyecto (antes - durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.

CLÁUSULA DÉCIMA: - OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA:
La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Aprobar la Garantía única del Contrato.
2. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
3. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.
4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
5. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor.
6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, por el Ordenador del Gasto exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
7. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.
8. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.
9. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.
10. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
12. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.
13. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.
14. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
15. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II.
16. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.
18. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar.
19. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.
20. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.
21. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.
22. Contratar un interventor para la vigilancia y verificación de la correcta ejecución del objeto del presente contrato
23. Las demás inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de Supervisión.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - SUPERVISION Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: A) SUPERVISOR: La supervisión, vigilancia en la ejecución y cumplimiento estricto del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Infraestructura de la SNR O quien haga sus veces o de quien designe el ordenador del gasto. **B) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 1).** Velar por

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

la correcta y oportuna ejecución del contrato. **2).** Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes de supervisión del contrato, así como actas y demás documentos que soporten la ejecución y seguimiento del contrato. **3).** Informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. **4).** Informar con la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, así como estado de las obligaciones económicas y del término de ejecución. **5).** Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecución del contrato. **6).** Verificar que el **CONTRATISTA** haya subido en la Plataforma Transaccional del SECOP II, todos los documentos requeridos para la legalización del contrato y los informes y soportes exigidos durante la ejecución del mismo. **7).** Allegar a la Dirección de Contratación original del acta de inicio dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación del acto administrativo de supervisión. **8)** Las demás que legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la **Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021**, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA**: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - CESIÓN:** Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia, al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PARÁGRAFO. -** Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes será la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecución del contrato, el Contratista preste sus servicios en otras partes del territorio nacional. **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: -EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y la **SUPERINTENDENCIA**, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogación diferente a los honorarios aquí pactados. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA:** El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal,

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: **A)** Estudios y documentos previos. **B)** Documento soportes del contrato. **C)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **D)** Registro Presupuestal. **E)** Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. **F)** Actas, informes y demás documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. **G)** Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. **H).** Modificaciones transaccionales que se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. **I).** Propuesta del oferente **SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS. CLÁUSULA VIGÉSIMA: - GARANTIAS:** Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

a) **De cumplimiento** cuyo valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).
b) **De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales** del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015)

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a publicar en la PLATAFORMA SECOP II el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados y notificar a la SNR de su publicación para su posterior aprobación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete a publicar en la PLATAFORMA SECOP II, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - PENAL PECUNIARIA: a.)** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a **LA SUPERINTENDENCIA** a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. **b.)** Igualmente, frente al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - MULTAS: a)**. con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. **b)**. La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. **c).** La imposición de multas no impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. **d).** El contratista autoriza a **la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar. **CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA TERCERA: - CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la póliza de garantía dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del **SECOP II** por la **SUPERINTENDENCIA. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.** El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del **SECOP II.** Para su ejecución requerirá: **1).** Expedición del Registro presupuestal; **2).** Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II. **3).** Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalización requerirá, **4).** Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes señalados.

Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda – Ordenador del Gasto.
Revisó y Aprobó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor de Despacho.
Revisó: Héctor Iván Suárez Betancur – Dirección de Contratación.
Proyectó: Daniel Palacios – Abogado de la Dirección de Contratación. Daniel Palacios

ACTA DE INICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1707 de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TOTALL INC SAS BIC
NIT: 901.620.351-9

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Oficinas de Instrumentos Públicos de Frontino Antioquia, Pereira Risaralda, Cali Valle del Cauca, Sevilla Valle del Cauca, EL Bordo Cauca, Istmina Choco.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $373.103.235.89
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 362623 del 13 de julio de 2023

El día 31 de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron **ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI** en su calidad de supervisor del contrato y **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** en su calidad de contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato de interventoría No. 1707 de 2023.**

Objeto: CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACION 1

Se firma en Bogotá D.C., para los fines pertinentes el día 31 de Julio de 2023.

Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Supervisor
Profesional Universitario
Grupo de Infraestructura

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Interventor
C.C. 79.553.539

Bogotá D.C, diciembre 21 de 2023

La suscrita Contadora de la empresa **TOTALL INC SAS BIC con NIT. 901.620.351-9**

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en los resultados de mi revisión, informo que la Compañía se encuentra debidamente afiliada a las entidades que administran los riesgos de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y que durante el periodo de seis meses, pagó cumplidamente los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal TOTALL INC SAS BIC


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.101.836

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8050610393E9E7760E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO							X											230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(5)**																						$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$63,500		$0	$0		$2,846,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,813,600	$11,100	$0	$1,824,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$7,300	$0	$1,212,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$2,000	$0	$322,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$1,800	$0	$289,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$63,500	$400	$0	$63,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$63,500	$400	$0	$63,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$484,800	$3,100	$0	$487,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$2,000	$0	$322,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$500	$0	$72,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**5**	**$2,846,700**	**$17,500**	**$0**	**$2,864,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																														
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Total			**Afiliados(5)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$465,200	$500	$0	$465,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$465,200	$500	$0	$465,700
TOTAL				**5**	**$465,200**	**$500**	**$0**	**$465,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649890	3	CONSORCIO TIG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	228499304	9457375884	E	2023/10/23	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,891,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,528,000	$0	$0	$2,528,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$864,000	$0	$0	$864,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$632,000	$0	$0	$632,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$416,000	$0	$0	$416,000
TOTAL				**7**	**$4,891,800**	**$0**	**$0**	**$4,891,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																			0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT	X																	230201	6	$300,000	$48,000	EPS005	6	$300,000	$12,000	CCF22	6	$300,000	$12,000	14-4	6	$300,000	0.522%	$1,600	6	$0	$0	Si	$73,600
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA	X																	231001	25	$1,250,000	$200,000	EPS017	25	$1,250,000	$50,000	CCF22	25	$1,250,000	$50,000	14-4	25	$1,250,000	0.522%	$6,600	25	$0	$0	Si	$306,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA	X																	230301	10	$666,667	$106,700	EPS018	10	$666,667	$26,700	CCF22	10	$666,667	$26,700	14-4	10	$666,667	6.960%	$46,500	10	$0	$0	Si	$206,600
5	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO	X																	231001	5	$391,667	$62,700	EPS002	5	$391,667	$15,700	CCF22	5	$391,667	$15,700	14-4	5	$391,667	6.960%	$27,300	5	$0	$0	Si	$121,400
6	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total			**Afiliados(6)**																				$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$865,400	$0	$0	$865,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$262,700	$0	$0	$262,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$554,700	$0	$0	$554,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$48,000	$0	$0	$48,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$283,000	$0	$0	$283,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$283,000	$0	$0	$283,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$262,800	$0	$0	$262,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$50,000	$0	$0	$50,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$26,700	$0	$0	$26,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,700	$0	$0	$15,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$12,000	$0	$0	$12,000
TOTAL				**6**	**$1,674,000**	**$0**	**$0**	**$1,674,000**

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 07:13:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8909576336

Fecha limite de pago: 2023-12-20

GUARDADA 04/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMENQUE				
Documento	CC11807075	**Dirección**	CR 49 # 25 56		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2692788		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11807075	GUERRERO PALOMEQUE DAVID ANTONIO	59	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 7.100	$ 343.800

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																								$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT		X															X		23020 1	5	$250,000	$40,000	EPS005	5	$250,000	$10,000	CCF22	5	$272,917	$11,000	14-4	5	$250,000	0.522%	$1,400	5	$0	$0	Si	$62,400
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
4	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO	X																		23030 1	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$52,800	CCF22	22	$1,320,000	$52,800	14-4	22	$1,320,000	6.960%	$91,900	22	$0	$0	Si	$408,700
5	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	72261222	FERRIGNO RIVAS MAURY JAVIER	X	X															X		23100 1	9	$750,000	$120,000	EPS037	9	$750,000	$30,000	CCF22	9	$781,250	$31,300	14-4	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$233,500
7	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	X																		25-14	14	$793,334	$127,000	EPS037	14	$793,334	$31,800	CCF22	14	$793,334	$31,800	14-4	14	$793,334	6.960%	$55,300	14	$0	$0	Si	$245,900
8	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
9	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																			23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
10	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA	X																		23020 1	25	$1,333,334	$213,400	EPS017	25	$1,333,334	$53,400	CCF22	25	$1,333,334	$53,400	14-4	25	$1,333,334	6.960%	$92,900	25	$0	$0	Si	$413,100
Total			**Afiliados(10)**																					$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,095,600	$0	$0	$2,095,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$736,000	$0	$0	$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$127,000	$0	$0	$127,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$979,200	$0	$0	$979,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$253,400	$0	$0	$253,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$805,400	$0	$0	$805,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$805,400	$0	$0	$805,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$572,700	$0	$0	$572,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$572,700	$0	$0	$572,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$570,400	$0	$0	$570,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$113,400	$0	$0	$113,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$61,800	$0	$0	$61,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$0	$0	$94,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$62,800	$0	$0	$62,800
TOTAL				**10**	**$4,044,100**	**$0**	**$0**	**$4,044,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS		R																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
6	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
7	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
8	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	25	$966,667	6.960%	$67,300	0	$0	$0	No	$67,300
Total			**Afiliados(8)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$591,900	$0	$0	$591,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$591,900	$0	$0	$591,900
TOTAL				**8**	**$591,900**	**$0**	**$0**	**$591,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
6	CC	1070821027	CORREA IZQUIERDO MANUEL VICENTE	X																	23020 1	20	$773,334	$123,800	EPSIC3	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
7	CC	1123314923	GERMAN PATIÑO JULY VANESSA	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
8	CC	1006846598	GONZALEZ GASCA JESUS ALEXIS	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
9	CC	5250677	PABON DIAZ ALCIDES MILCIADES	X																	23030 1	20	$773,334	$123,800	ESSC18	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
10	CC	1121712338	SUAREZ GASCA EVER HERNAN	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
Total			**Afiliados(10)**																				$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,469,800	$0	$0	$2,469,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$0	$0	$1,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$852,400	$0	$0	$852,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$411,800	$0	$0	$411,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$349,200	$0	$0	$349,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$349,200	$0	$0	$349,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$649,100	$0	$0	$649,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$31,000	$0	$0	$31,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$133,300	$0	$0	$133,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**10**	**$4,117,200**	**$0**	**$0**	**$4,117,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
3	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO																			23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
6	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
7	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES		X																X	23030 1	21	$1,960,000	$313,600	EPS008	21	$1,960,000	$78,400	CCF22	21	$2,391,667	$95,700	14-4	21	$1,960,000	6.960%	$136,500	21	$0	$0	Si	$624,200
8	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA		X																X	23020 1	15	$800,000	$128,000	EPS017	15	$800,000	$32,000	CCF22	15	$888,889	$35,600	14-4	15	$800,000	6.960%	$55,700	15	$0	$0	Si	$251,300
Total			**Afiliados(8)**																					$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,937,600	$5,700	$0	$1,943,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,000	$1,800	$0	$617,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,000	$800	$0	$272,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$921,600	$2,700	$0	$924,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$128,000	$400	$0	$128,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				8	$530,800	$1,900	$0	$532,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$78,400	$300	$0	$78,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,000	$300	$0	$92,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$68,000	$200	$0	$68,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$300	$0	$80,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$300	$0	$94,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$72,000	$300	$0	$72,300
TOTAL				**8**	**$3,772,800**	**$11,500**	**$0**	**$3,784,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
5	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total			**Afiliados(7)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
TOTAL				**7**	**$610,100**	**$1,800**	**$0**	**$611,900**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 16 - 11 - 2023

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1

LUGAR DE EJECUCION: ITSMINA -CHOCO

CONTRATO DE OBRA N°	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2.089.847.608,73
		ADICION	$ -
		VALOR TOTAL	$ 2.089.847.608,73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	TOTALLINC		

A LOS 31 DIAS DE JULIO DEL 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR DE OBRAY FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ EN CALIDAD DE CONTRATISTA DE OBRA , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL									CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN		CANT			VR. UNITARIOINCREMENTADO 20%	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1,00	PRELIMINARES				modif			$ 22.487.611,00				$ 3.939.001,00	$ 2.110.279,00			$ 24.316.331,99	
1,01	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	UN	se realizo	2,00	1,00	104.236,00	$ 52.117,97	$ 104.236,00		1,00			$ 52.118,00		1,00	$ 52.117,97	
1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	M	se realizo pero no se a terminado en su totalida	50,00		367.265,00	$ 7.345,30	$ 367.265,00							50,00	$ 367.265,00	
1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	UN	se realizo pero no se a terminado en su totalida	5,00	7,00	85.689,00	$ 17.137,85	$ 85.689,00	2,00			$ 34.276,00			7,00	$ 119.964,95	
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	8,00			$ 11.086,15	$ 88.689,00		8,00			$ 88.689,00				No aplica, se verrifico en sitio
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	se realizo	7,00	2,00	199.552,00	$ 28.507,42	$ 199.552,00							7,00	$ 199.551,94	
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	M2	se realizo	15,00	11,20		$ 21.176,23	$ 317.643,00		3,80			$ 80.470,00		11,20	$ 237.173,78	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	UN	se realizo	7,00	2,00	180.248,00	$ 25.749,70	$ 180.248,00							7,00	$ 180.247,90	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	UN	se realizo	7,00	2,00	167.711,00	$ 23.958,65	$ 167.711,00							7,00	$ 167.710,55	
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	se realizo	50,00		502.035,00	$ 10.040,69	$ 502.035,00							50,00	$ 502.034,50	
1,27	DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	M	se realizo	30,00		223.111,00	$ 7.437,02	$ 223.111,00							30,00	$ 223.110,60	
1,29	DESMONTE DE VIDRIO	M2	se realizo	8,00		43.079,00	$ 5.384,90	$ 43.079,00							8,00	$ 43.079,20	
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	se realizo se desmontaron dos y falta una.	2,00	3,00		$ 50.912,57	$ 101.825,00	1,00			$ 50.913,00			3,00	$ 152.737,71	
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	8,00			$ 20.964,55	$ 167.716,00		8,00			$ 167.716,00				No aplica, se verrifico en sitio
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	se realizo	5,00		164.716,00	$ 32.943,29	$ 164.716,00							5,00	$ 164.716,45	
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	no se ha realizado	60,00	no		$ 11.570,66	$ 694.240,00							60,00	$ 694.239,60	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	se realizo	30,00			$ 16.215,86	$ 486.476,00	157,00			$ 2.545.890,00			187,00	$ 3.032.365,82	cantidad verificada en sitio adicional
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	4,00			$ 41.710,37	$ 166.841,00		4,00			$ 166.841,00				No aplica, se verrifico en sitio
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	4,00			$ 51.212,45	$ 204.850,00		4,00			$ 204.850,00				No aplica, se verrifico en sitio
1,40		M	se realizo	12,00	4,50		$ 36.959,33	$ 443.512,00		7,50			$ 277.195,00		4,50	$ 166.316,99	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	se realizo	50,00	85,00		$ 16.215,86	$ 810.793,00	35,00			$ 567.555,00			85,00	$ 1.378.348,10	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	M2	se realizo	30,00	35,00		$ 21.979,44	$ 659.383,00	5,00			$ 109.897,00			35,00	$ 769.280,40	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	M2	se realizo	2,00		71.955,00	$ 35.977,37	$ 71.955,00							2,00	$ 71.954,74	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	se realizo	80,00		1.084.366,00	$ 13.554,58	$ 1.084.366,00							80,00	$ 1.084.366,40	
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	M2	se realizo	30,00	38,00		$ 23.153,09	$ 694.593,00	8,00			$ 185.225,00			38,00	$ 879.817,42	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	M	se realizo	77,00	110,00		$ 7.104,22	$ 547.025,00	33,00			$ 234.439,00			110,00	$ 781.464,20	mayor cantidad verificada en sitio
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	no se ha realizado	9,00	no		$ 27.890,02	$ 251.010,00							9,00	$ 251.010,18	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	UN	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	1,00			$ 101.787,50	$ 101.788,00		1,00			$ 101.788,00				No aplica, se verrifico en sitio
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	no se ha realizado	5,00	no		$ 142.401,84	$ 712.009,00							5,00	$ 712.009,20	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	se realizo	1,00		517.621,00	$ 517.621,10	$ 517.621,00							1,00	$ 517.621,10	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	M2	no se ha realizado	210,00	no		$ 19.547,47	$ 4.104.969,00							210,00	$ 4.104.968,70	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	se realizo	60,00	73,00		$ 16.215,86	$ 972.952,00	13,00			$ 210.806,00			73,00	$ 1.183.757,78	
1,67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	se esta realizo	78,00	35,00		$ 32.303,54	$ 2.519.676,00							78,00	$ 2.519.676,12	
1,68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	KG	pendiente	250,00	no		$ 1.901,59	$ 475.398,00							250,00	$ 475.397,50	
1,69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	KG	pendiente	100,00	no		$ 1.879,25	$ 187.925,00							100,00	$ 187.925,00	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	50,00			$ 19.412,23	$ 970.612,00		50,00			$ 970.612,00				No aplica, se verrifico en sitio
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	pendiente	20,00	no	no	$ 154.805,11	$ 3.096.102,00							20,00	$ 3.096.102,20	
2,00	CARPINTERÍA EN MADERA							$ 9.031.987,00				$ 2.645.979,00	$ 2.039.959,00			$ 9.638.005,59	
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	no se ha realizado	1,00	no	no	$ 1.048.623,91	$ 1.048.624,00							1,00	$ 1.048.623,91	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	M	no se ha realizado	1,00	4,00	no	$ 881.992,94	$ 881.993,00	3,00			$ 2.645.979,00			4,00	$ 3.527.971,76	REVISAR CANTIDAD EN SITIO
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	no se ha realizado	8,00	6,00		$ 633.627,62	$ 5.069.021,00		2,00			$ 1.267.255,00		6,00	$ 3.801.765,72	
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	no se ha realizado	8,00	6,00		$ 209.940,70	$ 1.679.526,00		2,00			$ 419.881,00		6,00	$ 1.259.644,20	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	M2	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	2,00			$ 99.489,60	$ 198.979,00		2,00			$ 198.979,00				
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	no se ha realizado	1,00			$ 153.844,32	$ 153.844,00		1,00			$ 153.844,00				
3,00	CARPINTERÍA METÁLICA							$ 11.256.609,00				$ 265.431,00	$ 8.903.740,00			$ 2.618.299,33	
3,01	BARANDA TUBO CUADRADO	M	no se ha realizado	12,00			$ 143.347,34	$ 1.720.168,00		12,00			$ 1.720.168,00				

CONTRACTUAL									CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN		CANT			VR. UNITARIOINCREMENTADO 20%	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	no se ha realizado	15,00			$ 376.260,02	$ 5.643.900,00		15,00			$ 5.643.900,00				
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	se realizo	4,00	5,00		$ 265.431,43	$ 1.061.726,00	1,00			$ 265.431,00			5,00	$ 1.327.157,15	
3,19	REJILLA DE PISO 30CM	M2	no se ha realizado	5,00	no		$ 126.256,54	$ 631.283,00							5,00	$ 631.282,70	
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	no se ha realizado	10,00	3,00		$ 219.953,16	$ 2.199.532,00		7,00			$ 1.539.672,00		3,00	$ 659.859,48	
4,00	**CIELORRASOS**							**$ 9.453.335,00**				**$ 8.318.935,00**				**$ 17.772.269,33**	
4,01	CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM	M2	pendiente se ha realizado una parte	25,00	47,00		$ 378.133,39	$ 9.453.335,00	22,00			$ 8.318.935,00			47,00	$ 17.772.269,33	
5,00	**CONCRETO Y MORTEROS**							**$ 3.434.509,00**				**$ 1.117.067,00**				**$ 4.551.575,42**	
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	M2	pendiente se ha realizado una parte	60,00	87,00	2.482.372,00	$ 41.372,86	$ 2.482.372,00	27,00			$ 1.117.067,00			87,00	$ 3.599.438,82	
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	pendiente se ha realizado una parte	20,00		952.137,00	$ 47.606,83	$ 952.137,00							20,00	$ 952.136,60	
6,00	**CUBIERTAS**							**$ 17.902.804,00**					**$ 12.600.619,00**			**$ 5.302.184,40**	
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	M	no se ha realizado	60,00	no		$ 58.360,18	$ 3.501.611,00							60,00	$ 3.501.610,80	
6,18	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	M	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	60,00	no		$ 99.353,18	$ 5.961.191,00		60,00			$ 5.961.191,00				**No aplica, se verrifico en sitio**
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	M	no se ha realizado	20,00	no		$ 90.028,68	$ 1.800.574,00							20,00	$ 1.800.573,60	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M	no se ha realizado	60,00	no		$ 43.610,78	$ 2.616.647,00		60,00			$ 2.616.647,00				
6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS	UN	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	1,00	no		$ 4.022.780,83	$ 4.022.781,00		1,00			$ 4.022.781,00				**No aplica, se verrifico en sitio**
7,00	**ENCHAPE MUROS**							**$ 7.450.355,00**				**$ 2.107.396,00**				**$ 9.557.751,42**	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	M2	no se ha realizado	40,00	274,00		$ 9.044,62	$ 361.785,00	233,00			$ 2.107.396,00			273,00	$ 2.469.181,26	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	se utilizo la de 30 x 45 CM	80,00	95,00	6.742.619,00	$ 84.282,74	$ 6.742.619,00							80,00	$ 6.742.619,20	
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	M2	se realizo	4,00	no		$ 86.487,74	$ 345.951,00							4,00	$ 345.950,96	
9,00	**ESTRUCTURA EN MADERA**							**$ 4.353.206,00**					**$ 4.353.206,00**				
9,01	ESCALERAS EN MADERA	M2	Se cambio por una tipo gato esta en los no previsto	6,00	no		$ 725.534,38	$ 4.353.206,00		6,00			$ 4.353.206,00				**No aplica, se verrifico en sitio**
10,00	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							**$ 7.612.872,00**					**$ 3.636.380,00**			**$ 3.976.491,10**	
10,01	GRANIPLAS	M2	no se ha realizado	220,00	100,00	n0	$ 30.303,17	$ 6.666.697,00		120,00			$ 3.636.380,00		100,00	$ 3.030.317,00	
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	M2	no se ha realizado	20,00	no		$ 18.385,58	$ 367.712,00							20,00	$ 367.711,60	
10,06	LAVADO FACHADA	M2	no se ha realizado	35,00	no		$ 16.527,50	$ 578.463,00							35,00	$ 578.462,50	
11,00	**IMPERMEABILIZACIÓN**							**$ 11.705.598,00**					**$ 9.965.685,00**			**$ 1.739.913,14**	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	M	se realizo	40,00	si		$ 26.565,84	$ 1.062.634,00							40,00	$ 1.062.633,60	
11,06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	M2	no se ha realizado	220,00	14,00	no	$ 48.377,11	$ 10.642.964,00		206,00			$ 9.965.685,00		14,00	$ 677.279,54	cantidad verificada en sitio acorde
12,00	**MAMPOSTERÍA**							**$ 13.780.559,00**					**$ 5.406.002,00**			**$ 8.374.557,08**	
12,01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	40,00	no		$ 60.735,70	$ 2.429.428,00		40,00			$ 2.429.428,00				
12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2	se realizo	70,00	50,00		$ 148.828,68	$ 10.418.008,00		20,00			$ 2.976.574,00		50,00	$ 7.441.434,00	
12,12	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	M2	se realizo	4,00		933.123,00	$ 233.280,77	$ 933.123,00							4,00	$ 933.123,08	
13,00	**PINTURAS**							**$ 6.268.067,00**								**$ 6.268.066,70**	
13,01	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M	pendiente	12,00			$ 17.585,90	$ 211.031,00							12,00	$ 211.030,80	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	pendiente	215,00			$ 28.172,26	$ 6.057.036,00							215,00	$ 6.057.035,90	
14,00	**PISOS**							**$ 15.619.598,00**				**$ 6.697.810,00**				**$ 22.317.407,27**	
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	se realizo	120,00	187,00		$ 87.014,59	$ 10.441.751,00	67,27			$ 5.853.471,00			187,27	$ 16.295.222,27	Cantidad verificada en sitio acorde
14,12	POYO COCINA 55X10CM	M	se realizo	4,00		393.038,00	$ 98.259,50	$ 393.038,00							4,00	$ 393.038,00	
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	se realizo	40,00		1.914.058,00	$ 47.851,44	$ 1.914.058,00							40,00	$ 1.914.057,60	
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	se realizo	85,00	110,00		$ 33.773,54	$ 2.870.751,00	25,00			$ 844.339,00			110,00	$ 3.715.089,40	
15,00	**RED ELÉCTRICA**							**$ 8.615.937,00**				**$ 3.027.888,00**	**$ 1.022.793,00**			**$ 10.621.032,27**	
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	UN	se contempla el cambio de 20 lampara de las 22	7,00	22,00		$ 201.859,22	$ 1.413.015,00	15,00			$ 3.027.888,00			22,00	$ 4.440.902,84	**INCLUIR LUMINARIAS RESTANTE**
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	se realizo	10,00			$ 136.967,54	$ 1.369.675,00							10,00	$ 1.369.675,40	
15,31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	se realizo	10,00	3,00		$ 146.113,30	$ 1.461.133,00		7,00			$ 1.022.793,00		3,00	$ 438.339,90	
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UN	se realizo	10,00	no		$ 152.504,86	$ 1.525.049,00							10,00	$ 1.525.048,60	
15,33	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC	UN	no se contempla	10,00	no		$ 145.578,22	$ 1.455.782,00							10,00	$ 1.455.782,20	
15,34	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	UN	se realizo	10,00	no		$ 12.055,18	$ 120.552,00							10,00	$ 120.551,80	
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	UN	se realizo	7,00	no		$ 153.204,58	$ 1.072.432,00							7,00	$ 1.072.432,06	**PENDIENTE VERIFICACION**
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	se realizo	1,00	no		$ 198.299,47	$ 198.299,00							1,00	$ 198.299,47	
16,00	**RED HIDRÁULICA**							**$ 12.085.041,00**					**$ 250.477,00**			**$ 11.834.564,25**	
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	se realizo	5,00			$ 39.971,06	$ 199.855,00							5,00	$ 199.855,30	
16,08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	se realizo	1,00			$ 38.060,06	$ 38.060,00							1,00	$ 38.060,06	
16,09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	se realizo	1,00			$ 38.837,40	$ 38.837,00							1,00	$ 38.837,40	
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	UN	se realizo	1,00			$ 42.626,47	$ 42.626,00							1,00	$ 42.626,47	
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	se realizo	1,00			$ 39.654,72	$ 39.655,00							1,00	$ 39.654,72	
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	no se ha realizado	4,00			$ 88.970,28	$ 355.881,00							4,00	$ 355.881,12	
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	no se ha realizado	4,00			$ 250.477,42	$ 1.001.910,00		1,00			$ 250.477,00		3,00	$ 751.432,26	
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	no se ha realizado	1,00			$ 1.012.614,79	$ 1.012.615,00							1,00	$ 1.012.614,79	
16,22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	no se ha realizado	1,00			$ 522.088,73	$ 522.089,00							1,00	$ 522.088,73	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	no se ha realizado	1,00			$ 115.538,47	$ 115.538,00							1,00	$ 115.538,47	
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UN	no se ha realizado	1,00			$ 623.189,45	$ 623.189,00							1,00	$ 623.189,45	
16,25	MOTOBOMBA 2,0 HP	UN	no se ha realizado	1,00			$ 1.062.087,94	$ 1.062.088,00							1,00	$ 1.062.087,94	
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	no se ha realizado	1,00			$ 183.654,74	$ 183.655,00							1,00	$ 183.654,74	
16,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	M	no se ha realizado	4,00			$ 1.289.147,66	$ 5.156.591,00							4,00	$ 5.156.590,64	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	no se ha realizado	4,00	no		$ 338.116,46	$ 1.352.466,00							4,00	$ 1.352.465,84	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	se realizo	4,00			$ 84.996,58	$ 339.986,00							4,00	$ 339.986,32	
17,00	**RED SANITARIA**							**$ 4.951.422,00**				**$ 864.970,00**	**$ 383.597,00**			**$ 5.432.794,35**	
17,02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN	se realizo	2,00	3,00		$ 864.970,34	$ 1.729.941,00	1,00			$ 864.970,00			3,00	$ 2.594.911,02	
17,06	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6"	M	no va, la quitaron de la ejecucion y del acta	4,00			$ 95.899,27	$ 383.597,00		4,00			$ 383.597,00				**No aplica, se verrifico en sitio**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	no se ha realizado	30,00	no		$ 20.928,10	$ 627.843,00							30,00	$ 627.843,00	
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	se realizo	1,00			$ 776.371,00	$ 776.371,00							1,00	$ 776.370,50	
17,29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	se realizo	1,00			$ 1.433.669,83	$ 1.433.670,00							1,00	$ 1.433.669,83	
18,00	**URBANISMO**							**$ 1.573.020,00**								**$ 1.573.019,60**	
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2	no se ha realizado	10,41	no		$ 151.106,59	$ 1.573.020,00							10,41	$ 1.573.019,60	**PENDIENTE POR DEFINIR**
19,00	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**							**$ 3.564.536,00**				**$ 45.908,00**				**$ 3.610.442,34**	
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	no se ha realizado	1,00	pendiente		$ 524.416,03	$ 524.416,00							1,00	$ 524.416,03	
19,02	AVISO ORIP 1,60X0,60X0,15	UN	no se ha realizado	1,00	pendiente		$ 1.771.033,66	$ 1.771.034,00							1,00	$ 1.771.033,66	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	no se ha realizado	20,00	pendiente		$ 19.589,81	$ 391.796,00							20,00	$ 391.796,20	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	no se ha realizado	1,00	2,00		$ 45.907,51	$ 45.908,00	1,00			$ 45.908,00			2,00	$ 91.815,02	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	no se ha realizado	1,00	pendiente		$ 205.270,80	$ 205.271,00							1,00	$ 205.270,80	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	no se ha realizado	1,00	pendiente		$ 626.110,63	$ 626.111,00							1,00	$ 626.110,63	
20,00	**NO PREVISTOS**													**$ 14.518.360,00**		**$ 14.518.360,30**	
NP-01	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	no se ha realizado				$ 95.532,68				12,00			$ 1.146.392,00	12,00	$ 1.146.392,12	Accesoriosn de baño
NP-02	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M	no se ha realizado				$ 47.184,85				61,89			$ 2.920.275,00	61,89	$ 2.920.275,45	Para mejorar el desague de cubierta
NP-02	ESCALERA TIPO GATO	M	no se ha realizado				$ 140.776,28				4,00			$ 563.105,00	4,00	$ 563.105,13	Para accesibilidad al tanque de

CONTRACTUAL									CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN		CANT			VR. UNITARIOINCREMENTADO 20%	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
NP-03	ALISTADO DE PISO 4CM	M2	se realizo				$ 45.352,00				147,00			$ 6.666.744,00	147,00	$ 6.666.744,00	Para nivelación de piso y mejor
NP-04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposicion final)	M3	se realizo				$ 46.111,00				15,00			$ 691.665,00	15,00	$ 691.665,00	Para la instalacion de red sanitaria en baterías nuevas
NP-05	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	M3	se realizo				$ 95.354,00				15,00			$ 1.430.310,00	15,00	$ 1.430.310,00	
NP-06	TUBERIA SANITARIA DE 2"(incluye accesorios)	ML	se realizo				$ 28.069,00				25,00			$ 701.725,00	25,00	$ 701.725,00	para el mejoramiento del suelo y
NP-07	TUBERIA SANITARIA DE 3" (incluye accesorios)	ML	se realizo				$ 39.814,36				10,00			$ 398.144,00	10,00	$ 398.143,60	para desagues re rejillas
NP-08	TUBERIA SANITARIA DE 4" (incluye accesorios)	ML	se realizo				$ 50.949,00				25,00			$ 1.273.725,00	25,00	$ 1.273.725,00	para puntos sanitarios nuevos
NP-10	PUNTOS DESAGUES 3"	UND	se realizo				$ 97.501,00				5,00			$ 487.505,00	5,00	$ 487.505,00	para rejillas y lava traperos
NP-11	PUNTOS DESAGUES 4"	UND	se realizo				$ 98.653,00				6,00			$ 591.918,00	6,00	$ 591.918,00	para desagues de baterias
NP-12	RED SUMINSTRIO DE 1/2" (incluye accesorios)	ML	se realizo				$ 6.124,00				20,00			$ 122.480,00	20,00	$ 122.480,00	para la conexxión de puntos de
NP-13	REGISTRO RED WHITE 3/4" (incluye accesorios)	UND	se realizo				$ 101.480,00				5,00			$ 507.400,00	5,00	$ 507.400,00	para control de agu en baterias en
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE DIMENSIONES 15X15 CMS	UND	no se ha realizado				$ 35.202,00				5,00			$ 176.010,00	5,00	$ 176.010,00	para llaves de registro
NP-15	SUMINISTRO SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UND	no se ha realizado				$ 367.265,00				3,00			$ 1.101.795,00	3,00	$ 1.101.795,00	bateria sanitaria nuevas
NP-16	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (incluye tuberia cobre hasta 3m	UN	no se ha realizado				$ 468.339,85				1,00			$ 468.340,00	1,00	$ 468.339,85	para la nueva oficina de el registrador
NP-17	ACABDOS EN MUROS ESTUCO PLASTICO	M2	no se ha realizado				$ 34.560,00				70,00			$ 2.419.200,00	70,00	$ 2.419.200,00	para obra de acabdos en muros
NP-18	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO,	M2	se realizo				$ 6.540,00				187,00			$ 1.222.980,00	187,00	$ 1.222.980,00	
NP-19	Suministro e instalcion de puerta correditza 1,50*2,10 (ALUMINIO ANONISADO Y PANELES EN VIDRIO, INCLUYE INSTALACION, TODOS LOS ACCESORIOS)	UN	no se ha realizado				$ 1.380.366,00				1,00			$ 1.380.366,00	1,00	$ 1.380.366,00	
NP-20	Suministro e instalación de salida lógica para voz y datos sencillo categoria 6A. Incluye: Jack RJ-45 color azul (Autoponchable), tapa abatible para protección al polvo, faceplate sencillo, canaleta plastica y caja con tapa.	UND	ya esta en proceso				$ 149.275,00				4,00			$ 597.100,00	4,00	$ 597.100,00	
NP-21	SUMINISTRO SANITARIO ALONGADO TIPO CORONA Y ACOPLE	UND	no se ha realizado				$ 1.390.256,00				1,00			$ 1.390.256,00	1,00	$ 1.390.256,00	
NP-22	REPOSICIO DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	M2	se realizo				$ 116.938,00				30,00			$ 3.508.140,00	30,00	$ 3.508.140,00	
NP-23	Suministro, transporte e instalación de canaleta plastica (20 x 8) cm con división. Incluye: tapa tornillo, elementos de fijación en pared y demás accesorios para su correcta instalación	ML	ya esta en proceso				$ 136.630,00				45,00			$ 6.148.350,00	45,00	$ 6.148.350,00	
NP-24	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	UND	no se ha realizado				$ 88.008,00				4,00			$ 352.032,00	4,00	$ 352.032,00	
NP-26	MOVIMIENTO DE ARCHIVOS DE OFICINA	UND	se realizo acarreo interno														
NP-27	RED SUMINISTRO DE 3/4" (incluye accesorios)	ML	se realizo acarreo interno				$ 8.676,00				25,00			$ 216.900,00	25,00	$ 216.900,00	
NP-29	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE TERMINALES RJ45 Y MARCACION	ML	no se ha realizado				$ 4.808,00				70,00			$ 336.560,00	70,00	$ 336.560,00	
NP-30	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	UND	no se ha realizado				$ 55.075,00				4,00			$ 220.300,00	4,00	$ 220.300,00	
NP-31	MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CM 5 mm DE 6X2,35 (Incluye alambre negro N. 18)	KG	se realizo				$ 8.214,00				54,00			$ 443.556,00	54,00	$ 443.556,00	
NP-32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEMNTANA EN ALUMINIO ANONIZADO	M2	no se ha realizado														
NP-33																	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ 171.147.066,00**				**$ 29.030.385,00**	**$ 50.672.737,00**	**$ 14.518.360,00**		**$ 186.324.122,74**	
	ADMINISTRACIÓN	**%**		**23,0%**				$ 39.363.825,00				$ 6.676.989,00	$ 11.654.730,00	$ 3.339.223,00		$ 42.854.548,23	
	IMPREVISTOS	**%**		**1,0%**				$ 1.711.471,00				$ 290.304,00	$ 506.727,00	$ 145.184,00		$ 1.863.241,23	
	UTILIDAD	**%**		**5,0%**				$ 8.557.353,00				$ 1.451.519,00	$ 2.533.637,00	$ 725.918,00		$ 9.316.206,14	
	IVA SOBRE UTILIDAD	**%**		**19,0%**				$ 1.625.897,00				$ 275.789,00	$ 481.391,00	$ 137.924,00		$ 1.770.079,17	
	COSTO TOTAL OBRA							**$ 222.405.612,00**				**$ 37.724.986,00**	**$ 65.849.222,00**	**$ 18.866.609,00**		**$ 242.128.197,49**	
	VALOR TOTAL OBRA							**$ 222.405.612,00**								**$ 242.128.197,49**	
	SALDO POR AJUSTAR															**$ 19.722.585,49**	

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRATISTA

ARQ.FERNANDO JIMENEZ
INTERVENTORIA (SI APLICA)

FERNANDO SANCHEZ
Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 11
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Versión: 01
	FORMATO: JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

JUSTIFICACIÓN ACTA No.1
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
LUGAR DE EJECUCION ISTMINA

CONTRATO DE OBRA N°	1674 DE 2023	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$2,089,847,608.73
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)- AGRUPACION 1	
INTERVENTORIA:	TOTALLINC S.A.S		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR. CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
1	**PRELIMINARES**					
1.01	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	UN	2.00	2.00	100%	
1.02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	M	50.00	50.00	100%	
1.03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	UN	5.00	5.00	100%	
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	8.00			No aplica
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	7.00	7.00	100%	
1.18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	M2	15.00	15.00	100%	
1.21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	UN	7.00	7.00	100%	
1.22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	UN	7.00	7.00	100%	
1.26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	50.00	50.00	100%	
1.27	DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	M	30.00	30.00	100%	
1.29	DESMONTE DE VIDRIO	M2	8.00	8.00	100%	
1.33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	2.00	2.00	100%	
1.34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	8.00			No aplica
1.35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	5.00	5.00	100%	
1.36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	60.00	60.00	100%	
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	30.00	157.00	523%	Mayor cantidad instalada en sitio
1.38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	4.00			No aplica
1.39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	4.00			No aplica
1.40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	12.00	12.00	100%	
1.44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	50.00	50.00	100%	
1.45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	M2	30.00	30.00	100%	
1.46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	M2	2.00	2.00	100%	
1.47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	80.00	80.00	100%	
1.49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	M2	30.00	30.00	100%	
1.50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	M	77.00	110.00	143%	Mayor cantidad instalada en sitio
1.51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	9.00	9.00	100%	
1.52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	UN	1.00			No aplica
1.56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	5.00	5.00	100%	
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	1.00	100%	
1.58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	M2	210.00	210.00	100%	
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	60.00	60.00	100%	
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	78.00	78.00	100%	
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	KG	250.00	250.00	100%	
1.69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	KG	100.00	100.00	100%	
1.73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	50.00			No aplica
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	20.00	20.00	100%	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					
2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	1.00	1.00	100%	
2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	M	1.00	1.00	100%	
2.14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	8.00	8.00	100%	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
OBRA						
2.16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	8.00	8.00	100%	
2.17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	M2	2.00	2.00	100%	
2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	1.00	1.00	100%	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
3.01	BARANDA TUBO CUADRADO	M	12.00	12.00	100%	
3.08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	15.00	15.00	100%	
3.14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	4.00	4.00	100%	
3.19	REJILLA DE PISO 30CM	M2	5.00	5.00	100%	
3.20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	10.00			No aplica
4	**CIELORRASOS**					
4.01	CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM	M2	25.00	25.00	100%	
5	**CONCRETO Y MORTEROS**					
5.02	PAÑETE MUROS 1:3	M2	60.00	60.00	100%	
5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	20.00	20.00	100%	
6	**CUBIERTAS**					
6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	M	60.00	60.00	100%	
6.18	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	M	60.00			No aplica
6.20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	M	20.00	20.00	100%	
6.21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M	60.00			No aplica
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS	UN	1.00			No aplica
7	**ENCHAPE MUROS**					
7.04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	M2	40.00	40.00	100%	
7.05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	80.00	88.00	110%	Mayor cantidad instalada en sitio
7.07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	M2	4.00	4.00	100%	
9	**ESTRUCTURA EN MADERA**					
9.01	ESCALERAS EN MADERA	M2	6.00			No aplica para las instalaciones
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					
10.01	GRANIPLAS	M2	220.00	93.43	42%	Menor cantidad instalado en sitio
10.04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	M2	20.00	20.00	100%	
10.06	LAVADO FACHADA	M2	35.00	35.00	100%	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					
11.05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	M	40.00	20.00	50%	Menor cantidad instalado en sitio
11.06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	M2	220.00	14.00	6%	Menor cantidad instalado en sitio
12	**MAMPOSTERÍA**					
12.01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	M	40.00			No aplica
12.09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2	70.00	70.00	100%	
12.12	MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	M2	4.00	4.00	100%	
13	**PINTURAS**					
13.01	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M	12.00	12.00	100%	
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	215.00	185.00	86%	Menor cantidad instalado en sitio
14	**PISOS**					
14.05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	120.00	185.79	155%	Mayor cantidad instalada en sitio
14.12	POYO COCINA 55X10CM	M	4.00	4.00	100%	
14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	40.00	40.00	100%	
14.16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	85.00	85.00	100%	
15	**RED ELÉCTRICA**					
15.10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	UN	7.00	7.00	100%	
15.30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	10.00	10.00	100%	
15.31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	10.00	10.00	100%	
15.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UN	10.00	10.00	100%	
15.33	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC	UN	10.00	10.00	100%	
15.34	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	UN	10.00	10.00	100%	
15.35	CAMBIO SALIDA TOMA	UN	7.00	7.00	100%	
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1.00	1.00	100%	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
OBRA						
16	**RED HIDRÁULICA**					
16.07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	5.00	5.00	100%	
16.08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	1.00	1.00	100%	
16.09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	1.00	1.00	100%	
16.10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	UN	1.00	1.00	100%	
16.11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	1.00	1.00	100%	
16.18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	4.00	4.00	100%	
16.19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	4.00	3.00	75%	Menor cantidad verificada en sitio
16.21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1.00	1.00	100%	
16.22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	1.00	100%	
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1.00	1.00	100%	
16.24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	1.00	100%	
16.25	MOTOBOMBA 2,0 HP	UN	1.00	1.00	100%	
16.26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	1.00	1.00	100%	
16.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	M	4.00	3.80	95%	Menor cantidad instalado en sitio
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	4.00	4.00	100%	
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	4.00	4.00	100%	
17	**RED SANITARIA**					
17.02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN	2.00	2.00	100%	
17.06	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6"	M	4.00			No aplica
17.19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	M	30.00	30.00	100%	
17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1.00	1.00	100%	
17.29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	1.00	1.00	100%	
18	**URBANISMO**					
18.03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2	10.41			No aplica
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	1.00	1.00	100%	
19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00	1.00	100%	
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	20.00	20.00	100%	
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	1.00	1.00	100%	
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	1.00	1.00	100%	
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	1.00	1.00	100%	
	NO PREVISTOS					
NP-01	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN		12.00		
NP-02	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M		31.89		
NP-03	ESCALERA TIPO GATO	M		4.00		
NP-04	ALISTADO DE PISO 4CM	M2		127.00		
NP-05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposicion final)	M3		10.50		
NP-06	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3		10.50		
NP-07	TUBERIA SANITARIA DE 2"(incluye accesorios)	ML		25.00		
NP-08	TUBERIA SANITARIA DE 3" (incluye accesorios)	ML		10.00		
NP-09	TUBERIA SANITARIA DE 4" (incluye accesorios)	ML		22.00		
NP-10	PUNTOS DESAGUES 3"	UND		1.00		
NP-11	PUNTOS DESAGUES 4"	UND		4.00		
NP-12	RED SUMINSTRIO DE 1/2" (incluye accesorios)	ML		20.00		
NP-13	REGISTRO RED WHITE 3/4" (incluye accesorios)	UND		5.00		
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE DIMENSIONES 20X20 CMS	UND		5.00		
NP-15	SUMINISTRO SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UND		3.00		
NP-16	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (incluye recarga gas refrigerante R-401 o el que corresponda, punta agua, punto electrico, tuberia cobre hasta 3m	UN		1.00		
NP-17	ACABDOS EN MUROS ESTUCO PLASTICO	M2		62.00		
NP-18	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		157.00		
NP-19	Suministro e instalcion de puerta corrediza 1,50*2,10 (ALUMINIO ANONISADO Y PANELES EN VIDRIO, INCLUYE INSTALACION, TODOS LOS	M2		3.15		
NP-20	Suministro e instalación de salida lógica para voz y datos sencillo categoria 6A. Incluye: Jack RJ-45 color azul (Autoponchable), tapa abatible para protección al polvo, faceplate sencillo, canaleta plastica y caja con tapa.	UND		4.00		
NP-21	SUMINISTRO SANITARIO ALONGADO TIPO CORONA Y ACOPLE	UND		1.00		
NP-22	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=15CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2		30.00		

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
NP-23	Suministro, transporte e instalación de canaleta plastica (20 x 8) cm con división. Incluye: tapa tornillo, elementos de fijación en pared y demás accesorios para su correcta instalación	ML		10.00		
NP-24	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre	UND		4.00		
NP-25	TUBERÍA PVCP 3/4"	ML		25.00		
NP-26	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE TERMINALES RJ45 Y MARCACION	ML		70.00		
NP-27	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	UND		4.00		

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMNIO SANCHEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA: TOTALLINC

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI

SUPERVISOR/ FUNCIONARIO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN ORCINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *UN*

1.01

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	OFICINAS	2.00								2.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN ORCINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M*

1.02

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	OFICINAS	50.00								50.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN ORCINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *UN*

1.03

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	b	TOTAL
DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	OFICINAS	5.00								5.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN ORCINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC — SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* — UNIDAD: *UN*

1.07

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	b	TOTAL	CROQUIS
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	COCINA , BAÑOS	7.00								7.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN ORCINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *UN*

1.18

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DESMONTE VENTANA METÁLICA	OFICINAS, PASILLO	15.00								15.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN ORCINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *UN*

1.21

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	BAÑOS, OFICINAS	7.00								7.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN ORCINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *UN*

1.22

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	b	TOTAL	CROQUIS
DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	OFINAS	7.00								7.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN ORCINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M*

1.26

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	BAÑOS, COCINA	50.00								50.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC — SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* — UNIDAD: *M*

1.27

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	BAÑOS, COCINA	30.00								30.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M*

1.29

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DESMONTE DE VIDRIO	OFICINAS	8.00								8.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *UN*

1.33

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	OFINAS	2.00								2.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *UN*

1.35

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	ARCHIVO	2.00								2.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M2*

1.37

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	PASILLO, BAÑOS	30.00								30.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M*

1.4

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	COCINA	12.00								12.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M2*

1.44

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	COCINA, OFICINAS	50.00								50.00

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 09 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M2*

1.45

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	COCINA,OFICINA Y BAÑOS	30.00								30.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC — SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* — UNIDAD: *M2*

1.46

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	COCINA	2.00								2.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M*

1.47

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
REGATA SOBRE MURO+RESANE	MUROS	80.00								80.00

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 09 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M2*

1.49

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	PACILLOS Y BAÑOS	30.00								30.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M*

1.50

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	OFICINAS	77.00								77.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *GLB*

1.57

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA		1.00								1.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* UNIDAD *M2*

1.66

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	BAÑOS	60.00								60.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC — SUPERVISOR SNR

ITEM: *PRELIMINARES* — UNIDAD: *M3*

1.67

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	ANDEN	78.00								78.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *CARPINTERÍA METÁLICA* UNIDAD *UN*

3.14

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	PASILLO	4.00								4.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *CIELORASOS* UNIDAD *M2*

4.01

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
CIELORRASO EN ACRILICO 1.20X0.60CM	OFICINAS	20.00								20.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: 5.02 CONCRETO Y MORTEROS UNIDAD M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
PAÑETE MUROS 1:3	MUROS EN GENERAL	60.00								60.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *CONCRETO Y MORTEROS* UNIDAD *M2*

5.03

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	BAÑOS Y COCINA	20.00								20.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *ENCHAPE MUROS* UNIDAD *M2*

7.04

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	BAÑOS, COCINA, PISO Y PARE EN GENERAL	40.00								40.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *ENCHAPE MUROS* UNIDAD *M2*

7.05

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
CERÁMICA FORMATO 25X35CM	PISO EN GENERAL	80.00								80.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *FACHADAS Y REVESTIMIENTOS* UNIDAD *M2*

10.01

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
GRANIPLAS	BAÑOS Y COCINA	40.78								40.78

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *MANPOSTERI* UNIDAD *M2*

12.09

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	BAÑOS,ARCHIVO, COCINA	70.00								70.00

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 09 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	

ITEM:	*MANPOSTERIA*	UNIDAD	*M*

12.12

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	L	a	h		
MESÓN EN CONCRETO 2500 PSI	COCINA	4.00								4.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* UNIDAD *UN*

15.30

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS	10.00								10.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC — SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* — UNIDAD: *UN*

15.31

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS	10.00								10.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* UNIDAD *UN*

15.32

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS	10.00								10.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* UNIDAD *UN*

15.34

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
TAPA INTERRUPTOR DOBLE	PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS	10.00								10.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* UNIDAD *UN*

15.35

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
CAMBIO SALIDA TOMA	PASILLOS, COCINA, OFICINA Y BAÑOS	7.00								7.00

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 09 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED ELÉCTRICA* UNIDAD *UN*

15.46

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	COCINA	1.00								1.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* UNIDAD *UN*

16.07

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	BAÑOS Y COCINA	5.00								5.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* UNIDAD *UN*

16.08

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	PATIO	1.00								1.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* UNIDAD *UN*

16.09

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	COCINA	1.00								1.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* UNIDAD *UN*

16.10

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	COCINA	1.00								1.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC — SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* — UNIDAD: *UN*

16.11

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	BAÑO	1.00								1.00

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 09 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No. 1674-2023 — CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA: TOTALLINC S.A.S. BIC — SUPERVISOR SNR

ITEM: *RED HIDRÁULICA* — UNIDAD: *UN*

16.33

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	BAÑOS	4.00								4.00

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 09 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR

ITEM:	RED SANITARIA	UNIDAD	UN

17.02

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL	CROQUIS
CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	PASILLO	2.00								2.00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	9	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR

ITEM:	RED SANITARIA	UNIDAD	M

17.03

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	PASILLO	4.00								12.00

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_PEREIRA - RISARALDA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	OBRA							
1	**PRELIMINARES**							**$15,276,286.61**
1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	30.00	30.00	30.00	$ 6,716.92	$201,507.60	
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2				$ 9,238.46		
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	24.00			$ 23,756.18		
1.08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	UN	1.00			$ 180,939.36		
1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	37.00			$ 17,401.86		
1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	M2	735.83	735.83	735.83	$ 8,067.36	$5,936,205.51	
1.20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN	1.00			$ 17,470.46		
1.26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	20.00			$ 8,367.24		
1.33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	35.00			$ 42,427.14		
1.34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	12.00			$ 17,470.46		
1.35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN				$ 27,452.74		
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	36.00			$ 13,513.22		
1.40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M				$ 30,799.44		
1.44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	100.00			$ 13,513.22		
1.47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	36.80			$ 11,295.48		
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	2.00			$ 431,350.92		
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	80.00	25.00	25.00	$ 13,513.22	$337,830.50	
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	30.00			$ 26,919.62		
1.73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	200.00			$ 16,176.86		
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	45.00	45.00	45.00	$ 129,004.26	$5,805,191.70	
1.75	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=12M MOVIL	UN/DIA	15.00	15.00		$ 199,703.42	$2,995,551.30	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**							
2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	5.20			$ 873,853.26		
2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	UN	5.20			$ 734,994.12		
2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	4.00			$ 128,203.60		
2.19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	1.00			$ 102,508.00		
2.21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	UN	1.00			$ 210,108.08		
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**							
3.04	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	UN	2.00			$ 102,462.92		
3.05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00			$ 433,722.52		
3.11	DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	24.00			$ 1,073,133.32		
3.17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	M2	5.88			$ 1,175,903.96		
3.18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2				$ 225,480.36		
3.20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	8.00			$ 183,294.30		
4	**CIELORRASOS**							
4.06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	M2	120.00			$ 26,411.98		
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**							
5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	159.38			$ 39,672.36		
6	**CUBIERTAS**							
6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	M	30.00			$ 48,633.48		
7	**ENCHAPE MUROS**							
7.05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	80.00			$ 70,235.62		
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							**$12,672,087.53**
10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	1,600.00	637.64		$ 19,873.42	$12,672,087.53	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**							**$74,281,076.09**
11.03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	M2	563.31	447.15	447.15	$ 166,122.74	$74,281,076.09	

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_PEREIRA - RISARALDA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
12	**MAMPOSTERÍA**							
12.07	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	M2				$ 85,719.62		
13	**PINTURAS**							
13.04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	30.00			$ 18,086.88		
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	900.00			$ 23,476.88		
13.11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	M2	219.20			$ 15,784.86		
14	**PISOS**							
14.05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	356.90			$ 72,512.16		
14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	578.31			$ 39,876.20		
14.16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	153.70			$ 28,144.62		
15	**RED ELÉCTRICA**							
15.09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	38.00			$ 170,218.16		
15.11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	10.00			$ 96,919.06		
15.15	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	UN	5.00			$ 25,433.94		
15.16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	UN	5.00			$ 24,444.14		
15.25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	UN				$ 186,793.88		
15.29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	UN				$ 184,109.66		
15.30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	15.00			$ 114,139.62		
15.31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	15.00			$ 121,761.08		
15.40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN	8.00			$ 277,537.96		
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	4.00			$ 165,249.56		
15.50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN				$ 1,008,083.86		
16	**RED HIDRÁULICA**							
16.05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UN	8.00			$ 44,777.18		
16.07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	10.00			$ 33,309.22		
16.08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	1.00			$ 31,716.72		
16.09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	2.00			$ 32,364.50		
16.11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	12.00			$ 33,045.60		
16.19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	2.00			$ 208,731.18		
16.21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1.00			$ 843,845.66		
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1.00			$ 96,282.06		
16.26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	1.00			$ 153,045.62		
16.29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1.00			$ 550,763.92		
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	9.00			$ 281,763.72		
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	9.00			$ 70,830.48		
17	**RED SANITARIA**							
17.02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN				$ 720,808.62		
17.05	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4"	M	20.00			$ 51,868.46		
17.12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UN	4.00			$ 116,234.86		
17.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	8.00			$ 79,374.12		
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M	50.00			$ 28,143.64		
17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN				$ 646,975.42		
17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	12.00			$ 419,874.14		
17.29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	3.00			$ 1,194,724.86		
18	**URBANISMO**							
18.02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	M				$ 37,593.78		

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_PEREIRA - RISARALDA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN							
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	2.00			$ 437,013.36		
19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00			$ 1,475,861.38		
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	UN	50.00			$ 16,324.84		
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	5.00			$ 38,256.26		
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	5.00			$ 171,059.00		
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	2.00			$ 521,758.86		
20	NO PREVISTOS							
NP-01	DESMONTE MUEBLES DE COCINA	UN	5.20			$ 49,770.35		
NP-02	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	UN	6.00			$ 452,565.24		
NP-03	RETIRO DE GRAFITI	M2	30.00			$ 20,625.83		
NP-04	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	ML	26.82			$ 44,292.65		
NP-05	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	ML	5.06			$ 112,648.13		
NP-06	PINTURA ANTIGRAFITI	M2	120.00			$ 55,841.03		
	TOTAL COSTO DIRECTO							$102,229,450.23
	ADMINISTRACIÓN	%	23%					$ 23,512,773.55
	IMPREVISTOS	%	1%					$ 1,022,294.50
	UTILIDADES	%	5%					$ 5,111,472.51
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19%					$ 971,179.78
	VALOR TOTAL OBRA							$132,847,170.57

VALOR TOTAL ORIP PEREIRA - RISARALDA	$ 442,823,901.91

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73
VALOR ADICIÓN N°1	
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$132,847,170.57		30.00%	$132,847,170.57			$132,847,170.57	$ 309,976,731.34
2								
3								
4								
5								
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FRAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
Representante Legal
INTERVENTORIA

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº		1674 DE 2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS	NIT / C.C.	800205914-1
PLAZO	CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DIAS		FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA	31/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA	30/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.089.847.608,73	TOTAL ADICIONES		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.089.847.608,73

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (I3 ORIP)

CUADRO RESUMEN AGRUPACION 1

No	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	PACIFICO	VALLE	CALI
2		VALLE	SEVILLA
3		CAUCA	EL BORDO
4		CHOCO	ISTMINA
5	ANDINA	RISARALDA	PEREIRA
6		ANTIOQUIA	FRONTINO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FACTURA / CUENTA DE COBRO

FECHA DD-MM-AA	NÚMERO DE ACTA PARCIAL	No DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR	% TOTAL DE EJECUCION
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DECALI - VALLE	FVE-3765	PAGO PRIMER 30% CALI - VALLE	$ 225.513.788,01	$ -	$ 225.513.788,01	10,79%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE SEVILLA - VALLE	FVE-3767	PAGO PRIMER 30% SEVILLA - VALLE	$ 74.138.284,20	$ -	$ 74.138.284,20	3,55%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE EL BORDO - CAUCA	FVE-3768	PAGO PRIMER 30% EL BORDO - CAUCA	$ 63.728.057,39	$ -	$ 63.728.057,40	3,05%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE ISTMINA - CHOCO	FVE-3829	PAGO PRIMER30% ISTMINA - CHOCO	$ 66.721.683,61	$ -	$ 66.721.683,61	3,19%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE PEREIRA - RISARALDA	FVE-3825	PAGO PRIMER 30% PEREIRA - R4ISARALDA	$ 132.847.170,57	$ -	$ 132.847.170,57	6,36%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE FRONTINO - ANTIOQUIA	FVE-3824	PAGO PRIMER 30% FRONTINO - ANTIOQUIA	$ 64.005.298,84	$ -	$ 64.005.298,84	3,06%
		TOTALES		$ **626.954.282,62**	$0,00	**$626.954.282,62**	30,00%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CALIDAD DE INTERVENTOR/ DEL CONTRATO DE OBRA No 1674 DE 2023 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA 4° FORMA DE PAGO.
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN	1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 2. Copia de Acta de Recibop Parcial No 1 firmada por el contratista, la interventorioa y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría. 4. Copia del RUT contratista de obra. 5. Copia del Contrato de obra. 6. Copia del acta de inicio. 7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 8. Copias planillas de seguridad social. 9. Certificación bancada no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancada donde se debe consignar los dineros correspondientes. 10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisordel contrato de interventoría. 11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obray obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría. 12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS 27 (VEINTI SIETE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoria
TOTALL INC SAS BIC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Entre los suscritos, **WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la **SNR**, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución No. **10989** del 14 de septiembre de 2022, con la cual es se le delegó la Ordenación del Gasto, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra **TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9,** representado legalmente por **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** identificado con **C.C. No. 79553539,** designado por Documento Privado No. 1 del 10 de junio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de agosto de 2022 con el No. 02865410 del Libro IX, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **Contrato de Interventoría**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma Transaccional del **SECOP II** y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideración a lo siguiente: **1).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **2).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. **3).** Que previamente se realizó el **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 002 DE 2023,** cuyo objeto es: **"CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)". 4).** Que en el mencionado proceso se recibieron 4 propuestas de los siguientes interesados:

Referencia de oferta	Entidad
snrRAM	CONSORCIO NIORAM
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS CPM 002 DE 2023	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR
GRUCOING - SUPERNOTARIADO	GRUCOING S.A.S.
Oferta al proceso CPM 002 DE 2023 por TOTALL INC SAS BIC	TOTALL INC SAS BIC

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

5). Que conforme a lo anterior y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, dando el siguiente resultado:

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
1	CONSORCIO NIORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84.30
2	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que, como se evidencia en el Informe de Evaluación Definitivo se presenta un empate entre los proponentes

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que el Comité Técnico evaluador procedió a dar aplicación a los criterios de desempate señalados en el numeral 5.14 del Pliego de Condiciones Definitivo dando como resultado el siguiente orden de elegibilidad:

CRITERIOS DE DESEMPATE		
CERTIFICADOS	TOTALL INC SAS BIC	GRUCOING SAS
1.Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes e servicios extranjeros.	Servicios Nacionales	Servicios Nacionales
2.Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	SI	SI
3. Preferir la propuesta presentada por proponente que acredite en las condiciones establecidas en la Ley que por lo menos el 15 % de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 361 de 1997.	SI	SI
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobreviviencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.	SI	SI
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.	SI	NO
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	NO	NO
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las siguientes condiciones.	NO	NO
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales, o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
10. Preferir a oferente que acredite su acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) este conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual o sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.	SI	NO
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.	SI	NO

Que, una vez establecido lo anterior y teniendo en cuenta el numeral 5.12 del pliego de condiciones definitivo - MODO DE ADJUDICACIÓN - el comité evaluador en Comité de Contratación de fecha 6 de julio de 2023, recomendó al Secretario General y Ordenador del Gasto de la Superintendencia de Notariado y Registro, adjudicar el proceso **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 02 DE 2023.** cuyo objeto es "*CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O*

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)." de la siguiente manera:

AGRUPACIÓN 1
ADJUDICATARIO: TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351 9

AGRUPACIÓN 2
ADJUDICATARIO: GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9

6). Que conforme a lo anterior, resultó ganador de la **AGRUPACIÓN No. 1** el proponente **TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351-9** con **100** puntos y quien oferto un precio de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89),** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **7).** Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas. **CLÁUSULA PRIMERA: - A) OBJETO:** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 1". **B) ALCANCE DEL OBJETO:** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, según corresponda. La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.

El objetivo de la Interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuéstales, contables y financieros en el desarrollo del contrato. La Interventoría debe asumir una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos específicos de la Interventoría serán entre otros:

- **Absolver:** En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la Interventoría es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicación entre las partes.

- **Colaborar:** Teniendo en cuenta que la Interventoría y el Contratista conforman un equipo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista.

- **Controlar:** Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, control, verificación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidación.

- **Exigir:** La Interventora tiene la obligación de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

- **Prevenir:** El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.

- **Solicitar:** Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecución del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoría podrá implicar la modificación del contrato. Esta acción también se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

- **Verificar:** Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

- **Ley 1474 de 2011**

Artículo 84: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.

PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

- Ley 80 de 1993

ARTÍCULO 53. De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría.

CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: A) VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **B) PLAZO DEL CONTRATO:** El término de ejecución del presente contrato será el relacionado en el cuadro siguiente sin que exceda el **31 de diciembre de 2023.** Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo.

AGRUPACION	PLAZO DE EJECUCION
Agrupación 1	Cinco Meses

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El plazo de ejecución del contrato de obra por agrupación está programado de acuerdo al cuadro antes expuesto y los tiempos serán contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con la interventoría y la entidad, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II. **Parágrafo 1:** La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual debe ser firmada en compañía de la supervisión del contrato. **Parágrafo 2:** El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras, deben estar contemplados en los costos de la propuesta económica del oferente. **Parágrafo 3:** La INTERVENTORIA a las obras se realizará en una (1) etapa de acuerdo con las especificaciones de construcción y el presupuesto publicado por la entidad **CLÁUSULA TERCERA: - CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:** Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C-1209-0800-13-0-1209004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la vigencia 2023, según CDP No. 55723 del 10 de mayo de 2023, expedido por el responsable de presupuesto. **CLÁUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO**: La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el 100% del valor del contrato así:

PAGOS – ACTA PARCIAL 1

El primer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 30%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor de contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2

El segundo pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 60%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

TERCER PAGO –ACTA PARCIAL 3

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El tercer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 90%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

CUARTO PAGO-PAGO FINAL

Se efectuará el pago final del 10% del valor ejecutado del contrato restante, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Copia del Acta de recibo final firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoria
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuerta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y e visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Entregar Informe de intervenoria en medio magnético con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación de la obra.
13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificación).
14. Entregar Bitácora de obra escaneada en medio magnético.
15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los resultados obtenidos.
16. Entregar Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social.
17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.
18. Entregar planos record en medio magnético y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
19. Entregar memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
20. Entregar el Manual de operación y funcionamiento con los respectivos catálogos.
21. Entregar el Manual de mantenimiento
22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios públicos en aquellas oficinas que se cuente con las conexiones.
23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecución de las obras.
24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificación de calibración de los equipos utilizados.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Nota: La entidad no realizara adición en dinero, teniendo en cuenta que la interventoría contratada tiene un fin específico el cual es controlar obras desde el inicio hasta su culminación. En caso de ser necesario solo se adicionará en valor el contrato de interventoría proporcionalmente al valor adicionado en el contrato de obra y siempre y cuando haya disponibilidad de recursos. **Liquidación del contrato:** La liquidación del contrato se efectuará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes al recibo a satisfacción de las obras por parte de la interventoría y la supervisión del contrato y contempladas dentro del objeto contractual y su alcance. **CLÁUSULA QUINTA: - LUGAR DE EJECUCION:** Las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la ejecución de las obras son las siguientes:

AGRUPACION 1

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Frontino	Antioquia	Andina	Carrera 32 No. 30 - 34	$38.098.394,60
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Pereira	Risaralda	Andina	Avenida 30 de Agosto No. 37 - 24	$79.075.700,38
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Cali	Valle del cauca	Pacifico	Calle 3 a Norte No. 16 - 34	$134.235.550,23
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Sevilla	Valle del cauca	Pacifico	Calle 48 No. 49 - 31	$44.129.958,25
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
El Bordo	Cauca	Pacifico	Calle 6 No 6-54	$37.933.498,23

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Istmina	Choco	Pacifico	Carrera 5 A No. 25 - 18	$39.715.411,93

CLÁUSULA SEXTA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones: **1).** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2).** Está debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **3).** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **4).** Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **CLÁUSULA SÉPTIMA:- RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del objeto establecido en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA:- OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, El contratista se obliga para con la Superintendencia a: EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los Estudios Previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecución.
2. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.
3. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato o quien haga las veces.
4. Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de LA SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.
5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.
6. Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.
7. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.
8. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor de la entidad.
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
10. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
11. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
13. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.
14. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
16. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta.
17. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de interventoría, que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el supervisor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del supervisor.
18. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
19. Desarrollar la interventoría a las obras de manera que se evite a toda costa afectación a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algún inconveniente, el contratista será el responsable de solucionarlo.
20. La Interventoría debe verificar que el contratista implemente un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecución de las obras por motivo de lluvias, así como llevar el registro diario en bitácora del estado del clima.
21. La interventoría debe solicitar al contratista las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y así verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.
22. Todos los empleados a cargo del interventor y contratista deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo que se encuentren en la obra.
23. La interventoría verificara cada vez que entre un nuevo trabajador, que el mismo cuente con todos las afiliaciones de Ley.

CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a desarrollar las siguientes obligaciones específicas:

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA

1. Verificar y aprobar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y las que se establezcan conjuntamente con la visita adelantada previo al inicio de la ejecución de las obras y presentar un informe a la SUPERINTENDENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al mismo.
3. Suscribir las actas de mayores y menores cantidades y obra no prevista que sean necesarias, de modo que cada actividad no prevista y mayor cantidad de obra sea aprobada antes de su ejecución.
4. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones, así mismo verificará la calidad de los materiales utilizados por el contratista.
5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.
6. Revisar y dar el visto bueno en caso de haber cambios en la ejecución del contrato, previo visto bueno del Supervisor del contrato.
7. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
8. Realizar seguimiento detallado de la información contenida en los documentos enunciados, presentando un informe semanal a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el cumplimiento del cuadro de rendimientos, programaciones y todo lo relacionado en la correcta ejecución y avance del contrato, en caso de incumplimiento por parte del contratista deberá informarlo por escrito a la entidad y en caso de que afecte la normal ejecución del contrato sugerir los procedimientos sancionatorios que correspondan.
9. Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a os análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos y los respectivos análisis de precios unitarios. En caso de que la SUPERINTENDENCIA presente observaciones a los APU de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar as correcciones del caso.
10. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigicos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.
11. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual. conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Velar por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra.
13. Exigir al constructor cuando sea necesaria la realización de ensayos y pruebas.
14. Vigilar que el constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que considere oportuno.
15. Completar o introducir en caso de que sea necesario modificaciones al proyecto el interventor realizará los planos y especificaciones pendientes y cuidará en todo momento de que el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados.
16. Presentar informes mensuales a la Entidad donde se muestre el avance del contrato en donde se enuncie las conclusiones y recomendaciones. Cualquier variación al contrato previa su realización deberá ser consultada y aprobada por la Entidad contratante.
17. Revisar la bitácora de la obra, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución de las obras, todas las bitácoras serán administrada por la interventoría, y se enviará diariamente copia digital al supervisor del contrato, dicha bitácora será diligencia en el formato entregado por la entidad. De todos los trabajos el interventor dejará constancia escrita.
18. Presentar documentos necesarios para garantizar la realización de la interventoría de acuerdo con los protocolos Bioseguridad.
19. El Interventor Debe verificar que el contratista realice la entrega y socialización del **Manual de Mantenimiento** de las obras ejecutadas.
20. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

B. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

1. Solicitar a la SUPERINTEDENCIA la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.
2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
3. Revisar y aprobar el Cronograma y el flujo de fondos del contratista y remitirlos a la Superintendencia.
4. Velar por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado.
5. Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales.
6. Autorizar la contratación de la mano de obra de los diferentes capítulos del presupuesto y supervisará la administración de los subcontratos.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

7. La Interventoría estará pendiente que todos los trabajadores contratos cuenten con la capacitación y experiencia en acabados de obra, esto con el fin de desempeñar ls labores que conlleva este tipo de intervenciones.
8. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la ley.
9. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los presupuestos, especificaciones y contrato de construcción.
10. Verificar que la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
11. Estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras.
12. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la SUPERINTENDENCIA.
13. Programar y coordinar con el contratista y con la SUPERINTENDENCIA las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.
14. Elaborar con el contratista de la obra las actas de iniciación y las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, las cuales no deberán sobrepasar el valor de la obra, debidamente justificadas, cambio de especificaciones, entregas parciales, liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar, en coordinación con el contratista. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por la Secretaria General.
15. Legalizar las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, mensualmente ante la Supervisión, cuando se requiera, de acuerdo con el avance del contrato.
16. Mantener actualizada la documentación de los contratos.
17. Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales.
18. Cumplir con la entrega de los informes ejecutivos semanales, informes mensuales y finales requeridos por la SUPERINTEDENCIA en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato.
19. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

20. Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.

21. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.

22. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto a la SUPERINTEDENCIA para la resolución final de las mismas.

23. Suspender si es necesario el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión.

24. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además, elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la SUPERINTEDENCIA para su aprobación con una antelación mínima de 10 días a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas técnica, jurídica y económicamente.

25. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato

26. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

27. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

28. Realizar la interventoría de acuerdo con la Resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021 ANEXO – MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA y las que la modifiquen, adicionen o deroguen, de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se adopta el manual interno de Supervisión e interventoría de los Contratos que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro.

29. Presentar los informes y documentos necesarios para realizar la interventoría de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia y los formatos entregados por la supervisión del contrato.

30. Enviar en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), si el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor con el fin de informar a la Dirección de Contratación, para que se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados y este remitirlos a la Secretaría General. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

31. Elaborar el acta de terminación del contrato y el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de 15 días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la SUPERINTEDENCIA para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
32. Verificar que el contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
33. Revisar, aprobar y vigilar los Planes de Seguridad, higiene, y salud ocupacional de acuerdo con las Normas técnicas vigentes, presentado por el contratista y remitirlo aprobado a la supervisión.
34. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.
35. Llevar acabo lo establecido en la resolución 682 del 24 de abril de 2020 con relación al PAPSO.
36. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

C. INTERVENTORÍA FINANCIERA

Realizar el seguimiento a la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir, con el fin de tener herramientas para realizar las recomendaciones y ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de las obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de ejecución del contrato.

La interventoría deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios para realizar los pagos y realizar la revisión de los mismos, realizando y suscribiendo las certificaciones que correspondan.

D. INTERVENTORÍA LEGAL

Revisión de los documentos del contratista de obra, tales como, Contrato de obra, Pliegos de condiciones y en general de los documentos que hacen parte del contrato. Lo anterior, con el objeto de que sean conocidas las condiciones y obligaciones del contratista de obra y el personal vinculado y responsable de la ejecución del contrato.

Se debe mantener un estricto control y seguimiento a las garantías suscritas por el contratista, haciendo énfasis en la vigencia de las mismas, en concordancia con lo establecido en el contrato

de obra. Se revisará e informará a la Entidad oportunamente de las condiciones y vencimiento de las mismas.

Así mismo realizar la verificación del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que utilice el contratista en la ejecución de las obras.

De igual manera, realizar el seguimiento legal a la ejecución del contrato y asegurarse de que el contrato se cumpla en todos sus términos y condiciones. Esto incluye la revisión de los plazos de ejecución, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos legales.

Debe además realizar los informes, reportes y conceptos jurídicos y/o Legales que La Entidad solicite al Interventor, en relación con la ejecución del contrato. También debe informar a las partes sobre cualquier problema o incumplimiento detectado y proponer soluciones para corregirlos.

E. INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La interventoría deberá efectuar el seguimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por ellos mismos, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se deberá atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, entre otras.

Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigación (Ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y demás normas que amplíen o modifiquen la materia).

F. CONTROL DE COSTOS

Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua confrontación de este con las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que inciden en los costos se procura mantener una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados, una idea de las razones y de las medidas correctivas que se puedan tomar.

En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, sea necesario ejecutar otros ítems no

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos - del respectivo manual de Interventoría, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaría de obras.

En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información al Supervisor designado por la SNR, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la interventora del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prorrogas por retrasos en el cronograma.

Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993.

G. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Consiste en controlar la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de los de las actividades contratadas. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de las obras.

Indica las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas.

Las visitas serán programadas conjuntamente, con el contratista de obra, interventoría y la entidad.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Hacer seguimiento constante a la programación de la obra.

Llevar a cabo lo establecido en la resolución 682 de 24 de abril de 2020 con relación al (PAPSO).

H. RECOMENDACIONES

Liquidación del contrato de interventoría

El Supervisor procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

Inspección final de la obra

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra, 10 días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

Manual de Mantenimiento de obras ejecutadas

El Interventor deberá solicitar al contratista la entrega y socialización de un manual de mantenimiento de las obras ejecutadas, así cada oficina será responsable del cuidado de las obras ejecutadas

I. CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO

La Interventoría designará Ingenieros y/o Arquitectos, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al municipio que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, según resolución vigente.

La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del contratista.

El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesión en el territorio nacional.

El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada interventoría.

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños del proyecto, la normatividad vigente y demás obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoría que garanticen la correcta ejecución del proyecto.

Insumos.
La SNR entregará al **Interventor:**
Copia del Contrato de obra suscrito con el Contratista, así como los estudios y los documentos previos que lo soportan.

Productos
El interventor deberá solicitar al contratista:

- Hojas de vida del personal profesional.
- Relación del equipo mínimo obligatorio.
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
- Programa de Obra y flujo de inversiones
- Plan de manejo de tránsito- PMT.
- Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y escombreras que utilizará durante la Etapa de Construcción, así como también los permisos que sean necesarios utilizar.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Plan de manejo ambiental
- Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

J. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS:

Objetivo:

El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el **Contratista,** corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el **Contrato de Obra.**

Materiales:

El **Interventor** realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada por el **Contratista** cumple con los requerimientos contenidos en el **Contrato de Obra.**

Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos, acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el **Contratista.** En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el **Contratista** e **Interventoría,** primaran para efectos de la comprobación de las **Metas Físicas** y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta última.

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados (de existir) y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del **Proyecto** por parte del **Interventor,** éste deberá solicitar al **Contratista** los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el **Contrato de Obra,** o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Para adelantar dicha labor el **Interventor** deberá contar, entre otros y como mínimo, con los siguientes insumos:

- Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
- Realización y/o Revisión de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra.
- Visita de inspección a sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos fabricados fuera del área del proyecto.

Productos:

Los productos resultantes de este proceso, corresponderán a:

- Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoría.
- Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
- Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad, cuando sea necesario.
- Presentar informes de inspección a las instalaciones de fabricación
- Notificar al Contratista y a la Alcaldía respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos realizados.
- Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra
- Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

K. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo:

Verificar los procesos constructivos empleados por el **Contratista,** la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la **Programación de Obra y flujo de inversiones** y **Cronograma de Metas Físicas** entregados por el Contratista.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Reuniones semanales entre contratista e interventoría, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría interno de la SNR según resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021.

- Informes de Inspectoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoría.

- Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.

- Registro fotográfico y fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción del proyecto (antes - durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.

CLÁUSULA DÉCIMA: - OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA:
La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Aprobar la Garantía única del Contrato.
2. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
3. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.
4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
5. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor.
6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, por el Ordenador del Gasto exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
7. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.
8. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.
9. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.
10. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
12. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.
13. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.
14. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
15. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II.
16. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.
18. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar.
19. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.
20. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.
21. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.
22. Contratar un interventor para la vigilancia y verificación de la correcta ejecución del objeto del presente contrato
23. Las demás inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de Supervisión.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - SUPERVISION Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: A) SUPERVISOR: La supervisión, vigilancia en la ejecución y cumplimiento estricto del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Infraestructura de la SNR O quien haga sus veces o de quien designe el ordenador del gasto. **B) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 1).** Velar por

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

la correcta y oportuna ejecución del contrato. **2).** Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes de supervisión del contrato, así como actas y demás documentos que soporten la ejecución y seguimiento del contrato. **3).** Informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. **4).** Informar con la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, así como estado de las obligaciones económicas y del término de ejecución. **5).** Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecución del contrato. **6).** Verificar que el **CONTRATISTA** haya subido en la Plataforma Transaccional del SECOP II, todos los documentos requeridos para la legalización del contrato y los informes y soportes exigidos durante la ejecución del mismo. **7).** Allegar a la Dirección de Contratación original del acta de inicio dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación del acto administrativo de supervisión. **8)** Las demás que legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la **Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021**, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA**: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - CESIÓN:** Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia, al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PARÁGRAFO. -** Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes será la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecución del contrato, el Contratista preste sus servicios en otras partes del territorio nacional. **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: -EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y la **SUPERINTENDENCIA**, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogación diferente a los honorarios aquí pactados. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA:** El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal,

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: **A)** Estudios y documentos previos. **B)** Documento soportes del contrato. **C)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **D)** Registro Presupuestal. **E)** Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. **F)** Actas, informes y demás documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. **G)** Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. **H).** Modificaciones transaccionales que se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. **I).** Propuesta del oferente **SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS. CLÁUSULA VIGÉSIMA: - GARANTIAS:** Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

a) **De cumplimiento** cuyo valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).
b) **De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales** del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015)

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a publicar en la PLATAFORMA SECOP II el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados y notificar a la SNR de su publicación para su posterior aprobación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete a publicar en la PLATAFORMA SECOP II, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - PENAL PECUNIARIA: a.)** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a **LA SUPERINTENDENCIA** a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. **b.)** Igualmente, frente al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - MULTAS: a)**. con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. **b)**. La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. **c).** La imposición de multas no impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. **d).** El contratista autoriza a **la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar. **CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA TERCERA: - CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la póliza de garantía dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del **SECOP II** por la **SUPERINTENDENCIA. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.** El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del **SECOP II.** Para su ejecución requerirá: **1).** Expedición del Registro presupuestal; **2).** Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II. **3).** Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalización requerirá, **4).** Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes señalados.

Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda – Ordenador del Gasto.
Revisó y Aprobó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor de Despacho.
Revisó: Héctor Iván Suárez Betancur – Dirección de Contratación.
Proyectó: Daniel Palacios – Abogado de la Dirección de Contratación. Daniel Palacios

ACTA DE INICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1707 de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TOTALL INC SAS BIC
NIT: 901.620.351-9

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Oficinas de Instrumentos Públicos de Frontino Antioquia, Pereira Risaralda, Cali Valle del Cauca, Sevilla Valle del Cauca, EL Bordo Cauca, Istmina Choco.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $373.103.235.89
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 362623 del 13 de julio de 2023

El día 31 de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron **ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI** en su calidad de supervisor del contrato y **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** en su calidad de contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato de interventoría No. 1707 de 2023.**

Objeto: CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACION 1

Se firma en Bogotá D.C., para los fines pertinentes el día 31 de Julio de 2023.

Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Supervisor
Profesional Universitario
Grupo de Infraestructura

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Interventor
C.C. 79.553.539

Bogotá D.C, diciembre 21 de 2023

La suscrita Contadora de la empresa **TOTALL INC SAS BIC con NIT. 901.620.351-9**

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en los resultados de mi revisión, informo que la Compañía se encuentra debidamente afiliada a las entidades que administran los riesgos de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y que durante el periodo de seis meses, pagó cumplidamente los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal TOTALL INC SAS BIC


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.101.836

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8050610393E9E7760E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO							X											230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(5)**																						$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$63,500		$0	$0		$2,846,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,813,600	$11,100	$0	$1,824,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$7,300	$0	$1,212,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$2,000	$0	$322,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$1,800	$0	$289,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$63,500	$400	$0	$63,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$63,500	$400	$0	$63,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$484,800	$3,100	$0	$487,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$2,000	$0	$322,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$500	$0	$72,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**5**	**$2,846,700**	**$17,500**	**$0**	**$2,864,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																														
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Total			**Afiliados(5)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$465,200	$500	$0	$465,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$465,200	$500	$0	$465,700
TOTAL				**5**	**$465,200**	**$500**	**$0**	**$465,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649890	3	CONSORCIO TIG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	228499304	9457375884	E	2023/10/23	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,891,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,528,000	$0	$0	$2,528,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$864,000	$0	$0	$864,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$632,000	$0	$0	$632,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$416,000	$0	$0	$416,000
TOTAL				**7**	**$4,891,800**	**$0**	**$0**	**$4,891,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																			0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT	X																	230201	6	$300,000	$48,000	EPS005	6	$300,000	$12,000	CCF22	6	$300,000	$12,000	14-4	6	$300,000	0.522%	$1,600	6	$0	$0	Si	$73,600
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA	X																	231001	25	$1,250,000	$200,000	EPS017	25	$1,250,000	$50,000	CCF22	25	$1,250,000	$50,000	14-4	25	$1,250,000	0.522%	$6,600	25	$0	$0	Si	$306,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA	X																	230301	10	$666,667	$106,700	EPS018	10	$666,667	$26,700	CCF22	10	$666,667	$26,700	14-4	10	$666,667	6.960%	$46,500	10	$0	$0	Si	$206,600
5	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO	X																	231001	5	$391,667	$62,700	EPS002	5	$391,667	$15,700	CCF22	5	$391,667	$15,700	14-4	5	$391,667	6.960%	$27,300	5	$0	$0	Si	$121,400
6	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total			**Afiliados(6)**																				$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$865,400	$0	$0	$865,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$262,700	$0	$0	$262,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$554,700	$0	$0	$554,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$48,000	$0	$0	$48,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$283,000	$0	$0	$283,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$283,000	$0	$0	$283,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$262,800	$0	$0	$262,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$50,000	$0	$0	$50,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$26,700	$0	$0	$26,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,700	$0	$0	$15,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$12,000	$0	$0	$12,000
TOTAL				**6**	**$1,674,000**	**$0**	**$0**	**$1,674,000**

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 07:13:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8909576336

Fecha limite de pago: 2023-12-20

GUARDADA 04/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMENQUE				
Documento	CC11807075	**Dirección**	CR 49 # 25 56		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2692788		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11807075	GUERRERO PALOMEQUE DAVID ANTONIO	59	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 7.100	$ 343.800

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																								$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT		X															X		23020 1	5	$250,000	$40,000	EPS005	5	$250,000	$10,000	CCF22	5	$272,917	$11,000	14-4	5	$250,000	0.522%	$1,400	5	$0	$0	Si	$62,400
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
4	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO	X																		23030 1	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$52,800	CCF22	22	$1,320,000	$52,800	14-4	22	$1,320,000	6.960%	$91,900	22	$0	$0	Si	$408,700
5	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	72261222	FERRIGNO RIVAS MAURY JAVIER	X	X															X		23100 1	9	$750,000	$120,000	EPS037	9	$750,000	$30,000	CCF22	9	$781,250	$31,300	14-4	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$233,500
7	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	X																		25-14	14	$793,334	$127,000	EPS037	14	$793,334	$31,800	CCF22	14	$793,334	$31,800	14-4	14	$793,334	6.960%	$55,300	14	$0	$0	Si	$245,900
8	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
9	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																			23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
10	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA	X																		23020 1	25	$1,333,334	$213,400	EPS017	25	$1,333,334	$53,400	CCF22	25	$1,333,334	$53,400	14-4	25	$1,333,334	6.960%	$92,900	25	$0	$0	Si	$413,100
Total			**Afiliados(10)**																					$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,095,600	$0	$0	$2,095,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$736,000	$0	$0	$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$127,000	$0	$0	$127,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$979,200	$0	$0	$979,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$253,400	$0	$0	$253,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$805,400	$0	$0	$805,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$805,400	$0	$0	$805,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$572,700	$0	$0	$572,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$572,700	$0	$0	$572,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$570,400	$0	$0	$570,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$113,400	$0	$0	$113,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$61,800	$0	$0	$61,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$0	$0	$94,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$62,800	$0	$0	$62,800
TOTAL				**10**	**$4,044,100**	**$0**	**$0**	**$4,044,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS		R																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
6	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
7	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
8	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	25	$966,667	6.960%	$67,300	0	$0	$0	No	$67,300
Total			**Afiliados(8)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$591,900	$0	$0	$591,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$591,900	$0	$0	$591,900
TOTAL				8	$591,900	$0	$0	$591,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
6	CC	1070821027	CORREA IZQUIERDO MANUEL VICENTE	X																	23020 1	20	$773,334	$123,800	EPSIC3	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
7	CC	1123314923	GERMAN PATIÑO JULY VANESSA	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
8	CC	1006846598	GONZALEZ GASCA JESUS ALEXIS	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
9	CC	5250677	PABON DIAZ ALCIDES MILCIADES	X																	23030 1	20	$773,334	$123,800	ESSC18	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
10	CC	1121712338	SUAREZ GASCA EVER HERNAN	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
Total			**Afiliados(10)**																				$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,469,800	$0	$0	$2,469,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$0	$0	$1,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$852,400	$0	$0	$852,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$411,800	$0	$0	$411,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$349,200	$0	$0	$349,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$349,200	$0	$0	$349,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$649,100	$0	$0	$649,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$31,000	$0	$0	$31,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$133,300	$0	$0	$133,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**10**	**$4,117,200**	**$0**	**$0**	**$4,117,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
3	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO																			23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
6	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
7	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES		X																X	23030 1	21	$1,960,000	$313,600	EPS008	21	$1,960,000	$78,400	CCF22	21	$2,391,667	$95,700	14-4	21	$1,960,000	6.960%	$136,500	21	$0	$0	Si	$624,200
8	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA		X																X	23020 1	15	$800,000	$128,000	EPS017	15	$800,000	$32,000	CCF22	15	$888,889	$35,600	14-4	15	$800,000	6.960%	$55,700	15	$0	$0	Si	$251,300
Total			**Afiliados(8)**																					$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,937,600	$5,700	$0	$1,943,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,000	$1,800	$0	$617,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,000	$800	$0	$272,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$921,600	$2,700	$0	$924,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$128,000	$400	$0	$128,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				8	$530,800	$1,900	$0	$532,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$78,400	$300	$0	$78,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,000	$300	$0	$92,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$68,000	$200	$0	$68,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$300	$0	$80,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$300	$0	$94,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$72,000	$300	$0	$72,300
TOTAL				**8**	**$3,772,800**	**$11,500**	**$0**	**$3,784,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
5	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total			**Afiliados(7)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
TOTAL				**7**	**$610,100**	**$1,800**	**$0**	**$611,900**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 2

20 de noviembre de 2023

LUGAR DE EJECUCION: PEREIRA-RISARALDA

CONTRATO DE OBRA N°	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2.089.847.608,73
		ADICION	$ -
		VALOR TOTAL	$ 2.089.847.608,73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA	TOTALLINC		

A LOS 31 DIAS DE JULIO DEL 2023. SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR DE OBRAY FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ EN CALIDAD DE CONTRATISTA DE OBRA . CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES				$ 30.904.422,50				$ 202.892,34	$ 4.654.299,93			$ 26.453.014,91	
1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	60,00	$ 6.716,92	$ 403.015,20		30,00			$ 201.507,60		30,00	$ 201.507,60	La cantidad es inferior a la contractual, se observa que la actividad esta para realizarla en el auditorio del primer piso
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	30,00	$ 9.238,46	$ 277.153,80		30,00			$ 277.153,80				
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	24,00	$ 23.756,18	$ 570.148,32							24,00	$ 570.148,32	
1.08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	UN	1,00	$ 180.939,36	$ 180.939,36							1,00	$ 180.939,36	
1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	30,00	$ 17.401,86	$ 522.055,80	7,00			$ 121.813,02			37,00	$ 643.868,82	
1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	M2	834,50	$ 8.067,36	$ 6.732.211,92		98,67			$ 796.006,41		735,83	$ 5.936.205,51	Se verifica que el area a intervenir es inferior a la inicialmente contratada
1.20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN	1,00	$ 17.470,46	$ 17.470,46							1,00	$ 17.470,46	
1.26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	20,00	$ 8.367,24	$ 167.344,80							20,00	$ 167.344,80	
1.33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	35,00	$ 42.427,14	$ 1.484.949,90							35,00	$ 1.484.949,90	
1.34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	140,00	$ 17.470,46	$ 2.445.864,40		128,00			$ 2.236.218,88		12,00	$ 209.645,52	Se verifico en sitio y es menor cantidad ya que no se requiere el desmonte de
1.35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	25,00	$ 27.452,74	$ 686.318,50		25,00			$ 686.318,50				No aplica, se verifico en sitio
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	30,00	$ 13.513,22	$ 405.396,60	6,00			$ 81.079,32			36,00	$ 486.475,92	Se requiere
1.40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	10,00	$ 30.799,44	$ 307.994,40		10,00			$ 307.994,40				No aplica, se verifico en sitio
1.44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	100,00	$ 13.513,22	$ 1.351.322,00							100,00	$ 1.351.322,00	
1.47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	50,00	$ 11.295,48	$ 564.774,00		13,20			$ 149.100,34		36,80	$ 415.673,66	La cantidad es inferior a la contractual.
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	2,00	$ 431.350,92	$ 862.701,84							2,00	$ 862.701,84	
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	80,00	$ 13.513,22	$ 1.081.057,60							80,00	$ 1.081.057,60	Las Cantidades son mayores medida verificada en sitio
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	30,00	$ 26.919,62	$ 807.588,60							30,00	$ 807.588,60	
1.73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	200,00	$ 16.176,86	$ 3.235.372,00							200,00	$ 3.235.372,00	
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	45,00	$ 129.004,26	$ 5.805.191,70							45,00	$ 5.805.191,70	

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1.75	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=12M MOVIL	UN/DIA	15,00	$ 199.703,42	$ 2.995.551,30							15,00	$ 2.995.551,30	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**				**$ 9.191.436,85**								**$ 9.191.436,86**	
2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	5,20	$ 873.853,26	$ 4.544.036,95							5,20	$ 4.544.036,95	
2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	UN	5,20	$ 734.994,12	$ 3.821.969,42							5,20	$ 3.821.969,42	
2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	4,00	$ 128.203,60	$ 512.814,40							4,00	$ 512.814,40	
2.19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	1,00	$ 102.508,00	$ 102.508,00							1,00	$ 102.508,00	
2.21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	UN	1,00	$ 210.108,08	$ 210.108,08							1,00	$ 210.108,08	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 43.319.156,58**				**$ 549.882,90**	**$ 9.094.521,76**			**$ 34.774.517,72**	
3.04	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	UN	2,00	$ 102.462,92	$ 204.925,84							2,00	$ 204.925,84	
3.05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 433.722,52	$ 433.722,52							1,00	$ 433.722,52	
3.11	DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	27,00	$ 1.073.133,32	$ 28.974.599,64		3,00			$ 3.219.399,96		24,00	$ 25.755.199,68	
3.17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	M2	8,00	$ 1.175.903,96	$ 9.407.231,68		2,12			$ 2.492.916,40		5,88	$ 6.914.315,28	
3.18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	15,00	$ 225.480,36	$ 3.382.205,40		15,00			$ 3.382.205,40				La Cantidad es menor, no se requiere cambio de ventanas
3.20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	5,00	$ 183.294,30	$ 916.471,50	3,00			$ 549.882,90			8,00	$ 1.466.354,40	Se verifico en sitio y es mayor cantidad
4	**CIELORRASOS**				**$ 2.641.198,00**				**$ 528.239,60**				**$ 3.169.437,60**	
4.06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	M2	100,00	$ 26.411,98	$ 2.641.198,00	20,00			$ 528.239,60			120,00	$ 3.169.437,60	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**				**$ 5.950.854,00**				**$ 372.194,59**				**$ 6.323.048,59**	
5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	150,00	$ 39.672,36	$ 5.950.854,00	9,38			$ 372.194,59			159,38	$ 6.323.048,59	
6	**CUBIERTAS**				**$ 2.431.674,00**					**$ 972.669,60**			**$ 1.459.004,40**	
6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	M	50,00	$ 48.633,48	$ 2.431.674,00		20,00			$ 972.669,60		30,00	$ 1.459.004,40	Se realiza sondeo de bajantes y se verifica que no se requiere cambio en todas las
7	**ENCHAPE MUROS**				**$ 8.428.274,40**					**$ 2.809.424,80**			**$ 5.618.849,60**	
7.05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	120,00	$ 70.235,62	$ 8.428.274,40		40,00			$ 2.809.424,80		80,00	$ 5.618.849,60	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**				**$ 31.797.472,00**								**$ 31.797.472,00**	
10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	1.600,00	$ 19.873,42	$ 31.797.472,00							1.600,00	$ 31.797.472,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**				**$ 84.981.748,87**				**$ 8.596.851,79**				**$ 93.578.600,67**	
11.03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	M2	511,56	$ 166.122,74	$ 84.981.748,87	51,75			$ 8.596.851,79			563,31	$ 93.578.600,67	Es mayor la cantidad según verificacion en sitio, algunas zonas de cubierta
12	**MAMPOSTERÍA**				**$ 1.714.392,40**					**$ 1.714.392,40**				
12.07	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	M2	20,00	$ 85.719,62	$ 1.714.392,40		20,00			$ 1.714.392,40				No aplica, se verrifico en sitio
13	**PINTURAS**				**$ 24.039.527,40**				**$ 1.092.312,31**				**$ 25.131.839,71**	
13.04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	30,00	$ 18.086,88	$ 542.606,40							30,00	$ 542.606,40	
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	900,00	$ 23.476,88	$ 21.129.192,00							900,00	$ 21.129.192,00	
13.11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	M2	150,00	$ 15.784,86	$ 2.367.729,00	69,20			$ 1.092.312,31			219,20	$ 3.460.041,31	
14	**PISOS**				**$ 46.941.857,90**				**$ 7.274.274,62**	**$ 949.909,30**			**$ 53.266.223,22**	
14.05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	370,00	$ 72.512,16	$ 26.829.499,20		13,10			$ 949.909,30		356,90	$ 25.879.589,90	
14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	398,50	$ 39.876,20	$ 15.890.665,70	179,81			$ 7.170.139,52			578,31	$ 23.060.805,22	Aumenta cantidad porque se cubra el area que presentaba filtraciones en la
14.16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	150,00	$ 28.144,62	$ 4.221.693,00	3,70			$ 104.135,09			153,70	$ 4.325.828,09	
15	**RED ELÉCTRICA**				**$ 23.653.166,32**				**$ 510.654,48**	**$ 10.057.137,30**			**$ 14.106.683,50**	
15.09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	35,00	$ 170.218,16	$ 5.957.635,60	3,00			$ 510.654,48			38,00	$ 6.468.290,08	Se mantiene la misma cantidad contractual
15.11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	10,00	$ 96.919,06	$ 969.190,60							10,00	$ 969.190,60	Se mantiene la misma cantidad contractual

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
15.15	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	UN	5,00	$ 25.433,94	$ 127.169,70							5,00	$ 127.169,70	Se mantiene la misma cantidad contractual
15.16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	UN	5,00	$ 24.444,14	$ 122.220,70							5,00	$ 122.220,70	Se mantiene la misma cantidad contractual
15.25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	UN	15,00	$ 186.793,88	$ 2.801.908,20		15,00			$ 2.801.908,20				No aplica, se verrifico en sitio
15.29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	UN	6,00	$ 184.109,66	$ 1.104.657,96		6,00			$ 1.104.657,96				No aplica, se verrifico en sitio
15.30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	15,00	$ 114.139,62	$ 1.712.094,30							15,00	$ 1.712.094,30	
15.31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	15,00	$ 121.761,08	$ 1.826.416,20							15,00	$ 1.826.416,20	
15.40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN	12,00	$ 277.537,96	$ 3.330.455,52		4,00			$ 1.110.151,84		8,00	$ 2.220.303,68	Solo se requiere la cantidad final para las cafeterias y baños autorizados con tomas
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	4,00	$ 165.249,56	$ 660.998,24							4,00	$ 660.998,24	
15.50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	5,00	$ 1.008.083,86	$ 5.040.419,30		5,00			$ 5.040.419,30				No aplica, se verrifico en sitio
16	**RED HIDRÁULICA**				**$ 4.850.683,46**				**$ 2.820.753,60**	**$ 1.252.387,08**			**$ 6.419.049,98**	
16.05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UN	8,00	$ 44.777,18	$ 358.217,44							8,00	$ 358.217,44	
16.07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	10,00	$ 33.309,22	$ 333.092,20							10,00	$ 333.092,20	
16.08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	1,00	$ 31.716,72	$ 31.716,72							1,00	$ 31.716,72	
16.09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	2,00	$ 32.364,50	$ 64.729,00							2,00	$ 64.729,00	
16.11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	12,00	$ 33.045,60	$ 396.547,20							12,00	$ 396.547,20	
16.19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	8,00	$ 208.731,18	$ 1.669.849,44		6,00			$ 1.252.387,08		2,00	$ 417.462,36	Se realizara mantenimiento a los existentes e irian dos lavamanos nuevos
16.21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1,00	$ 843.845,66	$ 843.845,66							1,00	$ 843.845,66	
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 96.282,06	$ 96.282,06							1,00	$ 96.282,06	
16.26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	1,00	$ 153.045,62	$ 153.045,62							1,00	$ 153.045,62	
16.29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1,00	$ 550.763,92	$ 550.763,92							1,00	$ 550.763,92	
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	1,00	$ 281.763,72	$ 281.763,72	8,00			$ 2.254.109,76			9,00	$ 2.535.873,48	es mayor la cantidad según verificacion en sitio, se eliminaron los lavamanos pero
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	1,00	$ 70.830,48	$ 70.830,48	8,00			$ 566.643,84			9,00	$ 637.474,32	es mayor la cantidad según verificacion en sitio, se eliminaron los lavamanos pero
17	**RED SANITARIA**				**$ 13.534.931,90**					**$ 1.367.784,04**			**$ 12.167.147,86**	
17.02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN	1,00	$ 720.808,62	$ 720.808,62		1,00			$ 720.808,62				
17.05	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4"	M	20,00	$ 51.868,46	$ 1.037.369,20							20,00	$ 1.037.369,20	
17.12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UN	4,00	$ 116.234,86	$ 464.939,44							4,00	$ 464.939,44	
17.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	8,00	$ 79.374,12	$ 634.992,96							8,00	$ 634.992,96	
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M	50,00	$ 28.143,64	$ 1.407.182,00							50,00	$ 1.407.182,00	
17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1,00	$ 646.975,42	$ 646.975,42		1,00			$ 646.975,42				No aplica, se verrifico en sitio
17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	12,00	$ 419.874,14	$ 5.038.489,68							12,00	$ 5.038.489,68	
17.29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	3,00	$ 1.194.724,86	$ 3.584.174,58							3,00	$ 3.584.174,58	
18	**URBANISMO**				**$ 1.127.813,40**					**$ 1.127.813,40**				
18.02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	M	30,00	$ 37.593,78	$ 1.127.813,40		30,00			$ 1.127.813,40				Se cambia por NP-05
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**				**$ 5.256.224,12**								**$ 5.256.224,12**	
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	2,00	$ 437.013,36	$ 874.026,72							2,00	$ 874.026,72	
19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1,00	$ 1.475.861,38	$ 1.475.861,38							1,00	$ 1.475.861,38	
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	UN	50,00	$ 16.324,84	$ 816.242,00							50,00	$ 816.242,00	
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	5,00	$ 38.256,26	$ 191.281,30							5,00	$ 191.281,30	
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	5,00	$ 171.059,00	$ 855.295,00							5,00	$ 855.295,00	

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	2,00	$ 521.758,86	$ 1.043.517,72							2,00	$ 1.043.517,72	
20	**NO PREVISTOS**										**$ 13.237.110,34**		**$ 12.052.283,35**	
NP-01	DESMONTE MUEBLES DE COCINA	UN		$ 49.770,35				5,20			$ 258.805,82	5,20	$ 258.805,82	Necesario para realizar reparacion de muros y enchape
NP-02	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	UN		$ 452.565,24				6,00			$ 2.715.391,43	6,00	$ 2.715.391,43	Solicitud para privacidad de espacios
NP-03	RETIRO DE GRAFITI	M2		$ 20.625,83				30,00			$ 618.774,97	30,00	$ 618.774,97	Para mantenimiento de fachada
NP-04	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	ML		$ 44.292,65				18,00			$ 797.267,79	26,82	$ 1.187.929,00	Obras de urbanismo para evitar humedad por capilaridad
NP-05	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	ML		$ 112.648,13				19,05			$ 2.145.946,94	5,06	$ 570.458,74	Para conduccion de aguas lluvias, evitando humedad en muros.
NP-06	PINTURA ANTIGRAFITI	M2		$ 55.841,03				120,00			$ 6.700.923,39	120,00	$ 6.700.923,39	Estabilidad de la fachada en el tiempo
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 340.764.834,10**				**$ 21.948.056,24**	**$ 34.000.339,60**	**$ 13.237.110,34**		**$ 340.764.834,10**	
	ADMINISTRACIÓN		**23,00%**		$ 78.375.911,84				$ 5.048.052,93	$ 7.820.078,11	$ 3.044.535,38		$ 78.375.911,84	
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 3.407.648,34				$ 219.480,56	$ 340.003,40	$ 132.371,10		$ 3.407.648,34	
	UTILIDAD		**5,00%**		$ 17.038.241,71				$ 1.097.402,81	$ 1.700.016,98	$ 661.855,52		$ 17.038.241,71	
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**		$ 3.237.265,92				$ 208.506,53	$ 323.003,23	$ 125.752,55		$ 3.237.265,92	
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 442.823.901,91**				**$ 28.521.499,08**	**$ 44.183.441,31**	**$ 17.201.624,88**		**$ 442.823.901,91**	
	VALOR TOTAL OBRA			**$**	**442.823.901,91**						**$ 1.539.682,7**		**$ 442.823.901,91**	
	SALDO POR AJUSTAR													

PARA CONSTANCIA. SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRATISTA

ARQ.FERNANDO JIMENEZ
INTERVENTORIA

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. SUPERVISION

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 11
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Versión: 01
	FORMATO: JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

JUSTIFICACIÓN ACTA No.1
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
LUGAR DE EJECUCION PEREIRA

CONTRATO DE OBRA N°	1674 DE 2023	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$2,089,847,608.73
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	**OBJETO:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)- AGRUPACION 1	
INTERVENTORIA:	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
1	**PRELIMINARES**					
1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	60.00	30.00	50.00%	Menor cantidad instalada en sitio
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	30.00			No aplica
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	24.00	24.00	100.00%	
1.08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	UN	1.00	1.00	100.00%	
1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	30.00	37.00	123.33%	Mayor cantidad en sitio
1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	M2	834.50	735.83	88.18%	Menor cantidad instalada en sitio
1.20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN	1.00	1.00	100.00%	
1.26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	20.00	20.00	100.00%	
1.33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	35.00	35.00	100.00%	
1.34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	140.00	12.00	8.57%	Menor cantidad instalada en sitio
1.35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	25.00			No aplica
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	30.00	36.00	120.00%	Mayor cantidad en sitio
1.40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	10.00			No aplica
1.44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	100.00	100.00	100.00%	
1.47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	50.00	36.80	73.60%	Menor cantidad en sitio
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	2.00	2.00	100.00%	
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	80.00	80.00	100.00%	
1.67	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	30.00	30.00	100.00%	
1.73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	200.00	200.00	100.00%	
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	45.00	45.00	100.00%	
1.75	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=12M MOVIL	UN/DIA	15.00	15.00	100.00%	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					
2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	5.20	5.20	100.00%	
2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	UN	5.20	5.20	100.00%	
2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	4.00	4.00	100.00%	
2.19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	1.00	1.00	100.00%	
2.21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	UN	1.00	1.00	100.00%	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
3.04	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	UN	2.00	2.00	100.00%	
3.05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	1.00	100.00%	
3.11	DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	27.00	24.00	88.89%	Menor cantidad en sitio
3.17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	M2	8.00	5.88	73.50%	Menor cantidad en sitio
3.18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	15.00			No aplica
3.20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	5.00	8.00	160.00%	Mayor cantidad en sitio
4	**CIELORRASOS**					
4.06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	M2	100.00	120.00	120.00%	Mayor cantidad en sitio
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					
5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	150.00	159.38	106.25%	Mayor cantidad en sitio
6	**CUBIERTAS**					
6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	M	50.00	30.00	60.00%	Menor cantidad en sitio
7	**ENCHAPE MUROS**					
7.05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	120.00	80.00	66.67%	Menor cantidad en sitio
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					
10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	1,600.00	1,600.00	100.00%	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**					
11.03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	M2	511.56	563.31	110.12%	Mayor cantidad en sitio
12	**MAMPOSTERÍA**					
12.07	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	M2	20.00			No aplica
13	**PINTURAS**					
13.04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	30.00	30.00	100.00%	
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	900.00	900.00	100.00%	
13.11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	M2	150.00	219.20	146.13%	Mayor cantidad en sitio
14	**PISOS**					
14.05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	370.00	356.90	96.46%	Menor cantidad en sitio
14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	398.50	578.31	145.12%	Mayor cantidad en sitio
14.16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	150.00	153.70	102.47%	Mayor cantidad en sitio
15	**RED ELÉCTRICA**					
15.09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	35.00	38.00	108.57%	Mayor cantidad en sitio
15.11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	10.00	10.00	100.00%	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
15.15	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	UN	5.00	5.00	100.00%	
15.16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	UN	5.00	5.00	100.00%	
15.25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	UN	15.00			No aplica
15.29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	UN	6.00			No aplica
15.30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	15.00	15.00	100.00%	
15.31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	15.00	15.00	100.00%	
15.40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN	12.00	8.00	66.67%	Menor cantidad en sitio
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	4.00	4.00	100.00%	
15.50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	5.00			No aplica
16	**RED HIDRÁULICA**					
16.05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UN	8.00	8.00	100.00%	
16.07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	10.00	10.00	100.00%	
16.08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	1.00	1.00	100.00%	
16.09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	2.00	2.00	100.00%	
16.11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	12.00	12.00	100.00%	
16.19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	8.00	2.00	25.00%	Menor cantidad en sitio
16.21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1.00	1.00	100.00%	
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1.00	1.00	100.00%	
16.26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	1.00	1.00	100.00%	
16.29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1.00	1.00	100.00%	
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	1.00	9.00	900.00%	Mayor cantidad en sitio
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	1.00	9.00	900.00%	Mayor cantidad en sitio
17	**RED SANITARIA**					
17.02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN	1.00			No aplica
17.05	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4"	M	20.00	20.00	100.00%	
17.12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UN	4.00	4.00	100.00%	
17.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	8.00	8.00	100.00%	
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M	50.00	50.00	100.00%	
17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1.00			No aplica
17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	12.00	12.00	100.00%	
17.29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	3.00	3.00	100.00%	
18	**URBANISMO**					
18.02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	M	30.00			No aplica
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	2.00	2.00	100.00%	
19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00	1.00	100.00%	
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	UN	50.00	50.00	100.00%	
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	5.00	5.00	100.00%	
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	5.00	5.00	100.00%	
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	2.00	2.00	100.00%	
20	**NO PREVISTOS**					
NP-01	DESMONTE MUEBLES DE COCINA	UN		5.20		Necesario para realizar reparacion de muros y enchape
NP-02	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	UN		6.00		Solicitud para privacidad de espacios
NP-03	RETIRO DE GRAFITI	M2		30.00		Para mantenimiento de fachada
NP-04	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	ML		26.82		Obras de urbanismo para evitar humedad por capilaridad
NP-05	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	ML		5.06		Para conduccion de aguas lluvias, evitando humedad en muros.
NP-06	PINTURA ANTIGRAFITI	M2		120.00		Estabilidad de la fachada en el tiempo

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMNIO SANCHEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA: TOTALLINC

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR/ FUNCIONARIO

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-556 **Versión:** 3 **Fecha de emisión:** 2023/10/08


	DD	**8**	**MM**	**10**	**AA**	**2023**	**CORTE N°**	3	**ELABORÓ**	ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CAPITULO	**PINTURA**	**ITEM**	**VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS**	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**OFICINAS**





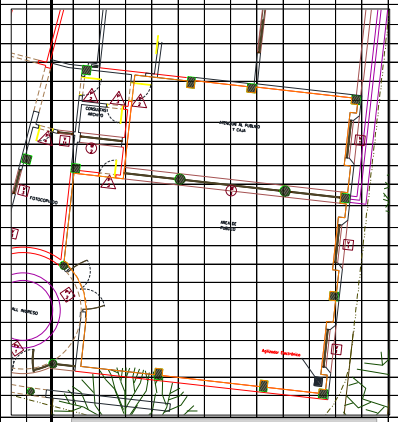

ATENCION AL USUARIO

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
ATENCION AL USUARIO					
ATENCION AL USUARIO		4,50	57,23		257,54
		2,50	10,77		26,93
		2,5	7,25		18,13
		2,50	22,85		57,13
		2,50	34,82		87,05
Subtotal					446,76
TOTAL					**446,76**

Elaboró: Nombre : Carlos Mario Garcia Oliva
Matrícula No.: A08322006-92536604


VoBo: Nombre : Juanita Duque Gómez
Matrícula No.: A17842018-1053835028

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-556 **Versión:** 3 **Fecha de emisión:** 2023-10-08

	DD	8	MM	10	AA	2023	CORTE N°	3	ELABORÓ	ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CAPITULOS	PRELIMINARES	ITEM	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	UNID.	M2	UBICACIÓN	OFICINAS/ATENCION AL USUARIO

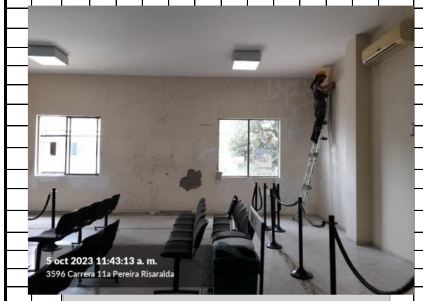

ATENCION AL USUARIO



BAÑOS Y PASILLOS

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
OFICINAS					
ATENCION USUARIO	2,00		2,00		4,00
	2,50		2,30		5,75
BAÑOS	1,20		1,7		2,04
	1,20		1,50		1,80
	1,10		1,70		1,87
PASILLOS	0,80		2,40		1,92
	0,85		2,300		1,96
	0,85		2,300		1,96
	0,85		2,300		1,96
Subtotal					23,25
TOTAL					**23,25**

Elaboró: Nombre : Carlos Mario Garcia Oliva

Matrícula No.: A08322006-92536604

VoBo Nombre : Juanita Duque Gómez

Matrícula No.: A17342018-1053835028

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-556 **Versión:** 3 **Fecha de emisión:** 2023-10-08

	DD	**8**	**MM**	**10**	**AA**	**2023**	**CORTE N°**	3	**ELABORÓ**	ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CAPITULOS	**PRELIMINARES**	**ITEM**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M**	**UNID.**	**ML**	**UBICACIÓN**	**PARQUEADERO**



ZONA 1

Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
SITIO DE ACOPIO					
ZONA 1			11,00		11,00

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 19- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *1.04 DESMONTE DE CIELO RASO* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	L	a	h	
AREA JURIDICA 1	*PISO 2*		*1.600*	*2.50*						*4.00*
		3.00	*0.71*	*2.80*						*6.00*
										-
AREA AUDITORIO	*PISO 1*	*1.00*	*10.00*	*2.00*						*20.00*
										-
										-
										-

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	23	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ZONA 1 (TERRAZA 1)	*CUBIERTA*	*1.00*	*1.265*	*7.25*						*9.17*
	CUBIERTA	*1.00*	*20.36*	*7.25*						*147.61*
	CUBIERTA	*1.00*	*1.03*	*17.57*						*18.10*
										-
ZONA 2 (TERRAZA 2)	*CUBIERTA*	*1.00*	*20.40*	*4.90*						*99.96*
	CUBIERTA	*1.00*	*9.51*	*4.89*						*46.50*
										-
ZONA 3 (AREA JURIDICA)	*CUBIERTA*	*2.00*	*7.55*	*18.75*						*283.13*
	CUBIERTA	*2.00*	*1.30*	*3.90*						*10.14*
ZONA 7 (TERRAZA REGISTRADOR)		*1.00*	*5.21*	*9.45*						*49.23*
										-
MEDIAS CAÑAS	*CUBIERTA*	*2.00*	*1.60*	*14.50*						*46.40*
			0.30	*85.30*						*25.59*
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 05- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *1.66 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
BAÑOS HOMBRES	*PISO 2*		*7.170*	*2.45*						*17.57*
BAÑOS DAMAS	*PISO 3*		*3.03*	*2.45*						*7.43*
										-
										-
										-

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *1.74 ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	L	a	h	
FACHADA INTERIOR	*PISO 2*	*45.00*								*45.00*
										-
										-
										-

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *1.75 ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=12M MOVIL* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	L	a	h	
FACHADA INTERIOR	*PISO 2*	*15.00*								*15.00*
										-
										-
										-

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
FACHADA INTERNA	*TERRAZA CUBIERTA*	*1.00*	*63.930*		*0.93*					*59.45*
			17.92		*0.93*					*16.67*
			25.68		*0.93*					*23.88*
			25.68		*4.50*					*115.56*
										-
FACHADA INTERNA			*52.76*		*8.00*					*422.08*
										-
										-
										-

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	5	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	5

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *11.03 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM* UNIDAD *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ZONA 1 (TERRAZA 1)	*CUBIERTA*	*1.00*	*1.265*	*7.25*						*9.17*
	CUBIERTA	*1.00*	*20.36*	*7.25*						*147.61*
	CUBIERTA	*1.00*	*1.03*	*17.57*						*18.10*
										-
ZONA 2 (TERRAZA 2)	*CUBIERTA*	*1.00*	*20.40*	*4.90*						*99.96*
	CUBIERTA	*1.00*	*9.51*	*4.89*						*46.50*
										-
ZONA 3 (AREA JURIDICA)	*CUBIERTA*	*1.00*	*7.55*	*16.66*						*125.81*
										-
										-
										-
										-

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)

LUGAR DE EJECUCION SEVILLA - VALLE DEL CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	OBRA							
1	**PRELIMINARES**							$8,695,430.34
1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	M				$ 6,121.08		
1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	UN				$ 14,281.54		
1,05	DESMONTE DE ALFOMBRA	M2				$ 5,279.26		
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2				$ 9,238.46		
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	37.00			$ 17,401.86		
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	259.50	259.50	259.50	$ 10,793.72	$2,800,970.34	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	UN	1.00			$ 96,282.06		
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	M2	259.50			$ 27,923.14		
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	6.00	6.00	6.00	$ 42,427.14	$254,562.84	
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	28.25	28.25	28.25	$ 17,470.46	$493,540.50	
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	41.20			$ 9,642.22		
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	174.10	128.08	128.08	$ 13,513.22	$1,730,827.27	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M				$ 34,758.64		
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	M2	9.00			$ 18,606.28		
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	M2	149.30	128.08	128.08	$ 15,650.60	$2,004,591.45	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	M2	1.96			$ 29,981.14		
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	20.00	8.30	8.30	$ 11,295.48	$93,752.48	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	M	117.80	117.80	117.80	$ 5,920.18	$697,397.20	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	2.00			$ 23,241.68		
1,54	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	5.60			$ 23,198.56		
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	37.00			$ 18,899.30		
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	1.00	1.00	$ 431,350.92	$431,350.92	
1,60	DESCAPOTE MANUAL E=20CM	M2				$ 17,260.74		
1,63	LLENO EN ARENA	M3	4.87			$ 170,412.20		
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	30.00	7.00	7.00	$ 26,919.62	$188,437.34	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	50.00			$ 16,176.86		
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	20.00			$ 129,004.26		
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**							
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	1.00			$ 873,853.26		
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	UN	1.00			$ 734,994.12		
2,13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	UN	1.00			$ 441,423.36		
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	1.00			$ 528,023.02		
2,15	MARCO PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	UN	1.00			$ 174,950.58		
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	1.00			$ 174,950.58		
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	2.00			$ 128,203.60		
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**							
3,05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN				$ 433,722.52		
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	0.45			$ 313,550.02		
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	2.00			$ 183,294.30		
4	**CIELORRASOS**							

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)

LUGAR DE EJECUCION SEVILLA - VALLE DEL CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	M2	226.04			$ 117,172.72		
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**							
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	M2	132.90			$ 34,477.38		
6	**CUBIERTAS**							**$41,435,078.77**
6,16	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M	345.04	345.04	345.04	$ 55,176.94	$19,038,251.38	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	M	41.60			$ 75,023.90		
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	M2	259.50	259.50	259.50	$ 86,307.62	$22,396,827.39	
7	**ENCHAPE MUROS**							
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	33.78			$ 70,235.62		
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
8,01	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M				$ 106,364.30		
8,02	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M				$ 97,983.34		
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	300.81			$ 19,873.42		
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	M2	170.30			$ 15,321.32		
12	**MAMPOSTERÍA**							
12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2				$ 124,023.90		
13	**PINTURAS**							
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	408.73			$ 23,476.88		
14	**PISOS**							**$6,920,883.12**
14,06	PISO CERÁMICO DURO PISO	M2	149.30	80.19	80.19	$ 86,304.68	$6,920,883.12	
14,07	PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL	M2	84.88			$ 74,376.12		
14,12	POYO COCINA 55X10CM	M	2.00			$ 81,882.92		
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	M2	149.30			$ 21,754.04		
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	90.00			$ 28,144.62		
15	**RED ELÉCTRICA**							
15,06	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4	UN	2.00			$ 14,488.32		
15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	UN	2.00			$ 96,377.12		
15,28	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	UN	5.00			$ 111,782.72		
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	1.00			$ 114,139.62		
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UN	11.00			$ 127,087.38		
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1.00			$ 165,249.56		
16	**RED HIDRÁULICA**							
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	3.00			$ 33,309.22		
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	3.00			$ 33,045.60		
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	UN	3.00			$ 30,953.30		
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	UN				$ 296,756.74		
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	2.00			$ 74,141.90		
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN				$ 843,845.66		
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00			$ 519,324.54		
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	3.00			$ 281,763.72		
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	3.00			$ 70,830.48		

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)

LUGAR DE EJECUCION SEVILLA - VALLE DEL CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
17	**RED SANITARIA**							
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UN	2.00			$ 116,234.86		
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	2.00			$ 79,374.12		
17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	2.00			$ 49,724.22		
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN				$ 646,975.42		
17,29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	1.00			$ 1,194,724.86		
18	**URBANISMO**							
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2	9.00			$ 125,922.16		
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**							
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	1.00			$ 437,013.36		
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00			$ 1,475,861.38		
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	20.00			$ 16,324.84		
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	8.00			$ 38,256.26		
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	1.00			$ 171,059.00		
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	1.00			$ 521,758.86		
20	**NO PREVISTOS**							
NP-01	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	226.04			$ 6,716.92		
NP-02	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	4.00			$ 23,756.18		
NP-03	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN	1.00			$ 17,470.46		
NP-04	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	33.78			$ 13,513.22		
NP-05	ESTUCO EXTERIOR	M2	25.00			$ 17,616.40		
NP-06	ESTUCO INTERIOR	M2	92.90			$ 15,239.98		
NP-07	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	31.00			$ 170,218.16		
NP-08	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC	UN	19.00			$ 111,606.32		
NP-09	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	2.00			$ 419,874.14		
NP-10	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	M2	65.00			$ 10,487.60		
NP-11	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	UN				$ 132,952.23		
NP-12	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M	60.00			$ 47,245.02		
NP-13	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	M2	60.32			$ 195,397.50		
NP-14	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	M2				$ 121,646.66		
NP-15	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN	1.00			$ 277,537.96		
NP-16	TUBERÍA PVCP 1/2"	M	20.00			$ 16,155.60		
NP-17	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UN	3.00			$ 52,189.57		
NP-18	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M	43.67			$ 36,586.73		
NP-19	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO LAVADO	M2	9.00			$ 75,723.12		
	TOTAL COSTO DIRECTO							**$57,051,392.23**
	ADMINISTRACIÓN	%	23%					$ 13,121,820.21
	IMPREVISTOS	%	1%					$ 570,513.92
	UTILIDADES	%	5%					$ 2,852,569.61
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19%					$ 541,988.23
	VALOR TOTAL OBRA							**$74,138,284.20**

VALOR TOTAL ORIP FRONTINO - ANTIOQUIA	**$ 247,127,614.00**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)

LUGAR DE EJECUCION SEVILLA - VALLE DEL CAUCA .

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)		HASTA (dd-mm-aa)	jueves 23 de noviembre de 2023

CONTRATO Nº	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	TOTALLINC		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
BALANCE PRESUPUESTAL								

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73
VALOR ADICIÓN N°1	
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 2,089,847,608.73

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$74,138,284.20		30.00%	**$74,138,284.20**			**$74,138,284.20**	**$ 172,989,329.80**
2								
3								
4								
5								
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FRAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
Representante Legal
INTERVENTORIA

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº		1674 DE 2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS	NIT / C.C.	800205914-1
PLAZO	CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DIAS		FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA	31/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA	30/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.089.847.608,73	TOTAL ADICIONES		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.089.847.608,73

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (I3 ORIP)

CUADRO RESUMEN AGRUPACION 1

No	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	PACIFICO	VALLE	CALI
2		VALLE	SEVILLA
3		CAUCA	EL BORDO
4		CHOCO	ISTMINA
5	ANDINA	RISARALDA	PEREIRA
6		ANTIOQUIA	FRONTINO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FACTURA / CUENTA DE COBRO

FECHA DD-MM-AA	NÚMERO DE ACTA PARCIAL	No DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR	% TOTAL DE EJECUCION
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DECALI - VALLE	FVE-3765	PAGO PRIMER 30% CALI - VALLE	$ 225.513.788,01	$ -	$ 225.513.788,01	10,79%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE SEVILLA - VALLE	FVE-3767	PAGO PRIMER 30% SEVILLA - VALLE	$ 74.138.284,20	$ -	$ 74.138.284,20	3,55%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE EL BORDO - CAUCA	FVE-3768	PAGO PRIMER 30% EL BORDO - CAUCA	$ 63.728.057,39	$ -	$ 63.728.057,40	3,05%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE ISTMINA - CHOCO	FVE-3829	PAGO PRIMER30% ISTMINA - CHOCO	$ 66.721.683,61	$ -	$ 66.721.683,61	3,19%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE PEREIRA - RISARALDA	FVE-3825	PAGO PRIMER 30% PEREIRA - R4ISARALDA	$ 132.847.170,57	$ -	$ 132.847.170,57	6,36%
20-12-2023	ACTA PARCIAL 1 DE FRONTINO - ANTIOQUIA	FVE-3824	PAGO PRIMER 30% FRONTINO - ANTIOQUIA	$ 64.005.298,84	$ -	$ 64.005.298,84	3,06%
		TOTALES		$ **626.954.282,62**	$0,00	**$626.954.282,62**	30,00%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CALIDAD DE INTERVENTOR/ DEL CONTRATO DE OBRA No 1674 DE 2023 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA 4° FORMA DE PAGO.
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN	1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 2. Copia de Acta de Recibop Parcial No 1 firmada por el contratista, la interventorioa y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría. 4. Copia del RUT contratista de obra. 5. Copia del Contrato de obra. 6. Copia del acta de inicio. 7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 8. Copias planillas de seguridad social. 9. Certificación bancada no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancada donde se debe consignar los dineros correspondientes. 10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisordel contrato de interventoría. 11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obray obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría. 12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS 27 (VEINTI SIETE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoria
TOTALL INC SAS BIC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Entre los suscritos, **WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la **SNR**, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución No. **10989** del 14 de septiembre de 2022, con la cual es se le delegó la Ordenación del Gasto, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra **TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9,** representado legalmente por **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** identificado con **C.C. No. 79553539,** designado por Documento Privado No. 1 del 10 de junio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de agosto de 2022 con el No. 02865410 del Libro IX, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **Contrato de Interventoría**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma Transaccional del **SECOP II** y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideración a lo siguiente: **1).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **2).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. **3).** Que previamente se realizó el **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 002 DE 2023,** cuyo objeto es: **"CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)". 4).** Que en el mencionado proceso se recibieron 4 propuestas de los siguientes interesados:

Referencia de oferta	Entidad
snrRAM	CONSORCIO NIORAM
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS CPM 002 DE 2023	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR
GRUCOING - SUPERNOTARIADO	GRUCOING S.A.S.
Oferta al proceso CPM 002 DE 2023 por TOTALL INC SAS BIC	TOTALL INC SAS BIC

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

5). Que conforme a lo anterior y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, dando el siguiente resultado:

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
1	CONSORCIO NIORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84.30
2	CONSORCIO INTER-CONSTRUIR	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que, como se evidencia en el Informe de Evaluación Definitivo se presenta un empate entre los proponentes

No	PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	PUNTAJE
3	GRUCOING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100
4	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100

Que el Comité Técnico evaluador procedió a dar aplicación a los criterios de desempate señalados en el numeral 5.14 del Pliego de Condiciones Definitivo dando como resultado el siguiente orden de elegibilidad:

CRITERIOS DE DESEMPATE		
CERTIFICADOS	TOTALL INC SAS BIC	GRUCOING SAS
1.Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes e servicios extranjeros.	Servicios Nacionales	Servicios Nacionales
2.Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	SI	SI
3. Preferir la propuesta presentada por proponente que acredite en las condiciones establecidas en la Ley que por lo menos el 15 % de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 361 de 1997.	SI	SI
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobreviviencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.	SI	SI
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.	SI	NO
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	NO	NO
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las siguientes condiciones.	NO	NO
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales, o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.	SI	SI
10. Preferir a oferente que acredite su acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) este conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual o sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.	SI	NO
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.	SI	NO

Que, una vez establecido lo anterior y teniendo en cuenta el numeral 5.12 del pliego de condiciones definitivo - MODO DE ADJUDICACIÓN - el comité evaluador en Comité de Contratación de fecha 6 de julio de 2023, recomendó al Secretario General y Ordenador del Gasto de la Superintendencia de Notariado y Registro, adjudicar el proceso **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 02 DE 2023.** cuyo objeto es "*CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O*

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)." de la siguiente manera:

AGRUPACIÓN 1
ADJUDICATARIO: TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351 9

AGRUPACIÓN 2
ADJUDICATARIO: GRUCOING S.A.S. NIT 830509427-9

6). Que conforme a lo anterior, resultó ganador de la **AGRUPACIÓN No. 1** el proponente **TOTALL INC SAS BIC NIT 901620351-9** con **100** puntos y quien oferto un precio de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89),** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **7).** Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas. **CLÁUSULA PRIMERA: - A) OBJETO:** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACIÓN 1". **B) ALCANCE DEL OBJETO:** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, según corresponda. La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.

El objetivo de la Interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuéstales, contables y financieros en el desarrollo del contrato. La Interventoría debe asumir una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos específicos de la Interventoría serán entre otros:

- **Absolver:** En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la Interventoría es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicación entre las partes.

- **Colaborar:** Teniendo en cuenta que la Interventoría y el Contratista conforman un equipo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista.

- **Controlar:** Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, control, verificación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidación.

- **Exigir:** La Interventora tiene la obligación de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

- **Prevenir:** El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.

- **Solicitar:** Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecución del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoría podrá implicar la modificación del contrato. Esta acción también se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

- **Verificar:** Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

- **Ley 1474 de 2011**

Artículo 84: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.

PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

- Ley 80 de 1993

ARTÍCULO 53. De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría.

CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: A) VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($373.103.235.89), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA. **B) PLAZO DEL CONTRATO:** El término de ejecución del presente contrato será el relacionado en el cuadro siguiente sin que exceda el **31 de diciembre de 2023.** Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo.

AGRUPACION	PLAZO DE EJECUCION
Agrupación 1	Cinco Meses

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El plazo de ejecución del contrato de obra por agrupación está programado de acuerdo al cuadro antes expuesto y los tiempos serán contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con la interventoría y la entidad, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II. **Parágrafo 1:** La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual debe ser firmada en compañía de la supervisión del contrato. **Parágrafo 2:** El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras, deben estar contemplados en los costos de la propuesta económica del oferente. **Parágrafo 3:** La INTERVENTORIA a las obras se realizará en una (1) etapa de acuerdo con las especificaciones de construcción y el presupuesto publicado por la entidad **CLÁUSULA TERCERA: - CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:** Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C-1209-0800-13-0-1209004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la vigencia 2023, según CDP No. 55723 del 10 de mayo de 2023, expedido por el responsable de presupuesto. **CLÁUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO**: La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el 100% del valor del contrato así:

PAGOS – ACTA PARCIAL 1

El primer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 30%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor de contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2

El segundo pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 60%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

TERCER PAGO –ACTA PARCIAL 3

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

El tercer pago será del 30% del valor inicial del contrato incluido el (IVA del 19%), el cual se pagará de acuerdo con las actividades realizadas durante el período de ejecución contra avance de obra mayor al 90%, con la suscripción del acta de recibo parcial.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento de obra firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoría.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Revisión y aprobación Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

CUARTO PAGO-PAGO FINAL

Se efectuará el pago final del 10% del valor ejecutado del contrato restante, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Copia del Acta de recibo final firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio del contrato de interventoria
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuerta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Revisión y aprobación del acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Revisión y aprobación del acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y e visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Entregar Informe de intervenoria en medio magnético con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación de la obra.
13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificación).
14. Entregar Bitácora de obra escaneada en medio magnético.
15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los resultados obtenidos.
16. Entregar Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social.
17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.
18. Entregar planos record en medio magnético y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
19. Entregar memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
20. Entregar el Manual de operación y funcionamiento con los respectivos catálogos.
21. Entregar el Manual de mantenimiento
22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios públicos en aquellas oficinas que se cuente con las conexiones.
23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecución de las obras.
24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificación de calibración de los equipos utilizados.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Nota: La entidad no realizara adición en dinero, teniendo en cuenta que la interventoría contratada tiene un fin específico el cual es controlar obras desde el inicio hasta su culminación. En caso de ser necesario solo se adicionará en valor el contrato de interventoría proporcionalmente al valor adicionado en el contrato de obra y siempre y cuando haya disponibilidad de recursos. **Liquidación del contrato:** La liquidación del contrato se efectuará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes al recibo a satisfacción de las obras por parte de la interventoría y la supervisión del contrato y contempladas dentro del objeto contractual y su alcance. **CLÁUSULA QUINTA: - LUGAR DE EJECUCION:** Las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la ejecución de las obras son las siguientes:

AGRUPACION 1

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Frontino	Antioquia	Andina	Carrera 32 No. 30 - 34	$38.098.394,60
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Pereira	Risaralda	Andina	Avenida 30 de Agosto No. 37 - 24	$79.075.700,38
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Cali	Valle del cauca	Pacifico	Calle 3 a Norte No. 16 - 34	$134.235.550,23
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
Sevilla	Valle del cauca	Pacifico	Calle 48 No. 49 - 31	$44.129.958,25
MUNICIPIO	**DEPARTAMENTO**	**REGIONAL**	**DIRECCION**	
El Bordo	Cauca	Pacifico	Calle 6 No 6-54	$37.933.498,23

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	REGIONAL	DIRECCION	
Istmina	Choco	Pacifico	Carrera 5 A No. 25 - 18	$39.715.411,93

CLÁUSULA SEXTA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones: **1).** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2).** Está debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **3).** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **4).** Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **CLÁUSULA SÉPTIMA:- RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

del objeto establecido en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA:- OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, El contratista se obliga para con la Superintendencia a: EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los Estudios Previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecución.
2. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.
3. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato o quien haga las veces.
4. Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de LA SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.
5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.
6. Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.
7. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.
8. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor de la entidad.
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
10. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
11. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
13. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.
14. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
16. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta.
17. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de interventoría, que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el supervisor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del supervisor.
18. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
19. Desarrollar la interventoría a las obras de manera que se evite a toda costa afectación a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algún inconveniente, el contratista será el responsable de solucionarlo.
20. La Interventoría debe verificar que el contratista implemente un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecución de las obras por motivo de lluvias, así como llevar el registro diario en bitácora del estado del clima.
21. La interventoría debe solicitar al contratista las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y así verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.
22. Todos los empleados a cargo del interventor y contratista deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo que se encuentren en la obra.
23. La interventoría verificara cada vez que entre un nuevo trabajador, que el mismo cuente con todos las afiliaciones de Ley.

CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a desarrollar las siguientes obligaciones específicas:

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA

1. Verificar y aprobar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

2. Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y las que se establezcan conjuntamente con la visita adelantada previo al inicio de la ejecución de las obras y presentar un informe a la SUPERINTENDENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al mismo.
3. Suscribir las actas de mayores y menores cantidades y obra no prevista que sean necesarias, de modo que cada actividad no prevista y mayor cantidad de obra sea aprobada antes de su ejecución.
4. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones, así mismo verificará la calidad de los materiales utilizados por el contratista.
5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.
6. Revisar y dar el visto bueno en caso de haber cambios en la ejecución del contrato, previo visto bueno del Supervisor del contrato.
7. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
8. Realizar seguimiento detallado de la información contenida en los documentos enunciados, presentando un informe semanal a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el cumplimiento del cuadro de rendimientos, programaciones y todo lo relacionado en la correcta ejecución y avance del contrato, en caso de incumplimiento por parte del contratista deberá informarlo por escrito a la entidad y en caso de que afecte la normal ejecución del contrato sugerir los procedimientos sancionatorios que correspondan.
9. Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a os análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos y los respectivos análisis de precios unitarios. En caso de que la SUPERINTENDENCIA presente observaciones a los APU de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar as correcciones del caso.
10. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigicos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.
11. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual. conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

12. Velar por el correcto cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra.
13. Exigir al constructor cuando sea necesaria la realización de ensayos y pruebas.
14. Vigilar que el constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que considere oportuno.
15. Completar o introducir en caso de que sea necesario modificaciones al proyecto el interventor realizará los planos y especificaciones pendientes y cuidará en todo momento de que el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados.
16. Presentar informes mensuales a la Entidad donde se muestre el avance del contrato en donde se enuncie las conclusiones y recomendaciones. Cualquier variación al contrato previa su realización deberá ser consultada y aprobada por la Entidad contratante.
17. Revisar la bitácora de la obra, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución de las obras, todas las bitácoras serán administrada por la interventoría, y se enviará diariamente copia digital al supervisor del contrato, dicha bitácora será diligencia en el formato entregado por la entidad. De todos los trabajos el interventor dejará constancia escrita.
18. Presentar documentos necesarios para garantizar la realización de la interventoría de acuerdo con los protocolos Bioseguridad.
19. El Interventor Debe verificar que el contratista realice la entrega y socialización del **Manual de Mantenimiento** de las obras ejecutadas.
20. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

B. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

1. Solicitar a la SUPERINTEDENCIA la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.
2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
3. Revisar y aprobar el Cronograma y el flujo de fondos del contratista y remitirlos a la Superintendencia.
4. Velar por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el presupuesto previamente aprobado.
5. Vigilar el cumplimiento de las pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales.
6. Autorizar la contratación de la mano de obra de los diferentes capítulos del presupuesto y supervisará la administración de los subcontratos.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

7. La Interventoría estará pendiente que todos los trabajadores contratos cuenten con la capacitación y experiencia en acabados de obra, esto con el fin de desempeñar ls labores que conlleva este tipo de intervenciones.
8. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la ley.
9. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los presupuestos, especificaciones y contrato de construcción.
10. Verificar que la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
11. Estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras.
12. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la SUPERINTENDENCIA.
13. Programar y coordinar con el contratista y con la SUPERINTENDENCIA las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.
14. Elaborar con el contratista de la obra las actas de iniciación y las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, las cuales no deberán sobrepasar el valor de la obra, debidamente justificadas, cambio de especificaciones, entregas parciales, liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar, en coordinación con el contratista. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por la Secretaria General.
15. Legalizar las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, mensualmente ante la Supervisión, cuando se requiera, de acuerdo con el avance del contrato.
16. Mantener actualizada la documentación de los contratos.
17. Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales.
18. Cumplir con la entrega de los informes ejecutivos semanales, informes mensuales y finales requeridos por la SUPERINTEDENCIA en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato.
19. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

20. Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.

21. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.

22. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto a la SUPERINTEDENCIA para la resolución final de las mismas.

23. Suspender si es necesario el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión.

24. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además, elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la SUPERINTEDENCIA para su aprobación con una antelación mínima de 10 días a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas técnica, jurídica y económicamente.

25. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato

26. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

27. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

28. Realizar la interventoría de acuerdo con la Resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021 ANEXO – MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA y las que la modifiquen, adicionen o deroguen, de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se adopta el manual interno de Supervisión e interventoría de los Contratos que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro.

29. Presentar los informes y documentos necesarios para realizar la interventoría de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia y los formatos entregados por la supervisión del contrato.

30. Enviar en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), si el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor con el fin de informar a la Dirección de Contratación, para que se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados y este remitirlos a la Secretaría General. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

31. Elaborar el acta de terminación del contrato y el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de 15 días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la SUPERINTEDENCIA para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
32. Verificar que el contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
33. Revisar, aprobar y vigilar los Planes de Seguridad, higiene, y salud ocupacional de acuerdo con las Normas técnicas vigentes, presentado por el contratista y remitirlo aprobado a la supervisión.
34. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.
35. Llevar acabo lo establecido en la resolución 682 del 24 de abril de 2020 con relación al PAPSO.
36. Revisar, aprobar y hacer cumplir todos los requerimientos establecidos en las obligaciones generales y específicas del contratista de obra.

C. INTERVENTORÍA FINANCIERA

Realizar el seguimiento a la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir, con el fin de tener herramientas para realizar las recomendaciones y ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de las obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de ejecución del contrato.

La interventoría deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios para realizar los pagos y realizar la revisión de los mismos, realizando y suscribiendo las certificaciones que correspondan.

D. INTERVENTORÍA LEGAL

Revisión de los documentos del contratista de obra, tales como, Contrato de obra, Pliegos de condiciones y en general de los documentos que hacen parte del contrato. Lo anterior, con el objeto de que sean conocidas las condiciones y obligaciones del contratista de obra y el personal vinculado y responsable de la ejecución del contrato.

Se debe mantener un estricto control y seguimiento a las garantías suscritas por el contratista, haciendo énfasis en la vigencia de las mismas, en concordancia con lo establecido en el contrato

de obra. Se revisará e informará a la Entidad oportunamente de las condiciones y vencimiento de las mismas.

Así mismo realizar la verificación del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que utilice el contratista en la ejecución de las obras.

De igual manera, realizar el seguimiento legal a la ejecución del contrato y asegurarse de que el contrato se cumpla en todos sus términos y condiciones. Esto incluye la revisión de los plazos de ejecución, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos legales.

Debe además realizar los informes, reportes y conceptos jurídicos y/o Legales que La Entidad solicite al Interventor, en relación con la ejecución del contrato. También debe informar a las partes sobre cualquier problema o incumplimiento detectado y proponer soluciones para corregirlos.

E. INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La interventoría deberá efectuar el seguimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por ellos mismos, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se deberá atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, entre otras.

Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigación (Ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y demás normas que amplíen o modifiquen la materia).

F. CONTROL DE COSTOS

Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua confrontación de este con las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que inciden en los costos se procura mantener una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados, una idea de las razones y de las medidas correctivas que se puedan tomar.

En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, sea necesario ejecutar otros ítems no

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos - del respectivo manual de Interventoría, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaría de obras.

En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información al Supervisor designado por la SNR, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la interventora del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prorrogas por retrasos en el cronograma.

Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993.

G. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Consiste en controlar la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de los de las actividades contratadas. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de las obras.

Indica las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas.

Las visitas serán programadas conjuntamente, con el contratista de obra, interventoría y la entidad.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Hacer seguimiento constante a la programación de la obra.

Llevar a cabo lo establecido en la resolución 682 de 24 de abril de 2020 con relación al (PAPSO).

H. RECOMENDACIONES

Liquidación del contrato de interventoría

El Supervisor procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

Inspección final de la obra

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra, 10 días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

Manual de Mantenimiento de obras ejecutadas

El Interventor deberá solicitar al contratista la entrega y socialización de un manual de mantenimiento de las obras ejecutadas, así cada oficina será responsable del cuidado de las obras ejecutadas

I. CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO

La Interventoría designará Ingenieros y/o Arquitectos, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al municipio que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, según resolución vigente.

La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del contratista.

El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesión en el territorio nacional.

El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada interventoría.

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños del proyecto, la normatividad vigente y demás obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoría que garanticen la correcta ejecución del proyecto.

Insumos.
La SNR entregará al **Interventor:**
Copia del Contrato de obra suscrito con el Contratista, así como los estudios y los documentos previos que lo soportan.

Productos
El interventor deberá solicitar al contratista:

- Hojas de vida del personal profesional.
- Relación del equipo mínimo obligatorio.
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
- Programa de Obra y flujo de inversiones
- Plan de manejo de tránsito- PMT.
- Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y escombreras que utilizará durante la Etapa de Construcción, así como también los permisos que sean necesarios utilizar.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Plan de manejo ambiental
- Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

J. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS:

Objetivo:

El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el **Contratista,** corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el **Contrato de Obra.**

Materiales:

El **Interventor** realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada por el **Contratista** cumple con los requerimientos contenidos en el **Contrato de Obra.**

Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos, acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el **Contratista.** En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el **Contratista** e **Interventoría,** primaran para efectos de la comprobación de las **Metas Físicas** y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta última.

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados (de existir) y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del **Proyecto** por parte del **Interventor,** éste deberá solicitar al **Contratista** los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el **Contrato de Obra,** o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

Para adelantar dicha labor el **Interventor** deberá contar, entre otros y como mínimo, con los siguientes insumos:

- Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
- Realización y/o Revisión de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra.
- Visita de inspección a sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos fabricados fuera del área del proyecto.

Productos:

Los productos resultantes de este proceso, corresponderán a:

- Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoría.
- Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
- Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad, cuando sea necesario.
- Presentar informes de inspección a las instalaciones de fabricación
- Notificar al Contratista y a la Alcaldía respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos realizados.
- Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra
- Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

K. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo:

Verificar los procesos constructivos empleados por el **Contratista,** la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la **Programación de Obra y flujo de inversiones** y **Cronograma de Metas Físicas** entregados por el Contratista.

Insumos:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

- Reuniones semanales entre contratista e interventoría, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría interno de la SNR según resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021.

- Informes de Inspectoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoría.

- Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.

- Registro fotográfico y fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción del proyecto (antes - durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.

CLÁUSULA DÉCIMA: - OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA:
La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Aprobar la Garantía única del Contrato.
2. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
3. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.
4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
5. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor.
6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, por el Ordenador del Gasto exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
7. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.
8. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.
9. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.
10. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
12. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.
13. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.
14. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
15. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II.
16. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.
18. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar.
19. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.
20. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.
21. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.
22. Contratar un interventor para la vigilancia y verificación de la correcta ejecución del objeto del presente contrato
23. Las demás inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de Supervisión.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - SUPERVISION Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: A) SUPERVISOR: La supervisión, vigilancia en la ejecución y cumplimiento estricto del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Infraestructura de la SNR O quien haga sus veces o de quien designe el ordenador del gasto. **B) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 1).** Velar por

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

la correcta y oportuna ejecución del contrato. **2).** Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes de supervisión del contrato, así como actas y demás documentos que soporten la ejecución y seguimiento del contrato. **3).** Informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. **4).** Informar con la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, así como estado de las obligaciones económicas y del término de ejecución. **5).** Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecución del contrato. **6).** Verificar que el **CONTRATISTA** haya subido en la Plataforma Transaccional del SECOP II, todos los documentos requeridos para la legalización del contrato y los informes y soportes exigidos durante la ejecución del mismo. **7).** Allegar a la Dirección de Contratación original del acta de inicio dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación del acto administrativo de supervisión. **8)** Las demás que legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la **Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021**, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA**: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - CESIÓN:** Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia, al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PARÁGRAFO. -** Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes será la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecución del contrato, el Contratista preste sus servicios en otras partes del territorio nacional. **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: -EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y la **SUPERINTENDENCIA**, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogación diferente a los honorarios aquí pactados. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA:** El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal,

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: **A)** Estudios y documentos previos. **B)** Documento soportes del contrato. **C)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **D)** Registro Presupuestal. **E)** Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. **F)** Actas, informes y demás documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. **G)** Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. **H).** Modificaciones transaccionales que se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. **I).** Propuesta del oferente **SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS. CLÁUSULA VIGÉSIMA: - GARANTIAS:** Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

a) **De cumplimiento** cuyo valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).
b) **De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales** del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015)

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a publicar en la PLATAFORMA SECOP II el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados y notificar a la SNR de su publicación para su posterior aprobación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete a publicar en la PLATAFORMA SECOP II, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - PENAL PECUNIARIA: a.)** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a **LA SUPERINTENDENCIA** a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. **b.)** Igualmente, frente al

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y TOTALL INC SAS BIC, IDENTIFICADA NIT. 901620351-9

incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - MULTAS: a)**. con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. **b)**. La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. **c).** La imposición de multas no impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. **d).** El contratista autoriza a **la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar. **CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA TERCERA: - CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la póliza de garantía dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del **SECOP II** por la **SUPERINTENDENCIA. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.** El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del **SECOP II.** Para su ejecución requerirá: **1).** Expedición del Registro presupuestal; **2).** Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II. **3).** Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalización requerirá, **4).** Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes señalados.

Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda – Ordenador del Gasto.
Revisó y Aprobó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor de Despacho.
Revisó: Héctor Iván Suárez Betancur – Dirección de Contratación.
Proyectó: Daniel Palacios – Abogado de la Dirección de Contratación. Daniel Palacios

ACTA DE INICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1707 de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TOTALL INC SAS BIC
NIT: 901.620.351-9

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Oficinas de Instrumentos Públicos de Frontino Antioquia, Pereira Risaralda, Cali Valle del Cauca, Sevilla Valle del Cauca, EL Bordo Cauca, Istmina Choco.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $373.103.235.89
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 362623 del 13 de julio de 2023

El día 31 de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C., se reunieron **ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI** en su calidad de supervisor del contrato y **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL** en su calidad de contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato de interventoría No. 1707 de 2023.**

Objeto: CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL QUE REALICE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP) AGRUPACION 1

Se firma en Bogotá D.C., para los fines pertinentes el día 31 de Julio de 2023.

Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Supervisor
Profesional Universitario
Grupo de Infraestructura

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Interventor
C.C. 79.553.539

Bogotá D.C, diciembre 21 de 2023

La suscrita Contadora de la empresa **TOTALL INC SAS BIC con NIT. 901.620.351-9**

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en los resultados de mi revisión, informo que la Compañía se encuentra debidamente afiliada a las entidades que administran los riesgos de salud, pensiones y cesantías, riesgos profesionales y que durante el periodo de seis meses, pagó cumplidamente los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal TOTALL INC SAS BIC


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.101.836

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8050610393E9E7760E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO							X											230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(5)**																						$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$63,500		$0	$0		$2,846,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281628683	9458767694	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$2,864,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,813,600	$11,100	$0	$1,824,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$7,300	$0	$1,212,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$2,000	$0	$322,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$1,800	$0	$289,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$63,500	$400	$0	$63,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$63,500	$400	$0	$63,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$484,800	$2,900	$0	$487,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$484,800	$3,100	$0	$487,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$2,000	$0	$322,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$500	$0	$72,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**5**	**$2,846,700**	**$17,500**	**$0**	**$2,864,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																														
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		0		0	14-4	30	6.960%	0	No
Total			**Afiliados(5)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	228456038	9457375272	Y	2023/10/18	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$465,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$465,200	$500	$0	$465,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$465,200	$500	$0	$465,700
TOTAL				**5**	**$465,200**	**$500**	**$0**	**$465,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649890	3	CONSORCIO TIG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	228499304	9457375884	E	2023/10/23	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,891,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,528,000	$0	$0	$2,528,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$864,000	$0	$0	$864,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$632,000	$0	$0	$632,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$416,000	$0	$0	$416,000
TOTAL				**7**	**$4,891,800**	**$0**	**$0**	**$4,891,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$1,550,000	$248,000			$2,710,000	$108,400			$2,710,000	$108,400			$2,710,000		$14,300		$0	$0		$479,100
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																			0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT	X																	230201	6	$300,000	$48,000	EPS005	6	$300,000	$12,000	CCF22	6	$300,000	$12,000	14-4	6	$300,000	0.522%	$1,600	6	$0	$0	Si	$73,600
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA	X																	231001	25	$1,250,000	$200,000	EPS017	25	$1,250,000	$50,000	CCF22	25	$1,250,000	$50,000	14-4	25	$1,250,000	0.522%	$6,600	25	$0	$0	Si	$306,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,858,334	$617,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334	$154,400			$3,858,334		$268,700		$0	$0		$1,194,900
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA	X																	230301	10	$666,667	$106,700	EPS018	10	$666,667	$26,700	CCF22	10	$666,667	$26,700	14-4	10	$666,667	6.960%	$46,500	10	$0	$0	Si	$206,600
5	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO	X																	231001	5	$391,667	$62,700	EPS002	5	$391,667	$15,700	CCF22	5	$391,667	$15,700	14-4	5	$391,667	6.960%	$27,300	5	$0	$0	Si	$121,400
6	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total			**Afiliados(6)**																				$5,408,334	$865,400			$6,568,334	$262,800			$6,568,334	$262,800			$6,568,334		$283,000		$0	$0		$1,674,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9457375119	E	2023/10/18			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$865,400	$0	$0	$865,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$262,700	$0	$0	$262,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$554,700	$0	$0	$554,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$48,000	$0	$0	$48,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$283,000	$0	$0	$283,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$283,000	$0	$0	$283,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$262,800	$0	$0	$262,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				6	$262,800	$0	$0	$262,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$50,000	$0	$0	$50,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$26,700	$0	$0	$26,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,700	$0	$0	$15,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$12,000	$0	$0	$12,000
TOTAL				**6**	**$1,674,000**	**$0**	**$0**	**$1,674,000**

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 07:13:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8909576336

Fecha limite de pago: 2023-12-20

GUARDADA 04/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMENQUE				
Documento	CC11807075	**Dirección**	CR 49 # 25 56		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2692788		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11807075	GUERRERO PALOMEQUE DAVID ANTONIO	59	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 7.100	$ 343.800

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																								$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$1,750,000	$280,000			$2,910,000	$116,400			$2,932,917	$117,400			$2,910,000		$15,400		$0	$0		$529,200
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1018462687	MOLINA RUIZ CARLOS EVERT		X															X		23020 1	5	$250,000	$40,000	EPS005	5	$250,000	$10,000	CCF22	5	$272,917	$11,000	14-4	5	$250,000	0.522%	$1,400	5	$0	$0	Si	$62,400
3	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																								$11,346,668	$1,815,600			$11,346,668	$454,000			$11,377,918	$455,300			$11,346,668		$790,000		$0	$0		$3,514,900
4	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO	X																		23030 1	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$52,800	CCF22	22	$1,320,000	$52,800	14-4	22	$1,320,000	6.960%	$91,900	22	$0	$0	Si	$408,700
5	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	72261222	FERRIGNO RIVAS MAURY JAVIER	X	X															X		23100 1	9	$750,000	$120,000	EPS037	9	$750,000	$30,000	CCF22	9	$781,250	$31,300	14-4	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$233,500
7	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	X																		25-14	14	$793,334	$127,000	EPS037	14	$793,334	$31,800	CCF22	14	$793,334	$31,800	14-4	14	$793,334	6.960%	$55,300	14	$0	$0	Si	$245,900
8	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
9	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES																			23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
10	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA	X																		23020 1	25	$1,333,334	$213,400	EPS017	25	$1,333,334	$53,400	CCF22	25	$1,333,334	$53,400	14-4	25	$1,333,334	6.960%	$92,900	25	$0	$0	Si	$413,100
Total			**Afiliados(10)**																					$13,096,668	$2,095,600			$14,256,668	$570,400			$14,310,835	$572,700			$14,256,668		$805,400		$0	$0		$4,044,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	288056151	9458836884	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,044,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,095,600	$0	$0	$2,095,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$736,000	$0	$0	$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$127,000	$0	$0	$127,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$979,200	$0	$0	$979,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$253,400	$0	$0	$253,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$805,400	$0	$0	$805,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$805,400	$0	$0	$805,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$572,700	$0	$0	$572,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$572,700	$0	$0	$572,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$570,400	$0	$0	$570,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$113,400	$0	$0	$113,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$61,800	$0	$0	$61,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$0	$0	$94,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$62,800	$0	$0	$62,800
TOTAL				**10**	**$4,044,100**	**$0**	**$0**	**$4,044,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,880,000		$339,900		$0	$0		$339,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS		R																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,617,335		$252,000		$0	$0		$252,000
5	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
6	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
7	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	0	$0	$0	No	$29,700
8	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA	X																	0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-4	25	$966,667	6.960%	$67,300	0	$0	$0	No	$67,300
Total			**Afiliados(8)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,497,335		$591,900		$0	$0		$591,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	288074312	9458897597	Y	2023/11/20	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$591,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$591,900	$0	$0	$591,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$591,900	$0	$0	$591,900
TOTAL				8	$591,900	$0	$0	$591,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$10,960,000	$1,813,600			$12,120,000	$484,800			$12,120,000	$484,800			$12,120,000		$63,500		$0	$0		$2,846,700
1	CC	1004350225	DURAN BARBOSA YEISON DANILO																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	52338896	FAGUA VIASUS MILLDRED																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
3	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YALILE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$4,098,669	$656,200			$4,098,669	$164,300			$4,098,669	$164,300			$4,098,669		$285,700		$0	$0		$1,270,500
6	CC	1070821027	CORREA IZQUIERDO MANUEL VICENTE	X																	23020 1	20	$773,334	$123,800	EPSIC3	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
7	CC	1123314923	GERMAN PATIÑO JULY VANESSA	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
8	CC	1006846598	GONZALEZ GASCA JESUS ALEXIS	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
9	CC	5250677	PABON DIAZ ALCIDES MILCIADES	X																	23030 1	20	$773,334	$123,800	ESSC18	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
10	CC	1121712338	SUAREZ GASCA EVER HERNAN	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
Total			**Afiliados(10)**																				$15,058,669	$2,469,800			$16,218,669	$649,100			$16,218,669	$649,100			$16,218,669		$349,200		$0	$0		$4,117,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332727255	9460281416	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,117,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,469,800	$0	$0	$2,469,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,205,600	$0	$0	$1,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$852,400	$0	$0	$852,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$411,800	$0	$0	$411,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$349,200	$0	$0	$349,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$349,200	$0	$0	$349,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$649,100	$0	$0	$649,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$649,100	$0	$0	$649,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$31,000	$0	$0	$31,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$133,300	$0	$0	$133,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**10**	**$4,117,200**	**$0**	**$0**	**$4,117,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$1,500,000	$240,000			$2,660,000	$106,400			$2,660,000	$106,400			$2,660,000		$14,000		$0	$0		$466,800
1	CC	1067842507	GUZMAN MONTALVO DAVIER ALFONSO																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	1032395155	PLAZAS RAMIREZ JENNY MILENA																			23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$10,610,000	$1,697,600			$10,610,000	$424,400			$11,130,556	$445,300			$10,610,000		$738,700		$0	$0		$3,306,000
3	CC	1075258188	CARDOZO FALLA OMAR IGNACIO																			23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
4	CC	1053835028	DUQUE GOMEZ JUANITA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
6	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO																			23100 1	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
7	CC	79941664	PAEZ DUQUE CARLOS ANDRES		X																X	23030 1	21	$1,960,000	$313,600	EPS008	21	$1,960,000	$78,400	CCF22	21	$2,391,667	$95,700	14-4	21	$1,960,000	6.960%	$136,500	21	$0	$0	Si	$624,200
8	CC	1015471222	RAMIREZ GUASCA MARIA JULIANA		X																X	23020 1	15	$800,000	$128,000	EPS017	15	$800,000	$32,000	CCF22	15	$888,889	$35,600	14-4	15	$800,000	6.960%	$55,700	15	$0	$0	Si	$251,300
Total			**Afiliados(8)**																					$12,110,000	$1,937,600			$13,270,000	$530,800			$13,790,556	$551,700			$13,270,000		$752,700		$0	$0		$3,772,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	355539946	9460223966	E	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$3,784,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,937,600	$5,700	$0	$1,943,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,000	$1,800	$0	$617,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,000	$800	$0	$272,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$921,600	$2,700	$0	$924,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$128,000	$400	$0	$128,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$752,700	$2,200	$0	$754,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$551,700	$1,700	$0	$553,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				8	$530,800	$1,900	$0	$532,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$78,400	$300	$0	$78,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,000	$300	$0	$92,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$68,000	$200	$0	$68,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$300	$0	$80,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$94,000	$300	$0	$94,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$72,000	$300	$0	$72,300
TOTAL				**8**	**$3,772,800**	**$11,500**	**$0**	**$3,784,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$242,400
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,280,000		$367,700		$0	$0		$367,700
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
5	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total			**Afiliados(7)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,760,000		$610,100		$0	$0		$610,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355571916	9460229015	Y	2023/12/19	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	3	$611,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$610,100	$1,800	$0	$611,900
TOTAL				**7**	**$610,100**	**$1,800**	**$0**	**$611,900**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1

LUGAR DE EJECUCION: SEVILLA- VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA N°	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2.089.847.608,73
		ADICION	$ -
		VALOR TOTAL	$ 2.089.847.608,73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	TOTALLINC		

A LOS 31 DIAS DE JULIO DEL 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR DE OBRAY FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ EN CALIDAD DE

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES				$ 28.330.617,00				$ 1.690.416,75	$ 14.091.290,89			$ 15.929.743,58	
1,02	DESMONTE DE CANALETA PLASTICA Y METALICA DE RED DE VOZ Y DATOS	M	5,23	$ 6.121,08	$ 32.013,00		5,23			$ 32.013,25				No aplica, se verrifico en sitio
1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	UN	2,00	$ 14.281,54	$ 28.563,00		2,00			$ 28.563,08				No aplica, se verrifico en sitio
1,05	DESMONTE DE ALFOMBRA	M2	207,30	$ 5.279,26	$ 1.094.391,00		207,30			$ 1.094.390,60				No aplica, se verrifico en sitio
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	5,60	$ 9.238,46	$ 51.735,00		5,60			$ 51.735,38				No aplica, se verrifico en sitio
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	37,00	$ 17.401,86	$ 643.869,00							37,00	$ 643.868,82	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	258,70	$ 10.793,72	$ 2.792.335,00	12,00			$ 129.524,64			270,70	$ 2.921.860,00	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 96.282,06	$ 96.282,00		1,00			$ 96.282,06				
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	M2	258,70	$ 27.923,14	$ 7.223.716,00		258,70			$ 7.223.716,32				No aplica, se verrifico en sitio
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	3,00	$ 42.427,14	$ 127.281,00	4,00			$ 169.708,56			7,00	$ 296.989,98	
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	2,25	$ 17.470,46	$ 39.309,00	20,11			$ 351.330,95			22,36	$ 390.639,49	No aplica, se verrifico en sitio
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	37,60	$ 9.642,22	$ 362.547,00	34,40			$ 331.692,37			72,00	$ 694.239,84	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	234,10	$ 13.513,22	$ 3.163.445,00		91,67			$ 1.238.756,88		142,43	$ 1.924.687,92	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	3,73	$ 34.758,64	$ 129.650,00		3,73			$ 129.649,73				No aplica, se verrifico en sitio
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	M2	1,70	$ 18.606,28	$ 31.631,00	11,35			$ 211.181,28			13,05	$ 242.811,95	
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	M2	234,01	$ 15.650,60	$ 3.662.397,00		91,58			$ 1.433.281,95		142,43	$ 2.229.114,96	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	M2	1,14	$ 29.981,14	$ 34.178,00	0,82			$ 24.584,53			1,96	$ 58.763,03	cantidad verificada en sitio acorde al proyecto
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	1,70	$ 11.295,48	$ 19.202,00	7,40			$ 83.586,55			9,10	$ 102.788,87	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	M	186,97	$ 5.920,18	$ 1.106.896,00		69,17			$ 409.498,85		117,80	$ 697.397,20	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	2,00	$ 23.241,68	$ 46.483,00		2,00			$ 46.483,36				
1,54	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	5,60	$ 23.198,56	$ 129.912,00	16,76			$ 388.807,87			22,36	$ 518.719,80	No aplica, se verrifico en sitio
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	37,00	$ 18.899,30	$ 699.274,00		24,00			$ 453.583,20		13,00	$ 245.690,90	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	1,00	$ 431.350,92	$ 431.351,00							1,00	$ 431.350,92	
1,60	DESCAPOTE MANUAL E=20CM	M2	84,88	$ 17.260,74	$ 1.465.092,00		84,88			$ 1.465.091,61				No aplica, se verrifico en sitio
1,63	LLENO EN ARENA	M3	4,24	$ 170.412,20	$ 722.548,00							4,24	$ 722.547,73	

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	30,00	$ 26.919,62	$ 807.589,00							30,00	$ 807.588,60	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	50,00	$ 16.176,86	$ 808.843,00		24,00			$ 388.244,64		26,00	$ 420.598,36	
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	20,00	$ 129.004,26	$ 2.580.085,00							20,00	$ 2.580.085,20	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**				**$ 3.184.602,00**				**$ 2.240.295,68**	**$ 791.324,52**			**$ 4.633.573,28**	
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	1,00	$ 873.853,26	$ 873.853,00							1,00	$ 873.853,26	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	UN	1,00	$ 734.994,12	$ 734.994,00							1,00	$ 734.994,12	
2,13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	UN	1,00	$ 441.423,36	$ 441.423,00		1,00			$ 441.423,36				
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	1,00	$ 528.023,02	$ 528.023,00	4,00			$ 2.112.092,08			5,00	$ 2.640.115,10	
2,15	MARCO PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	UN	1,00	$ 174.950,58	$ 174.951,00		1,00			$ 174.950,58				
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	1,00	$ 174.950,58	$ 174.951,00		1,00			$ 174.950,58				
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	2,00	$ 128.203,60	$ 256.407,00	1,00			$ 128.203,60			3,00	$ 384.610,80	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 673.800,00**				**$ 395.915,69**	**$ 433.722,52**			**$ 635.992,12**	
3,05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 433.722,52	$ 433.723,00		1,00			$ 433.722,52				cantidad verificada en sitio acorde a el proyecto
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	0,45	$ 313.550,02	$ 141.098,00							0,45	$ 141.097,51	No aplica, se verrifico en sitio
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	0,54	$ 183.294,30	$ 98.979,00	2,16			$ 395.915,69			2,70	$ 494.894,61	
4	**CIELORRASOS**				**$ 24.258.268,00**				**$ 3.024.227,90**				**$ 27.282.496,12**	
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	M2	207,03	$ 117.172,72	$ 24.258.268,00	25,81			$ 3.024.227,90			232,84	$ 27.282.496,12	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**				**$ 18.693.980,00**					**$ 10.937.259,26**			**$ 7.756.720,95**	
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	M2	542,21	$ 34.477,38	$ 18.693.980,00		317,23			$ 10.937.259,26		224,98	$ 7.756.720,95	
6	**CUBIERTAS**				**$ 39.422.954,00**				**$ 4.882.832,18**	**$ 2.520.803,04**			**$ 41.784.983,46**	
6,16	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M	258,70	$ 55.176,94	$ 14.274.274,00	84,74			$ 4.675.693,90			343,44	$ 18.949.968,27	cantidad verificada en sitio acorde a el proyecto
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	M	37,60	$ 75.023,90	$ 2.820.899,00		33,60			$ 2.520.803,04		4,00	$ 300.095,60	
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	M2	258,70	$ 86.307,62	$ 22.327.781,00	2,40			$ 207.138,29			261,10	$ 22.534.919,58	cantidad verificada en sitio acorde a el proyecto
7	**ENCHAPE MUROS**				**$ 1.341.500,00**				**$ 2.282.657,65**				**$ 3.624.157,99**	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	19,10	$ 70.235,62	$ 1.341.500,00	32,50			$ 2.282.657,65			51,60	$ 3.624.157,99	
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 1.998.884,00**					**$ 1.998.884,71**				
8,01	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M	14,50	$ 106.364,30	$ 1.542.282,00		14,50			$ 1.542.282,35				
8,02	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M	4,66	$ 97.983,34	$ 456.602,00		4,66			$ 456.602,36				
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**				**$ 2.471.696,00**				**$ 4.348.333,99**				**$ 6.820.030,00**	
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	113,81	$ 19.873,42	$ 2.261.794,00	187,00			$ 3.716.329,54			300,81	$ 5.978.123,47	
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	M2	13,70	$ 15.321,32	$ 209.902,00	41,25			$ 632.004,45			54,95	$ 841.906,53	cantidad verificada en sitio acorde a el proyecto
12	**MAMPOSTERÍA**				**$ 1.999.265,00**					**$ 1.999.265,27**				
12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2	16,12	$ 124.023,90	$ 1.999.265,00		16,12			$ 1.999.265,27				
13	**PINTURAS**				**$ 21.602.721,00**					**$ 16.203.038,27**			**$ 5.399.682,40**	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	920,17	$ 23.476,88	$ 21.602.721,00		690,17			$ 16.203.038,27		230,00	$ 5.399.682,40	
14	**PISOS**				**$ 37.120.907,00**				**$ 622.241,69**	**$ 11.876.273,04**			**$ 25.866.876,33**	
14,06	PISO CERÁMICO DURO PISO	M2	234,01	$ 86.304,68	$ 20.196.158,00		91,58			$ 7.903.782,59		142,43	$ 12.292.375,57	
14,07	PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL	M2	84,88	$ 74.376,12	$ 6.313.045,00	8,19			$ 609.140,42			93,07	$ 6.922.185,49	
14,12	POYO COCINA 55X10CM	M	1,80	$ 81.882,92	$ 147.389,00	0,16			$ 13.101,27			1,96	$ 160.490,52	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	M2	234,01	$ 21.754,04	$ 5.090.663,00		91,58			$ 1.992.234,98		142,43	$ 3.098.427,92	

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	190,93	$ 28.144,62	$ 5.373.652,00		70,36			$ 1.980.255,46		120,57	$ 3.393.396,83	
15	**RED ELÉCTRICA**				**$ 643.614,00**				**$ 747.219,62**	**$ 290.603,32**			**$ 1.100.229,34**	
15,06	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4	UN	2,00	$ 14.488,32	$ 28.977,00		2,00			$ 28.976,64				
15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	UN	1,00	$ 96.377,12	$ 96.377,00		1,00			$ 96.377,12				
15,28	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	UN	1,00	$ 111.782,72	$ 111.783,00	1,00			$ 111.782,72			2,00	$ 223.565,44	
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	1,00	$ 114.139,62	$ 114.140,00							1,00	$ 114.139,62	
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UN	1,00	$ 127.087,38	$ 127.087,00	5,00			$ 635.436,90			6,00	$ 762.524,28	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1,00	$ 165.249,56	$ 165.250,00		1,00			$ 165.249,56				
16	**RED HIDRÁULICA**				**$ 2.889.160,00**				**$ 276.545,22**	**$ 1.140.602,40**			**$ 2.025.102,38**	
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	1,00	$ 33.309,22	$ 33.309,00	1,00			$ 33.309,22			2,00	$ 66.618,44	
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	1,00	$ 33.045,60	$ 33.046,00	1,00			$ 33.045,60			2,00	$ 66.091,20	
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	UN	1,00	$ 30.953,30	$ 30.953,00	2,00			$ 61.906,60			3,00	$ 92.859,90	
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	UN	1,00	$ 296.756,74	$ 296.757,00		1,00			$ 296.756,74				
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	1,00	$ 74.141,90	$ 74.142,00	2,00			$ 148.283,80			3,00	$ 222.425,70	
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1,00	$ 843.845,66	$ 843.846,00		1,00			$ 843.845,66				
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 519.324,54	$ 519.325,00							1,00	$ 519.324,54	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	3,00	$ 281.763,72	$ 845.291,00							3,00	$ 845.291,16	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	3,00	$ 70.830,48	$ 212.491,00							3,00	$ 212.491,44	
17	**RED SANITARIA**				**$ 2.087.033,00**					**$ 646.975,42**			**$ 1.440.058,06**	
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UN	1,00	$ 116.234,86	$ 116.235,00							1,00	$ 116.234,86	
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	1,00	$ 79.374,12	$ 79.374,00							1,00	$ 79.374,12	
17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	1,00	$ 49.724,22	$ 49.724,00							1,00	$ 49.724,22	
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1,00	$ 646.975,42	$ 646.975,00		1,00			$ 646.975,42				
17,29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	1,00	$ 1.194.724,86	$ 1.194.725,00							1,00	$ 1.194.724,86	
18	**URBANISMO**				**$ 214.068,00**				**$ 1.429.216,52**				**$ 1.643.284,19**	
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2	1,70	$ 125.922,16	$ 214.068,00	11,35			$ 1.429.216,52			13,05	$ 1.643.284,19	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**				**$ 3.238.239,00**				**$ 1.197.413,00**	**$ 326.496,80**			**$ 4.109.155,68**	
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	1,00	$ 437.013,36	$ 437.013,00							1,00	$ 437.013,36	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1,00	$ 1.475.861,38	$ 1.475.861,00							1,00	$ 1.475.861,38	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	20,00	$ 16.324,84	$ 326.497,00		20,00			$ 326.496,80				
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	8,00	$ 38.256,26	$ 306.050,00							8,00	$ 306.050,08	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	1,00	$ 171.059,00	$ 171.059,00	7,00			$ 1.197.413,00			8,00	$ 1.368.472,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	1,00	$ 521.758,86	$ 521.759,00							1,00	$ 521.758,86	
20	**NO PREVISTOS**										**$ 34.045.296,89**		**$ 40.119.222,11**	
1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	M2		$ 6.716,92				226,04			$ 1.518.292,60	226,04	$ 1.518.292,60	
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN		$ 23.756,18				6,00			$ 142.537,08	6,00	$ 142.537,08	
1.15	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA	M2		$ 14.811,72				259,50			$ 3.843.641,34	259,50	$ 3.843.641,34	
1.20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN		$ 17.470,46				1,00			$ 17.470,46	1,00	$ 17.470,46	
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2		$ 13.513,22				52,00			$ 702.687,44	52,00	$ 702.687,44	
2.17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	M2		$ 82.908,00		7,04		1,00			$ 82.908,00	8,04	$ 666.580,32	

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	UN		$ 223.880,02				1,00			$ 223.880,02	1,00	$ 223.880,02	
6.08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	M2		$ 63.866,53				9,36			$ 597.790,69	9,36	$ 597.790,69	
6.22	CABALLETE UPVC E=2,2 MM (Caballete Forte Blanco 0.6X0.94mt 2mm UPVC)	ML		$ 153.028,99				12,00				12,00	$ 1.836.347,88	
7.01	ESTUCO EXTERIOR	M2		$ 16.329,74				68,00			$ 1.110.422,32	68,00	$ 1.110.422,32	
7.02	ESTUCO INTERIOR	UN		$ 15.239,98				203,37			$ 3.099.354,73	203,37	$ 3.099.354,73	
15.09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN		$ 170.218,16				31,00			$ 5.276.762,96	31,00	$ 5.276.762,96	
15.37	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC	UN		$ 107.254,14				1,00			$ 107.254,14	1,00	$ 107.254,14	
16.09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN		$ 32.364,50				1,00			$ 32.364,50	1,00	$ 32.364,50	
16.19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN		$ 208.731,18		3,00			$ 626.193,54			3,00	$ 626.193,54	
17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN		$ 419.874,14				3,00			$ 1.259.622,42	3,00	$ 1.259.622,42	
17.24	TUBERÍA PVCS 4" DESCOLGADA	ML		$ 50.020,18		24,00			$ 1.200.484,32			24,00	$ 1.200.484,32	
20.02	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2		$ 24.867,00		73,48			$ 1.827.227,16			73,48	$ 1.827.227,16	
NP-02	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	UN		$ 132.952,23				2,00			$ 265.904,46	2,00	$ 265.904,46	
NP-03	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M		$ 47.245,02				72,00			$ 3.401.641,44	72,00	$ 3.401.641,44	
NP-04	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	M2		$ 195.397,50				47,91			$ 9.362.443,20	47,91	$ 9.362.443,20	
NP-06	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN		$ 277.537,96				1,00			$ 277.537,96	1,00	$ 277.537,96	
NP-07	TUBERÍA PVCP 1/2"	M		$ 16.155,60				20,00			$ 323.112,08	20,00	$ 323.112,08	
NP-08	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UN		$ 52.189,57				3,00			$ 156.568,71	3,00	$ 156.568,71	
NP-09	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M		$ 36.586,73				50,00			$ 1.829.336,50	50,00	$ 1.829.336,50	
NP-10	GRANITO LAVADO	M2		$ 45.973,76				9,00			$ 413.763,84	9,00	$ 413.763,84	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 190.171.308,00**				**$ 26.791.220,91**	**$ 63.256.539,47**	**$ 34.045.296,89**		**$ 190.171.308,00**	
	ADMINISTRACIÓN	**%**	**23%**		$ 43.739.401,00				$ 6.161.980,81	$ 14.549.004,08	$ 7.830.418,28		$ 43.739.401,00	
	IMPREVISTOS	**%**	**1%**		$ 1.901.713,00				$ 267.912,21	$ 632.565,39	$ 340.452,97		$ 1.901.713,00	
	UTILIDAD	**%**	**5%**		$ 9.508.565,00				$ 1.339.561,05	$ 3.162.826,97	$ 1.702.264,84		$ 9.508.565,00	
	IVA SOBRE UTILIDAD	**%**	**19%**		$ 1.806.627,00				$ 254.516,60	$ 600.937,12	$ 323.430,32		$ 1.806.627,00	
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 247.127.614,00**				**$ 34.815.191,57**	**$ 82.201.873,03**	**$ 44.241.863,30**		**$ 247.127.614,00**	
	VALOR TOTAL OBRA			**$**	**247.127.614,00**						**-$ 3.144.818,16**		**$ 247.127.614,00**	
	SALDO POR AJUSTAR													

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRATISTA

ARQ.FERNANDO JIMENEZ
INTERVENTORIA (SI APLICA)

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. SUPERVISION

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 11
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Versión: 01
	FORMATO: JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

JUSTIFICACIÓN ACTA No.1
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
LUGAR DE EJECUCION SEVILLA

CONTRATO DE OBRA N°	1674 DE 2023	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$2,089,847,608.73
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)- AGRUPACION 1	
INTERVENTORIA:	TOTALLINC S.A.S		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR. CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
1	**PRELIMINARES**					
1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	M	5.23			No aplica
1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	UN	2.00			No aplica
1,05	DESMONTE DE ALFOMBRA	M2	207.30			No aplica
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	5.60			No aplica
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	37.00	37.00	100%	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	258.70	259.50	100%	Mayor cantidad realizada en sitio
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	UN	1.00	1.00	100%	
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	M2	258.70	259.50	100%	Mayor cantidad realizada en sitio
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	3.00	6.00	200%	Mayor cantidad realizada en sitio
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	2.25	28.25	1256%	Mayor cantidad realizada en sitio
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	37.60	41.20	110%	Mayor cantidad realizada en sitio
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	234.10	174.10	74%	Menor cantidad revisada en sitio
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	M	3.73			No aplica
1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	M2	1.70	9.00	529%	Mayor cantidad realizada en sitio
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	M2	234.01	149.30	64%	Menor cantidad revisada en sitio
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	M2	1.14	1.96	172%	Mayor cantidad realizada en sitio
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	1.70	20.00	1176%	Mayor cantidad realizada en sitio
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	M	186.97	117.80	63%	Menor cantidad revisada en sitio
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	2.00	2.00	100%	
1,54	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	5.60	5.60	100%	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	37.00	37.00	100%	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	1.00	100%	
1,60	DESCAPOTE MANUAL E=20CM	M2	84.88			No aplica
1,63	LLENO EN ARENA	M3	4.24	4.87	115%	Mayor cantidad realizada en sitio
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	30.00	30.00	100%	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	50.00	50.00	100%	
1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	20.00	20.00	100%	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**					
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	1.00	1.00	100%	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	UN	1.00	1.00	100%	
2,13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	UN	1.00	1.00	100%	
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	1.00	1.00	100%	
2,15	MARCO PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	UN	1.00	1.00	100%	
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	UN	1.00	1.00	100%	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	2.00	2.00	100%	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**					

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 11
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Versión: 01
	FORMATO: JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

JUSTIFICACIÓN ACTA No.1
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
LUGAR DE EJECUCION SEVILLA

CONTRATO DE OBRA N°	1674 DE 2023	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$2,089,847,608.73
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)- AGRUPACION 1	
INTERVENTORIA:	TOTALLINC S.A.S		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR. CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
3,05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00			No aplica
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	0.45	0.45	100%	
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	0.54	2.00	370%	Mayor cantidad realizada en sitio
4	**CIELORRASOS**					
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	M2	207.03	226.04	109%	Mayor cantidad realizada en sitio
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**					
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	M2	542.21	132.90	25%	Menor cantidad revisada en sitio
6	**CUBIERTAS**					
6,16	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M	258.70	345.04	133%	Mayor cantidad realizada en sitio
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	M	37.60	41.60	111%	Mayor cantidad realizada en sitio
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	M2	258.70	259.50	100%	
7	**ENCHAPE MUROS**					
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	19.10	33.78	177%	Mayor cantidad realizada en sitio
8	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
8,01	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M	14.50			no aplica
8,02	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	M	4.66			No aplica
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	113.81	300.81	264%	Mayor cantidad realizada en sitio
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	M2	13.70	170.30	1243%	Mayor cantidad realizada en sitio
12	**MAMPOSTERÍA**					
12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2	16.12			no aplica
13	**PINTURAS**					
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	920.17	408.73	44%	Menor cantidad revisada en sitio
14	**PISOS**					
14,06	PISO CERÁMICO DURO PISO	M2	234.01	149.30	64%	Menor cantidad revisada en sitio
14,07	PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL	M2	84.88	84.88	100%	
14,12	POYO COCINA 55X10CM	M	1.80	2.00	111%	Mayor cantidad realizada en sitio
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	M2	234.01	149.30	64%	Menor cantidad revisada en sitio
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	190.93	90.00	47%	Menor cantidad revisada en sitio
15	**RED ELÉCTRICA**					
15,06	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4	UN	2.00	2.00	100%	
15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	UN	1.00	2.00	200%	Mayor cantidad realizada en sitio
15,28	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	UN	1.00	5.00	500%	Mayor cantidad realizada en sitio
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	1.00	1.00	100%	
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	UN	1.00	11.00	1100%	Mayor cantidad realizada en sitio
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	1.00	1.00	100%	
16	**RED HIDRÁULICA**					

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 11
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Versión: 01
	FORMATO: JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

JUSTIFICACIÓN ACTA No.1
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
LUGAR DE EJECUCION SEVILLA

CONTRATO DE OBRA N°	1674 DE 2023	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$2,089,847,608.73
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)- AGRUPACION 1	
INTERVENTORIA:	TOTALLINC S.A.S		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR. CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	1.00	3.00	300%	Mayor cantidad realizada en sitio
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	1.00	3.00	300%	Mayor cantidad realizada en sitio
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	UN	1.00	3.00	300%	Mayor cantidad realizada en sitio
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	UN	1.00			no aplica
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	UN	1.00	2.00	200%	Mayor cantidad realizada en sitio
16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1.00			no aplica
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	1.00	100%	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	3.00	3.00	100%	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	3.00	3.00	100%	
17	**RED SANITARIA**					
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UN	1.00	2.00	200%	Mayor cantidad realizada en sitio
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	1.00	2.00	200%	Mayor cantidad realizada en sitio
17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	1.00	2.00	200%	Mayor cantidad realizada en sitio
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1.00			no aplica
17,29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	1.00	1.00	100%	
18	**URBANISMO**					
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	M2	1.70	9.00	529%	Mayor cantidad realizada en sitio
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**					
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	1.00	1.00	100%	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00	1.00	100%	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	M	20.00	20.00	100%	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	8.00	8.00	100%	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	1.00	1.00	100%	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	1.00	1.00	100%	
20	**NO PREVISTOS**					
NP-01	DESMONTE DE CIELORRASO	M2		226.04		Necesario para cambio de cielorraso
NP-02	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN		4.00		Necesario para cambio de piso
NP-03	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN		1.00		Necesario para mantenimiento
NP-04	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2		33.78		Necesario para instalacion de nuevo
NP-05	ESTUCO EXTERIOR	M2		25.00		Necesario para la proteccion del muro
NP-06	ESTUCO INTERIOR	M2		92.90		Necesario para la proteccion del muro
NP-07	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN		31.00		Necesarios para iluminacion de orip
NP-08	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC	UN		19.00		Necesario conexión
NP-09	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN		2.00		Necesario en sitio
NP-10	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	M2		65.00		Necesario para instalacion de nuevo
NP-11	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	UN				Necesario para baño del personal de discapacitado
NP-12	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	M		60.00		

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 11
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Versión: 01
	FORMATO: JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

JUSTIFICACIÓN ACTA No.1
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
LUGAR DE EJECUCION SEVILLA

CONTRATO DE OBRA N°	1674 DE 2023	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$2,089,847,608.73
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)- AGRUPACION 1	
INTERVENTORIA:	TOTALLINC S.A.S		

A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FLAMINIO SANCHEZ SANCHES REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS COMO CONTRATISTA, Y FERNANDO JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL DE TOTALL INC SA COMO INTERVENTOR. CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	OBRA					
NP-13	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	M2		60.32		Necesario para evitar filtraciones
NP-14	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	M2				
NP-15	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN		1.00		
NP-16	TUBERÍA PVCP 1/2"	M		20.00		
NP-17	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UN		3.00		Necesario para el mantenimiento
NP-18	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M		43.67		Necesario para el mantenimiento de la red
NP-19	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GRANITO LAVADO	M2		9.00		Necesario

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

ARQ. FERNANDO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA: TOTALLINC

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR/ FUNCIONARIO

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No:	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,11 DESMONTE DE CUBIERTA	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,00						60,30
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,00						30,60
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,00						62,10
		1,00	9,70	9,00						87,30
		1,00	3,20	6,00						19,20
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UNIDAD	UN

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
AREA DE CAJAS										-
VENTANILLAS DE ATENCION	PISO 1	2,00								2,00
CONTRATISTA		1,00								1,00
PATIO INTERNO		1,00								1,00
OFICINA 1		1,00								1,00
OFICINA 2		1,00								1,00
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,34 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	5,00	2,51		2,25					28,25
										-
										-
										-

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ


ITEM:	ITEM 1,37 DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
OFICINAS Y PATIO INTERNO	PISO 1									-
OFICINA 1	PISO 1	1,00	3,40	3,20						10,88
OFICINA 2	PISO 1	1,00	3,00	3,20						9,60
CUARTO RACK	PISO 1	1,00	3,10	3,20						9,92
CAFETERIA	PISO 1	1,00	2,00	3,80						7,60
PASILLO	PISO 1	1,00	9,56	1,00						9,56
AREA PATIO	PISO 1	1,00	3,10	9,00						27,90
	PISO 1	1,00	4,82	3,20						15,42
	PISO 1	1,00	2,00	1,52						3,04
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	7,200	3,20						23,04
	PISO 1	2,00	1,43	3,00						8,58
	PISO 1	1,00	2,54	1,00						2,54
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
						TOTAL				128,08

CROQUIS





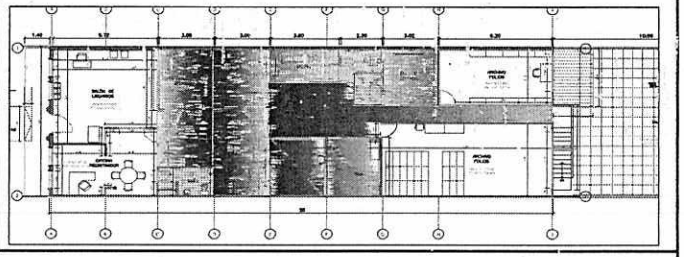

Observaciones

RESIDENTE

CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
A0[illegible]322006-92536604

INTERVENTOR

DIDIER A MOLTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78[illegible]47710

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1.43 DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINAS Y PATIO INTERNO	PISO 1									-
OFICINA 1	PISO 1	1,00	3,40	3,20						10,88
OFICINA 2	PISO 1	1,00	3,00	3,20						9,60
CUARTO RACK	PISO 1	1,00	3,10	3,20						9,92
CAFETERIA	PISO 1	1,00	2,00	3,80						7,60
PASILLO	PISO 1	1,00	9,56	1,00						9,56
AREA PATIO	PISO 1	1,00	3,10	9,00						27,90
	PISO 1	1,00	4,82	3,20						15,42
	PISO 1	1,00	2,00	1,52						3,04
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	7,200	3,20						23,04
	PISO 1	2,00	1,43	3,00						8,58
	PISO 1	1,00	2,54	1,00						2,54
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										TOTAL 128,08

CROQUIS



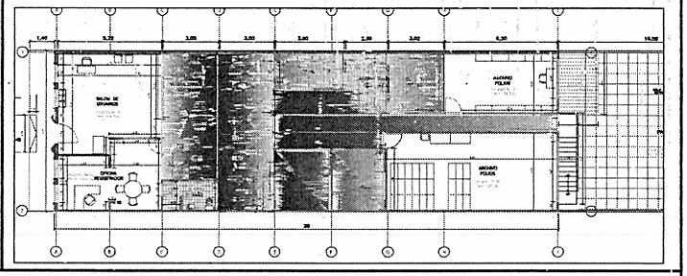

Observaciones

RESIDENTE

CARLOS SANTIAGO GARCIA OLIVA
A08322005-92536604

INTERVENTOR

DIDIER A MONTERROZA CASSAB
Matricula No.: A08192002- 787477 10

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ


ITEM:	ITEM 1,47 REGATA SOBRE MURO+RESANE	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BATERIAS SANITARIAS	PISO 1	1,00	8,300							8,30
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	8,30

CROQUIS



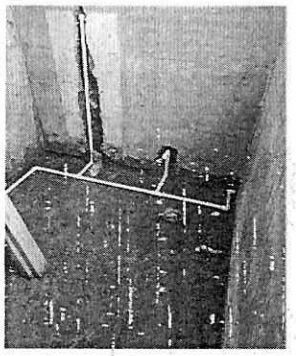



Observaciones

RESIDENTE

CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
A08122006-92536604

INTERVENTOR

DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matricula No.: A08192002- 78747710

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTAL INC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,50 DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO. (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA PATIO, OFICINAS Y RACK	PISO 1	1,00	90,000							90,00
AREA OFICINAS	PISO 1	1,00	27,80							27,80
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TCTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	UNIDAD	GL

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	1,00

CROQUIS









Observaciones

RESIDENTE

CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
A08 J22006-92536604

INTERVENTOR

DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matricula No.: A08192002- 78747710

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 1,67 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	7,00								7,00
										-
										-
										-

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S


OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)


INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ


ITEM: *ITEM 6,16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO* — UNIDAD: *ML*

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA 1	CUBIERTA	7,00	9,080							63,56
ZONA 2	CUBIERTA	5,00	9,080							45,40
ZONA 3	CUBIERTA	8,00	9,080							72,64
ZONA 4	CUBIERTA	11,00	9,080							99,88
ZONA 5	CUBIERTA	7,00	9,080							63,56
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
							TOTAL			345,04

CROQUIS







Observaciones

RESIDENTE

CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
A08122006-92536604

INTERVENTOR

DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM: *ITEM 6,22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM* — UNIDAD: *M2*

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	*PISO 1*	*1,00*	*6,700*	*9,00*						*60,30*
ZONA DE ARCHIVO 2		*1,00*	*3,40*	*9,00*						*30,60*
ZONA DE PATIO INTERNO		*1,00*	*6,90*	*9,00*						*62,10*
ATNCION AL USUARIO		*1,00*	*9,70*	*9,00*						*87,30*
PATIO INTERNO		*1,00*	*3,20*	*6,00*						*19,20*
										-
										-
										-

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 28 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	28	MES	10	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.-	1674-2023	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S BIC	SUPERVISOR SNR	ALFONSO RENE SANCHEZ

ITEM:	ITEM 14,06 PISO CERÁMICO DURO PISO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINAS Y PATIO INTERNO	PISO 1									-
OFICINA 1	PISO 1	1,00	3,40	3,20						10,88
OFICINA 2	PISO 1	1,00	3,00	3,20						9,60
CUARTO RACK	PISO 1	1,00	3,10	3,20						9,92
CAFETERIA	PISO 1	1,00	2,00	3,80						7,60
PASILLO	PISO 1	1,00	9,56	1,00						9,56
AREA PATIO	PISO 1	1,00	3,10	9,00						27,90
	PISO 1	1,00	1,48	3,20						4,73
										-
										-
										-
