ACTIVIDADES DE ENTREGA

Para el mes de SEPTIEMBRE 2024 se realizan las siguientes entregas en la localidad de Sumapaz. Para este periodo se realizan la programación de las siguientes visitas.

	
Entrega N° 53 MVR 33 Beneficiaria: Blanca Inesa Salazar 6-9-2024	Entrega N° 54 MVR 35 Beneficiaria: Leide Esperanza Benítez Valbuena 6-9-2024
	
Entrega N° 55 MVR 41 Beneficiaria: María Aurora Rodríguez. 6-9-2024	Entrega N° 56 MVR 45 Beneficiaria: María Nely Chingate. 6-9-2024

	
Entrega N° 57 MVR 46 Beneficiario: Carlos Alberto Cifuentes. 6-9-2024	Entrega N° 58 MVR 40 Beneficiario: Josué Torres Riveros 25-9-2024
	
Entrega N° 59 MVR 47 Beneficiario: Senen Poveda Pabón 25-9-2024	Entrega N° 60 MVR 57 Beneficiaria: Lucrecia Hurtado 25-9-2024
	
Entrega N° 61 MVR 26 Beneficiario: José Floriberto Gutiérrez Penagos 25-9-2024	Entrega N° 62 MVR 63 Beneficiaria: Cecilia Poveda González 25-9-2024

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS SEPTIEMBRE

Para el mes de SEPTIEMBRE 2024 se realizan los siguientes seguimientos en la localidad de Sumapaz. Para este periodo se acompañó las siguientes visitas.









MVR33 actividades de pañete , instalación de cieloraso , avance del 60%









MVR41 Actividades de cubierta terminadas , se realiza toma de medidas









MVR46 Actividades de instalación de cubierta , avance del 80% , se realiza toma de medidas









MVR35 Actividades de remates , avance del 90 % se toman medidas

3 DE SEPTIEMBRE 2024









MVR40 Actividades pendientes de pintura interna , redes eléctricas internas , interruptores y tomas, falta el combo sanitario , lavaplatos , grifería , canal y aseo









MVR45 Actividades terminadas según presupuesto, pendiente la instalación de una ducha eléctrico y medir ya que algunas cantidades no se hicieron completas

	
Humedad bastante pronunciada en esa vivienda **MVR45**	**MVR 33** Esta caja casi no se puede abrir por el cielo raso , según los maestros nose puede subir más el nivel
18 DE SEPTIEMBRE	
	
	
MVR57 Módulo cocina , actividades de pañete e instalación de perfiles para cubierta avance del 70%	









MVR54 Actividades de enchape piso hall , enchape baño , cieloraso cocina y habitación, y excavación manual para pozo











MVR47 Módulo cocina, actividades de fundida de columnas y armado de hierros para vigas aéreas





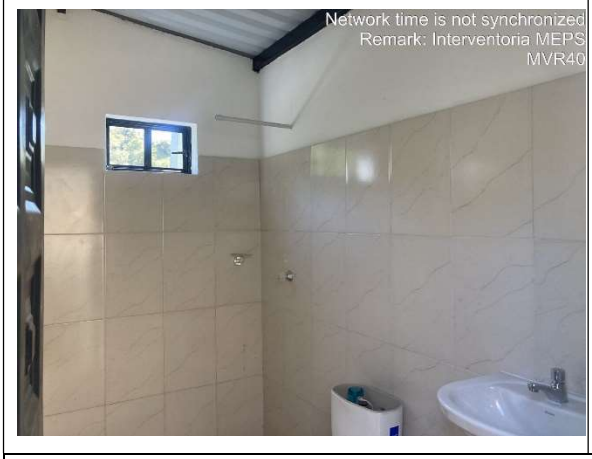

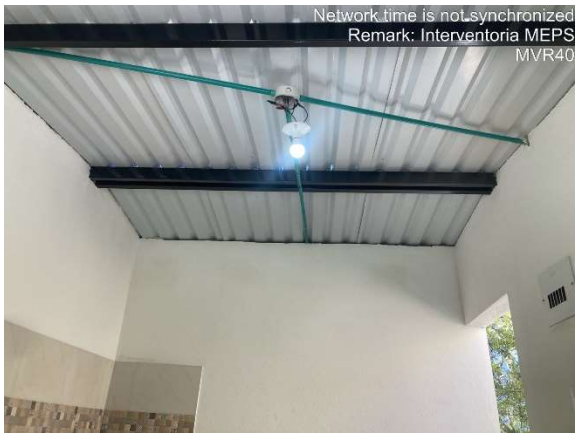

MVR40 Pendiente puerta

19 DE SEPTIEMBRE 2024











MVR26 Actividades terminadas de pañete , enchape pisos , pintura interna , cubierta , mesón de cocina , avance del 95%



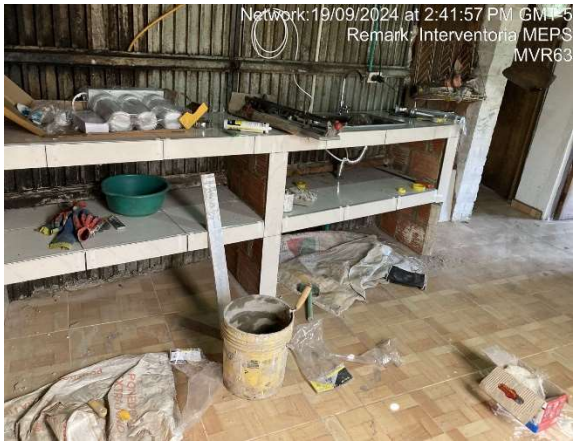



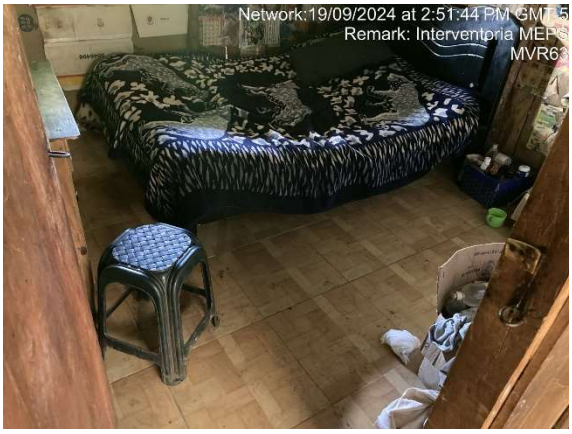

MVR63 Actividades terminadas de enchape piso, placa piso de una habitación , pintura una habitación , enchape piso baño , enchape mesón , avance del 90%

ENSAYOS DE LABORATORIO





MVR_47 Elementos estructurales

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo





MVR_57 Elementos estructurales

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo
