
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" PVC -P Incluye tubería (Promedio 1,10m), cámara de aire PVC-P y accesorios**				
CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,01**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**		

UBICACIÓN

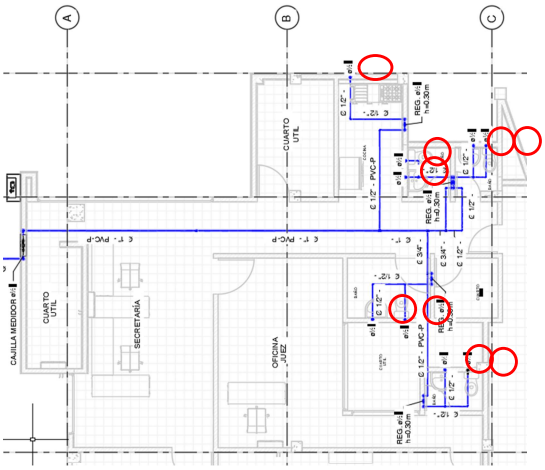

REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO				9,00	9,00
TOTAL CANTIDAD					9,00


TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**9,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2", por afinado de placa, Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de piso**

CAPITULO 1	ÍTEM	1,02	UNIDAD	UND
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN

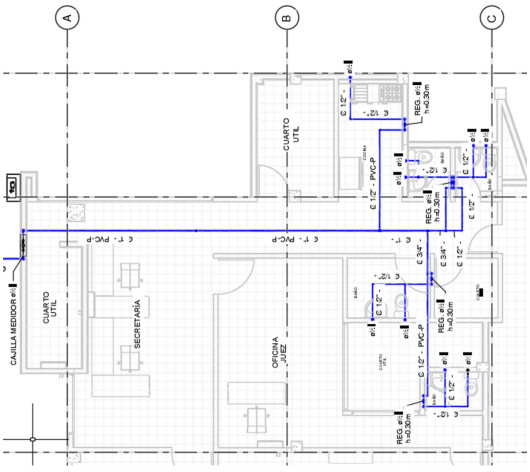

REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO			36,00		36,00
TOTAL CANTIDAD					36,00


TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	36,00

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de piso**

CAPITULO 1	ÍTEM	1,03	UNIDAD	M
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN

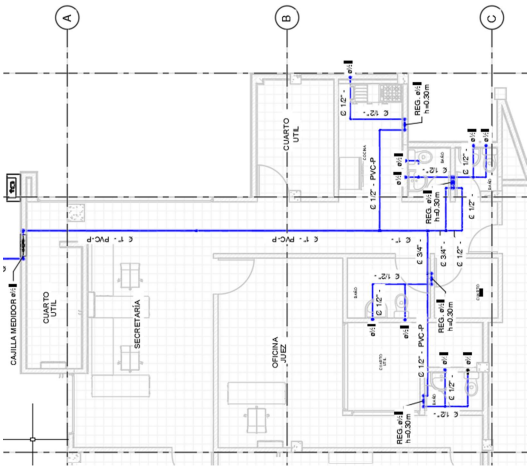

REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO			2,50		2,50
TOTAL CANTIDAD					2,50


TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	2,50

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua fría (Red de suministro). Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de piso**

CAPITULO 1	ÍTEM	1,04	UNIDAD	M
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN

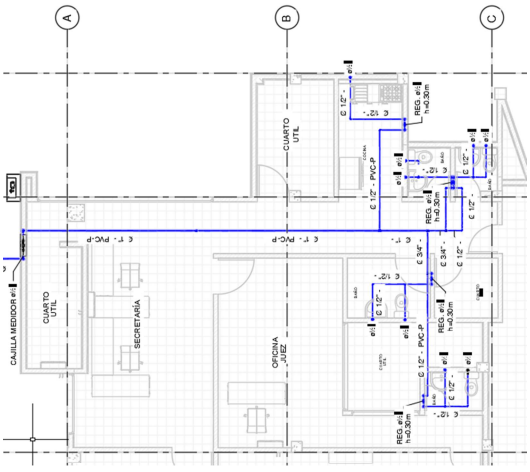


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO			18,50		18,50
TOTAL CANTIDAD					18,50

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	18,50

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 1/2" LISA SOLDABLE. Grival o similar. Incluye accesorios (adaptadores), universal, tapa registro PVC blanco de 20x20cm, y demás elementos necesarios para su**				
CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,05**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**		

UBICACIÓN

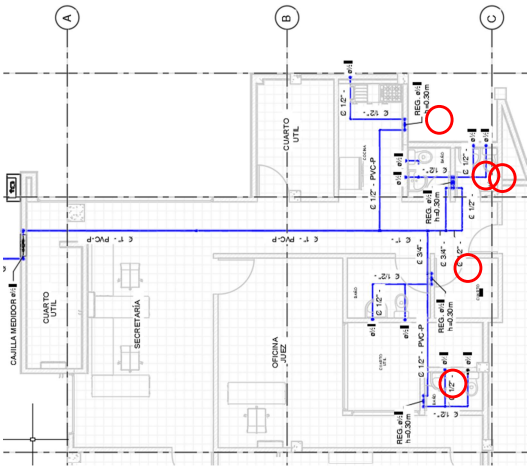


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO				5,00	5,00
TOTAL CANTIDAD					5,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**5,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1/2" PARA AGUA FRÍA, VALIDADO Y HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas,**				
CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,06**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**		

UBICACIÓN

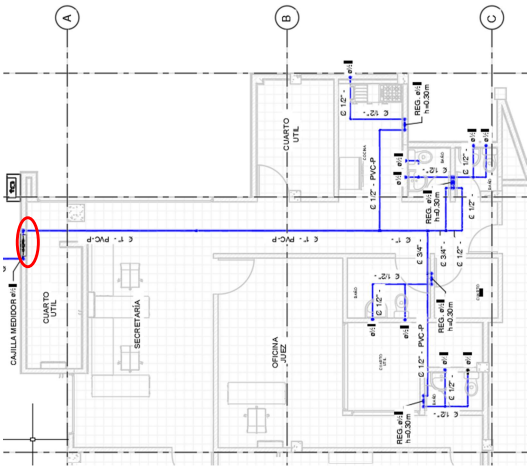


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					1,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**Suministro e instalación de cajilla en lámina Cal. 18 para 1 medidor, homologada por la empresa prestadora del servicio. Incluye plaqueta de identificación y de adecuación de nicho con mortero. A todo costo.**				
	CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,07**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

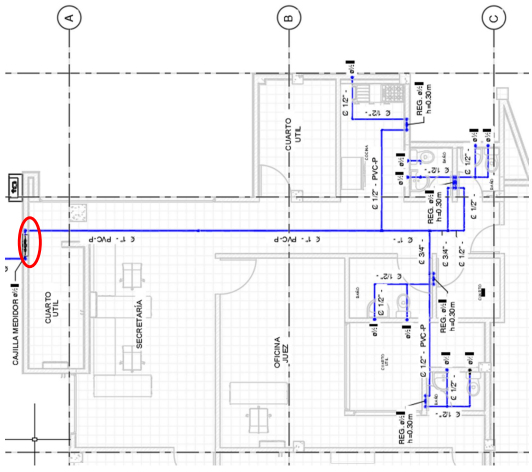


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					1,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**CONEXION A RED HIDRAULICA PVC-P Diámetro variable. Incluye instalación, accesorios, collarin y valvula de corte y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.**				
	CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,08**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

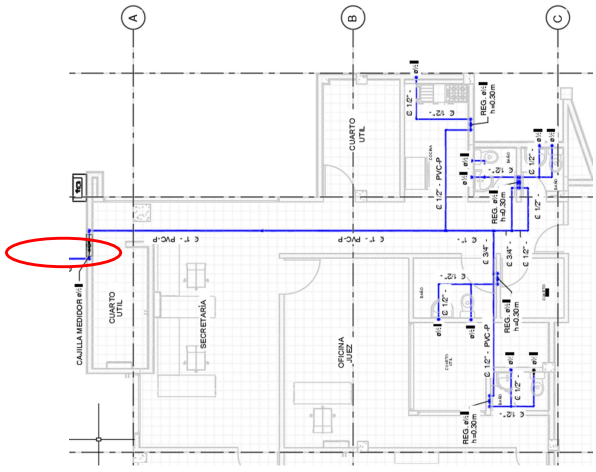


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					1,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AG 1/2" (Incluye accesorios)**				
CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,09**	**UNIDAD**	**ML**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**		

UBICACIÓN

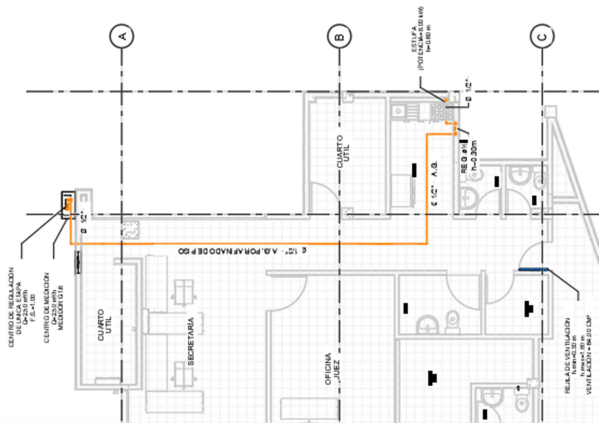


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
RED DE GAS INTERNA			18,00		18,00
TOTAL CANTIDAD					18,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**18,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE GAS 1/2" Tubería AG. Estufa u Horno. Incluye tubería (Promedio 1.10m), accesorios, cortes y roscado**				
	CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,10**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

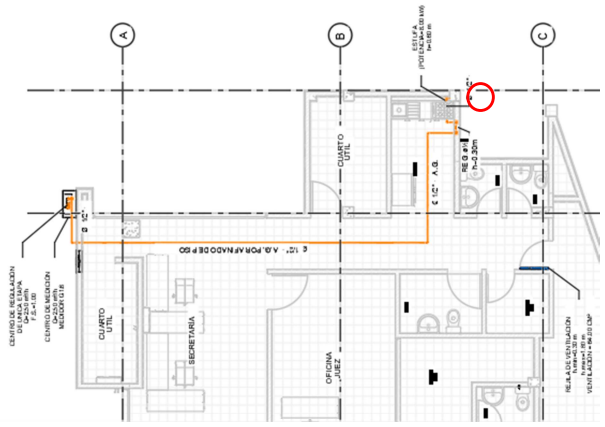


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
COCINA				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					1,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE 2.5 m3/h VALIDADO Y HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE GAS. Incluye elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento**				
	CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,11**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

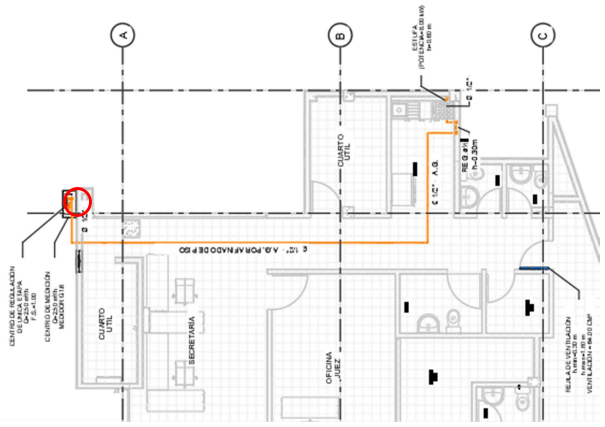


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
CENTRO DE MEDICION				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					1,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUM. E INST. DE REJILLAS DE VENTILACIÓN PVC Tipo celosía (2 und int y ext). Incluye apertura de vano, aprox 100cm2, pañete, filos y adecuación en fachada, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado**				
CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,12**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**		

UBICACIÓN

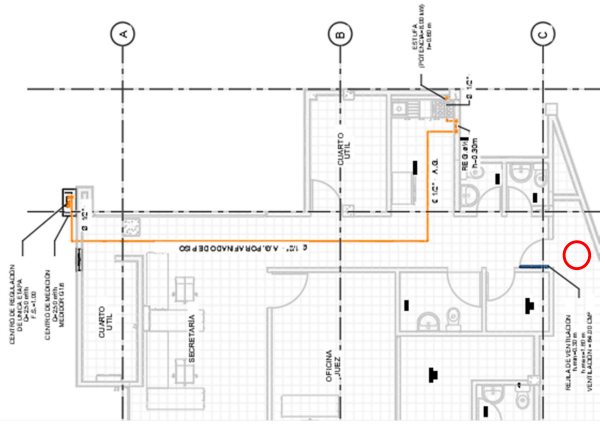


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO				2,00	2,00
TOTAL CANTIDAD					2,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**2,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR PARA GLP, CAUDAL HASTA 15 M3/H. Incluye Válvula de bola para gas 1", universales, elevador 1" y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento**				
	CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,13**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

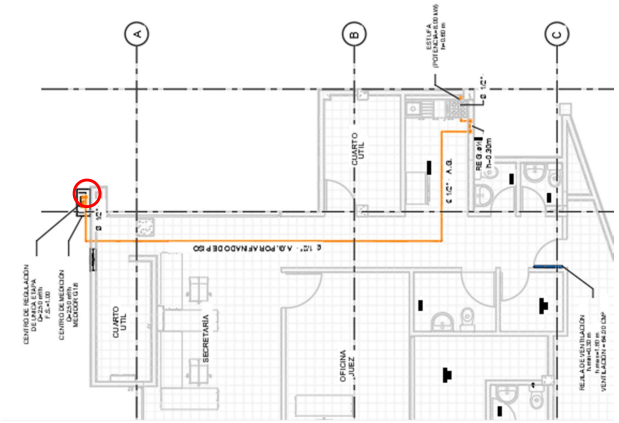


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
CENTRO DE MEDICION				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					1,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**DEMOLICION DE MURO y AFINADO DEL MISMO PARA CAJILLA DE VALVULA DE GAS 0.15 M X 0.15 M (incluye corte y demolicion del mismo, afinado de la caja, con filos, retiro de material a botadero autoirzado)**				
	CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,14**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

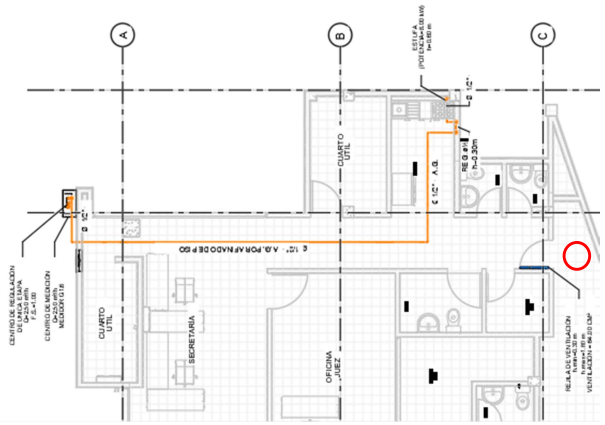


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					1,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**CONSTRUCCIÓN NICHO DE MEDIDORES DE GAS**				
	CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,15**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

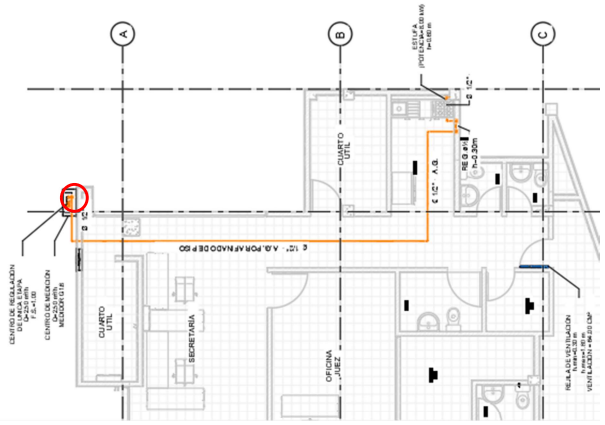


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
EMPLAZAMIENTO				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					1,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 1/2" DE BOLA PARA GAS. Incluye accesorios cobre para la conexión, tapa registro PVC blanco 15x15cm**				
	CAPITULO 1	**ÍTEM**	**1,16**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

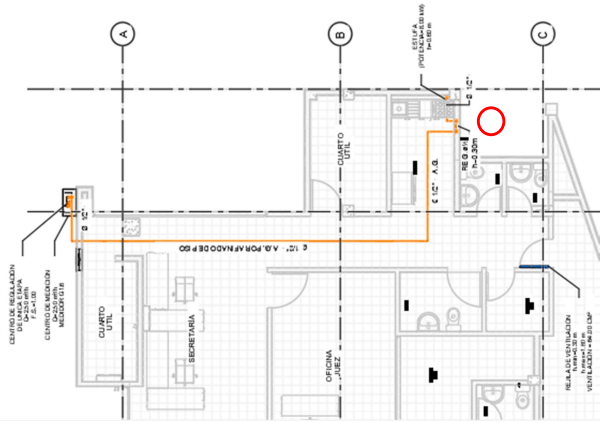


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
COCINA				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					1,00

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**			
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**			
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,01**	**UNIDAD**	**UND**
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

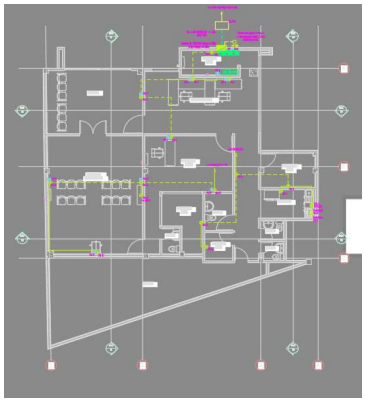

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**			
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu HFFRLS EN CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.**			
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,02**	**UNIDAD**	**M**
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

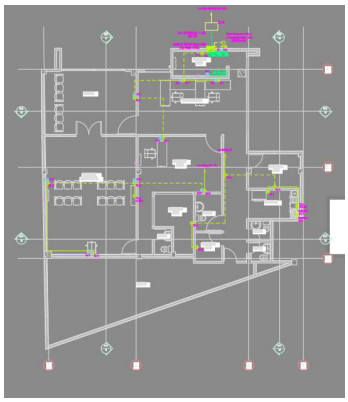

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu HFFRLS EN CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	1,00		10,00	10,00
TOTAL CANTIDAD				10,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**10,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027493-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu HFFRLS EN CABLE 3X6AWG + 6AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,03**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

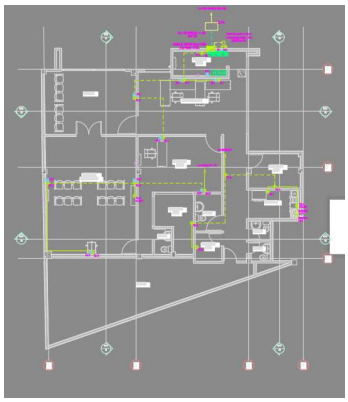

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu HFFRLS EN CABLE 3X6AWG + 6AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	1,00		30,00	30,00
TOTAL CANTIDAD				30,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**30,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027493-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu HFFRLS EN CABLE 1X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,04**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

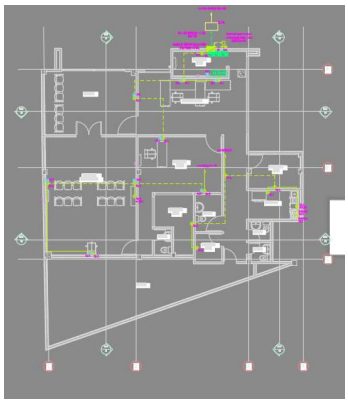

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu HFFRLS EN CABLE 1X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	1,00		15,00	15,00
TOTAL CANTIDAD				15,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**15,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027403-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2".**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,05**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

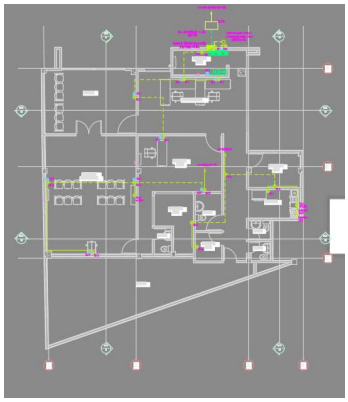

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2".	1,00		30,00	30,00
TOTAL CANTIDAD				30,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**30,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027403-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,06**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

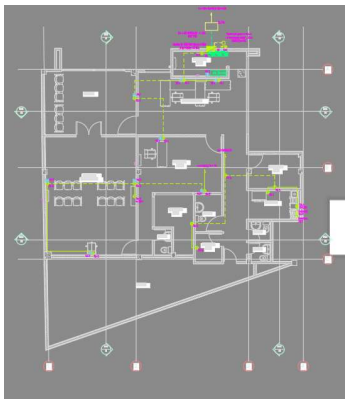

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	1,00		30,00	30,00
TOTAL CANTIDAD				30,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**30,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027403-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET**				
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,07**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**		


UBICACIÓN

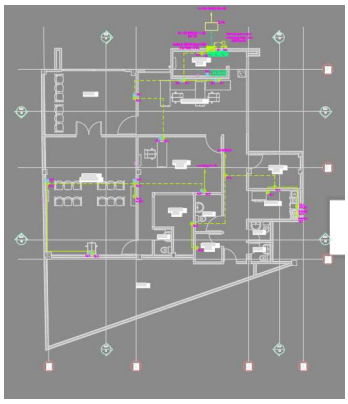

REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027403-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET**				
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,08**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**		


UBICACIÓN

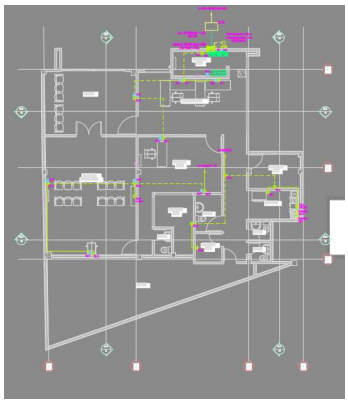

REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,09**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

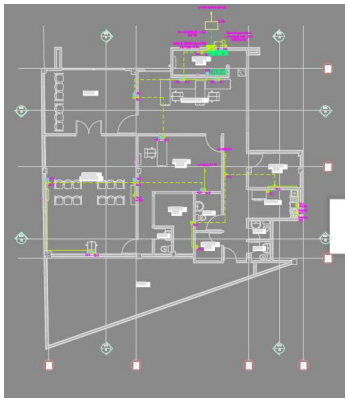

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,10**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

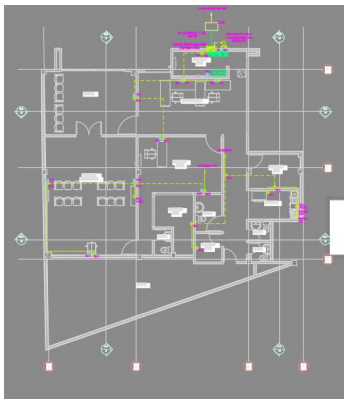

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1,00		10,00	10,00
TOTAL CANTIDAD				10,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**10,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,11**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

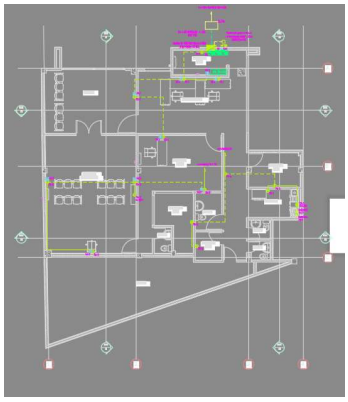

REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,12**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

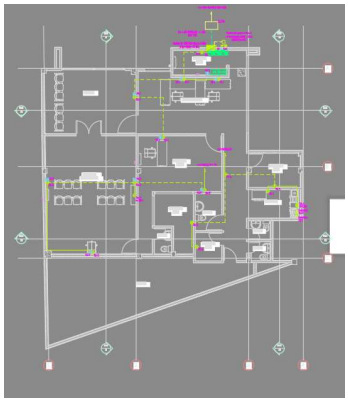

REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,13**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

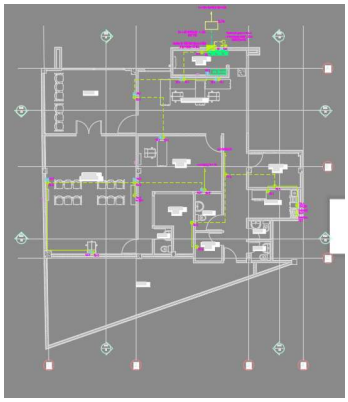

REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1,00		4,00	4,00
TOTAL CANTIDAD				4,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**4,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 30A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,14**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

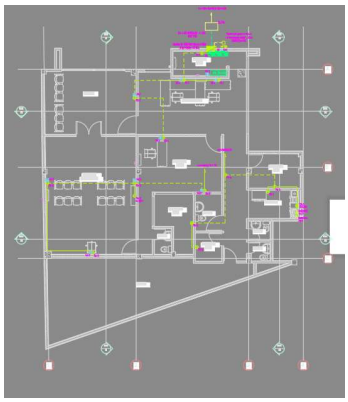


REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 30A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 50A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

CAPITULO 2	ÍTEM	2,15	UNIDAD	UND
INSTALACIONES ELECTRICAS			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN

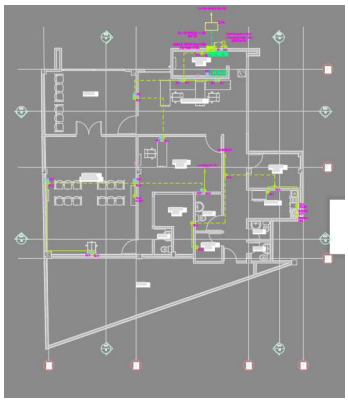


REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 50A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		2,00	2,00
TOTAL CANTIDAD				2,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**2,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**MEDIDOR TRIFASICO Electromagnético de 20 a 100 AMP, calibrado y certificado por CIDET**

CAPITULO 2	ÍTEM	2,16	UNIDAD	UND
INSTALACIONES ELECTRICAS			AGOSTO DE 2024	


UBICACIÓN

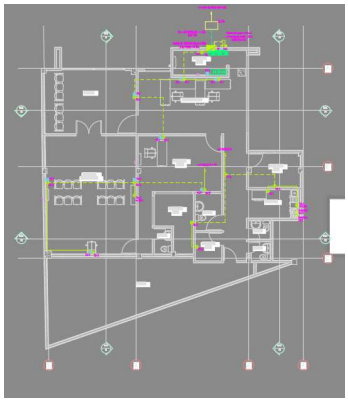

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
MEDIDOR TRIFASICO Electromagnético de 20 a 100 AMP, calibrado y certificado por CIDET	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA CODENSA AE305 Dimensiones de la caja: 600x600x200 mm**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,17**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

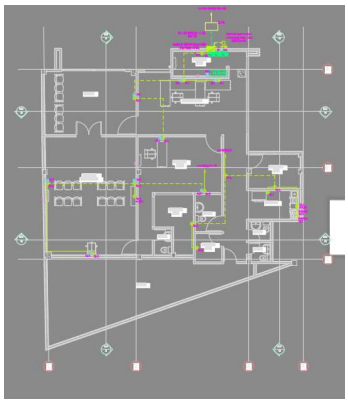

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA CODENSA AE305 Dimensiones de la caja: 600x600x200 mm	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMAATOS OR, RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,18**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

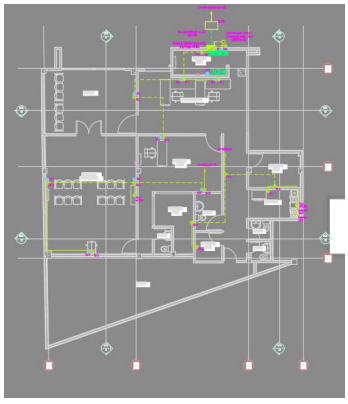

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMAATOS OR, RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 8. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales)**				
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,19**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**		


UBICACIÓN

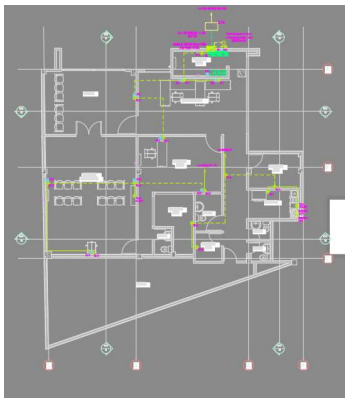

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 8. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales)	1,00		60,00	60,00
TOTAL CANTIDAD				60,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**60,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8" X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,20**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**		


UBICACIÓN

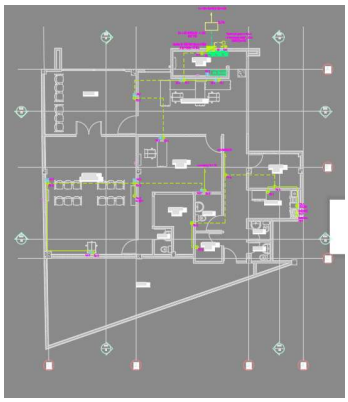

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8" X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027485-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,21**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

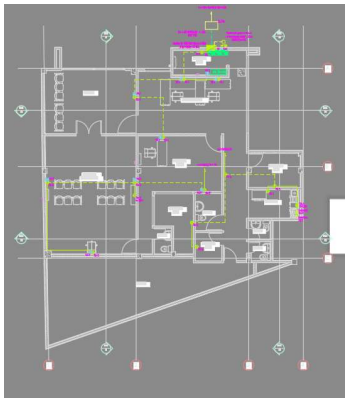

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027485-1	**SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 15 A,127 V TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,22**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

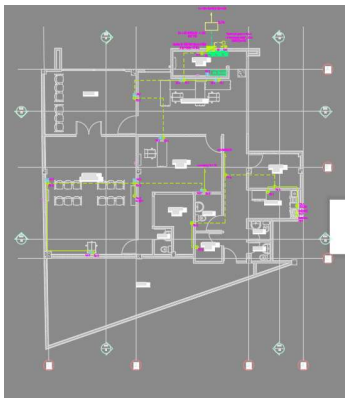

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 15 A,127 V TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS	**SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,23**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

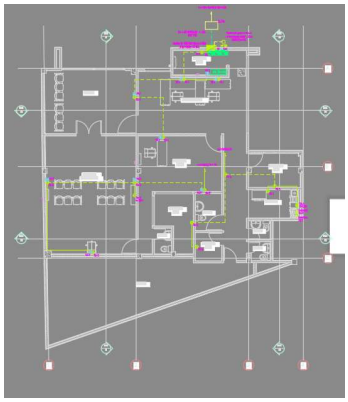

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m	1,00		17,00	17,00
TOTAL CANTIDAD				17,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**17,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS	**SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,24**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

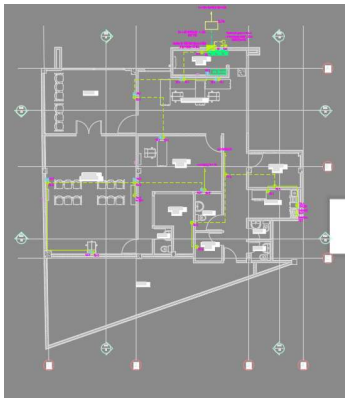

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m	1,00		9,00	9,00
TOTAL CANTIDAD				9,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**9,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027493-1	**SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 4m**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,25**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN



REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 4m	1,00		49,00	49,00
TOTAL CANTIDAD				49,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**49,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027493-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseñor. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,26**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN



REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseñor. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		3,00	3,00
TOTAL CANTIDAD				3,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**3,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 40 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseñor. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,27**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

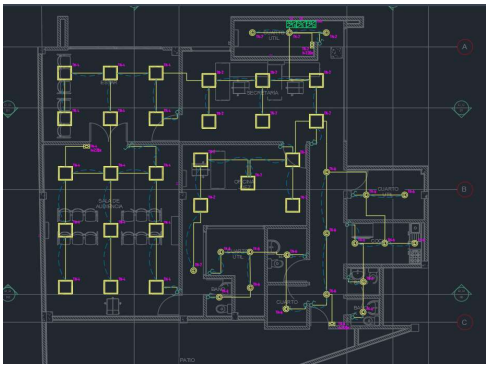

REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 40 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseñor. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		26,00	26,00
TOTAL CANTIDAD				26,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**26,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 6-8" DE 18 W, Multivoltaje, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.650 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 50.000 Hrs o superior, IP20 o superior, En calidad Sylvania similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,28**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN



REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 6-8" DE 18 W, Multivoltaje, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.650 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 50.000 Hrs o superior, IP20 o superior, En calidad Sylvania similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	1,00		20,00	20,00
TOTAL CANTIDAD				20,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**20,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS	**SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m**				
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,29**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**		

UBICACIÓN



REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m	1,00		13,00	13,00
TOTAL CANTIDAD				13,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**13,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS SAS	**SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO conmutable EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m**				
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,30**	**UNIDAD**	**UND**	
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**		


UBICACIÓN



REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO conmutable EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m	1,00		2,00	2,00
TOTAL CANTIDAD				2,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**2,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027435-1	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS RACKEABLE DE3 kVA monofasica; Tecnología ON-LINE, Doble Conversión - Configuración tipo torre o similar, Controlador DSP, Entrada Dual (Red y Generador), Conexión en paralelo (Escalabilidad o Redundancia) hasta 8 equipos o superior, Display Touch Screen o similar, Bypass de Mantenimiento y Automático, Eficiencia AC- AC 96% o superior, Modo Eco mode 98% o similar, Indicador de estado de la UPS con barra de iluminación, Tarjeta de Comunicación SNMP o similar, Autonomía de 18 minutos o superior, Nivel de tensión 208 Vac, Frecuencia 50-60 Hz. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,31**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

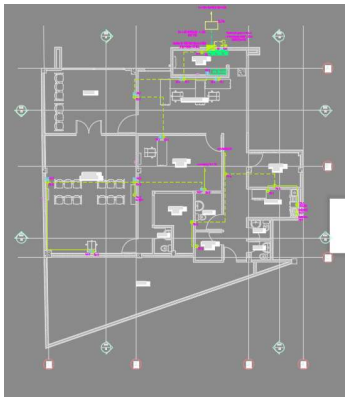

REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS RACKEABLE DE3 kVA monofasica; Tecnología ON-LINE, Doble Conversión - Configuración tipo torre o similar, Controlador DSP, Entrada Dual (Red y Generador), Conexión en paralelo (Escalabilidad o Redundancia) hasta 8 equipos o superior, Display Touch Screen o similar, Bypass de Mantenimiento y Automático, Eficiencia AC- AC 96% o superior, Modo Eco mode 98% o similar, Indicador de estado de la UPS con barra de iluminación, Tarjeta de	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027435-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,32**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

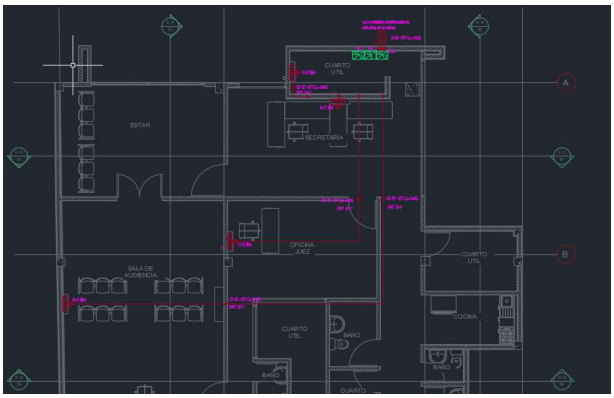

REFERENCIA	**cantidad**		**NUMERO ELEMENTOS**	**total**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	1,00		80,00	80,00
TOTAL CANTIDAD				80,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**80,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, POLO A TIERRA. , CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 12m**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,33**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

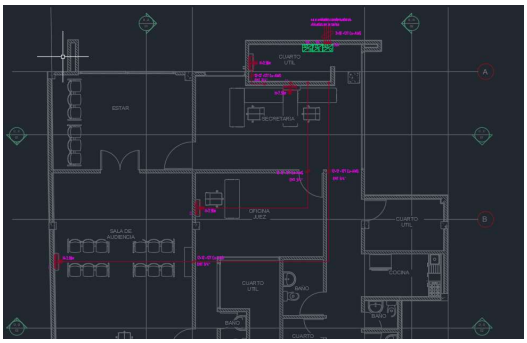

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, POLO A TIERRA. , CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 12m	1,00		4,00	4,00
TOTAL CANTIDAD				4,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**4,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFRLS EN CABLE 2X10AWG + 12TAWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,34**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

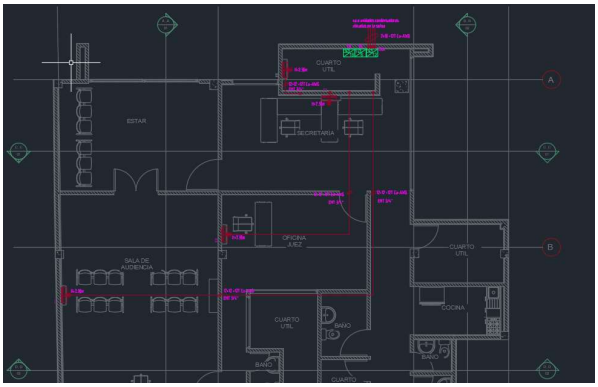

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFRLS EN CABLE 2X10AWG + 12TAWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	1,00		40,00	40,00
TOTAL CANTIDAD				40,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**40,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA 3/4"**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,35**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

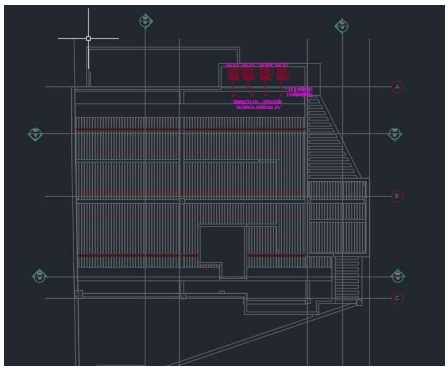

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA 3/4"	1,00		30,00	30,00
TOTAL CANTIDAD				30,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**30,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 24.000 BTU NIIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,36**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

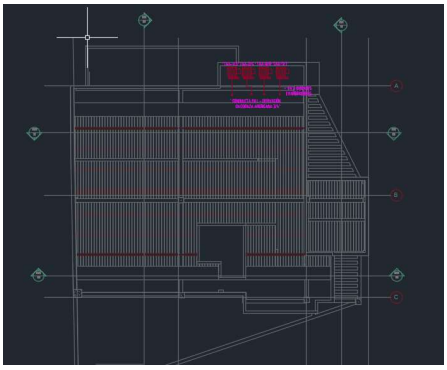

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 24.000 BTU NIIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**			
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 18.000 BTU NIIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO**			
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,37**	**UNIDAD**	**UND**
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

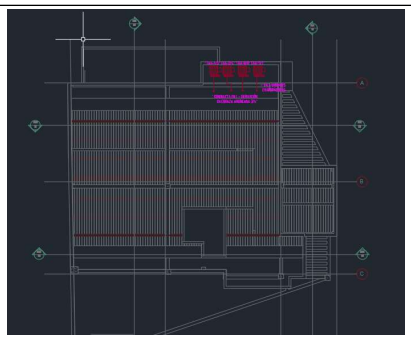

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 18.000 BTU NIIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1,00		2,00	2,00
TOTAL CANTIDAD				2,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**2,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**			
CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 12.000 BTU NIIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO**			
CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,38**	**UNIDAD**	**UND**
INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

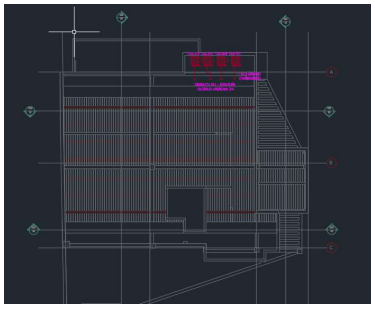


REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 12.000 BTU NIIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**			
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**			
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,39**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN



REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		6,00	6,00
TOTAL CANTIDAD				6,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**6,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**			
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 1.5 mtrs, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia 5 Mhz mínimo. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**			
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,40**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN



REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 1.5 mtrs, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia 5 Mhz mínimo. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		12,00	12,00
TOTAL CANTIDAD				12,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**12,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 3 mtrs, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia 5 Mhz mínimo. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,41**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

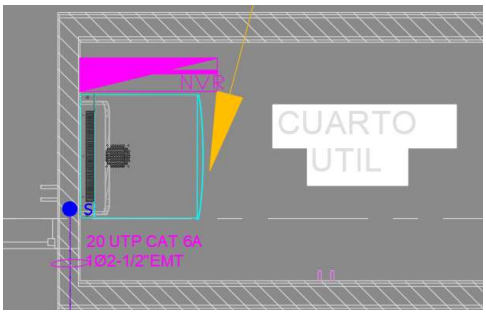

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 3 mtrs, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia 5 Mhz mínimo. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		20,00	20,00
TOTAL CANTIDAD				20,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**20,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 19", 15 UR, Capacidad de carga para 36 kg o superior, Ranuras de ventilación, Calibre CR 18" o superior, En calidad Ortronics similar o de características técnias superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,42**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

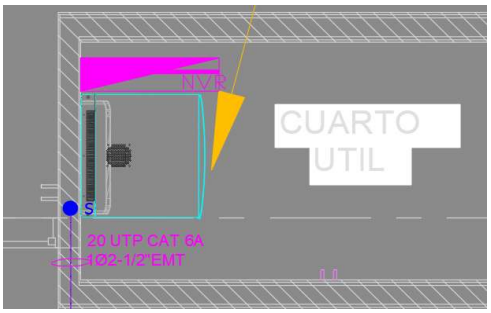


REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 19", 15 UR, Capacidad de carga para 36 kg o superior, Ranuras de ventilación, Calibre CR 18" o superior, En calidad Ortronics similar o de características técnias superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH 24 x 10/100/1000T POE+, 4 x 10G SFP+ ports US Power Cord, Soporte técnico para cada uno de sus componente por 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

CAPITULO 2	ÍTEM	2,43	UNIDAD	UND
INSTALACIONES ELECTRICAS			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN

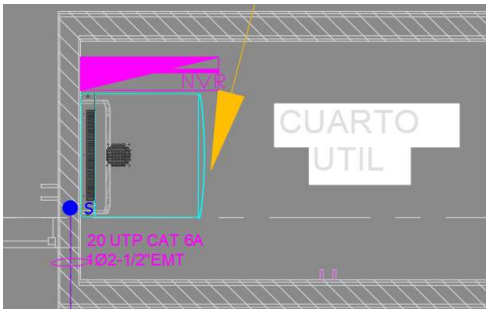


REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH 24 x 10/100/1000T POE+, 4 x 10G SFP+ ports US Power Cord, Soporte técnico para cada uno de sus componente por 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, Categoría 6A UTP, 10G, En calidad Ortronics o Superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

CAPITULO 2	ÍTEM	2,44	UNIDAD	UND
INSTALACIONES ELECTRICAS			AGOSTO DE 2024	


UBICACIÓN

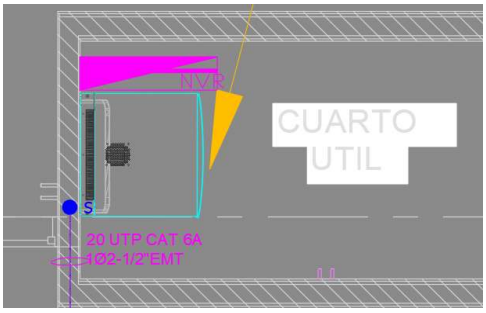

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, Categoría 6A UTP, 10G, En calidad Ortronics o Superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027403-1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE TAPA DE 19", En calidad Ortronics o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,45**	**UNIDAD**	**UND**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

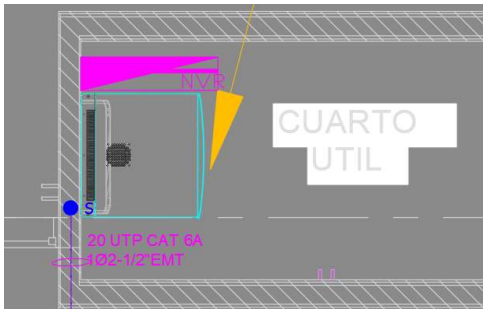

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE TAPA DE 19", En calidad Ortronics o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027403-1	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CAT6A LSZH, 4 PARES, 23 AWG mínimo, Cumplimiento con las normas TIA-568-c.2 o IEC 11801 Class E similar o características técnicas superiores, Color según uso, Velocidad de propagacion 65% o superior, Impedancia de entrada 100ohm (±22%), Diámetro del cable menor a 7.24 mm mínimo, Resistencia max en DC 9.36 Ohm, Capacitancia mutua menor a 6 nF a 1Khz, Resistencia de desbalanceo menor a 5%, Normatividad IEC 60332-3-22 IEC 61034-2 IEC 60754-2 o similar, Inlcuye (Velcros, Cintas , Marquillas), Mano de personal certificado por la marca, Temperatura de trabajo -20°C hasta 60°C. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECEASARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,46**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

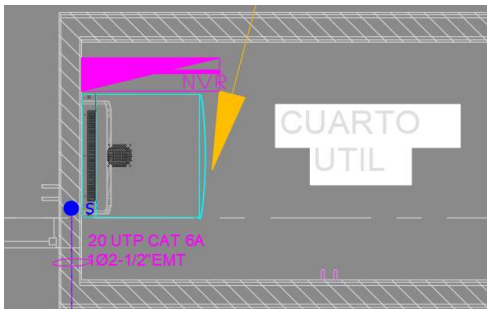


REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CAT6A LSZH, 4 PARES, 23 AWG mínimo, Cumplimiento con las normas TIA-568-c.2 o IEC 11801 Class E similar o características técnicas superiores, Color según uso, Velocidad de propagacion 65% o superior, Impedancia de entrada 100ohm (±22%), Diámetro del cable menor a 7.24 mm mínimo, Resistencia max en DC 9.36 Ohm, Capacitancia mutua menor a 6 nF a 1Khz, Resistencia de desbalanceo menor a 5%, Normatividad IEC 60332-3-22 IEC 61034-2 IEC 60754-	1,00		380,00	380,00
TOTAL CANTIDAD				380,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**380,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027403-1	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACCESS POINT, Frequencia de 2.4GHz y 5GHz, Fuente de Alimentación PoE, Dos (2) puertos Ethernet mínimo, Consumo de Energía 9.6 W o similar, Velocidad de transmisión inalámbrica de 450 Mbps mínimo. INLCUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

CAPITULO 2	ÍTEM	2,47	UNIDAD	UND
INSTALACIONES ELECTRICAS			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN

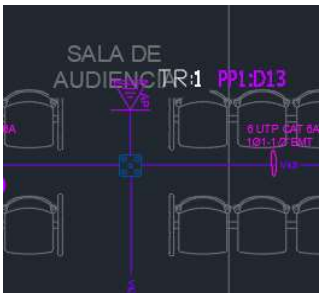

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACCESS POINT, Frequencia de 2.4GHz y 5GHz, Fuente de Alimentación PoE, Dos (2) puertos Ethernet mínimo, Consumo de Energía 9.6 W o similar, Velocidad de transmisión inalámbrica de 450 Mbps mínimo. INLCUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		2,00	2,00
TOTAL CANTIDAD				2,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**0,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027403-1	**SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLUG RJ-45 CAT 6ª, Para Cable Blindado Conocido Como MPTL (Modular Plug Terminated Link), Capacidad para soportar 10Gb/s, Capacidad de ser reutilizable y reinstalado, Para salidas de Cámaras y lectoras. Cumplimiento con las normas ANSI/TIA 568D o su última actualización. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

CAPITULO 2	ÍTEM	2,48	UNIDAD	UND
INSTALACIONES ELECTRICAS			AGOSTO DE 2024	


UBICACIÓN



REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLUG RJ-45 CAT 6ª, Para Cable Blindado Conocido Como MPTL (Modular Plug Terminated Link), Capacidad para soportar 10Gb/s, Capacidad de ser reutilizable y reinstalado, Para salidas de Cámaras y lectoras. Cumplimiento con las normas ANSI/TIA 568D o su última actualización. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00		8,00	8,00
TOTAL CANTIDAD				8,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**8,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,49**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

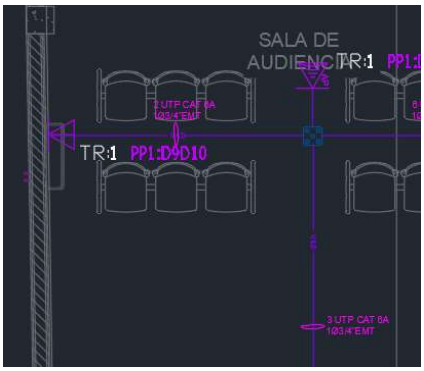

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	1,00		25,00	25,00
TOTAL CANTIDAD				25,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**25,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1-1/2".**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,50**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

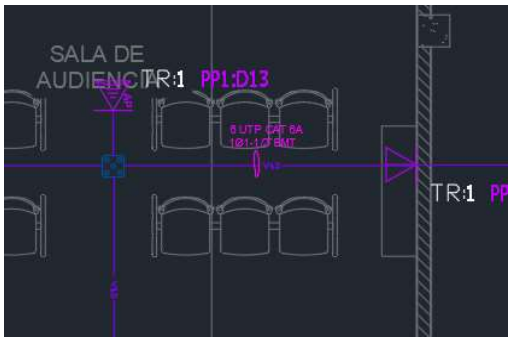

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1-1/2".	1,00		3,00	3,00
TOTAL CANTIDAD				3,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**3,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2".**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,51**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	


UBICACIÓN

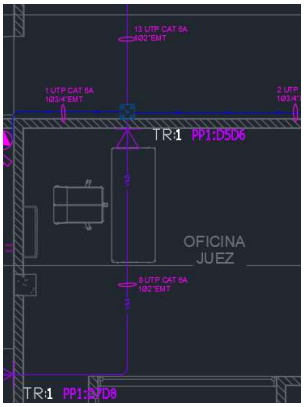

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2".	1,00		10,00	10,00
TOTAL CANTIDAD				10,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**10,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2-1/2".**				
	CAPITULO 2	**ÍTEM**	**2,52**	**UNIDAD**	**M**
	INSTALACIONES ELECTRICAS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

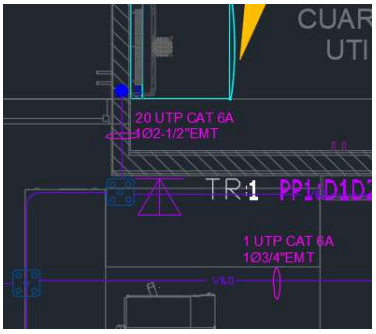

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2-1/2".	1,00		3,00	3,00
TOTAL CANTIDAD				3,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**3,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CÁMARA FLEXIDOMO IP 2MP, Resolución Full HD (1080p), IP66, Alcance del iluminador IR integrado ≥30 metros, Analíticos de Video tipo (Essential Video Analytics) o superior, Lente 3 a 10 mm o mínimo, Grabación local, Alimentación eléctrica 12VDC - 24 VCA o PoE, Color (RAL 9003, RAL 9017), Protección antivandalíca IK10, Compresión de vídeo (H.265; H.264; M-JPEG). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

CAPITULO 2	ÍTEM	2,53	UNIDAD	UND
INSTALACIONES ELECTRICAS			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN




REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMARA FLEXIDOMO IP 2MP, Resolución Full HD (1080p), IP66, Alcance del iluminador IR integrado ≥30 metros, Analíticos de Video tipo (Essential Video Analytics) o superior, Lente 3 a 10 mm o mínimo, Grabación local, Alimentación eléctrica 12VDC - 24 VCA o PoE, Color (RAL 9003, RAL 9017), Protección antivandalíca IK10, Compresión de vídeo (H.265; H.264; M- JPEG). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	1,00		2,00	2,00
TOTAL CANTIDAD				2,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**2,00**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NVR DE 2U DE 1TB, 8 canales IP mínimo, 320 Mbps de ancho de banda entrante mínimo, Compatibilidad con cámaras IP de 12MP mínimo para visualizar y reproducir imágenes, Consumo máximo de energía de conmutador de PoE+ de 185 W Aprox., Consumo máximo de energía(por puerto de PoE+) de 25.5 W Aprox. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA POR PERSONAL CERTIFICADO POR LA MARCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

CAPITULO 2	ÍTEM	2,54	UNIDAD	UND
INSTALACIONES ELECTRICAS			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN

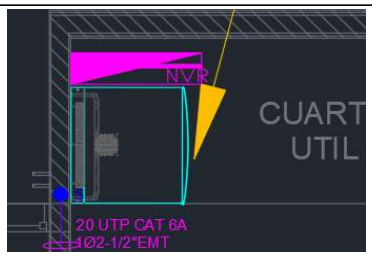

REFERENCIA	cantidad		NUMERO ELEMENTOS	total
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE NVR DE 2U DE 1TB, 8 canales IP mínimo, 320 Mbps de ancho de banda entrante mínimo, Compatibilidad con cámaras IP de 12MP mínimo para visualizar y reproducir imágenes, Consumo máximo de energía de conmutador de PoE+ de 185 W Aprox., Consumo máximo de energía(por puerto de PoE+) de 25.5 W Aprox. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA POR PERSONAL CERTIFICADO POR LA MARCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	1,00		1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD				1,00
TOTAL CANTIDAD ACUMULADO				**1,00**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS
Una nueva generación de servicios
NIT 901027483-1


MEMORIA DE CANTIDADES

PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE

PAÑETE DE MURO, MORTERO DE PEGA 1:4 INCLUYE TEXTURA EXISTENTE INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

CAPITULO 3	ÍTEM	3,01	UNIDAD	M2
DESMONTES Y DEMOLICIONES			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN

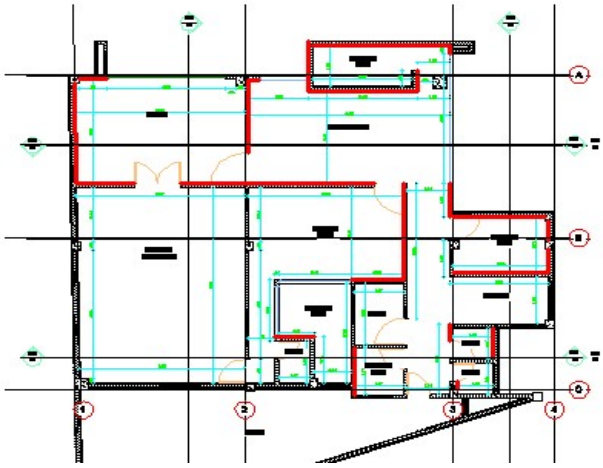

REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m2)	CANTIDAD	TOTAL
PAÑETE MURO		2,66	5,76	1,00	15,31
PAÑETE MURO		2,66	0,96	1,00	2,55
PAÑETE MURO		2,66	6,65	2,00	35,38
PAÑETE MURO		2,66	2,73	2,00	14,52
PAÑETE MURO		2,66	0,36	1,00	0,96
PAÑETE MURO		2,66	4,49	2,00	23,86
PAÑETE MURO		2,66	1,53	1,00	4,07
PAÑETE MURO		2,66	4,95	1,00	13,17
PAÑETE MURO		2,66	5,38	2,00	28,62
PAÑETE MURO		2,66	1,34	2,00	7,13
PAÑETE MURO		2,66	1,77	2,00	9,42
PAÑETE MURO		2,66	0,65	2,00	3,46
PAÑETE MURO		2,66	1,13	1,00	3,01
PAÑETE MURO		2,66	3,26	2,00	17,34
PAÑETE MURO		2,66	0,91	1,00	2,42
PAÑETE MURO		2,66	0,74	1,00	1,97
PAÑETE MURO		2,66	4,50	1,00	11,97
TOTAL CANTIDAD					53,24

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	53,24

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS
Una nueva generación de servicios
NIT 901027483-1


MEMORIA DE CANTIDADES

PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE

PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS

CAPITULO 3	ÍTEM	3,02	UNIDAD	M2
DESMONTES Y DEMOLICIONES			AGOSTO DE 2024	

UBICACIÓN

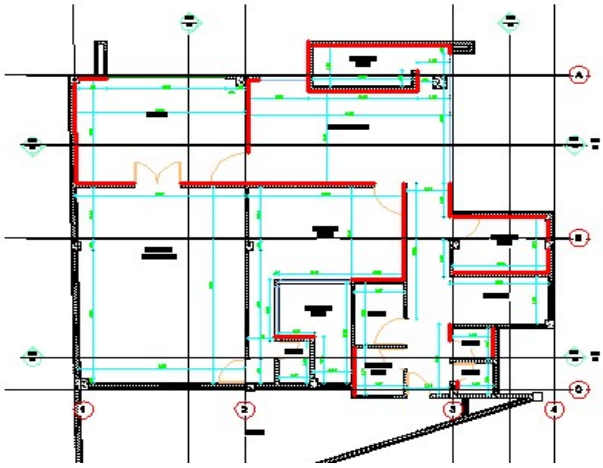


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m2)	CANTIDAD	TOTAL
PINTURA EN VINILO		2,66	5,76	1,00	15,31
PINTURA EN VINILO		2,66	0,96	1,00	2,55
PINTURA EN VINILO		2,66	6,65	2,00	35,38
PINTURA EN VINILO		2,66	2,73	2,00	14,52
PINTURA EN VINILO		2,66	0,36	1,00	0,96
PINTURA EN VINILO		2,66	4,49	2,00	23,86
PINTURA EN VINILO		2,66	1,53	1,00	4,07
PINTURA EN VINILO		2,66	4,95	1,00	13,17
PINTURA EN VINILO		2,66	5,38	2,00	28,62
PINTURA EN VINILO		2,66	1,34	2,00	7,13
PINTURA EN VINILO		2,66	1,77	2,00	9,42
PINTURA EN VINILO		2,66	0,65	2,00	3,46
PINTURA EN VINILO		2,66	1,13	1,00	3,01
PINTURA EN VINILO		2,66	3,26	2,00	17,34
PINTURA EN VINILO		2,66	0,91	1,00	2,42
PINTURA EN VINILO		2,66	0,74	1,00	1,97
PINTURA EN VINILO		2,66	4,50	1,00	11,97
TOTAL CANTIDAD					53,24

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	53,24

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 E:0,05**				
	CAPITULO 4	**ÍTEM**	**4,01**	**UNIDAD**	**M2**
	PISOS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

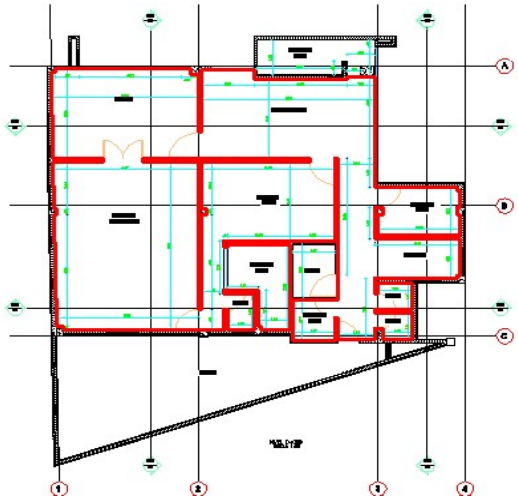


REFERENCIA	B (m)	H (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL
ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 E:0,05			153,17	1,00	153,17
MUROS			-1,83		-1,83
TOTAL CANTIDAD					151,34

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**151,34**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 90x90 INCLUYE BOQUILLA**				
CAPITULO 4	**ÍTEM**	**4,02**	**UNIDAD**	**M2**	
PISOS			**AGOSTO DE 2024**		

UBICACIÓN

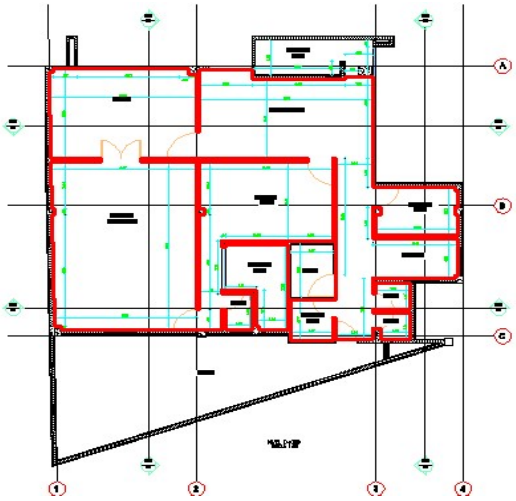


REFERENCIA	B (m)	H (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 90x90 INCLUYE BOQUILLA			153,17	1,00	153,17
MUROS			-1,83		-1,83
TOTAL CANTIDAD					151,34

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**151,34**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PORCELANATO ANTIDESLIZANTE O SIMILAR H=7 a 10 cm**				
	CAPITULO 4	**ÍTEM**	**4,03**	**UNIDAD**	**ML**
	PISOS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

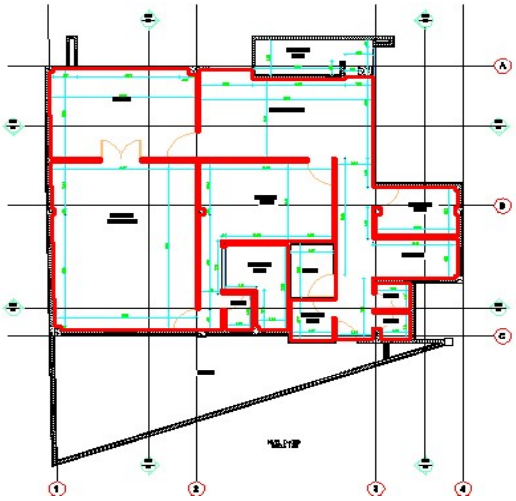


REFERENCIA	B (m)	H (m)	L (m)	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PORCELANATO ANTIDESLIZANTE O SIMILAR H=7 a 10 cm			117,09	1,00	117,09
MUROS			26,75	1,00	26,75
TOTAL CANTIDAD					143,84

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**143,84**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**REPARACION DE CIELORRASO EN DRYWALL**				
	CAPITULO 5	**ÍTEM**	**5,01**	**UNIDAD**	**M2**
	CUBIERTA			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

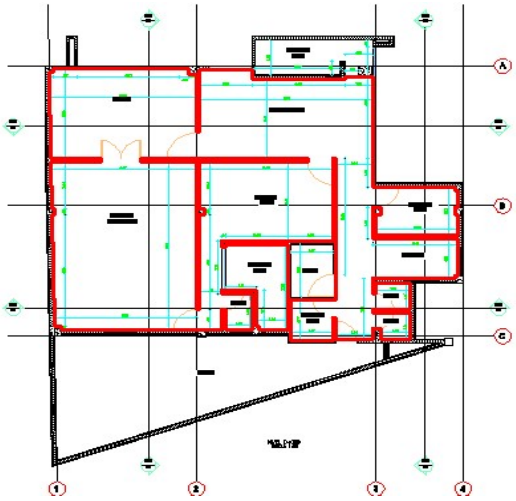


REFERENCIA	B (m)	H (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL
REPARACION DE CIELORRASO EN DRYWALL			153,17	1,00	153,17
MUROS			-1,83		-1,83
TOTAL CANTIDAD					151,34

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**151,34**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES** **PALACIO DE JUSTICIA COLOSÓ - SUCRE**				
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS Una nueva generación de servicios NIT 901027483-1	**ASEO GENERAL DE OBRA**				
	CAPITULO 6	**ÍTEM**	**6,01**	**UNIDAD**	**M2**
	VARIOS			**AGOSTO DE 2024**	

UBICACIÓN

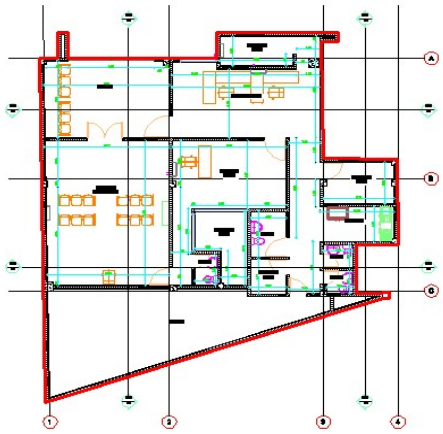

REFERENCIA	B (m)	H (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL
ASEO GENERAL DE OBRA			227,18	1,00	227,18
TOTAL CANTIDAD					227,18

TOTAL CANTIDAD ACUMULADO	**227,18**

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC
