
INFORME EJECUTIVO VISITA DE OBRA


FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO 'ERUDM' PARA LA IMPLEMENTACION DE OBRAS DE RECUPERACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN URBANA SOBRE LA CALLE 10 EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA – CALDAS.

Se inicia la visita con un recorrido por toda la obra en la cual se identifica y se informa por parte del ingeniero residente de interventoría **Héctor Barahona** que la obra está dividida en 4 islas en las cuales se informa e identifica las siguientes actividades en cada una de ellas.
Este recorrido se realiza en compañía del ingeniero residente de interventoría **Héctor Barahona** y del ingeniero residente de obra **Jairo Maldonado.**


Isla #4:
Se realiza visita de obra en la cual se inicia el recorrido por la isla 4, en la cual se están realizando las siguientes actividades:

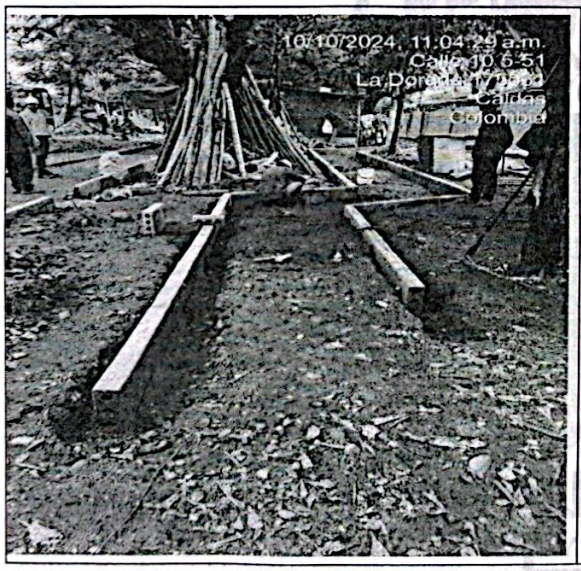

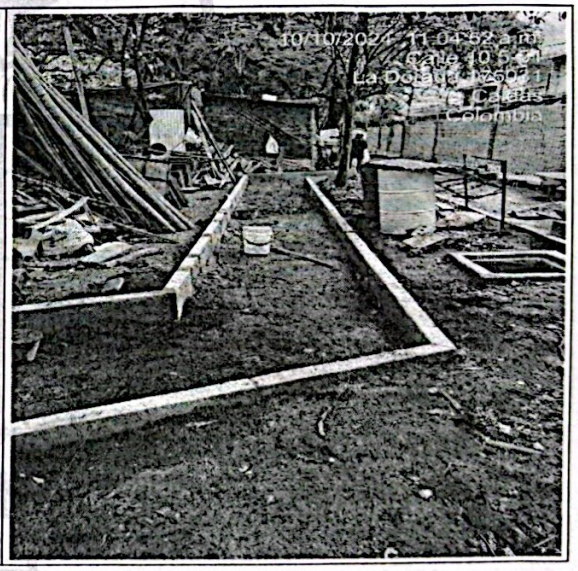


Preparación del sitio de apoyo, Alineación, instalación, sentado y pega de bordillos para anden en el lado sur de la calle 10.

Scanned with CamScanner

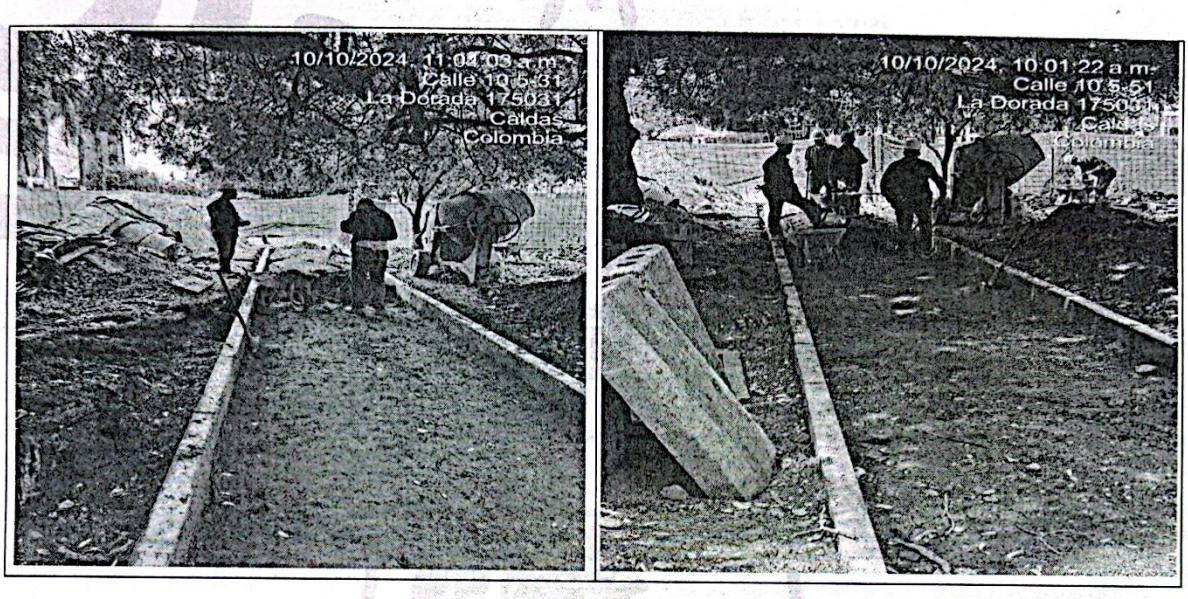


Excavación para llegar a nivel de sub rasante en el área de la ciclo ruta costado de la carrera 6.

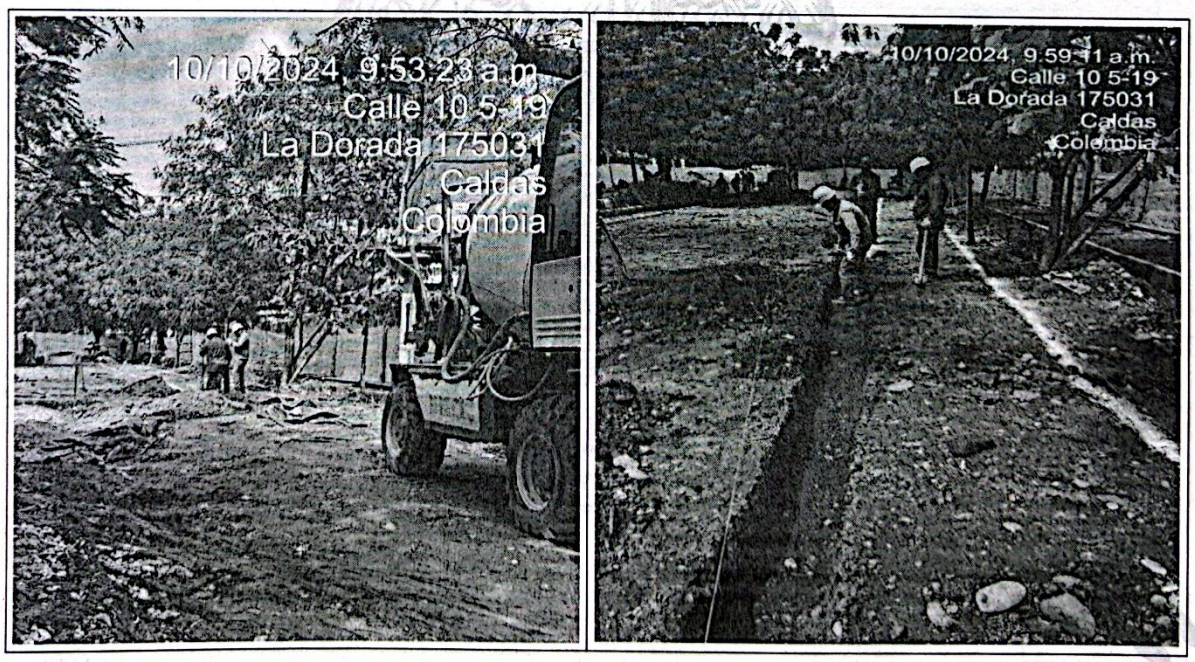


Excavación para instalación de bordillos del andén del lado norte de la calle 10.

Scanned with CamScanner

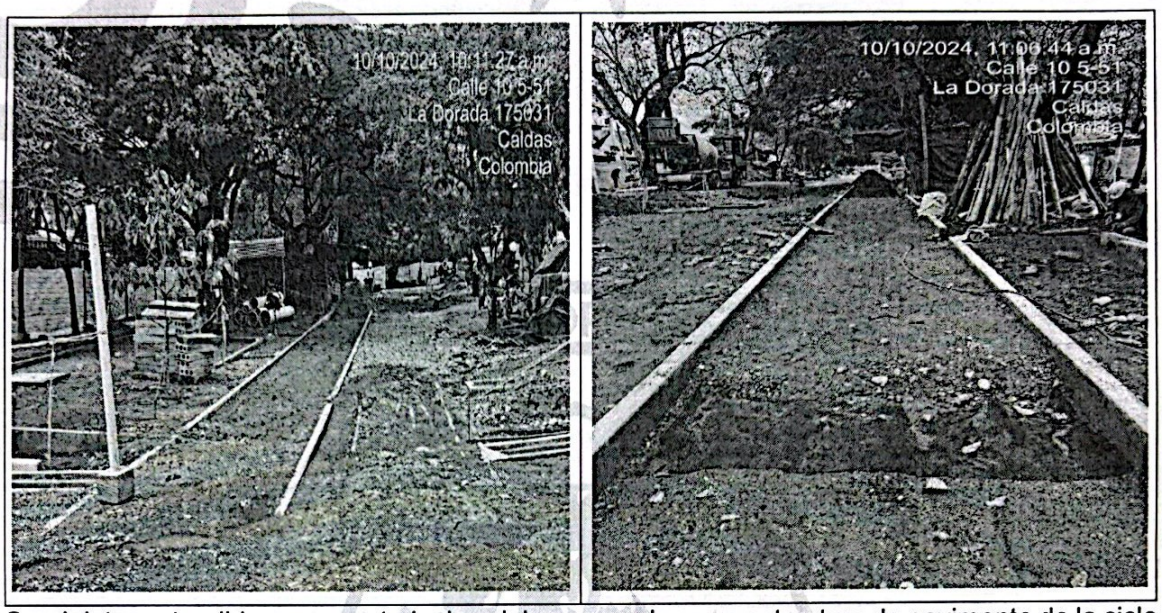


Suministro extendido y compactado de sub basegranular para estructura de pavimento de la ciclo ruta.

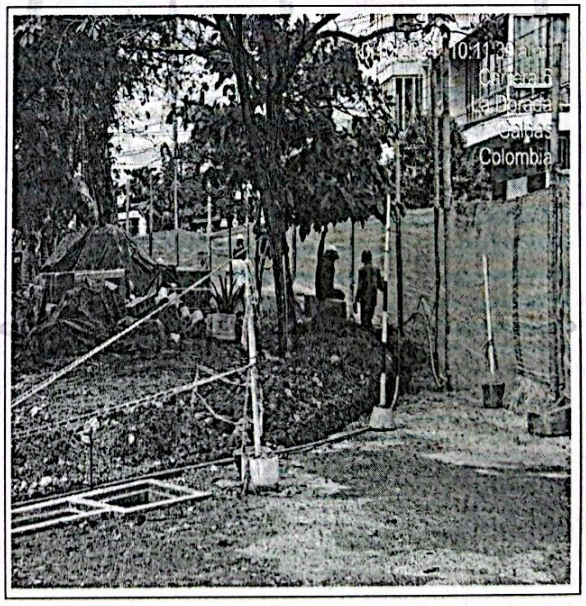


Excavación e instalación de sardinel externo del lado sur de la calle 10.

Scanned with CamScanner

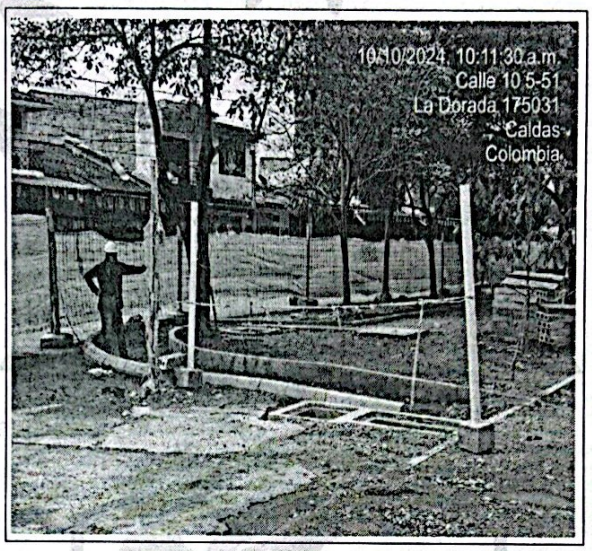

Excavación de para llegar a subrasante del área del andén en el costado sur de la calle 10.

Isla 3: en esta isla en la fecha que se realiza la visita no se encuentran realizando actividades, se toman unas fotos en las cuales se describe algunas actividades pendientes a terminar.

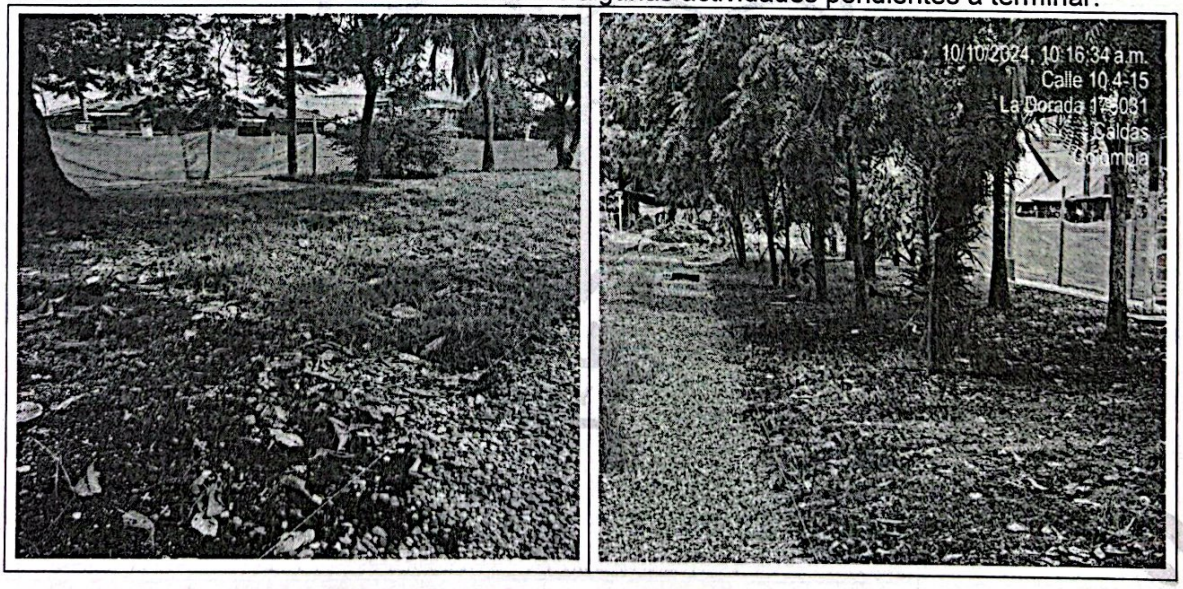


Se evidencia un área grande en la cual no se ha terminado la rehabilitación de la zona verde.

Scanned with CamScanner



Se evidencia en las fotos que hace falta terminar la placa de concreto la cual va en el área de los juegos infantiles, esta área ya se encuentra lista para que se realice la instalación del concreto.

Isla 2

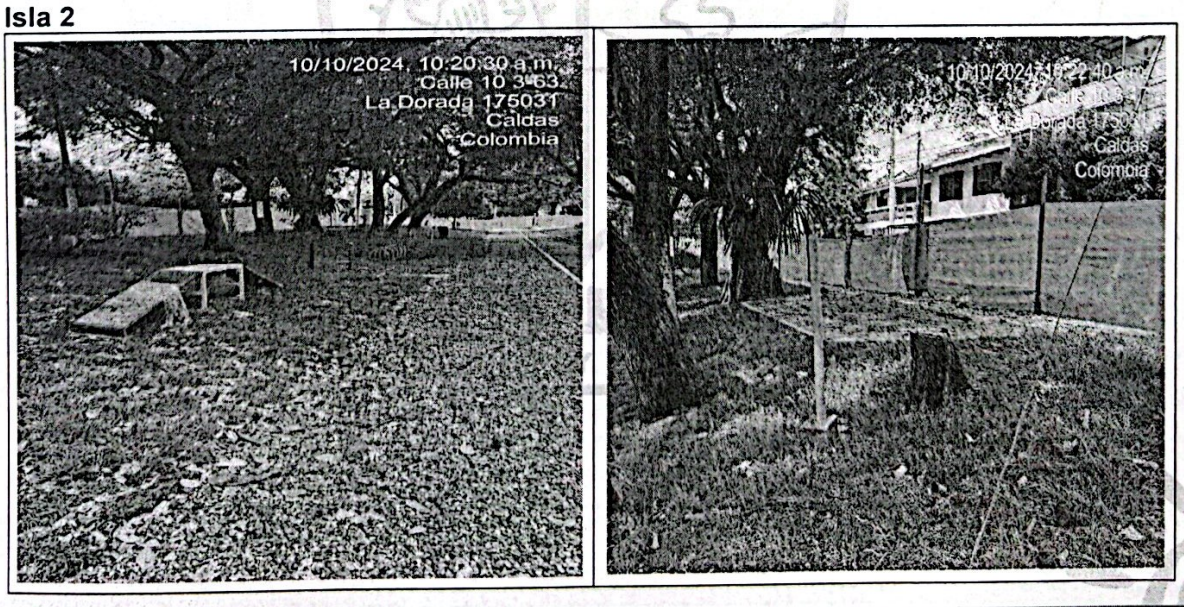

Scanned with CamScanner

Cómo podemos evidenciar en las anteriores fotografías esta isla se encuentra bastante avanzada y muy pronta a que se terminen los trabajos en ella, falta por intervenir un área importante la cual es terminar la ciclo ruta.

Isla 1: esta isla ya se encuentra habilitada al público en esta se evidencia que falta por terminar la ciclo ruta, entre otros detalles los cuales son mínimos.

Juan Sebastian Millan Mariño
Ingeniero civil
Contratista alcaldía de La Dorada, Caldas.

Scanned with CamScanner
