
INFORME EJECUTIVO VISITA DE OBRA

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO "ERUDM" PARA LA CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO DEL PROYECTO PAROUE CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS.

Se inicia la visita con un recorrido por toda la obra en la cual se identifica y se informa por parte del coordinador de obra que en esta se encuentran realizando las siguientes actividades.

Este recorrido se realiza en compañía del coordinador de obra Jaime Rojas

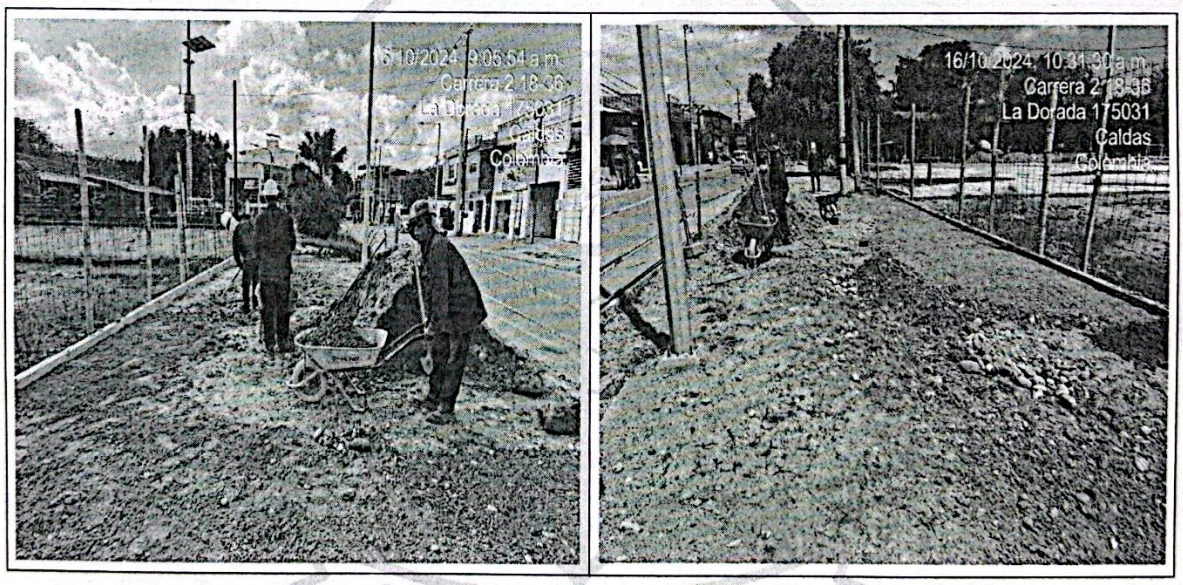


Extendido de recebo para área peatonal sobre carrera 2 con calle 19


Scanned with CamScanner





Se encuentran compactando el área de la plazoleta en la parte central costado de la carrera 1ra

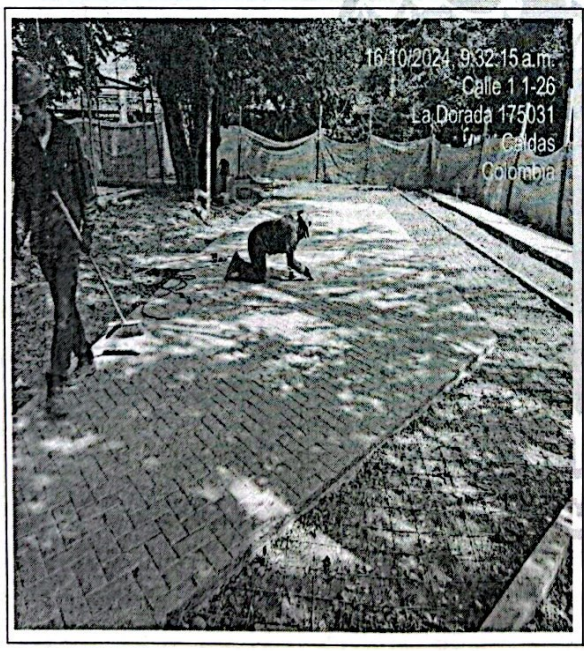

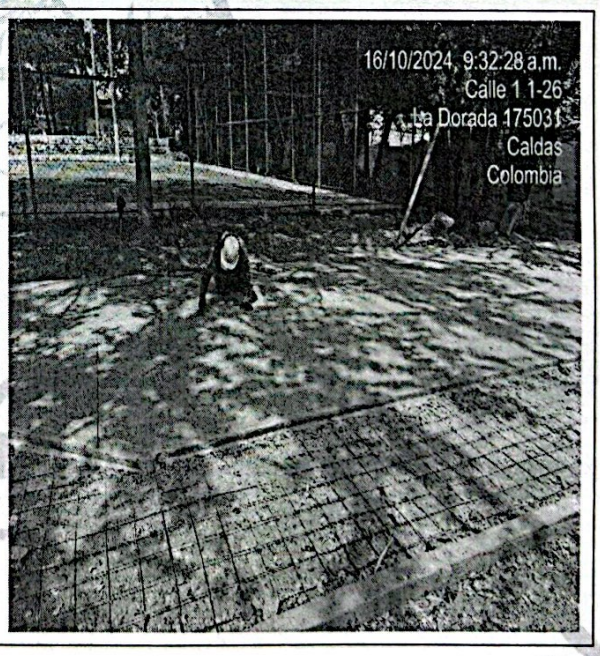

Corte de dilataciones en la placa de concreto del andén en la esquina de la carrera 1 con calle 20

Scanned with CamScanner



Instalación de bordillo en las islas 7 y 20.

Scanned with CamScanner

En el recorrido se observa una baja cantidad de personal en la obra, esto lleva a que se estén desarrollando muy pocas actividades. Se evidencia en el recorrido que se tienen lista un área considerable en la cual ya pueden realizar la fundida del concreto para la placa de la plataforma, también tienen en la obra una gran cantidad de bordillo y sardinel el cual ya pueden iniciar su instalación para así avanzar.

Juan Sebastian Millan Mariño
Ingeniero civil
Contratista alcaldía de La Dorada, Caldas.

Scanned with CamScanner
