CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO 358 ARC-DISAN-DHONAC 2024
FECHA FIRMA CONTRATO	19 DE JUNIO 2024
CONTRATISTA:	**DEGAR SOLUTIONS S.A.S**
NIT:	901594034-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	5 DE NOVIEMBRE DEL 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N°1	10 DE JULIO DEL 2023	MODIFICACIÓN EN ADICIÓN EN VALOR, MODIFICACIÒN AL ANEXO TECNICO Y MODIFICACIÒN AL LUGAR DE EJECUCIÒN CONTRATO No. 358-ARC-DISAN-DHONAC-2024.

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A/A Y NEVERAS DE VACUNACIÒN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA					
ITEM 1	DESCRIPCIÒN	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: limpieza GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: limpieza GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00

5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 3TR O 36.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: limpieza GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 195.000,00	$ 37.050,00	$ 232.050,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5TR O 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: limpieza GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 215.000,00	$ 40.850,00	$ 255.850,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 3TR O 36.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: limpieza GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 195.000,00	$ 37.050,00	$ 232.050,00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 5TR O 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410	1	$ 215.000,00	$ 40.850,00	$ 255.850,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TR O 120.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410		$ 255.000,00	$ 48.450,00	$ 303.450,00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7,5 TR O 90.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.		$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HOSPITALARIO DE 12,5 TR O 150.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: MANTENIMIENTO UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN UNIDAD CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.		$ 290.000,00	$ 55.100,00	$ 345.100,00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HOSPITALARIO DE 7,5 TR O 90.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: MANTENIMIENTO UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN UNIDAD CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410	1	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 333.200,00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION 36.000 BTU 3 HP 220VAC. INCLUYE MANTENIMIENTO UNIDAD EVAPORADORA, LAVADO CON AGUA A PRESION AL SERPENTIN DE LA EVAPORADORA, LIMPIEZA AL DRENAJE, SISTEMA DE VENTILACION, MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, LAVADO SERPENTIN DE LA CONDENSADORA, AJUSTE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA Y CALIBRACION DE CARGA REFRIGERANTE.	1	$ 199.000,00	$ 37.810,00	$ 236.810,00

14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION 48.000 BTU 5 HP 220VAC. INCLUYE MANTENIMIENTO UNIDADA EVAPORADORA, LAVADO CON AGUA A PRESION AL SERPENTIN DE LA EVAPORADORA, LIMPIEZA AL DRENAJE, SISTEMA DE VENTILACION, MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, LAVADO SERPENTIN DE LA CONDENSADORA, AJUSTE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA Y CALIBRACION DE CARGA REFRIGERANTE.	1	$ 265.000,00	$ 50.350,00	$ 315.350,00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA				
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 1 HP Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	**$ 690.000,00**	$ 131.100,00	$ 821.100,00
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 1-1/2 HP Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 790.000,00	$ 150.100,00	$ 940.100,00
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 2 HP Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 1.650.000,00	$ 313.500,00	$ 1.963.500,00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 3 HP Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 2.390.000,00	$ 454.100,00	$ 2.844.100,00
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 36.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 3 HP Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 2.450.000,00	$ 465.500,00	$ 2.915.500,00
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 5 HP Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 2.850.000,00	$ 541.500,00	$ 3.391.500,00
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 A 24000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL UNIDAD EVAPORADORA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 297.500,00
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 A 24000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 155.000,00	$ 29.450,00	$ 184.450,00
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRALES DE 36.000 A 60.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 215.000,00	$ 40.850,00	$ 255.850,00
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT O CENTRALES DE 24.000 A 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE POTENCIA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO	1	$ 198.000,00	$ 37.620,00	$ 235.620,00
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRALES DE 36.000 A 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO PARA BLOWER ACUERDO REFERENCIA UNIDAD MANEJADORA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 798.000,00	$ 151.620,00	$ 949.620,00
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRALES DE 36.000 A 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO PARA VENTILADOR ACUERDO REFERENCIA UNIDAD CONDENSADORA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 850.000,00	$ 161.500,00	$ 1.011.500,00
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO	1	$ 290.000,00	$ 55.100,00	$ 345.100,00
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONGELACION. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 290.000,00	$ 55.100,00	$ 345.100,00
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO UNIDAD EVAPORADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONGELACION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO UNIDAD EVAPORADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO UNIDAD CONDENSADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONGELACION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO UNIDAD CONDENSADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO : TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE.					
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO: TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS. INCLUYE: limpieza GENERAL Y DESINFECCION EN TODAS SUS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS, LUBRICACION DE EMPAQUETADURA, DESMONTE Y LIMPIEZA DE SOPORTES DE ACUMULADORES , DRENAJE Y LLENADO DE ACUMULADORES, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN , MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL Y FUERZA (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) , ASPA DEL VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR NEGRO Y CALIBRACION Y AJUSTE DE TEMPERATURA, CARGA DE REFRIGERANTE ACUERDO FICHA TECNICA DEL EQUIPO.	1	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO : TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE.					
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO: TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS. INCLUYE: CAMBIO DE ACUMULADORES DE AGUA DE LA CABINA DE LA NEVERA EN CASO DE SER NESESARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$ 750.000,00	$ 142.500,00	$ 892.500,00
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO: TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS. INCLUYE: CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$ 655.000,00	$ 124.450,00	$ 779.450,00
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO: TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS. INCLUYE: CAMBIO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 1/4 HP ACUERDO FICHA TECNICA DEL EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$ 3.650.000,00	$ 693.500,00	$ 4.343.500,00
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO: TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS. INCLUYE: CORRECION DE FUGAS Y AJUSTES DE REFRIGERANTE ACUERDO FICHA TECNICA DEL EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$ 550.000,00	$ 104.500,00	$ 654.500,00
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO: TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS. INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUETADURA, FILTROS, RODACHINES DE DESPLAZAMIENTO Y CHAPAS DE CIERRE DEL EQUIPO DE SER NESESARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$ 1.005.000,00	$ 190.950,00	$ 1.195.950,00
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO: TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS. INCLUYE: CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL DE TEMPERATURA ACUERDO FICHA TECNICA DEL EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$ 845.000,00	$ 160.550,00	$ 1.005.550,00
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO: TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS. INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR ACUERDO FICHA TECNICA DEL EQUIPO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$ 3.150.000,00	$ 598.500,00	$ 3.748.500,00
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO NEVERAS VACUNACION (REFRIGERADORES Y CONGELADORES HORIZONTALEZ), MARCA B MEDICAL SYSTEMS SARL, MODELO: TCW3000 AC DE CAPACIDAD DE 150 LITROS. INCLUYE: CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR ELECTRICO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$ 750.000,00	$ 142.500,00	$ 892.500,00
TOTAL			$		40.995.500,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES PESOS ($ 30.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS ($ 45.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$45.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS DE LAS NEVERAS HORIZONTALES DEL DISPENSARIO MEDICO COVEÑAS, DISPENSARIO MEDICO COROZAL Y LA UNIDAD BASICA EN ATENCIÒN ESCUELA NAVAL ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO DEL PRESENTE CONTRATO.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
ACTUAL	51244	26-01-2024	45.000.000	68224	17/06/2024	45.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	78600001974

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	06 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DE DICIEMBRE

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101098508
FECHA EXPEDICIÓN:	08/08/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	19/06/24	20/04/2025	$ 13.500.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/06/24	20/04/2022	$ 13.500.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
12-08-2024	DS 159	12-08-2024	N/A	$ 9.621.150,00
30-09-2024	DS 179	30-09-2024	N/A	15.761.550,00
			VALOR TOTAL	$ 25.382.700,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
12-08-2024	DS 159	12-08-2024	N/A	$ 9.621.150,00
02-10-2024	DS 179	30-09-2024	N/A	15.761.550,00
			VALOR TOTAL	$ 25.382.700,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
12-08-2024	DS 159	12-08-2024	N/A	$ 9.621.150,00
02-10-2024	DS 179	30-09-2024	N/A	15.761.550,00
			VALOR TOTAL	$ 25.382.700,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
ABONO A CUENTA	2024	$ 9.621.150,00	303762524	2024-09-02	249124	2024-09-04	$ 9.621.150,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$45.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 25.382.700,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 25.382.700,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 19.617.300,00
SALDO POR LIBERAR	$ 19.617.300,00

OBSERVACIONES

PENDIENTE ENVIO DE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÒN DE LOS DISPENSARIOS MEDICOS COVEÑAS, DISPENSARIO MEDICO COROZAL Y LA UNIDAD BASICA EN ATENCIÒN ESCUELA NAVAL

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS DE LAS NEVERAS HORIZONTALES DEL DISPENSARIO MEDICO COVEÑAS, DISPENSARIO MEDICO COROZAL Y LA UNIDAD BASICA EN ATENCIÒN ESCUELA NAVAL ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO DEL PRESENTE CONTRATO QUEDÒ PENDIENTE EL MANTENIMIENTO DE LA NEVERA DE VACUNACIÒN DE LA UNIDAD BASICA EN ATENCIÒN SAN ANDRES ISLAS.

12. APORTES PARAFISCALES

NO APLICA

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CUMPLIÒ

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NINGUNA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

56.4 %

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

SE HA EJECUTADO UN 73 % DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS ACUERDO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

QUEDA PENDIENTE EL MANTENIMIENTO DE LA NEVERA HORIZONTAL DE LA UNIDAD BASICA EN ATENCIÒN DE SAN ANDRES Y LA ENTREGA DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE.


18. **ANEXOS**





NINGUNO

19. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO**



MANTENIMIENTO NEVERAS DE VACUNACIÓN UNIDAD BASICA EN ATENCIÒN ESCUELA NAVAL



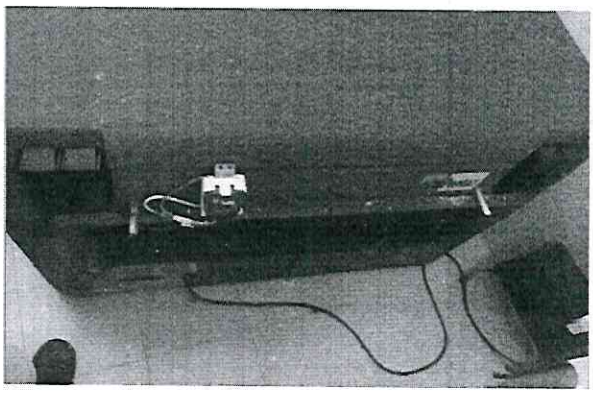


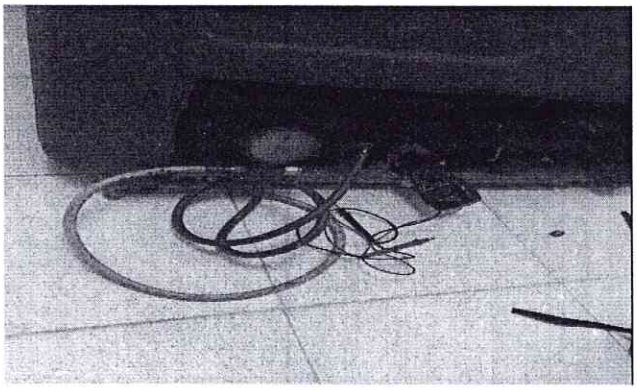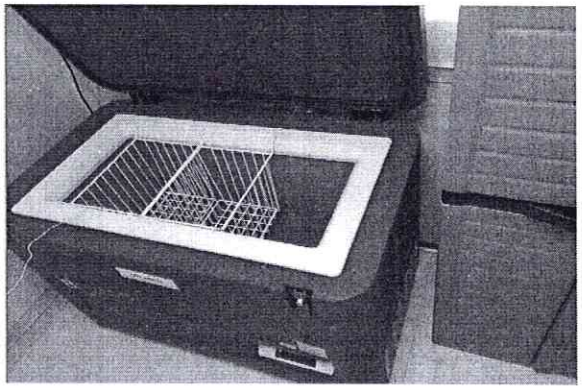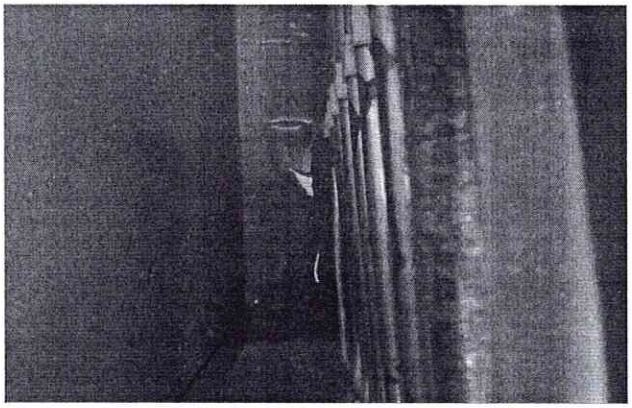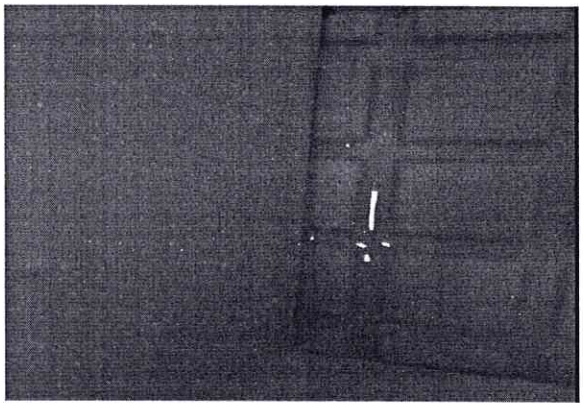
MANTENIMIENTO NEVERAS DE VACUNACIÓN DISPENSARIO MEDICO DE COROZAL



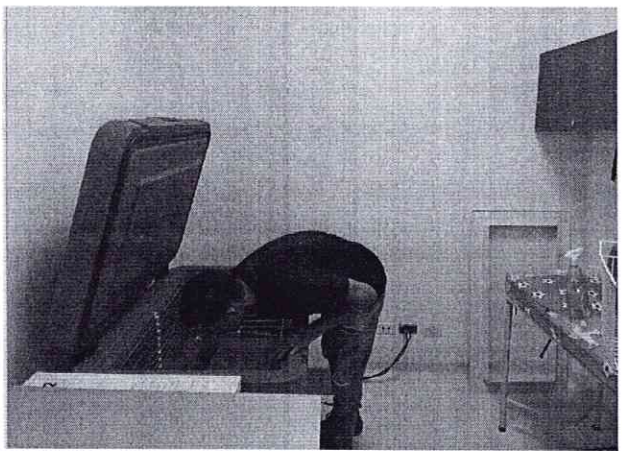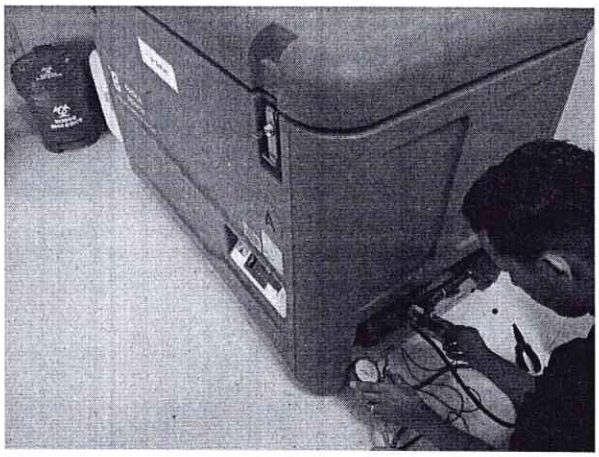


MANTENIMIENTO NEVERAS DE VACUNACIÓN DISPENSARIO MEDICO DE COVEÑAS

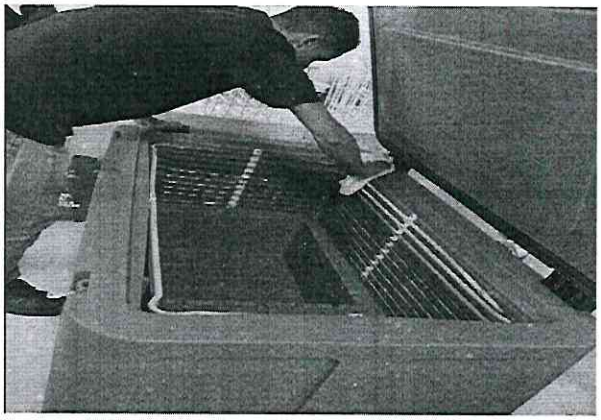

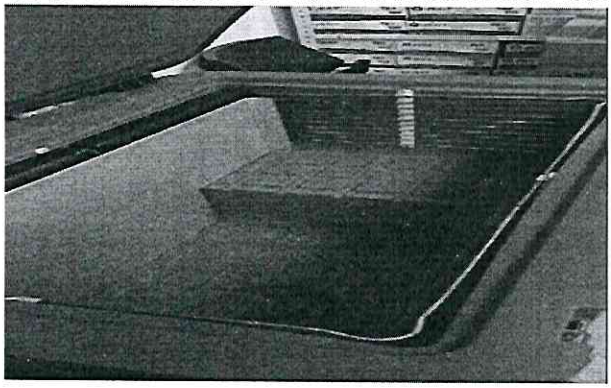



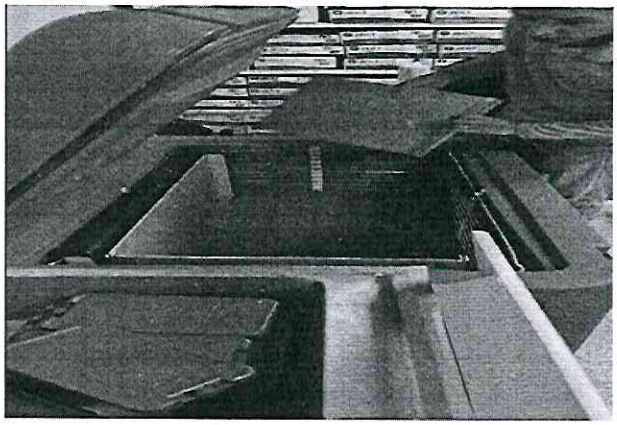

S1 CARO CASTILLO MANUEL
SUPERVISOR CONTRATO Nº 358-ARC-DISAN-DHONAC-2024
