	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18-oct-24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No. 1517 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES SAN JUAN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCION DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMA EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.LOTE 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1551 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NOGAALL-LITORAL

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se inicia la reunión tratando los temas desarrollados en el anterior comité de obra, revisando los plazos y avances al respecto durante la reunión

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Estado de la revision a los estudios y diseños por parte de interventoría, soportes de pago de planillas por parte del contratista, respuesta a observaciones de la Interventoria en cuanto a documento PAGA , Respuesta de ajuste de A.I.U, Respuesta de ajuste a de cronograma presentado para la entrega de volumenes, actas de cobro 1 y 2 de contratista, matriz de actividades de participación ciudadana, registro sukubun, reunión de sostenibililidad, mesas de trabajo de estudios y diseños

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

Se da inicio al comité de obra siendo las 9:00 a.m; con la presencia de Gestores y supervisores por parte del INVIAS, el equipo de interventoria (técnica, ambiental, sostenibilidad), y área técnica del contratista, se aclara que este comité se programó con el fin de realizar una mesa de trabajo de estudios y diseños

se hace un recuento del comité anterior con el fin de informar al ingeniero Jannier sobre los avances, debido a que en el comité pasado no pudo asistir

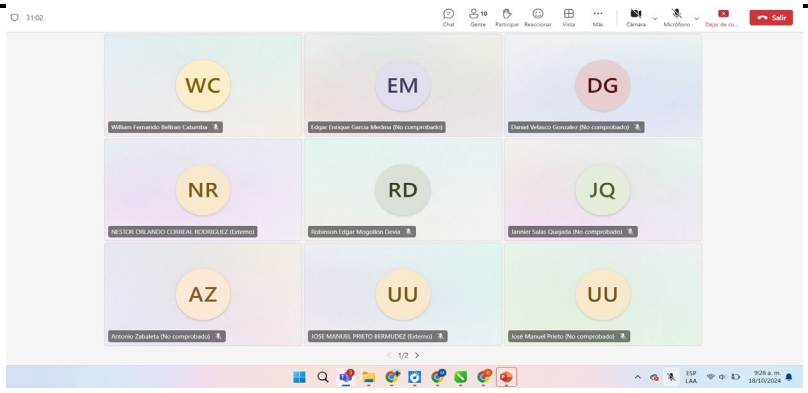
Con relación a los muelles que se encuentran en contrsucción sobre el rión san juan, se plantea la necesidad de realizar una reunión el próximo martes 22 de octubre con las comunidades de los 10 muelles a construír con el fin de realizar una socialización y dar cumplimiento a un requisito por medio de este evento público adquirido con las comunidades de la zona y la organización ACAESAN, la cual representa varias asociaciones populares en la zona, el evento busca informar sobre los últimos avances en el desarrollo de la construcción de los muelles y permitir a la comunidad expresarse con relación a como se ajusta a sus necesidades y las dudas que hayan al respecto. Por otro lado se menciona que en la reunión deben participar tanto personal de la interventoría como del contratista, los cuales deben estar de forma presencial a las 10 am, hora en la que se ha planteado la reunión, es importante mencionar que los gastos de transporte, logística, transporte y alimentación corre por cuenta de cada contrato por lo que se pasarán los soportes de estos dentro de las cuentas de cobro para ser reconocidas por el supervisor

los objetivos de la reunión, se comenta que durante la semana se ha intentado comunicar con el representante pero hasta el momento no ha sido posible la comunicación, por lo que se acuerda confirmar durante la semana la reunión para que las partes puedan asistir.

De las mesas de trabajo planteadas en el comité anterior, cabe anotar que solamente se pudo sostener la mesa de la revisión de volúmenes 7 y 8, la otra mesa planteada no tuvo presencia del contratista por lo que se hizo un llamado por medio de oficio a cumplir con los compromisos del contrato

Se aclara al director del contratista que la información del personal que trabaja en el proyecto debe anexarse completa incluyendo los soportes de todo el personal

posterior a la presentación y en vista de que no se pudo realizar la mesa de trabajo programada, se acuerda realizar dos mesas de trabajo el mismo viernes con el ánimo de adelantar la revisión y atención de observaciones a volúmenes cruciales para el desarrollo de la fase



COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
diligenciar y entregar Matriz de participación ciudadana	sin fecha	obra
revisar y emitir concepto de documento PAGA	martes, 22 de octubre de 2024	interventoria
Presentación de pago de planillas de aportes parafiscales	jueves, 24 de octubre de 2024	Obra
Se espera una respuesta de l asupervisión frente a la solicitud de aclaración del A.I.U	jueves, 24 de octubre de 2024	Obra
entregar reprogramación de cronograma de entrega de volúmenes de estudios y diseños	martes, 22 de octubre de 2024	OBRA
sostener mesas de trabajo entre especilistas	viernes, 18 de octubre de 2024	Obra e Interventoría

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA 25/10/2024
(Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Néstor Correal	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	
Jose Prieto	ESPECIALISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	
Jannier Quesada	SUPERVISOR INVIAS	INVIAS	
Robinson Mogollón	GESTOR INVIAS	INVIAS	
Luisa Palma	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	
Fernando Beltran	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	
Antonio Zabaleta	COORDINADOR DE PROYECTOS	CONSORCIO MUELES SAN JUAN	
Daniel Velazco	DIRECTOR	CONSORCIO MUELES SAN JUAN	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial
