RICARDO GELVEZ
MORENO
INGENIERO CIVIL

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

PMT

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA AVENIDA 2E ENTRE CALLE 34 Y 35, INCLUYE INTERSECCION CON LA CALLE 35 EN EL BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO LP-SI-010-2023

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO
INGENIERO CIVIL

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 3

ITEMS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA 4

SEÑALIZACION VIAL 4

1 BARRICADAS UND 8,00 4

2 DELINEADORES TUBULARES(COLOMBINAS) UND 55,00 5

3 CINTA PLASTICA "PELIGRO NO PASE" ML 286,00 6

SEÑALIZACION PROVISIONAL 7

1 SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SRO-01 UND 2,00 7

PERSONAL 9

1 OBRERO MOVIMIENTOS DE VALLAS Y SEÑALES MES(02) 9

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al cumplimiento de lo contratado para el PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT.

Detalla las acciones que se desarrollaron cumplimiento los ítems detallados en el proyecto PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA AVENIDA 2E ENTRE CALLE 34 Y 35, INCLUYE INTERSECCION CON LA CALLE 35 EN EL BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA AVENIDA 2E ENTRE CALLE 34 Y 35, INCLUYE INTERSECCION CON LA CALLE 35 EN EL BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
CONTRATO DE OBRA:	LP-SI-010-2023
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	LP-SI-010-2023
INTERVENTORIA:	OBRAINCOL SAS R/L ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS
SUPERVISIÓN:	SERGIO DAVID ALBARRACIN (SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA)

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

ITEMS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA

SEÑALIZACION VIAL

1.1 BARRICADAS UND 12,00

Desde el inicio y hasta el final de las obras realizadas se realizó la colocación provisional de las barricadas con el fin de delimitar el área de trabajo de las demás vías aledañas, con el objetivo de proteger, advertir la realización de obras, regulando el paso vehicular tanto de automóviles como de motocicletas. Su presentación es de color naranja con detalles reflectivos blancos que ayudan a detectarlos con facilidad durante el día y noche.



Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO
INGENIERO CIVIL

1.3 DELINEADORES TUBULARES(COLOMBINAS) UND 30,00

Durante el desarrollo de la obra se realizó la instalación de delineadores tubulares con varios objetivos, el primero junto con las barricadas delimitar el área de trabajo, otra función fue delimitar lugares por los que estaba prohibido el paso peatonal, esto con el fin de afectar la integridad de los peatones o la calidad de la obra; además permitieron indicar por donde era seguro el tránsito peatonal.



Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

1.4 CINTA PLASTICA "PELIGRO NO PASE" ML 2000

En el transcurso de las labores realizadas se utilizó la cinta plástica con el fin de delimitar las diferentes zonas y advertir tanto a vehículos como a los peatones la prohibición de paso, esta cinta plástica debido a su material debía ser cambiada de manera frecuente, garantizando su optimo rendimiento y visibilidad a las personas.



Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com


RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

SEÑALIZACION PROVISIONAL

2.4 SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SRO-01 UND 2,00

Durante el desarrollo de las obras, se efectuó la instalación de dos señales vertical SRO-01 priorizando los dos puntos en los que se presenta el flujo vehicular, logrando con esto informar a los vehículos el estado de "VÍA CERRADA".

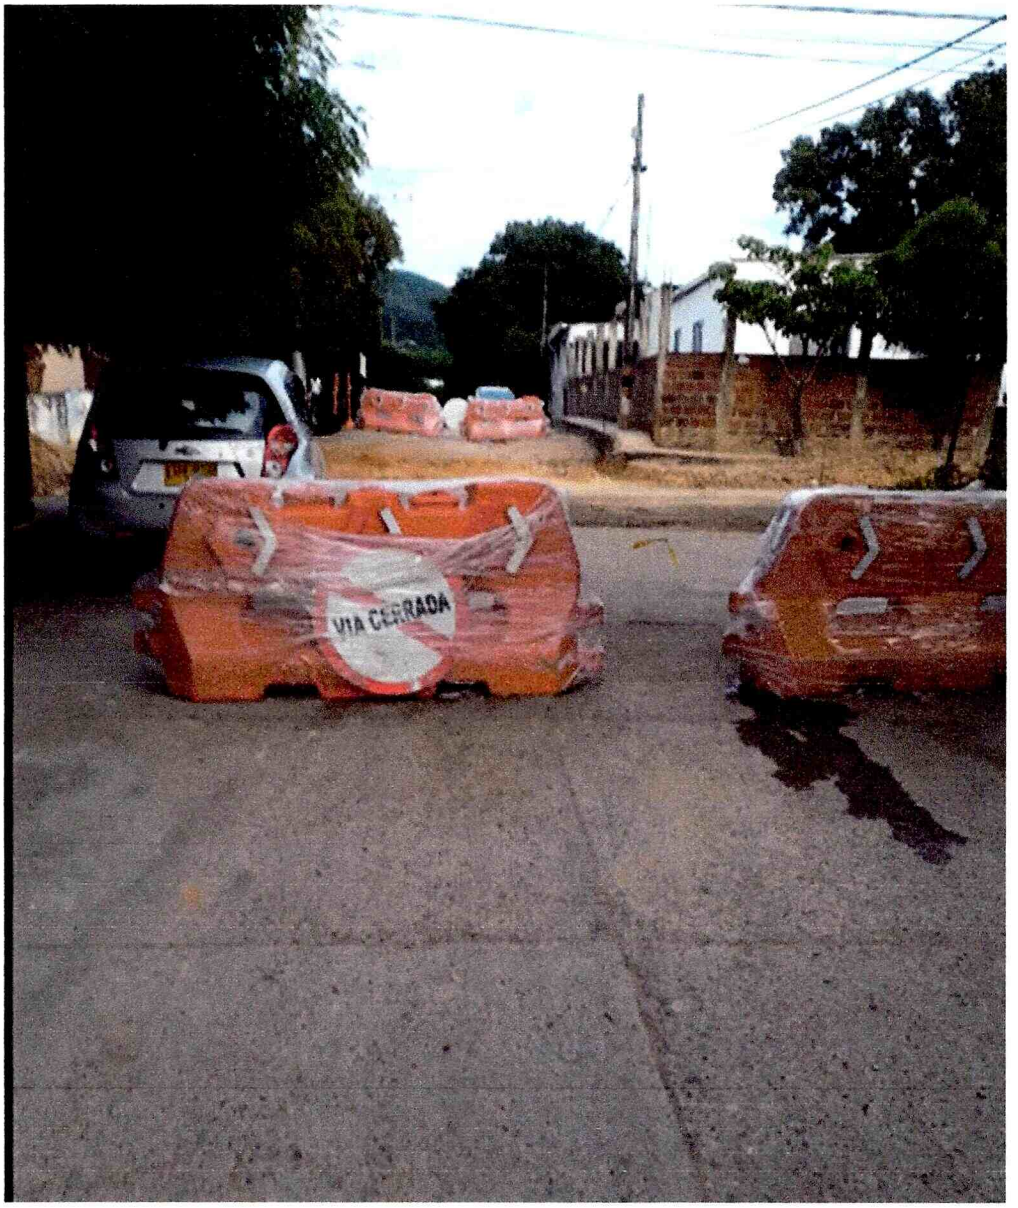

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL




Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

4.0 PERSONAL

4.1 OBRERO MOVIMIENTOS DE VALLAS Y SEÑALES MES (03)

Durante el desarrollo de las obras, se requirió de personal para informar a los transeúntes, motorizados o conductores de vehículo sobre movimientos de vehículos en la vía y durante el desarrollo de las actividades.

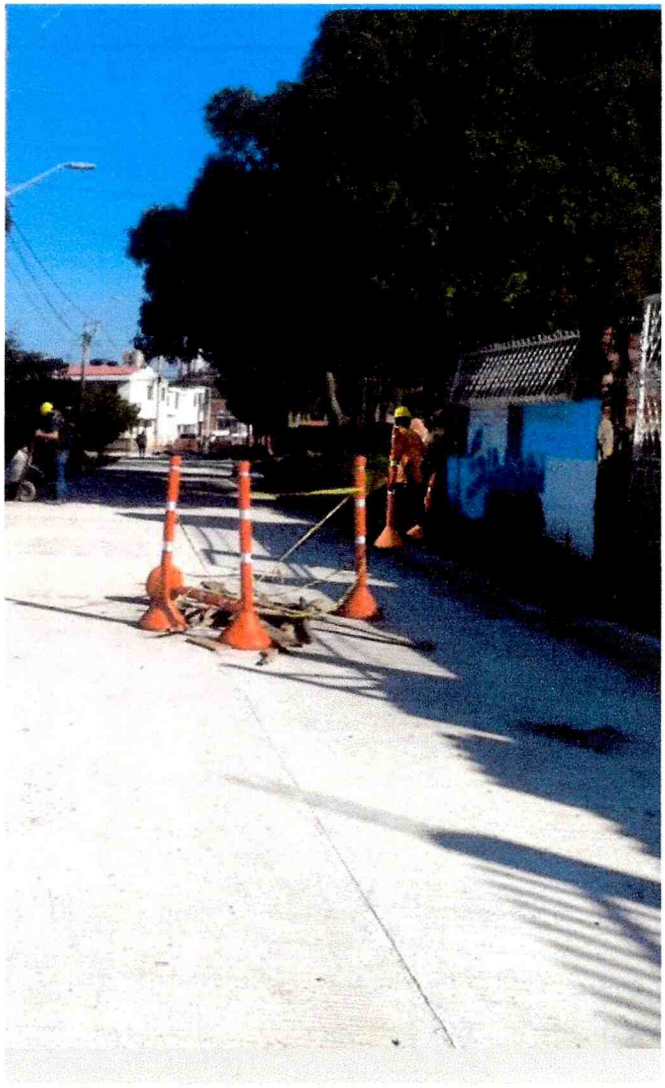

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

De esta forma se ha dado cumplimiento a lo contratado para el PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT. En el contrato denominado PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA AVENIDA 2E ENTRE CALLE 34 Y 35, INCLUYE INTERSECCION CON LA CALLE 35 EN EL BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.

Ricardo Gelvez Moreno
Contratista de Obra

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com
