ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	

INFORME 13 **PERIODO** 11/13/2024 **a** 11/19/2024

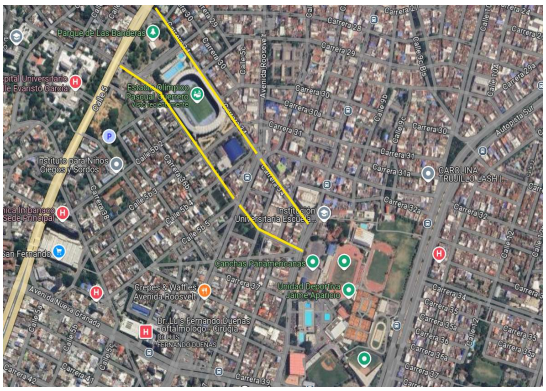
CONTRATO DE OBRA	
NÚMERO DE CONTRATO	4151.010.26.1.0743-2024
OBJETO	LOTE 5: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.
CONTRATISTA	*PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS*
FECHA DE TERMINACION	11/5/2024
SUPERVISOR S.I.	LEONARDO SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NUMERO CONTRATO	4151.010.26.1.0752-2024
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 4151.010.32.1.0493-2024, CUYO OBJETO ES "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI" que comprende los lotes de obra : Lotes 1, 3, 5 y 6.
CONTRATISTA	*CONSORCIO TD CALI*
FECHA DE TERMINACION	11/20/2024
SUPERVISOR S.I.	LEONARDO SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA OBRA	**El proyecto consiste en la realizacion del mantenimiento de 5 tramos viales en el perimetro urbano de Santiago de Cali, especificamente en la comuna 19, los cuales presentan deterioro vial en la capa de rodadura, ya sea en pavimento rigido o en flexible. Los frentes en intervencion son los siguientes:** **· F7: Calle 9 entre carreras 66 y 39.** **· F15: Carrera 34 entre calle 9 y Av Roosevelt .** **· F16: Carrera 34 entre Av Roosevelt y calle 5.** **· F17: Carrera 36 entre calle 5 y Av Roosevelt.** **· F18: Carrera 36 entre Av Roosevelt y calle 9.**

Actividades
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
2. DEMOLICIONES
3. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE
4. RELLENOS Y BASES
5. PAVIMENTOS ASFALTICOS
6. CONCRETOS
7. ACEROS
9. DEMARCACION Y SEÑALIZACION
11. DRENAJES


Parque de las Banderas
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Estadio Deportivo Cali
Unidad Deportiva Alfonso Lopez
Unidad Deportiva Panamericana
Unidad Deportiva Antonio Nariño
Unidad Deportiva Alberto Galindo
Unidad Deportiva Cristo Rey
Unidad Deportiva Julio Cesar Perea
Unidad Deportiva Julio Cesar Perea
Unidad Deportiva Julio Cesar Perea

Intervención en el F7: Calle 9 entre carrera 39 y carrera 42	*Se continuará con fundir las losas con espesor de 20 cm en carril derecho.*
Intervención en el F18: Carra 36 entre calle Roosevelt y calle 9	*Se realizará corte de las losas fundidas para dilataciones y se fundirá losas en MR -42 con espesor de 20 cm en el carril CENTRAL.*

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

		
Carrera 36 entre calle 7 y Calle 8. Instalación de material granularpara base tipo INVIAS	**Calle 9 entre carrera 39 y Carrera 42.** Instalación de material granularpara base tipo INVIAS	**Calle 9 entre carrera 39 y Carrera 42.** Instalación de formaleta para fundida de losas.
		
Calle 9 entre carrera 39 y Carrera 42. Instalación de formaleta para fundida de losas.	**Calle 9 entre carrera 39 y carrera 42.** Se realiza la fundida de losas en concreto MR-42	**Carrera 36 entre calle 7 y Calle 8.** Se realiza la fundida de losas en concreto MR-42

ELABORÓ: ING YENNY LEÓN

REVISÓ: ING LEONARDO TORO
