
CRONOGRAMA - AV. CIUDAD DE CALI TRAMO TRAMO DESDE AV. CIRCUNVALAR SUR HASTA AV. BOSA - GRUPO 1

Id	EDT	ACTIVIDAD	PLAZO
1	1	AV. CIUDAD DE CALI TRAMO TRAMO DESDE AV. CIRCUNVALAR SUR HASTA AV. BOSA - GRUPO 1	24 MESES
2	1.1	INICIO DEL PROYECTO	HITO
3	1.2	PRELIMINARES	6 MESES
4	1.3	OBRA	18 MESES
5	1.3.1	INICIO OBRA	Hito
6	1.3.2	TRAMO AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA	17 meses
7	*1.3.2.1*	*INICIO TRAMO AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA*	*Hito*
8	1.3.2.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	2 meses
9	1.3.2.3	CALZADA ORIENTAL	6 meses
10	1.3.2.3.1	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	2½ meses
11	1.3.2.3.1.1	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	1 mes
12	1.3.2.3.1.2	RELLENOS	1½ meses
13	1.3.2.3.1.3	RED DE ACUEDUCTO	1 mes
14	1.3.2.3.1.4	RED DE ALCANTARILLADO	1 mes
15	1.3.2.3.2	CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	4 meses
16	1.3.2.3.2.1	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	1 mes
17	1.3.2.3.2.2	RELLENOS	2½ meses
18	1.3.2.3.2.3	REDES ELÉCTRICAS	2 meses
19	1.3.2.3.2.4	REDES DE TELECOMUNICACIONES	1½ meses
20	1.3.2.3.2.5	REDES DE GAS	1½ meses
21	1.3.2.3.3	TAQUILLAS Y CICLO-ESTACIONES	2 meses
22	1.3.2.3.4	ESPACIO PÚBLICO (Calzada Oriental)	3 meses
23	1.3.2.3.5	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2 meses
24	1.3.2.3.6	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	2 meses
25	1.3.2.4	CALZADA OCCIDENTAL	6 meses
26	1.3.2.4.1	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	2½ meses
27	1.3.2.4.1.1	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	1 mes
28	1.3.2.4.1.2	RELLENOS	1½ meses
29	1.3.2.4.1.3	RED DE ACUEDUCTO	1 mes
30	1.3.2.4.1.4	RED DE ALCANTARILLADO	1 mes
31	1.3.2.4.2	CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	4 meses
32	1.3.2.4.2.1	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	1 mes
33	1.3.2.4.2.2	RELLENOS	2½ meses
34	1.3.2.4.2.3	REDES ELÉCTRICAS	2 meses
35	1.3.2.4.2.4	REDES DE TELECOMUNICACIONES	1½ meses
36	1.3.2.4.2.5	REDES DE GAS	1½ meses
37	1.3.2.4.3	TAQUILLAS Y CICLO-ESTACIONES	2 meses
38	1.3.2.4.4	ESPACIO PÚBLICO (Calzada Occidental)	3 meses
39	1.3.2.4.5	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2 meses
40	1.3.2.4.6	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	2 meses
41	1.3.2.4.7	CICLORUTA	1½ meses
42	1.3.2.5	CORREDOR BRT	5 meses
43	1.3.2.5.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	4½ meses
44	1.3.2.5.2	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	1½ meses
45	1.3.2.6	CONSTRUCCIÓN ESTACIONES	9 meses
46	1.3.2.6.1	ESTACIÓN TERREROS	5 meses
47	1.3.2.6.1.1	CIMENTACIÓN	2 meses
48	1.3.2.6.1.2	ESTRUCTURAS	2½ meses
49	1.3.2.6.1.3	ACABADOS	2 meses
50	1.3.2.6.2	ESTACIÓN SAN BERNANDINO	6 meses
51	1.3.2.6.2.1	CIMENTACIÓN	2½ meses
52	1.3.2.6.2.2	ESTRUCTURAS	3 meses
53	1.3.2.6.2.3	ACABADOS	2 meses
54	1.3.2.6.3	ESTACIÓN CALLE 70 SUR	6½ meses
55	1.3.2.6.3.1	CIMENTACIÓN	3 meses
56	1.3.2.6.3.2	ESTRUCTURAS	3 meses
57	1.3.2.6.3.3	ACABADOS	2 meses
58	*1.3.2.7*	*FIN TRAMO AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA*	*Hito*
59	1.3.3	FIN OBRA	Hito
60	1.3.4	ETAPA FINAL DE RECIBO DE OBRA	1 MES
61	1.4	ADECUACIÓN DE DESVÍOS	17 meses
62	1.5	FIN PROYECTO	HITO

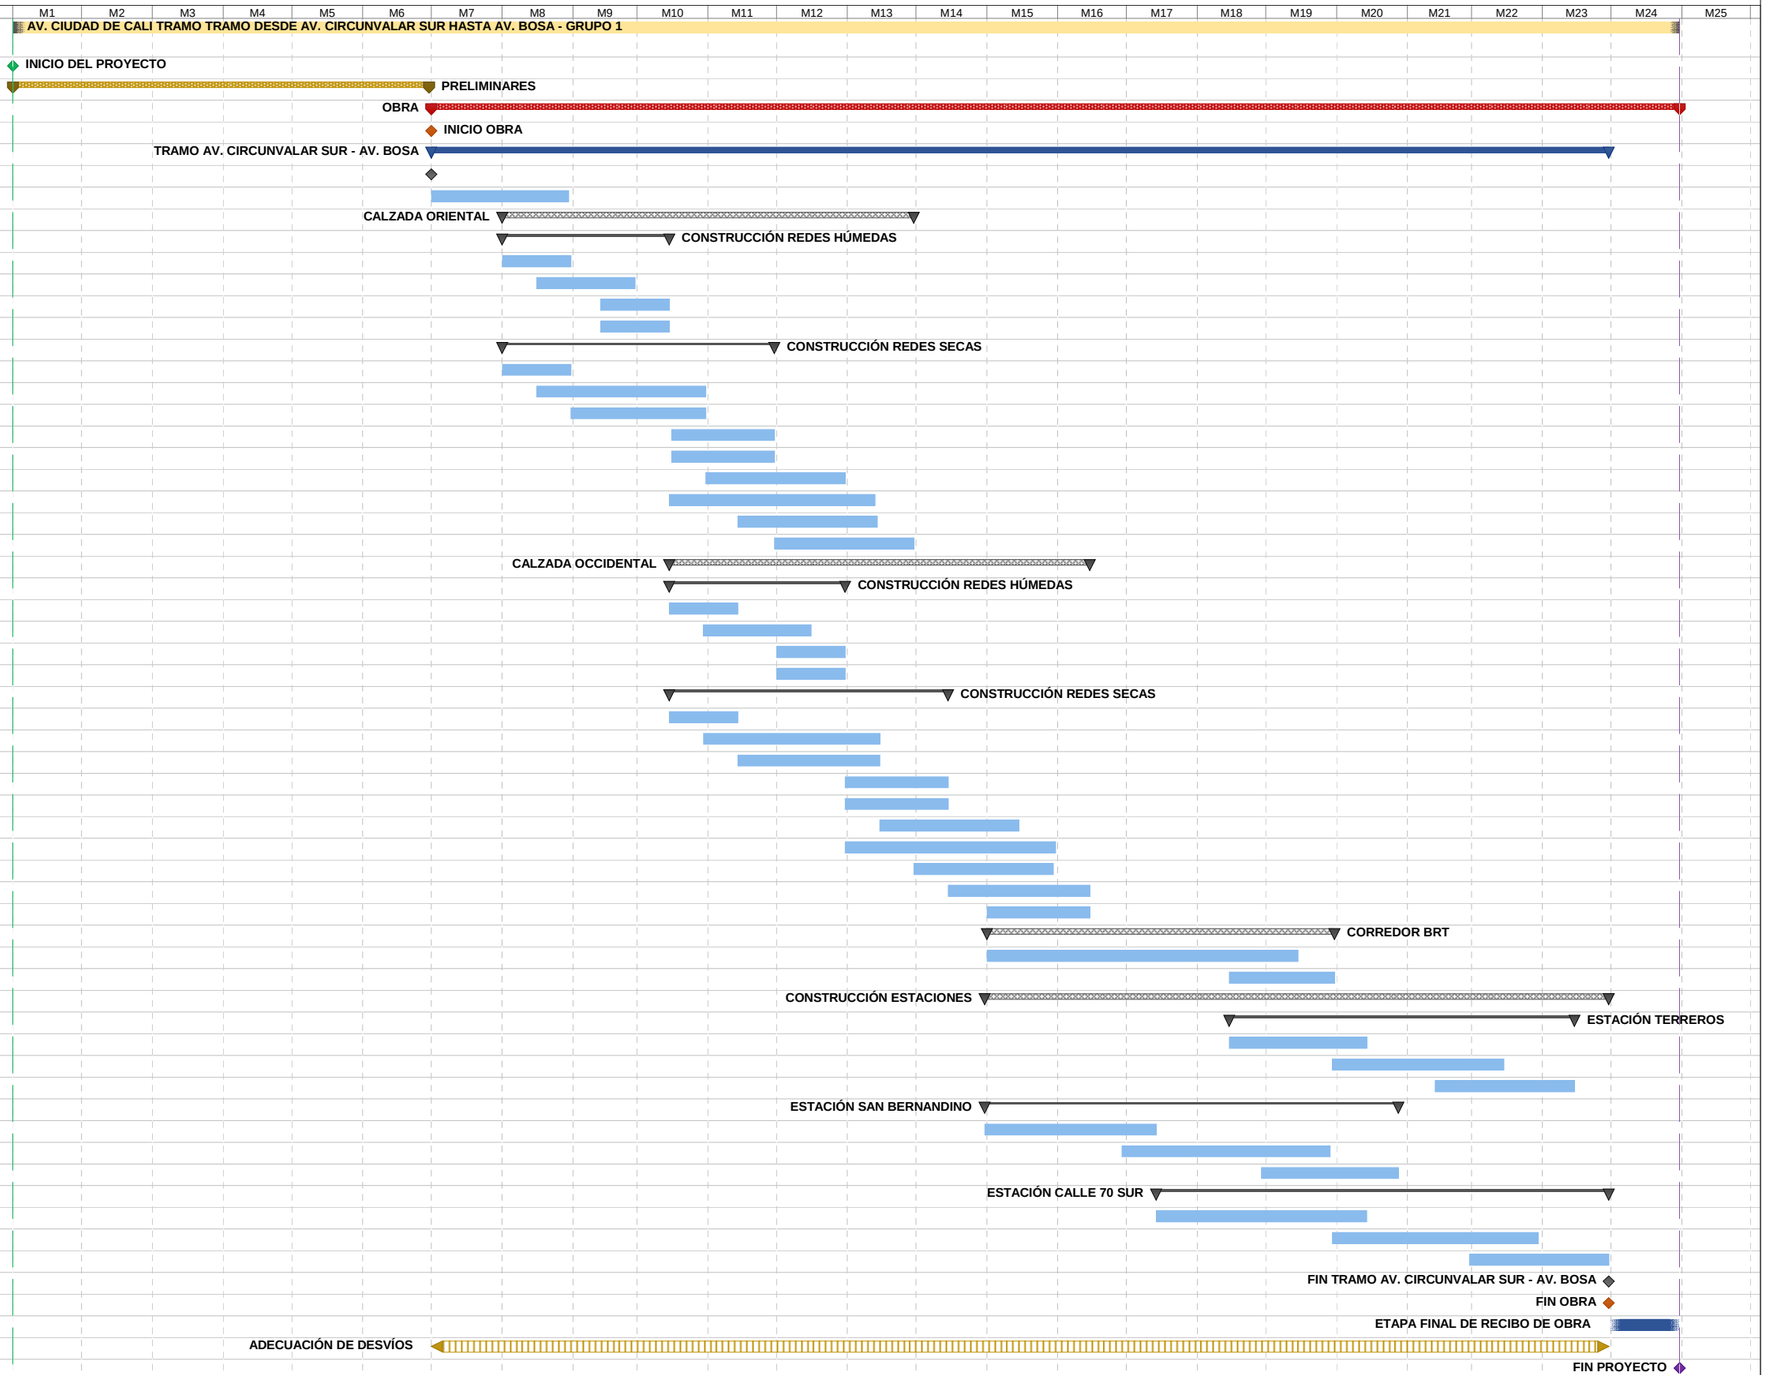

Proyecto: AV. CD. de CALI T1 - Grupo_1
Plazo: 24 MESES

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	Progreso manual	
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Progreso		
