Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA FORMATO ACTA		
V.04	Revisado por: Líder SGC	Aprobado por: Secretario de Educación Distrital	Fecha de aprobación: 11 /07/2022

Tema de la Reunión:	Sesión Ordinaria N° 4 Fondo FIEB		
Área	Educación – Infraestructura		
Fecha de la Reunión:	30/07/2024		
Lugar:	Auditorio 2 CPC		
Hora de inicio:	3:00 pm	Hora Finalización:	5:00 p.m.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer seguimiento a los proyectos aprobados por el Fondo FIEB
Presentar y aprobar proyectos de Infraestructura Educativa al Comité FIEB
Sesión Ordinaria N° 4 Fondo FIEB

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y presentación del Comité
2. Verificación del quórum
3. Lectura de los compromisos generados en el acta anterior
4. Seguimiento a proyectos FIEB
5. Aprobación de presupuesto para los nuevos proyectos de Infraestructura Educativa
6. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Dra. Maribel Benítez Perea, en calidad de Secretaría de Educación a cargo de la secretaría técnica de este Fondo, saluda a todos los miembros del comité, secretarios de despacho, a los equipos de trabajo del Fondo de Infraestructura Educativa, los rectores y representante del consejo de padres de familia y a la representante de los estudiantes.

1. LLAMADO A LISTA Y PRESENTACIÓN DEL COMITÉ

La Dra. Maribel Benítez Perea, secretaria de Educación y procede a llamar a lista a los miembros del comité, contando con la presencia de

10 integrantes. Así mismo, indica el orden del día de la sesión ordinaria llevada a cabo el julio 30 de 2024.

ENTIDAD	CONOVOCADO	ASISTENCIA	OBSERVACIONES
Delegada Alcalde Distrital de Barrancabermeja	Dra. Ingrid Armesto Salgado	Sí	Se adjunta Decreto No. 086 de 2024
Secretaría de Planeación	Ing. Edwin Adrián García Ávila	Sí	
Secretaría de Hacienda	Dr. Oscar Enrique Jaramillo Jiménez	Sí	
Secretaría de Infraestructura	Ing. Johanna Paola Santos Rey	Sí	
Secretaría de Tec. Innovación y Ciencia	Ing. Luis Alberto Arismendi Solano	Sí	
Secretaría de Educación	Dra. Maribel Benítez Perea	Sí	
Representante del Consejo de Padres de Familia	Sra. Mary Luz contreras	Sí	
Representante de Rectores Rurales	Lic. Ana Isabel Gutiérrez	Sí	
Representante de Rectores urbanos	Lic. Manuel Salvador Tapias	SI	
Representante de los personeros	Luisa Fernanda Grateron Marulanda	Si	Asiste de manera virtual

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez efectuado el llamado a lista, la secretaria técnica informa que, de los 10 miembros que conforman el Comité FIEB, se encuentran presentes 10 integrantes, por tanto, se cuenta con quórum para iniciar la sesión ordinaria No. 04 del Comité de Infraestructura Educativa de los Establecimientos Educativos del Distrito de Barrancabermeja

3. LECTURA DE COMPROMISOS DEL ACTA DEL ANTERIOR COMITÉ FONDO FIEB

3.1 Trabajar en la devolución del recurso a instituciones y estas presentar el plan de inversión. Hasta la fecha la secretaria se encuentra pendiente de recibir el plan de inversión por parte de las instituciones educativas.

La Secretaría de Hacienda expidió el decreto por un valor aproximado de 332 millones para el traslado presupuestal, el valor de las transferencias son las siguientes:

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	VALOR
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	80.219.521,74
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EN COMUNICACIÓN INTECOBA	75.401.472,00
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	78.835.237,77
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO AGROPECUARIO LA FORTUNA	51.598.955,00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CHUCURI	43.449.210,00
INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES	3.413.960,00
TOTAL	**332.918.356,51**

3.2 Realizar reunión con las sedes Nueva Bélgica y Zarzal la Y.

- Se realizo la reunión con la sede Nueva Bélgica, con la asistencia de funcionarios de la secretaria de hacienda y secretaria de educación.
- Se encuentra pendiente la reunión con la sede zarzal la Y teniendo en cuenta que ellos están vinculados a proyecto vía yuma.
- Se está trabajando en la legalización de la sede nueva Bélgica para realizar la inversión correspondiente.

- Se debe tener pendiente realizar la solicitud de disponibilidad de Nueva Bélgica $531.801.007y mantenimiento de bombas de real de mares 39.205.227, cuyos recursos ya están aprobados.

3.3 Enviar modificación del borrador del manual operativo del comité FIEB.

4. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

4.1 Construcción y dotación de la Infraestructura del Centro Educativo Campo Galán, sede Ciénaga del Opón en el Distrito de Barrancabermeja, Santander, Se realizo una visita en el mes de julio, se estaba terminando algunos puntos que la comunidad había solicitado con un avance del 95% y esta para entrega el 14 de agosto del 2024.

4.2 Proyecto de construcción y dotación de comedor y cocina del Instituto Técnico Superior Industrial en el distrito de Barrancabermeja, La semana pasada se realizó una visita para hacer el respectivo seguimiento el cual esta para entregar en el mes de septiembre, así mismo esta semana se va hacer la entrega de la cancha la cual hace parte de una obra vecina.
Las mesas contratadas no eran aptas, por lo cual se realizó la modificación para ajustar los comedores

4.3 El proyecto construcción, adecuación y mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales, centros de desarrollo infantil (CDI) o espacios educativos del distrito de Barrancabermeja, Santander; adecuación y recuperación de áreas polideportivas de establecimiento educativos, El proceso contractual está en fase de liquidación

4.4 El proyecto construcción, adecuación y mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales, centros de desarrollo infantil (CDI) o espacios educativos del distrito de Barrancabermeja, Santander. Aulas Provisionales I.E. Pueblo Regado sede Campo 23, Ya fueron entregadas, el viernes 02 de agosto se va a realizar la entrega oficial a las 9:00 am.

4.5 Suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado en los diferentes establecimientos educativos del distrito de Barrancabermeja, se realizó la instalación al 100% de los aires y el proceso está en liquidación. Se debe realizar seguimiento al funcionamiento de los aires de la institución Real de Mares

4.6 Consultoría 26 de marzo y sede B y pozos Tenerife y Rafael Fernández, se encuentra en espera de la licencia de construcción, ya hubo reunión con el consultor. Se hace actas de recibo y se debe hacer la respectiva revisión

4.7 Adecuación de Batería Sanitaria Escuela Normal Superior Cristo Rey: Ya se encuentran en funcionamiento las baterías sanitarias y actualmente está en proceso la reparación del tanque de agua.

PROYECTOS	PROYECTOS	OBJETO	No PROCESO	CUANTIA	No CONTRATO	VALOR DEL C ADIC
COLEGIO NUEVO CIENAGA DEL OPON	OBRA CIENAGA DEL OPON	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENEGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	LPO-009-2022	MAYOR	6223-22	$ 4.164.2
	INTERVENTORIA CIENAGA DEL OPON	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	CM-013-2022	MENOR	6231-22	$ 545.20
COMEDOR DEL INDUSTRIAL	OBRA COMEDOR INDUSTRIAL	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	LPO-015-2022	MAYOR	0756-23	$ 5.073.9
	INTERVENTORIA COMEDOR INDUSTRIAL	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.	CM-021-2022	MENOR	0757-23	$ 375.61
POLIDEPORTIVAS	OBRA POLIDEPORTIVAS	ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS POLIDEPORTIVAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	LPO-007-2023	MAYOR	4160-23	$ 2.286.4
	INTERVENTORIA POLIDEPORTIVAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN Y RECUPERACION DE LAS AREAS POLIDEPORTIVAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	CM-023-2023	MAYOR	4161-23	$ 235.34
AULAS PROVISIONALES CAMPO 23	AULAS PROVISIONALES CAMPO 23	MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL CAMPO 23	SA-MC-032-2023	MENOR	4236-23	$ 481.72
AIRES ACONDICIONADOS	AIRES ACONDICIONADOS	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	SA-SI-012-2023	MAYOR	4117-23	$ 1.323.5
CONSULTORIA 26 DE MARZO SEDE B Y POZOS TENERIFE Y RAFAEL FERNANDEZ	CONSULTORIA 26 DE MARZO SEDE B Y POZOS TENERIFE Y RAFAEL FERNANDEZ	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	CM-027-2023	MENOR	4163-23	$ 600.35
BATERIAS DE BAÑO LA NORMAL	BATERIAS DE BAÑO LA NORMAL	ADECUACION DE BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY	SA-MC-034-2023	MENOR	4623-23	$ 648.19

5. BALANCE FINANCIERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
NIT: 00890201900 - 6
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 30-07-2024
Fecha de Impresión: 30.07.2024 Hora: 09:51:am
Impreso por: OTM - ORFILIA TORRES

Unidad Ejecutor	Codigo de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inici	Saldo por Ejecut	Saldo por Comprometer
0007		2.3-2201-0700-052-200108	Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) O ESPACIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6.689.774.908,00	3.324.238.131,43	3.324.238.131,43

6. PROYECTOS PARA APROBACIÓN

6.1 Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos educativos oficiales del sector urbano del distrito de Barrancabermeja

La consultoría para el proyecto en Establecimientos Educativos, tiene como objetivo proporcionar el análisis y la planificación necesaria para el diseño y la construcción de infraestructura para tres instituciones educativas del Distrito de Barrancabermeja, las cuales son: JOSE ANTONIO GALAN (Salón comedor, cocina, baterías de baños y cubierta en polideportiva con gradería); TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO (Salón comedor, cocina y biblioteca); y por último el TECNICO EN COMUNICACIÓN – INTECOBA (Reubicación de la zona de cafetería cubierta, baterías de baños y construcción de una nueva zona de juegos). Cada una de ellas con un diseño arquitectónico

funcional y con sus respectivos diseños de Ingeniería de detalle, levantamiento topográfico, Diseño Estructural, Geotécnico, eléctrico e hidrosanitario entre otros.



Imagen Satelital Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja INTECOBA
Coordenadas: 7.057445499999999, -73.85414759999999 – Google Earth



Imagen Satelital Colegio José Antonio Galán
Coordenadas: 7.068581527140173S, -73.86425411658038 – Google Earth



Imagen Satelital Institución Educativa Técnico Superior De Comercio
Coordenadas: 7.070748999999999, -73.85246169999999 – Google Earth

LOCALIZACIÓN

- En la I.E de José Antonio Galán: Zona de alimentación escolar (área cubierta comedor al aire libre, cocina con muebles y baterías de baños) y cancha polideportiva.




- En la I.E Técnico Superior de Comercio: Zona de alimentación escolar (Rampa de acceso, comedor, cocina) y Biblioteca




- En la I.E Intecoba: Reubicación de la batería de baños y cubierta para cafetería, zona de juegos)



6.2 Consultoría I.E Laureles: La consultoría para el proyecto Establecimiento Educativo Oficial Institución Los Laureles, en el Distrito de Barrancabermeja, tiene como objetivo proporcionar el análisis, la planificación y el asesoramiento técnico necesarios para el diseño y la construcción de una infraestructura educativa moderna y funcional. El propósito de esta consultoría es asegurar que el proyecto cumpla con todos los estándares de Calidad, Normativos y seguridad, además de ser sostenible y adaptable a las necesidades cambiantes de la comunidad educativa.

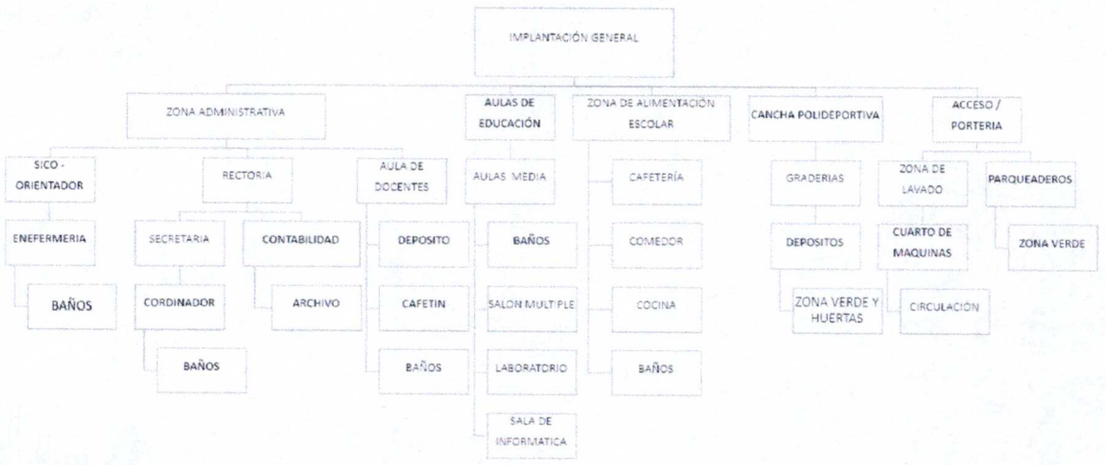

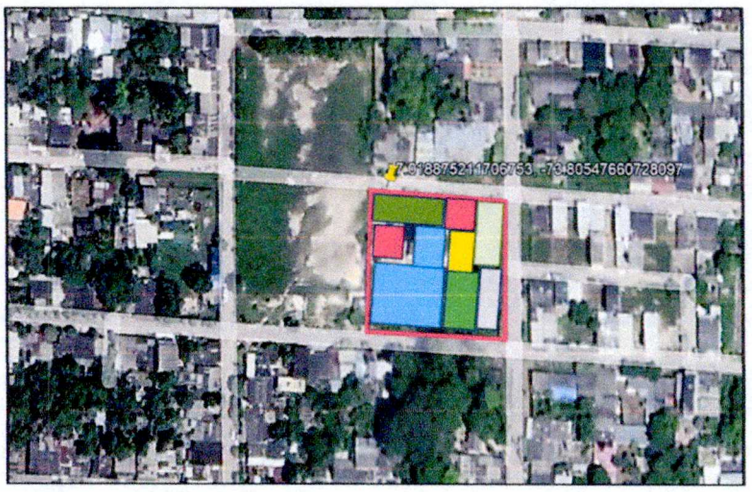

6.3 Obras de mantenimiento y mejoramiento de la I.E Camilo Torres:

El objetivo es solucionar problemas de humedad en la institución, teniendo en cuenta el diagnostico se debe hacer el cambio de material de la cubierta, tejas, manto asfaltico, cielorraso, para evitar filtración.

Dentro de la problemática se encuentra



- Hongos
- Mal olor
- Problemas de salud
- Espacios sin utilizar
- Caída de cielo raso

Causas




Mal estado de las cubiertas metálicas y policarbonato, ruanas, flanches, canales, lo que ca que se filtre agua a los pisos inferiores.








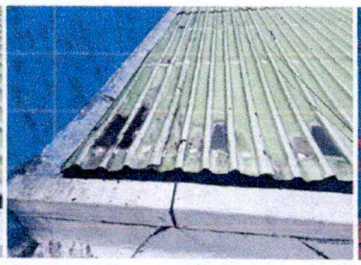



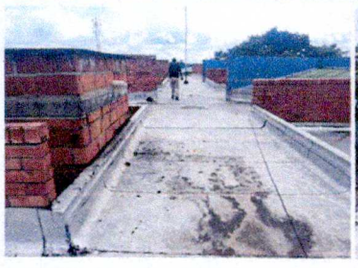





ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Desmonte de teja metálica.
- Desmonte de cubierta en policarbonato.
- Desmonte de cielo raso en aulas de clase.
- Desmonte reparación y/o construcción de Canal metálico.

ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA Y DEMÁS ELEMENTOS

- Adecuación de ruanas perimetrales.
- Suministro e instalación de cielo raso en PVC.
- Suministro e instalación de teja Standing Seam tipo sándwich con aislante en poliuretano.
- Suministro e instalación de cubierta en policarbonato.
- Lavado e impermeabilización de muros en aulas de clase.
- Instalación de puntos eléctricos para lámparas y ventiladores en aulas de clase (No incluye suministro de lámparas, ni ventiladores).
- Adecuación de manto asfaltico.

6.4 Estudio de mitigación de riesgo por inundación Eduardo Santos: La sede tiene un tiempo considerable con el inconveniente de inundación por lo que se hace necesario realizar el estudio correspondiente, actualmente la administración tiene una demanda y este punto es un compromiso solicitado en los requerimientos presentados

Elaborar los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómeno de inundación en la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo, Sede J Eduardo Santos del Barrio El Danubio, de acuerdo con lo establecido en el POT de Barrancabermeja, a lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015 y en la Resolución 400 de 2022 de la Secretaría de Planeación Distrital.



6.5 Consultoría Escaleras Técnico de Comercio: En los compromisos establecidos en el cese de actividades por los estudiantes se estableció el compromiso de hacer la revisión, para conocer que obras o intervención se debe realizar.





N°	PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PLAZO EJECUCION	VALOR TOTAL CONSULTORIA U OBRA	VALOR TOTAL INTERVENTORIA	VALOR TOTAL PROYECTO
1	CONCULTORIA 3 COLEGIOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	6 MESES	$ 585.499.040,00	$ 56.334.600,00	$ 641.833.640,00
2	CONSULTORIA LAURELES	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.	5 MESES	$ 584.400.075,00	$ 56.040.300,00	$ 640.440.375,00
3	CUBIERTA CAMILO TORRES	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CUBIERTAS Y AREAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL CAMILO TORRES RESTREPO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	3 MESES	$ 757.125.394,00	$ -	$ 757.125.394,00
4	ESTUDIO DE MITIGACION EDUARDO SANTOS	ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL, CAMILO TORRES RESTREPO SEDE J EDUARDO SANTOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.	2 MESES	$ 60.575.760,00	$ -	$ 60.575.760,00
5	ESCALERA ITSC	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA DEMOLICION, RESTAURACION, CONSERVACION Y/O PRESERVACION DE LAS ESTRUCTURAS EN RIESGO INMINENTE BAJO LA METODOLOGIA BIM EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.	2 MESES	$ 80.900.365,00	$ -	$ 80.900.365,00
					TOTAL	**$ 2.180.875.534,00**

Fuente: Infraestructura Educativa SED

La asesora, Ingrid Armesto delegada del presidente del Comité sometió a consideración la aprobación de los cinco proyectos anteriormente mencionados. Aprueban todos los miembros presentes.

ENTIDAD	CONOVOCADO	APRUEBA SI/NO
Delegada Alcalde Distrital de Barrancabermeja	Dra. Ingrid Armesto Salgado	Sí
Representante de los personeros	Luisa Fernanda Grateron Marulanda	Si
Secretaría de Hacienda	Dr. Oscar Enrique Jaramillo Jiménez	Sí
Secretaría de Infraestructura	Ing. Johanna Paola Santos Rey	Sí
Secretaría de Tec. Innovación y Ciencia	Ing. Luis Alberto Arismendi Solano	Sí
Secretaría de Educación	Dra. Maribel Benítez Perea	Sí
Representante del Consejo de Padres de Familia	Sra. Mary Luz contreras	Sí
Representante de Rectores Rurales	Lic. Ana Isabel Gutiérrez	Sí
Representante de Rectores urbanos	Lic. Manuel Salvador Tapias	SÍ


7. BALANCE GENERAL


N°	PROYECTO	VALOR TOTAL PROYECTO
1	CONCULTORIA 3 COLEGIOS	$ 641.833.640,00
2	CONSULTORIA LAURELES	$ 640.440.375,00
3	CUBIERTA CAMILO TORRES	$ 757.125.394,00
4	ESTUDIO DE MITIGACION EDUARDO SANTOS	$ 60.575.760,00
5	ESCALERA ITSC	$ 80.900.365,00
6	NUEVA BELGICA	$ 531.801.007,00
7	MANTENIMIENTO DE BOMBAS REAL DE MARES	$ 39.205.227,00
Total		**$ 2.751.881.768,00**

SALDO DISPONIBLE	$ 3.324.238.131,43
PROYECTOS PARA APROBACIÓN	$ 2.751.881.768,00
SALDO RESTANTE	$ 572.356.363,43


8. PROPOSICIONES Y VARIOS

8.1 ADECUACIONES DE RESTAURANTE (SAN RAFAEL DE CHUCURÍ).

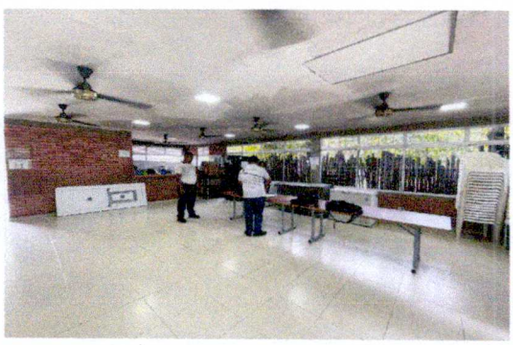


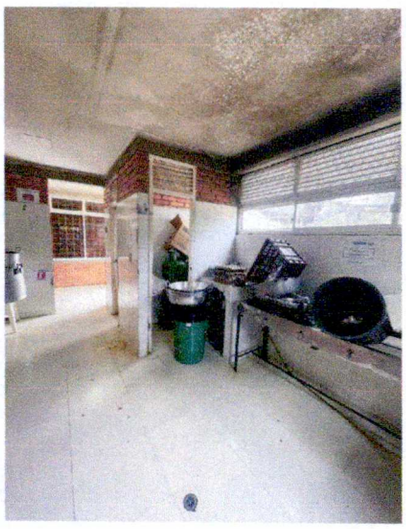

DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL COMEDOR SAN RAFAEL DE CHUCURI

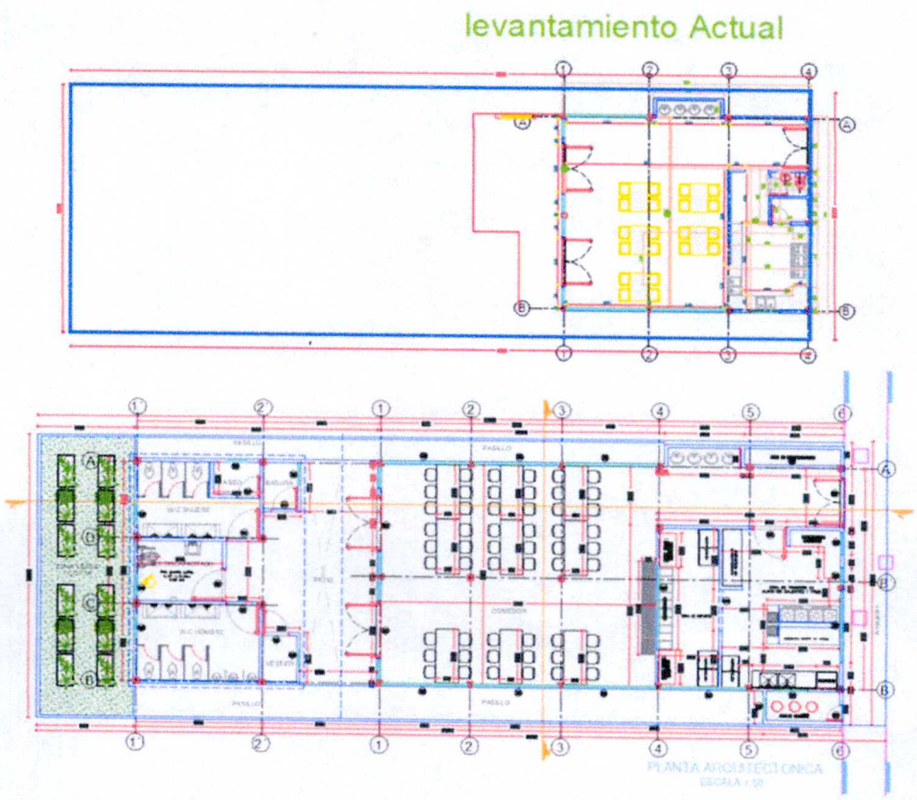


8.2 ADECUANCION Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE PLACA CUBIERTA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

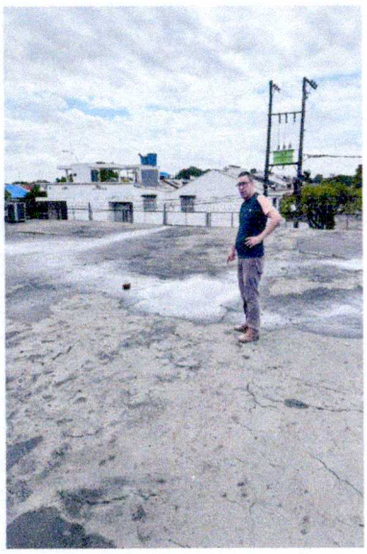



PLANTA ARQUITECTONICA DE PLACA CUBIERTA

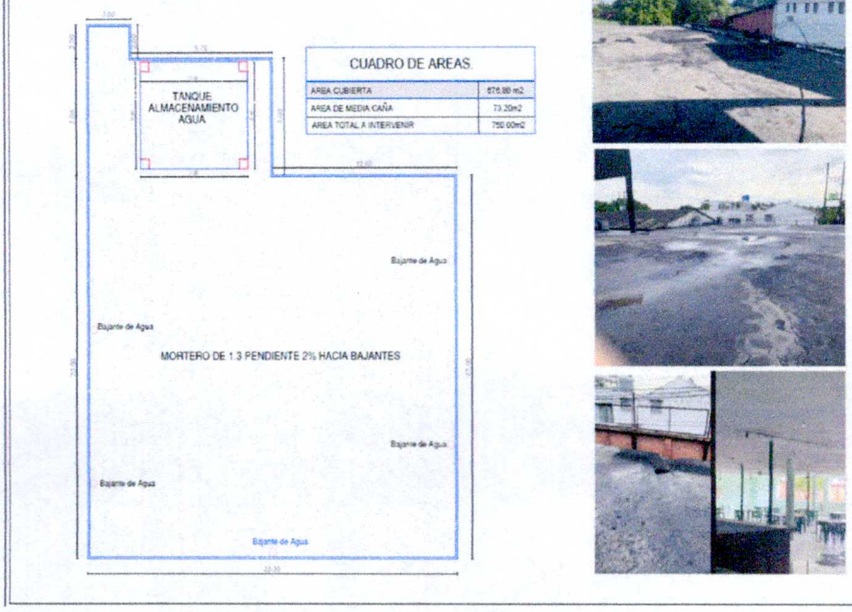

8.3 PROPOSICION DE MODIFICACION AL MANUAL OPERATIVO DEL COMITÉ

Modificación al manual operativo del comité: Se pregunta a los miembros del comité si recibieron el documento con el borrador del documento vía correo electrónico, todos manifiestan haber recibido el correo a excepción de la representante de personeros.
El documento es proyectado y presentado en la mesa del comité el cual incluye puntos como subsanación de predios y la conformación de comités de mantenimiento escolar, quienes incluyen dicho comité, sus funciones.

Los miembros proponen incluir la periocidad de los comités de mantenimiento escolar y establecer la participación de los funcionarios de la administración que van a realizar el acompañamiento a dichos comités.

Se debe aclarar que el 30% del FIEB es destinado a mantenimientos de las instituciones educativas (pinturas, reparaciones menores, entre otras) el cual debe ser priorizado en dichas mesas de trabajo y que atienda a las necesidades planteadas por los estudiantes. Y el 70% son recursos a proyectos que ejecuta directamente la administración distrital.

El comité de infraestructura educativa debe hacer el acompañamiento para hacer alertas tempranas a ir subsanando inconvenientes y mejorar la calidad de educación a los estudiantes, por lo que es necesario el apoyo técnico por parte de la administración.

La administración Distrital tiene como propuesta realizar un estudio para concentrar la mayor cantidad de estudiantes posibles en sedes principales para garantizar un mayor aprovechamiento de los recursos.

8.4 El Rector de la I.E Camilo torres presenta una propuesta para la aprobación de un recurso por un valor de diez millones de pesos moneda cte ($10.000.000) para la ejecución de un proyecto con el fin de modificar diseños presentados del muro de la sede G Antonio Nariño, la cual presenta riesgo por amenaza, ya que se encuentra en riesgo la vida e integridad de la comunidad educativa.
El secretario de Hacienda Oscar Jaramillo, como miembro del comité menciona que para aprobar esos recursos se debe tener un soporte para realizar el traslado presupuestal, por tanto, la secretaria de Educación se encargará de realizar dicho trámite con la secretaría de hacienda.
En consecuencia, la apropiación para estos efectos, se hará con recursos propios diferentes a los del Acuerdo No 038 de 2022.

8.5 La rectora de la I.E Laureles presenta solicitud para la atención y revisión de la parte eléctrica del establecimiento educativo y realizar los trabajos pertinentes.
Se debe realizar un diagnóstico de las redes eléctricas las cuales deben ser actualizadas, por lo cual ya se estableció una consultoría en la cual está incluida en el momento 10 instituciones educativas)

8.6 El secretario de las TICS menciona que hay una falencia en el funcionamiento de aires acondicionados instalados en los puntos vive digital, los cuales no están habilitados y no se ha podido dar uso de esos espacios y es necesario el aprovechamiento de esos espacios.
Se necesita 24 aires acondicionados para habilitar 6 puntos vive digital. (Presenta presupuesto)

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA FORMATO ACTA		
V.04	Revisado por: Líder SGC	Aprobado por: Secretario de Educación Distrital	Fecha de aprobación: 11 /07/2022

La presente acta, es un resumen sucinto del Comité desarrollado el día 30 de julio de 2024 y siendo las 5:30 pm se da por terminada la reunión.

Se adjunta listado de asistencia Julio 30 de 2024

INGRID ARMESTO SALGADO
Delegada Presidente del Comité FIEB

MARIBEL BENITEZ PEREA
Secretaria Técnica del FIEB

NOTA: SI REQUIERE AGREGAR MAS INFORMACIÓN, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA

Compromisos adoptados por las partes.

ACCIONES – TAREAS - COMPROMISOS

N°	Descripción	Responsabilidad	Fecha prevista	Responsable del seguimiento
1	Revisar el borrador del manual operativo comité FIEB	Miembros del Comité	Inmediato	Comité FIEB
2	Revisar cargas del sistema eléctrico en los establecimientos educativos por parte de Infraestructura educativa para la activación de puntos vive digital	Secretaria de Educación Distrital		Comité FIEB
3	Revisar de diagnósticos eléctricos para actualización	Secretaria de Educación Distrital		Secretaria de Educación Distrital
4	Avances del cerramiento la normal por parte de la Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura		Secretaria de Educación Distrital

	Nombre del funcionario	Firma	Fecha
Proyectó:	Liry Vanessa Jiménez Garzón. - Despacho SED		Agosto de 2024
Aprobó:	Miguel Jaraba - Abogado Infraestructura Educativa SED		Agosto de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	V.02	Proyectado por: Líder SGC SED	Aprobado por: Secretario de Educación Distrital	Fecha de aprobación : 8 de julio de 2022

DEPENDENCIA: Sec. Educacion. FECHA: 30-07-2024 LUGAR: Auditorio CPC. HORA: 3:00pm RESPONSABLE DE LA ACITIVIDAD: Sec. de Educacion.

TEMA: Comité FIEB. TIPO DE REUNIÓN: Seguimiento

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/CARGO	TELEFONO	CORREO	SEXO Y TIPO DE POBLACION							ENFOQUE DIFERENCIAL																FIRMA
						SEXO		TIPO DE POBLACION					ENFOQUE ETNICO					ENFOQUE GENERO		GRUPOS ETARIOS					DISCAPACIDAD				
						MASCULINO	FEMENINO	VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	REINTEGRADOS	SISBENIZADO	DESMOVILIZADO		INDIGENAS	COMUNIDADES NEGRAS,	PALENQUERO	RAIZAL	PUEBLO ROM O GITANO	LGBTIQ+	MUJER CABEZA DE FAMILIA	NIÑOS, NIÑAS(0 A 12)	ADOLESCENTES (13 A 17)	JOVENES (18 A 28 AÑOS)	ADULTEZ (29 AÑOS Y ANTES DE LOS 60 AÑOS	ADULTOS MAYORES (60 AÑOS O MAS)	SI	NO	
1	Mariluz Contreras Vargas	28060847	Repra. padres	304 6291113	mariconta@hotmail.com		X																			X	
2	Manuel Tapias	13890415	rector/urbano	3052119 15	tapiaswilches uno@gmail.com	X																				X	
3	Ana Isabel Contreras	37'926.884.	I.E los Laureles Rectora	3106303475	Rectoria.ielos laureles.2020 @gmail.com.		X																			X	
4	Luis Alberto Arismendi S	91.436.060	Secretario TLC	3212053586	luis.arismendi@bumbum.gov.co	X																			X		
5	Maribel Benitez Perez	37935599	SED.	3137450002	maribel.Benitez@barrancabermeja.gov.co		X																X			X	
6	INGRID ARMESTO	1098712256	DESPACHO	3173791940	INGRID.ARMESTO@BARRANCABERMEJA.GOV		X																X			X	
7	Oscar E Jaramillo	91428463	Despacho	314 3505588	oscar.jaramillo@barrancabermeja.gov.co	X																				X	
8	Arturo F. Rueda	1096228013	SED	3153053233	arturo.f.rueda@barrancabermeja	X																				X	
9	EDWIN GUEVARA	13871181	Planeacion	3004721281	edwin.gueva@barrancabermeja	X																				X	
10	Johanna Santos	37713409	Infraestructura	3004871109	Johanna.Santos@barrancabermeja.gov		X																			X	
11	Liny Jimenez	37581375	SED	3004454377	liny.jimenez@sed		X																			X	
12	CAMILO ANDRES DEVIA ANGULO	316877 8771	INFRA ESTRUCTURA	3[illegible] 639807	INFRATECNICA@BARRANCABERMEJA.GOV.CO	X																				X	
13	GIOVANNY DIAS	91490 717	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	1317 640527	dpiageov@hotmail.com	X																				X	GIOVANNY DIAS
14	Jose Luis Prada	1095839004	SED	3203332[illegible] 28	jose.prada@Barrancabermeja.gov.co	X																				X	

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

V.02	Proyectado por: Líder SGC SED	Aprobado por: Secretario de Educación Distrital	Fecha de aprobación : 8 de julio de 2022

DEPENDENCIA: Sec Educación **FECHA:** 30/07/24. **LUGAR:** Auditorio CPC **HORA:** 3:00pm **RESPONSABLE DE LA ACITIVIDAD:**

TEMA: Sesión Ordinaria N°4 fondo FIE3 **TIPO DE REUNIÓN:** Seguimiento

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/CARGO	TELEFONO	CORREO	SEXO Y TIPO DE POBLACION							ENFOQUE DIFERENCIAL																		FIRMA
						SEXO		TIPO DE POBLACION					ENFOQUE ETNICO					ENFOQUE GENERO		GRUPOS ETARIOS					DISCAPACIDAD							
						MASCULINO	FEMENINO	VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	REINTEGRADOS	SISBENIZADO	DESMOVILIZADO		INDIGENAS	COMUNIDADES NEGRAS,	PALENQUERO	RAIZAL	PUEBLO ROM O GITANO	LGBTIQ+	MUJER CABEZA DE FAMILIA	NIÑOS, NIÑAS(0 A 12)	ADOLESCENTES (13 A 17)	JOVENES (18 A 28 AÑOS)	ADULTEZ (29 AÑOS Y ANTES DE LOS 60 AÑOS	ADULTOS MAYORES (60 AÑOS O MAS)	SI	NO					
1	ALBERTO MORALES BOLIVAR.	13.847.838	SED.	3134408494	almogo@hotmail.com																										
2	Leonardo Muñoz Dedoya	91485649	IETR/rector	3175004857		X																									
3	OSCAR Cuello Mendoza	77174019	Sec. Infraestruct.	3203579276	ocuello.arq.@gmail.com	X																									
4	Jorge Mario Polido Barrera	1098719594	Sec Infraestructura	322795 6329	JorgemarioPolido8@gmail.com																										
5	Miguel Fdo Jerez G.	8145864	Secretario Educación	3007160522		X																									
6	BENGU tarazona	1'00162260 36	Infraestructura Educativa SED	3155333131.																											
7	Jorge A. Rueda Mejía	1094096445	SED Arquitecto	3013893864	joarumo_1@hotmail.com	X																									
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
