**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16 DE 60X60CMS, ,REFLECTIVIDAD TIPO XI Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | INTERVENTOR: **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S** | |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| CAJICA - HATOGRANDE |     | |

| UBICACIÓN | TIPO | LADO | CANTIDAD | NUMERO INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 0+870 | SP-25A | AMBOS | 2 | 25126018 - 25126019 |
| 0+980 | SP-01 | IZQUIERDA | 1 | 25126024 |
| 1+140 | SP-36 | DERECHO | 1 | 25126025 |
| 1+360 | SP-36 | IZQUIERDA | 1 | 25126035 |
| 1+680 | SP-08 | DERECHO | 1 | 25126044 |
| 1+910 | SP-08 | IZQUIERDA | 1 | 25126026 |
| | | | | |
| | | TOTAL | 7,00 | |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16 DE 60X60CMS, ,REFLECTIVIDAD TIPO XI Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | | INTERVENTOR: **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S** |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| CAJICA - HATOGRANDE |    | |

| UBICACIÓN | TIPO | LADO | CANTIDAD | NUMERO INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| 0+160 | SP-46 | IZQUIERDA | 1 | 25126003 |
| 0+315 | SP-24 | IZQUIERDA | 1 | 25126005 |
| 0+320 | SP-03 | DERECHA | 1 | 25126004 |
| 0+450 | SP-04 | IZQUIERDA | 1 | 25126006 |
| 0+570 | SP-03 | DERECHA | 1 | 25126008 |
| 0+640 | SP-04 | IZQUIERDA | 1 | 25126015 |
| 0+850 | SP-02 | DERECHA | 1 | 25126017 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **7,00** | |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO TIPO XI(60X75CMS), DELINEADORES DE CURVA TABLERO LAMINA GALVANIZADA, AMARILLO LIMON FLUORESENTE , CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD TIPO XI.

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | INTERVENTOR: **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S** | |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| |  | |
| CAJICA - HATOGRANDE | | |
| | | |



| UBICACIÓN | TIPO | CANTIDAD | LADO | NUMERO INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 0+580 | SP-75 | 6 | DERECHO | **252126009 AL 25126014** |
| 0+900 | SP-75 | 4 | IZQUIERDO | **25126020 AL 25126023** |
| 1+160 | SP-75 | 4 | DERECHO | **25126027 AL 25126030** |
| 1+280 | SP-75 | 4 | DERECHO | **25126031 AL 25126034** |
| 1+600 | SP-75 | 6 | IZQUIERDO | **25126038 AL 25126043** |
| 1+730 | SP-75 | 4 | IZQUIERDO | **25126045 AL 25126048** |
| 1+800 | SP-75 | 6 | DERECHO | **25126049 AL 25126054** |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | **34** | | |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S
TP No 08202-301059

RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROL EN ALUMINIO CON ESPIGO

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | INTERVENTOR: **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S** | |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| CAJICA - HATOGRANDE |   | |

| UBICACIÓN | DISPOSITIVO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| | | |
| 0+220 NORTE | ESTOPEROLES | 420 |
| 0+220 SUR | ESTOPEROLES | 406 |
| | | |
| | **TOTAL** | **826** |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S
TP No 08202-301059

RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX ,REFLECTIVIDAD TIPO XI Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739.

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | INTERVENTOR: **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S** | |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| CAJICA - HATOGRANDE |   | |

| UBICACIÓN | TIPO | LADO | CANTIDAD | NUMERO INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| 0+000 | SP-46/SR-31 | DERECHO | 1 | 25126001 |
| 0+100 | SP-24 / SR-30 | DERECHO | 1 | 25126002 |
| 1+420 | SP-46 / SR-30 | IZQUIERDO | 1 | 25126036 |
| 1+950 | SP-52 / SR-30 | DERECHO | 1 | 25126037 |
| 2+200 | SP-46/SR-31 | IZQUIERDO | 1 | 25126016 |
| | | TOTAL | 5,00 | |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

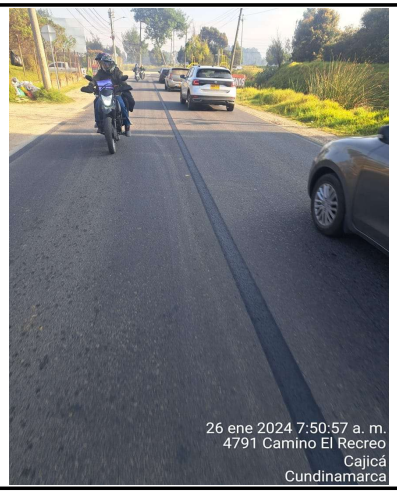
RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR MINIMO 110 MICRONES

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | | INTERVENTOR: ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| |  | |
| CAJICA - HATOGRANDE | | |
| | | |



| | | CARRILES | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | LONGITUD | LATERALES | CENTRAL | TOTAL |
| | | | | |
| Pr 0+000 AL Pr 2+100 | 2057 | | 1 | **2057** |
| Pr 0+000 AL Pr 2+100 | 2034 | 2 | | **4068** |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | **6125** |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S
TP No 08202-301059

RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA PLASTICA EN FRIO, LINEA DE DEMARCACION CON MICROESFERA DE VIDRIO,ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO= 12 CMS. NORMA NTC-4744

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | | INTERVENTOR: ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| CAJICA - HATOGRANDE |  | |

| | | CARRILES | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | LONGITUD | LATERALES | CENTRAL | TOTAL |
| | | | | |
| Pr 0+000 AL Pr 2+100 | 2057 | | 1 | **2057** |
| Pr 0+000 AL Pr 2+100 | 2034 | 2 | | **4068** |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | **6125** |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S
TP No 08202-301059

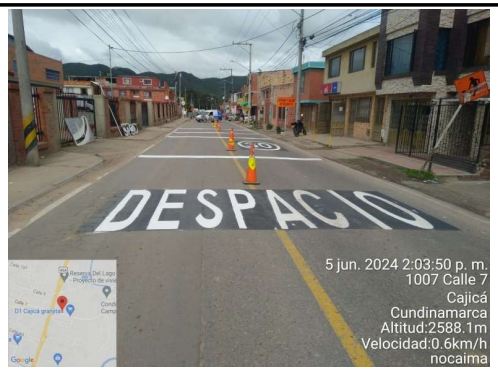
RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PLASTICA EN FRIO PARA MARCA VIAL CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC-4744.

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | | INTERVENTOR: ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| |  | |
| Pr 0+00 Y Pr 0+240 | | |
| | | |



| | UNIDADES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | CANTD | LARGO | ANCHO | TOTAL | |
| | | | | | |
| CEBRA Pr 0+000 | 7 | 4 | 0,4 | 11,2 | |
| BANDAS ALERTADORAS NORTE | 5 | 5,7 | 0,5 | 14,25 | |
| BANDAS ALERTADORAS SUR | 5 | 5,7 | 0,5 | 14,25 | |
| TEXTO DESPACIO | 2 | 4,4 | | 8,8 | |
| SR 30 | 2 | 3,36 | | 6,72 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL | | 55,22 | |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PLASTICA EN FRIO PARA MARCA VIAL CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC-4744.

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | | INTERVENTOR: ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Pr 0+870 |   | |

| | UNIDADES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | CANTD | LARGO | ANCHO | TOTAL | |
| | | | | | |
| RESALTO | 1 | 6,18 | 3,6 | 22,248 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL | | 22,25 | |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

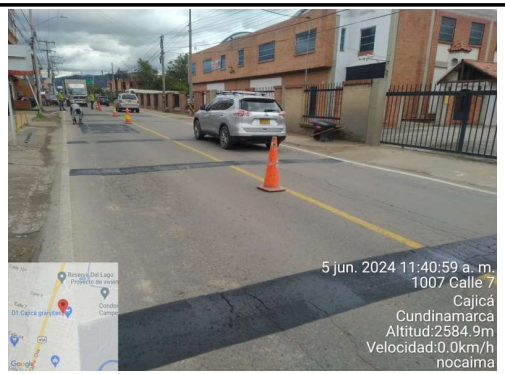
RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR MINIMO DE 110 MICRONES QUE CUMPLA LA NORMA NTC-4744.

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | | INTERVENTOR: ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Pr 0+00 Y Pr 0+240 |   | |

| UBICACIÓN | UNIDADES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CANTD | LARGO | ANCHO | TOTAL | |
| CEBRA Pr 0+000 | 7 | 4,1 | 0,5 | 14,35 | |
| BANDAS ALERTADORAS NORTE | 5 | 5,8 | 0,6 | 17,4 | |
| BANDAS ALERTADORAS SUR | 5 | 5,8 | 0,6 | 17,4 | |
| TEXTO DESPACIO | 2 | 12,5 | | 25 | |
| SR 30 | 2 | 10,34 | | 20,68 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL | | 94,83 | |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

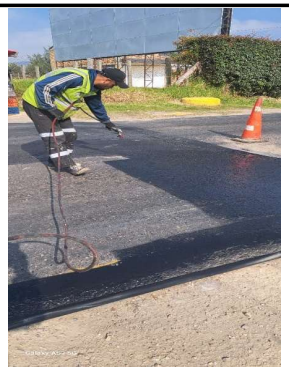
RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR MINIMO DE 110 MICRONES QUE CUMPLA LA NORMA NTC-4744.

| OBJETO: | EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CORTE: |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS | | INTERVENTOR: ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S |

| DIRECCION / LOCALIZACION | FOTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| |  | |
| Pr 0+870 | | |
| | | |

| | UNIDADES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | CANTD | LARGO | ANCHO | TOTAL | |
| | | | | | |
| RESALTO | 1 | 6,28 | 3,7 | 23,236 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL | | 23,24 | |

ING.CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – STMC

ENTREGADO POR

ING. JUAN CAMILO ARRIETA ABUABARA
RESIDENTE DE OBRA
F REESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

RECIBIDO POR

ING. FIDEL MARTINEZ SORIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S
