INFORME EJECUTIVO VISITA DE OBRA

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA

Se inicia la visita con un recorrido por los diferentes puntos de intervención los cuales al día de esta visita son 4, el primero se encuentra en la carrera 2 entre calles 9 y 8, el segundo en la carrera 2 con calle 8, el tercer punto es en la carrera 2 con calle 8 y 7ª y el cuarto en la carrera 2 entre calles 16 y 17.

CARRERA 2 ENTRE CALLES 9 Y 8.







En este punto de intervención de la carrera 2 entre calle 9 y 8 se encuentran realizando una limpieza para poder instalar la formalete y terminar de fundir el pozo M 4, adicional a esto se realizaran resanes en el concreto de este pozo.

CARRERA 2 CON CALLE 9 SECTOR DE CAR WASH







En este punto de intervención de esta terminando de realizar la excavación para poder iniciar con la construcción del pozo.


CARRERA 2 ENTRE CALLES 8 Y 7A





En este punto se están realizando trabajos de excavación e instalación de tubería de 45”

CARRERA 2 ENTRE CALLES 16 Y 17

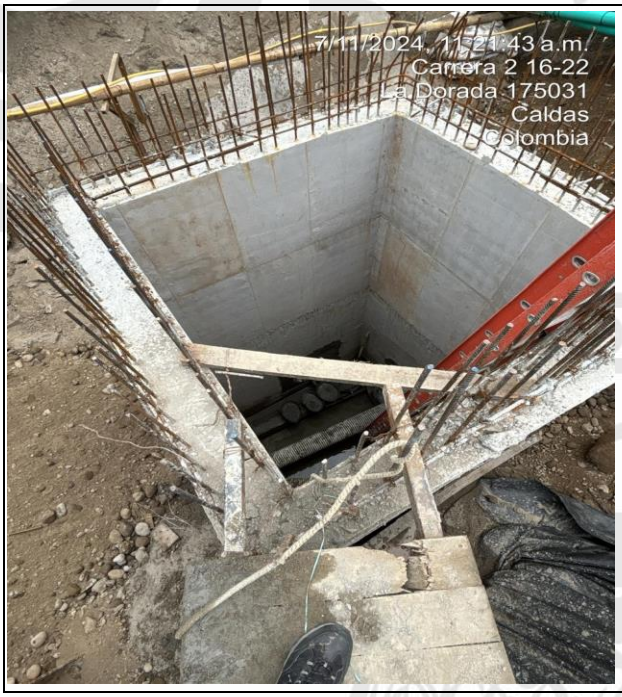





En este punto se está realizando lleno con material alrededor de la caja de inspección (aliviadero), al mismo tiempo dentro de la caja se está realizando una pantalla de rebose y una cañuela.

Durante el recorrido en 2 de los puntos de intervención se encuentra a un maestro por punto, los cuales están encargados de las obras que se están realizando. No se encuentra en ninguno de los puntos de intervención al ingeniero residente de la obra ni a la interventoría.

Juan Sebastian Millan Mariño
Ingeniero civil
Contratista Alcaldía de La Dorada, Caldas.

Alejandro Murcia Franco
Director Administrativo de Obras
Alcaldía de La Dorada, Caldas
