OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



FINALIZACION CAI LIBERTAD, EN TRAMITE DE SERVICIOS INSTALACION FINAL



VISTA LATERAL, FINALIZADA ZONA DURA, ACABADOS, CON TODO EL EQUIPAMENTE, PENDIENTE INSTALACION DE SERVICIOS PUBLICOS, AGUA, LUZ, COORDINACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CAMARAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



OTRA VISTA DEL ESTADO ACTUAL DEL CASI



VISTA FRONTAL, SE ESTAN HACIENDO LOS PROCESOS DE TRAMITES PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



OTRA VISTA, EL CUAL SE VERIFICA QUE ESTA DENTRO DEL ALCANCE PARA ESTE TIPO DE INSTALACIONES

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO

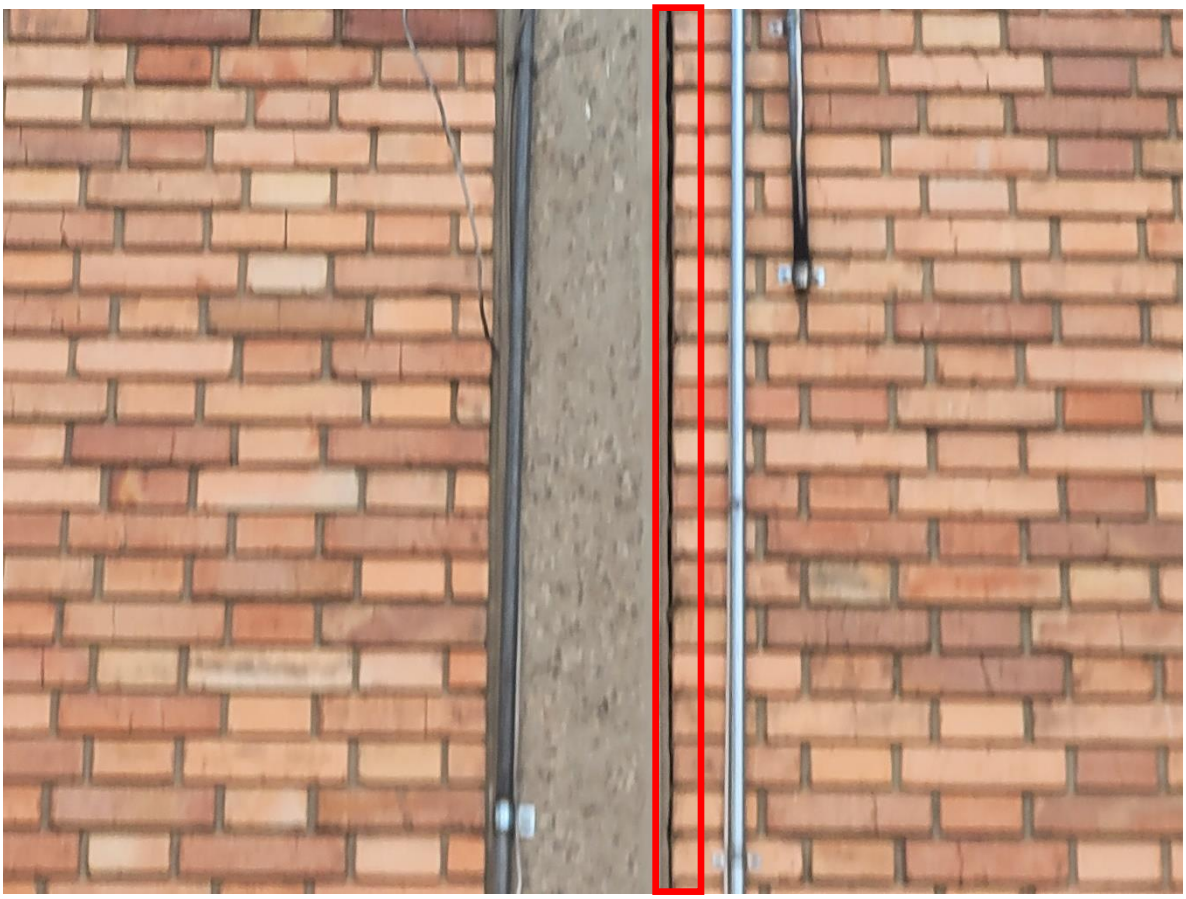

SE EVIDENCIA ESTADO DE DETERIORO AVANZADO, POR INCREMENTO DE FISURAS, DADOS LOS MOVIMIENTOS ACTUALES DEL TERRENO.

INCREMETO DE LA DILATACION

EL BLOQUE AFECTADO CORRESPONDE AL DONDE SE UBICA LA EMISORA, SEGUNDO PISO Y PRIMER PISO


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



LA ZONA DE ACCESO ESTA PROXIMA A QUEDAR FUERA DE SERVICIO, TODA VEZ QUE EL DETERIORO DEL PAVIMENTO SE INCREMENTO DADO LOS MOVIMIENTOS DEL TALUD, LA INEXISTENCIA DE UN MURO DE CONTENCION, EL CUAL SE HA RECOMENDADO, CON ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA OFICINA DEL IDIGER

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS

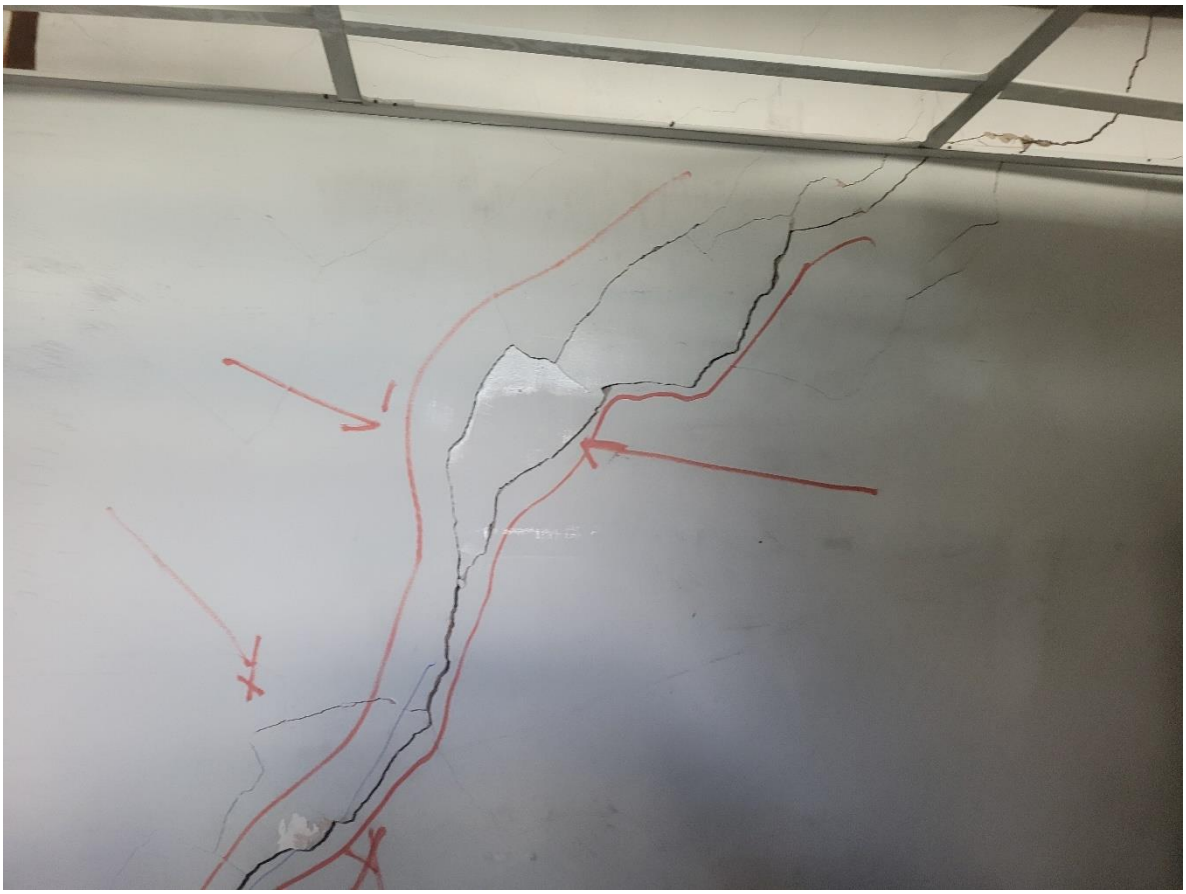

FISURAS Y GRIETAS DE LA ZONA DEL SEGUNDO PISO, ZONA DONDE SE UBICA LA EMISORA, LA CUAL DEBE GENERAR UN PLAN ALTERNATIVO, PARA UBICACIÓN, TODA VEZ QUE EL PROBLEMA DE PATOLOGIA EXISTENT, NO HA SIDO SUBSANADO, DE CONFORMIDAD A RECOMENDACIONES DE TIPO TECNICO, COMO RESULTADO DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ESTABILIDAD DE LADERAS O TALUDES.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA


ESTACION DE POLICIA CHAPINERO PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS



LAS EVIDENCIAS DEL MOVIMIENTO DEL TERRENO, AFLORAN EN LA MAMPOSTERIA, MUROS DIVISORIOS DEL SEGUNDO PISO, DADO EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS

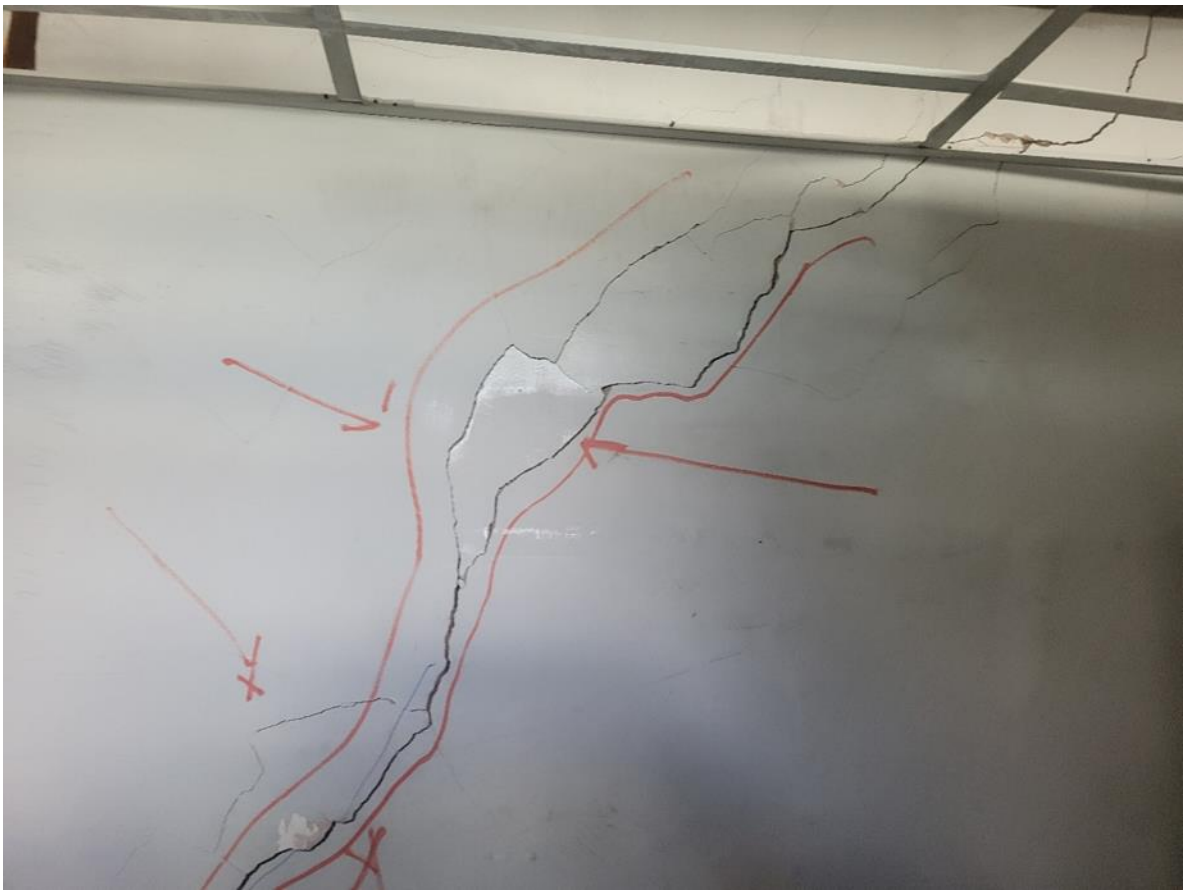

SE RESALTA EL ESTADO DE DETERIORO, GRIETAS, QUE PASAN EL ESPESOR DEL MURO, LO CUAL PUEDE GENERAR LA INESTABILIDAD DE ESOS MUROS, ELEMENTOS QUE SON PARTE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS



LOS DAÑOS, O LESIONES SE VERIFICAN EN LOS DESCUADRES, DE LOS MARCO DE PUERTAS, ESTO INDICA CLARAMENTE QUE SE HAN GENERADO MOVIMIENTOS, LOS CUALES AFECTAN EL CORRECTO USO Y PUEDEN PRESENTAR CONDICIONES DE ALTO RIESGO EN EL EVENTO DE UN SISMO

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA


ESTACION DE POLICIA CHAPINERO PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS



OTRA MUESTRA, DE LA SECCION DEL MURO, CON GRIETAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS

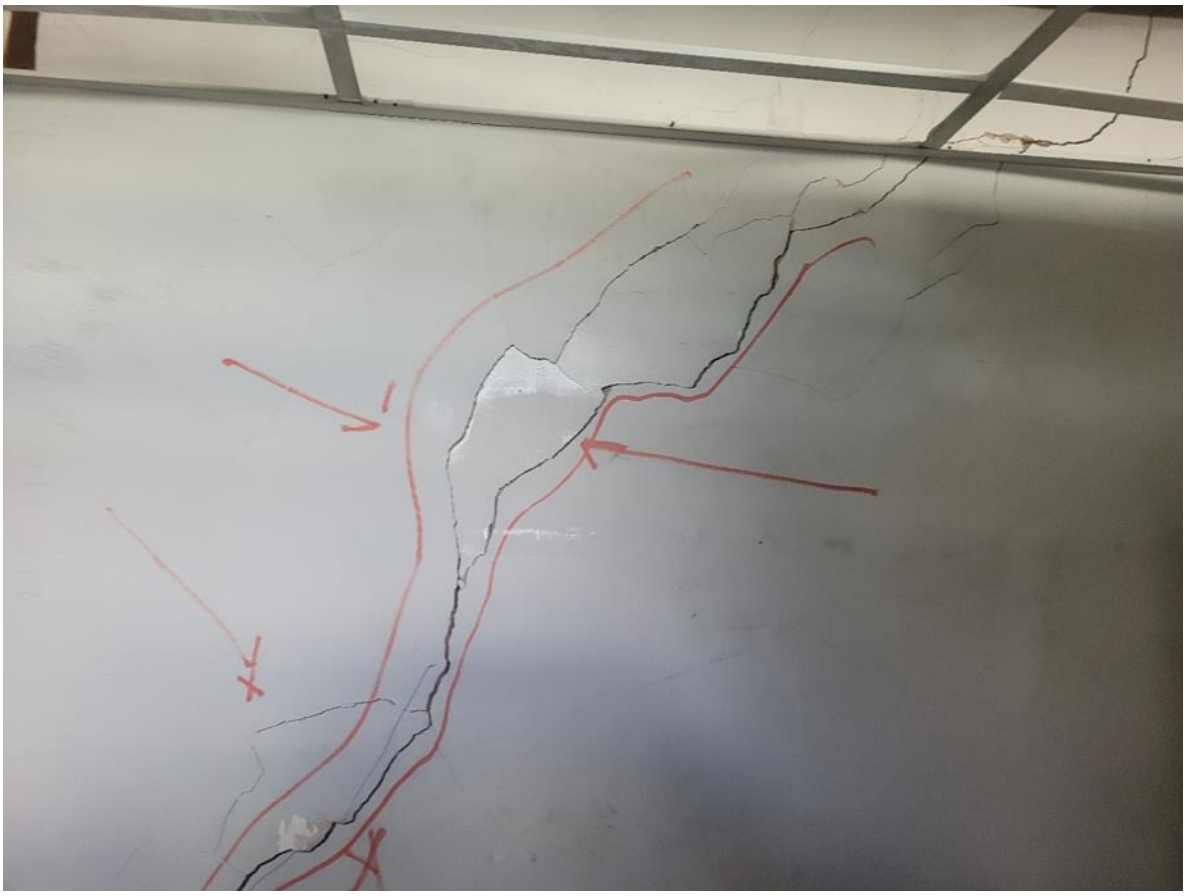

SE RESALA LA FORMA DIAGONAL DE LA FALLA Y EL INCREMENTO QUE HA DESARROLLADO, ESTO MUY POSIBLMENTE ASOCIADO AL PERIODO INVERNAL QUE SE ESTA DANDO, LO CUAL GENERA CONDICIONES DE INESTABILIDAD DEL TERRENO

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

ESTACION DE POLICIA CHAPINERO PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS

DETERIORO DEL PAVIMENTO



PERDIDA DE LAS CARPETA ASFALTICA, EN LA ZONA DE ACCESO, LO CVUAL DIFICULTA EL ACCEO SE LOS VEHICULOS. ESTO COMO CONSECUENCIA DEL ASENTAMIENTO DIFERENCIAL

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

ESTACION E-24



INTERVENCION EN FACHADA, LA CUAL NO HA TENIDO EL RENDIMIENTO PROGRAMADO, DADO QUE SE AFECTO POR EL PERIODO INVERNAL.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

ESTACION E-24



SE HACEN VERIFICACIONES DEL ESTADO DE AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADE EN DESARROLLO, QUE CORRESPONDEN A OBRAS DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE CIELORRASOS, PINTURA, CAMBIOS DE ENCHAPE, ACTIVIDADES DE TIPO ELECTRICOS, REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



OTRA VISTA DE LA FACHADA, EN E-24

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



SE PRESENTAN ALGUNAS OFICINAS TERMINADAS DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES PROPUSTAS, CON RECIBO A SATISFACCION

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



LA ZONA DEL ANTIGUO AUDITORIO, EN AVANCE, CON UNA MODIFICACION DE ACABADOS, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTOS PARA ESTE TIPO DE ESPACIOS.

SE INTERVIENES DE MANERA SECUENCIAL VARIOS ESPACION

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



OTRO FRENTE DE OBRA, EN PROCESO DE FINALIZAICON.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



AQCTIVIDADES DE PISOS, ENCHAPES, CIELLORASOS.

SE DISPUSO PROCEDER DE MANERA SIMULTANEA CON VARIAS ACTIVIDADES, EN CADA UNO DE LOS PISOS.

EL PERSONAL DE OBRA, CON CUARENTA (40) OBREROS.

NO OBSTANTE LA OBRA HA PRESENTADO RETRASOS.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA



ESTADO DEL ENCHAPE DISPUESTO COMO ACABADO FINAL, PARA E 24. ESTA ZONA CORRESPONDE A LA PARTE POSTERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL,

SE INFORMA QUE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL ESTA EN OBRA, POR LO CUAL ESTE RECURSO ES SUFICIENTE PARA CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA, QUE SE EJECUTAN, ESTO ES BAÑOS, OFICINAS, CORREDORES, FACHADAS.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

CASA AMBIENTAL



SE HICIERON ACABADOS EN UNA CASA PREFABRICADA, CON LOS COLORES INSTITUCIONALES



EN EL ALCANCE OBRAS DE SISTEMA ELECTRICO, REPOSICION DE LA CUBIERTA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
