INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Contrato de Interventoría INVIAS N° 2746 de 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9

INFORME MENSUAL
Periodo del 01 al 31 de enero del 2024

LA VIALIDAD
Ingenieros - Consultores

CONSORCIO ZONA NORTE

ALCIRA PAEZDURAN
INGENIERA CIVIL

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	01 de febrero del 2024	Elaboración de Informe



CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Firma	
	Nombre	Yessica Tatiana Sastoque Lugo
	Cargo	Ingeniera Auxiliar
REVISÓ Y APROBÓ	Firma	
	Nombre	William Leonel Casasbuenas Rodríguez
	Cargo	Ingeniero Residente
FECHA DE ENTREGA:		05 de febrero del 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA....7
1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO....7
1.2. OBJETIVO GENERAL....7
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS....8
1.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO....8
1.5. ASPECTOS TÉCNICOS....9
1.5.1. Visitas de rutina a las vías 5604,50CN01 y 5008B1....9
2. INFORMACIÓN TECNICA....9
2.1. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES....9
2.2. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE LAS COOPERATIVAS A CARGO:....9
2.3. ACCIDENTALIDAD....10
2.4. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA....10
2.5. ASPECTOS ECONÓMICOS:....14
2.6. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS....14
2.7. ASPECTOS AMBIENTALES....15
2.8. ASPECTOS DE GESTIÓN....16
2.9. INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL....16
2.9.1. Información general del contrato....16
3. ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.....16
4. ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)....18
5. COOPERATIVAS....23
5.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO RIONEGRO....23
5.2. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO LOS CHIGUANOS....23
6. INFORME SST....23

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Cuadros control indicadores mantenimiento rutinario
Anexo 2. Informes Semanales

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del contrato....7
Tabla 2. Vías a cargo de las Cooperativas para el mantenimiento rutinario....9
Tabla 3. Información General del contrato....16

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del Proyecto....8
Ilustración 2 Atropellamiento a Fauna serpiente N°1....11
Ilustración 3 Atropellamiento a fauna Didelphis N°2....11
Ilustración 4 Atropellamiento a fauna Ave – Búho N°3....12
Ilustración 5 Atropellamiento a fauna Ave - Búho N°4....12
Ilustración 6. Atropellamiento a fauna Didelphis N°5....13
Ilustración 7. Animal observado – Serpiente N°6....13

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N° 2746 de 2023, que tiene por objeto la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9**; el Consorcio Zona Norte entrega el presente informe mensual con la descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

En este documento se presenta el resumen ejecutivo de las actividades realizadas por las microempresas, las cuales llevan a cabo el mantenimiento rutinario de las vías Yacopí- La Palma con código 5604, desde el PR0+0000 al PR 19+0500 y del PR 21+0500 al PR 24+0500, Puerto Salgar- Utica- Tobia Grande, desde el tramo El Curapo- Cruce Quebrada Negra desde el PR 0+0000 al PR 2+0000 y Tobiagrande-Utica, tramo cruce Quebrada Negra- salida Túnel de la Abuela desde el PR2+0600 al PR5+0100 con código 5008B1 y El Dindal- Caparrapí desde el PR0+0000 al PR 14+0000, de Caparrapí- La Aguada desde el PR 19+0000 al PR 35+0895 con código 50CN01, como también la inspección de los puentes que se encuentran en El Dindal PR 0+0014 y de Caparrapí- El Aguada sobre el río Pata de igual forma se específica las actividades que realizó la administración vial, donde se describen los mismas y se reporta el cumplimiento o incumplimiento por parte de las microempresas y contratistas con base en la entrega de los productos de acuerdo al contrato, los pliegos de condiciones y las responsabilidades frente al contratante Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Por consiguiente, se presenta actividades por parte de la administración vial, donde la principal es alertar oportunamente al INVIAS sobre sitios críticos que se presenten por diversas circunstancias, o en su defecto diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de las vías, encaminadas al paisajismo, preservación del medio ambiente y a la contaminación visual, de igual forma se debe mantener actualizado el sistema de referencia vial, y requerir al contratista de obra reponer postes de referencia (Señales SI-04) que hagan falta en la vía, junto con la actualización de los costos de insumos, salarios, tarifas generales de equipos y los que requieran, con la finalidad de emplearlos en la proyección de los Análisis de Precios Unitarios- APU de referencia del INVIAS, junto con la participación activa en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial- HERMES, por consiguiente el seguimiento y la respectiva inspección visual del estado de las vías y puentes para así evidenciar las necesidades que presentan cada una de estas, por lo tanto se lleva a cabo la supervisión a las obras de construcción que se desarrollan en ellas, también se llevan a cabo diversas capacitaciones mensuales con temas relacionados al mantenimiento rutinario, aspectos administrativos, de prevención y de economía solidaria, junto con el registro de accidentalidad y atropellamiento de fauna que se llegasen a presentar.

De igual forma se realiza el seguimiento y la interventoría a la ejecución de las labores que desarrollan las microempresas LOS CHIGUANOS y RIO NEGRO, las cuales son las encargas de llevar a cabo el mantenimiento rutinario de las vías 5604, 5008B1 y 50CN01.

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1. Generalidades del contrato

Generalidades	Interventoría
Razón Social	Consorcio Zona Norte
Nit	901.735.468-6
Número del contrato	INVIAS N° 2746 del 2023
Representante legal	Juan Manuel Alba Rojas
Número del Contacto	321-4521739
Valor Inicial del Contrato	$283.776.853,00
Dirección	Carrera 5 #5-08 La Palma Cundinamarca
Fecha de inicio	15 de agosto del 2023
Plazo Inicial Contrato	4 meses
Fecha de terminación	14 de diciembre del 2023
Prórroga N°1	Dieciocho (18) días
Fecha de terminación con Prórroga N°1	31 de diciembre de 2023
Valor adición N°1	$101.195.188,00
Valor total con adición	$384.972.041,00
Prórroga N°2	Un (1) mes
Fecha de terminación con Prórroga N°2	31 de enero de 2024
Prórroga N°3	Un (1) mes
Fecha de terminación con Prórroga N°3	29 de febrero de 2024

Fuente. Consorcio Zona Norte

1.2. OBJETIVO GENERAL

Entregar el informe del periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2024, de las actividades realizadas por la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Brindar información de la supervisión y cumplimiento de los indicadores de Administración de mantenimiento vial en una longitud de 58,16 km y los recursos asignados están destinados para invertir en el departamento de Cundinamarca.

- Especificar la programación de las actividades ejecutadas durante el mes.


- Detallar el registro de accidentalidad y de atropellamiento a fauna.

- Detalle de los informes semanales.

1.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se sitúa en diferentes zonas, debido a que la red vial principal pasa por municipios de Cundinamarca de los cuales se encuentra ubicados en la provincia del bajo Magdalena desde el Puente de Dindal, hasta Caparrapí de allí hasta La Aguada, después en la intersección desde el PR 18+0000 se dirige desde Yacopí finalizando en La Palma, cabe especificar que hay diversos tramos que no se encuentran dentro de lo administrado, por lo que también se encuentra Útica- Guaduero el tramo El Curapo, Cruce Quebrada Negra y Tobiagrande- Utica por la salida del túnel de la Abuela, más adelante se detalla específicamente los kilómetros y los puntos de referencia que se administran.

Ilustración 1. Localización del Proyecto

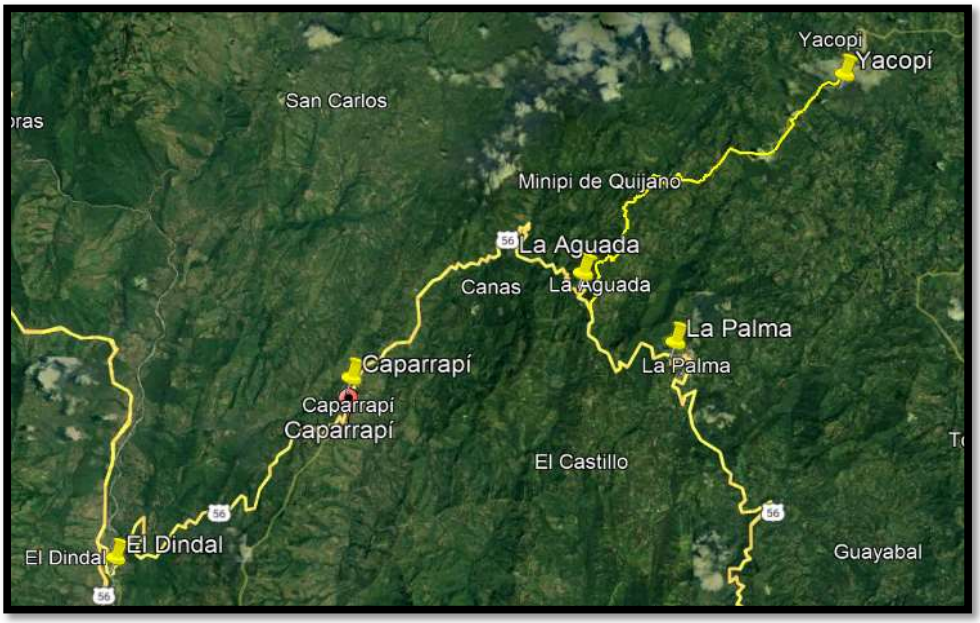

Fuente. Consorcio Zona Norte

1.5. ASPECTOS TÉCNICOS

Dentro de los aspectos técnicos se evidencia las actividades ejecutadas.

1.5.1. Visitas de rutina a las vías 5604,50CN01 y 5008B1

Se realizaron diversas visitas periódicas a las diferentes vías a cargo de la administración vial, con la finalidad de verificar el estado en el que se encuentran, por lo que también estar prestos y atentos para atender los eventos que afecten la movilidad y establecer las tareas de mantenimiento prioritario o ejecutar otras actividades para mantener en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad las vías a cargo, de las cuales son las siguientes:

Tabla 2. Vías a cargo de las Cooperativas para el mantenimiento rutinario

CÓDIGO	NOMBRE	SECTOR	COOPERATIVA
50CN01	Dindal- Caparrapí- La Aguada	Dindal- Caparrapí- La Aguada	Los Chiguanos
5008B1	El Curapo- Cruce Quebrada negra- Salida del Túnel de la Abuela	El Curapo- Cruce Quebrada negra	
		Cruce Quebrada negra- Salida del Túnel de la Abuela	
5604	Yacopí – La Palma	Yacopí – La Palma	Rio Negro

Fuente. Consorcio Zona Norte

2. INFORMACIÓN TECNICA

Se presentará la información técnica asociada a la programación de actividades de las cooperativas y de lo ejecutado por la administración vial, junto con la supervisión y cumplimiento de los indicadores, se especificará la accidentalidad, junto con diversos aspectos, tales como los económicos, ambientales, de gestión y la información asociada a cada una de las cooperativas.

2.1. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES

Se realiza la programación de las actividades de mantenimiento rutinario en las vías administradas; de igual manera la vigilancia se realiza de manera constante para que se encuentren cumpliendo con los EPP necesarios para ejecutar cada una de las actividades para las cooperativas RIO NEGRO Y LOS CHIGUANOS.

2.2. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE LAS COOPERATIVAS A CARGO:

Se verificó que las dos cooperativas cumplieran con los monitoreos a la vía y las actividades programadas para el periodo 01 al 31 de enero del 2024.

2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del cual estamos informando no se presentaron accidentes en las vías administradas.

2.4. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA

Durante este mes, se presentaron cinco (5) eventos de atropellamiento a fauna donde todos los animales fallecieron, se especifica que se evidencia un (1) animal observado, por lo que se procede a moverlos a un costado de la calzada estos se presentan en la vía código 50CN01, se especifica que tres (3) de estos se ubican en la vía que conduce de Dindal hacía Caparrapí, junto con el animal observado y los otros dos (2) se observan en la ruta que conduce de Caparrapí hacia La Aguada en el PR 12+0426 en la ruta que conduce de Dindal hacia Caparrapí.

Por lo que el primer evento se presenta el 02 de enero, en el PR 26+0449, el cual fue un reptil, específicamente una serpiente, el segundo evento se presenta el 10 de enero, en el PR 34+0179, el cual fue un mamífero, específicamente una Zarigüeya, el tercer y cuarto evento se presenta los días 16 y 22 de enero donde , en los PR 13+0765 y en el PR 13+0630, se evidencia el atropellamiento a un ave, específicamente un búho, el quinto evento se presenta el 27 de enero, en el PR 11+0930, el cual fue nuevamente otro mamífero, una zarigüeya, este mismo día se observa como una serpiente atraviesa la calzada sin ser atropellada, se asegura de que la misma pase sin ser lastimada; por último se especifica que estos eventos se cargan al aplicativo SUKUBUN.

Ilustración 2 Atropellamiento a Fauna serpiente N°1



Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 3 Atropellamiento a fauna Didelphis N°2



Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 4 Atropellamiento a fauna Ave – Búho N°3



Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 5 Atropellamiento a fauna Ave - Búho N°4




Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 6. Atropellamiento a fauna Didelphis N°5



Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 7. Animal observado – Serpiente N°6

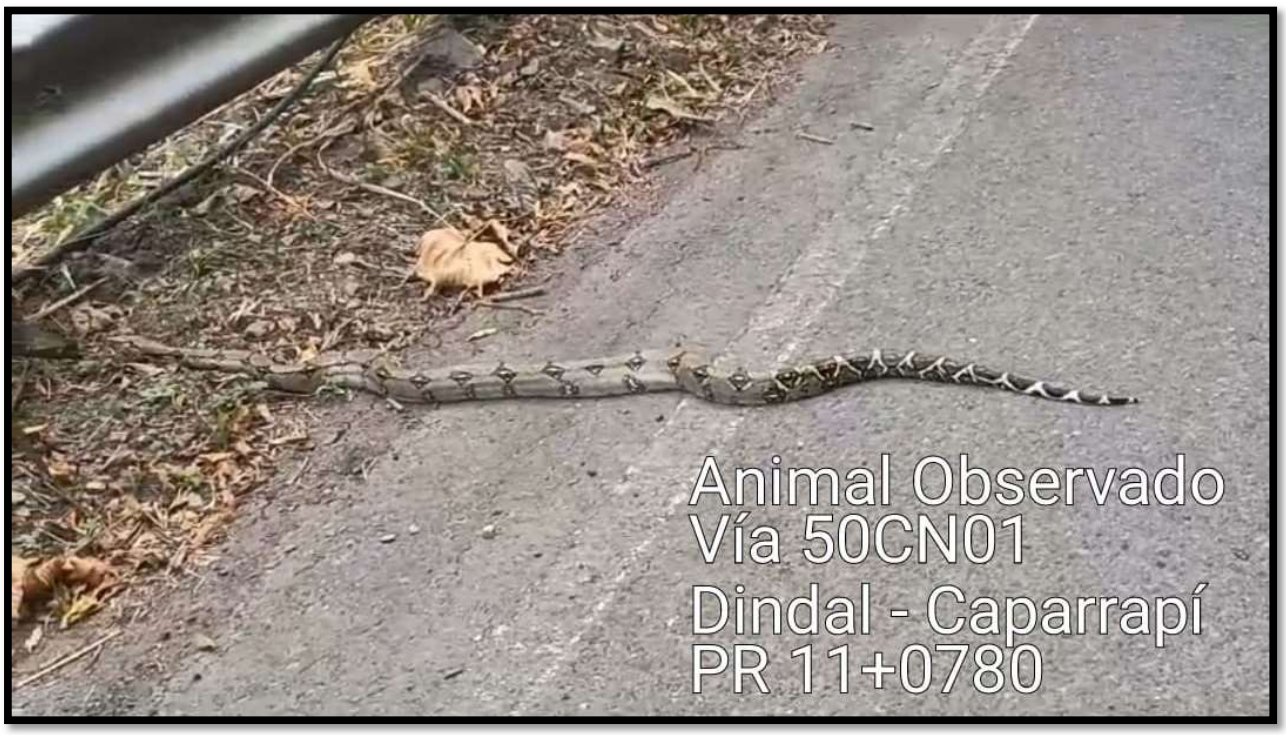

Fuente. Consorcio Zona Norte

2.5. ASPECTOS ECONÓMICOS:

Durante el periodo la administración ha contado con los recursos suficientes para que el funcionamiento de la administración sea continuo y así poder atender todos y cada uno de los compromisos que implica el contrato.

2.6. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

- ✓ CONSORCIO ZONA NORTE está al día en el pago de aportes PARAFISCALES Y obligatorios.
- ✓ Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscal de las dos (2) cooperativas de trabajo asociado.
- ✓ Se confeccionan los seguimientos semanales en el periodo del presente informe del contrato de la administración.
- ✓ Se elabora el informe mensual del periodo diciembre de 2023.
- ✓ Se elaboraron los reportes diarios del estado de las vías.
- ✓ Se solicita el informe de accidentalidad correspondiente al periodo de diciembre de 2023 a la policía de tránsito.
- ✓ Se envía informes de interventoría del mes de diciembre a los contratos 3022 y 3287 de 2023.
- ✓ Se envía informe trimestral sobre el registro de datos en el aplicativo SUKUBUN, en el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2023, donde se reportan siete (7) eventos de atropellamiento a fauna ocurridos en la vía 50CN01 de Dindal – Caparrapí – La Aguada.
- ✓ Se realiza visita de campo y se envía respuesta al PQRS No.2023E-VUVR-042593, sobre el derecho de petición para intervención urgente por parte de Alexis Devia Leal perteneciente a la comunidad afecta, por el deslizamiento ocasionado el día 28 de

diciembre de 2023, en la vía código 42613 Yacopí, La Torax – Guayabales de Yacopí, correspondiente a 18 kms, a 4.6 kms del camino Bilbao Theran Llano Mateo, debido a que la vía se encuentra afectada y no se tiene ingreso a los alimentos, agua potable ni medicamentos.

- ✓ Se realiza visita de campo y se envía respuesta al Memorando No.2024I-VBOG-002340, postulando a las vías a cargo sobre el plan piloto acerca de los sistemas de contención vehicular.

- ✓ Se envían los documentos de la primera suspensión el día 27 de enero de 2024 a los contratos de las cooperativas de trabajo asociado bajo el contrato 3022 de 2023 de Los Chiguanos y el 3287 de 2023 de Rio Negro por un (1) y dos (2) días hasta el 29 de febrero de 2024, con fecha de reanudación el 01 de marzo de 2024.

- ✓ Se envían los documentos para la prórroga N°3, del contrato 2746 de 2023 correspondientes a la administración vial, hasta el día 29 de febrero de 2024.

- ✓ Se envía informe de accidentalidad del mes de noviembre con el registro fotográfico y los respectivos formatos.

- ✓ Se envía informe SST correspondiente al mes de diciembre.

- ✓ Se envía informe de capacitación correspondiente al mes de diciembre sobre otros dispositivos para la regulación del tránsito a las cooperativas de trabajo asociado.

2.7. ASPECTOS AMBIENTALES

- ✓ Se vigila que las Cooperativas de trabajo asociado en sus labores cotidianas tengan presente la normatividad que rige en la parte ambiental, así como también en los diferentes presupuestos que se realizan se tiene presente que se deben cumplir las normas y parámetros ambientales en la ejecución de proyectos y obras civiles en las vías 5008B1, 5604 y 50CN01.

- ✓ Se monitorea constantemente el cauce del rio Pata en el sitio de la pérdida de banca PR24+0400 del tramo 50CN01 con el objeto de establecer si hay caída de material a él y si representa algún peligro de represamiento.

2.8. ASPECTOS DE GESTIÓN

✓ Se realizan diversos oficios en los cuales se solicitan recursos para atender varias necesidades de las vías.

2.9. INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL

2.9.1. Información general del contrato

Tabla 3. Información General del contrato

CONTRATISTA:	CONSORCIO ZONA NORTE
OBJETO:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de INVIAS, de las direcciones territoriales Huila, Meta y Cundinamarca - lote 9
PROFESIONALES	
INGENIERO RESIDENTE	WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
NUMERO M.P.	25202177615 CND
INGENIERO AUXILIAR	YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO
NUMERO M.P.	091037-0645948 CND
PERSONAL AUXILIAR	
INSPECTOR SST	WENDY JULIETH ROMERO HERNANDEZ
INSPECTOR VIAL	MIGUEL ANGEL VERA GUIROGA
CONDUCTOR	JOSE ROBERTO SAAVEDRA
OFICINA:	La Palma, Cundinamarca
TELEFONO:	(031) 4776033
CELULARES:	3214521739 – 3214055679
EMAIL	u236vialcmarca@gmail.com
VEHICULOS	Camioneta Toyota modelo 2023 – Placa: GXV815

Fuente. Consorcio Zona Norte

3. ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.

✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las Cooperativas de Trabajo Asociado encargadas del Mantenimiento rutinario de las carreteras a cargo.

- ✓ Durante la ejecución del periodo, la administración vial estuvo atenta en la colaboración necesaria para efectuar el pago de aportes y demás actividades relacionadas con su trabajo de las dos (2) microempresas.

- ✓ La Administración Vial dispuso en coordinación con las Cooperativas de trabajo asociado, del personal disponible para eventuales percances presentados en cada sector, como caída de árboles, pequeños derrumbes, caída de rocas, control de tráfico etc.

- ✓ Se envía el informe Diario de Estado de las vías a cargo de esta Administración y de las novedades presentadas en las rutas, vía correo electrónico y los informes semanales presentados a la Territorial.

- ✓ Se supervisa a las cooperativas de trabajo asociado las actividades especiales programadas.

- ✓ Se responden los diferentes requerimientos de la DTCUN.

- ✓ Se realiza el control y seguimiento a las cooperativas de RIO NEGRO y LOS CHIGUANOS del correcto uso de los elementos de protección personal.

- ✓ Se monitorea el cauce del rio negro por precipitaciones debido a las fuertes lluvias

- ✓ Se envía el informe de capacitación dado a las cooperativas, correspondiente al mes de diciembre de 2023.

- ✓ Brindar capacitación a las cooperativas de trabajo asociado en el tema de señalización de calles y carreteras afectadas por eventos especiales, información extraída del manual de señalización vial del año 2015.

4. ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CUADRO No 3

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

INGENIERO RESIDENTE: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ

PERIODO EVALUADO: DICIEMBRE 2023

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
50CN01	0+000 00	2+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	2+000 00	4+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	4+000 00	5+0185	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,19	P	R
50CN01	5+01 85	5+0255	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,07	P-9	B
50CN01	5+02 55	6+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,75	P	R
50CN01	6+000 00	8+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	8+000 00	10+000 0	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	10+0 000	12+000 0	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	12+0 000	13+000 0	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,00	P	R
50CN01	13+0 000	14+000 0	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,00	P	R

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	
	REGULAR	13,93
	MALO	
TOTAL		**13,93**

ADOQUIN	BUENO	0,07
	REGULAR	
	MALO	
TOTAL		**0,070**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
50CN01	19+000	19+0068	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,068	R	R
50CN01	19+068	19+0368	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,300	A	B
50CN01	19+368	21+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,822	A	B
50CN01	21+000	23+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,994	A	B
50CN01	23+000	24+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,998	A	B
50CN01	24+000	24+0400	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,400	A	B
50CN01	24+400	24+0600	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,200	A	B
50CN01	24+600	25+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,392	A	B
50CN01	25+000	27+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,979	A	B
50CN01	27+000	29+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,010	A	R
50CN01	29+000	31+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,083	A	R
50CN01	31+000	33+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,007	A	M
50CN01	33+000	35+0716	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,728	A	M
50CN01	35+716	35+0895	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,179	A	R

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	8,085
	REGULAR	4,272
	MALO	4,735
TOTAL		**17,092**

RESUMEN RIGIDO	BUENO	
	REGULAR	0,068
	MALO	
TOTAL		**0,068**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
5604	0+0000	0+0460	Yacopí - La Palma	0,46	P	B

5604	0+0460	1+0000	Yacopí - La Palma	0,655	P	B
5604	1+0000	1+0034	Yacopí - La Palma	0,041	P-9	M
5604	1+0034	1+0122	Yacopí - La Palma	0,087	P	B
5604	1+0122	4+0122	Yacopí - La Palma	3	P	R
5604	4+0122	4+0157	Yacopí - La Palma	0,035	P-9	B
5604	4+0157	4+0305	Yacopí - La Palma	0,148	P	B
5604	4+0305	4+0328	Yacopí - La Palma	0,023	P-9	R
5604	4+0328	5+0672	Yacopí - La Palma	1,354	P	B
5604	5+0672	6+0018	Yacopí - La Palma	0,346	P-9	R
5604	6+0018	6+0367	Yacopí - La Palma	0,349	P	R
5604	6+0367	6+0872	Yacopí - La Palma	0,505	A	M
5604	6+0872	7+0000	Yacopí - La Palma	0,125	P	R
5604	7+0000	8+0000	Yacopí - La Palma	1,001	P	R
5604	8+0000	9+0690	Yacopí - La Palma	1,694	P	R
5604	9+0690	9+0727	Yacopí - La Palma	0,037	A	M
5604	9+0727	10+0828	Yacopí - La Palma	1,092	P	R
5604	10+0828	10+0895	Yacopí - La Palma	0,067	A	M
5604	10+0895	11+0078	Yacopí - La Palma	0,193	P	R
5604	11+0078	11+0125	Yacopí - La Palma	0,047	A	M
5604	11+0125	11+0572	Yacopí - La Palma	0,447	P	R
5604	11+0572	12+0000	Yacopí - La Palma	0,433	A	M
5604	12+0000	12+0100	Yacopí - La Palma	0,100	P	R
5604	12+0100	12+0445	Yacopí - La Palma	0,345	A	M
5604	12+0445	12+0842	Yacopí - La Palma	0,397	P	R
5604	12+0842	12+0943	Yacopí - La Palma	0,101	A	M
5604	12+0943	13+0069	Yacopí - La Palma	0,126	P	R

5604	13+0 069	13+023 7	Yacopí - La Palma	0,168	A	M
5604	13+0 237	13+043 8	Yacopí - La Palma	0,201	P	M
5604	13+0 438	13+070 4	Yacopí - La Palma	0,266	A	M
5604	13+0 704	17+000 0	Yacopí - La Palma	3,29	P	B
5604	17+0 000	17+062 1	Yacopí - La Palma	0,621	P	R
5604	17+0 621	18+040 0	Yacopí - La Palma	0,75	A	R
5604	18+0 400	18+090 0	Yacopí - La Palma	0,5	P	B
5604	18+0 900	19+001 4	Yacopí - La Palma	0,161	A	M
5604	19+0 014	19+038 0	Yacopi - La Palma	0,366	P	R
5604	19+0 380	19+039 1	Yacopi - La Palma	0,011	A	M
5604	19+0 391	19+050 0	Yacopi - La Palma	0,109	A	M
5604	21+0 500	23+055 6	Yacopi - La Palma	2,05	P	B
5604	23+0 556	24+000 0	Yacopi - La Palma	0,454	P	B
5604	24+0 000	24+050 0	Yacopi - La Palma	0,345	P	B
				22,5000		

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	
	REGULAR	
	MALO	3,00
TOTAL		**3,000**

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	9,343
	REGULAR	9,511
	MALO	0,201
TOTAL		**19,055**

ADOQUIN	BUENO	0,04
	REGULAR	0,37
	MALO	0,04
TOTAL		**0,445**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
5008B1	0+0000	1+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	A	M
5008B1	1+0000	2+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	A	M
5008B1	2+0600	3+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	0,40	NP-1	M
5008B1	3+0000	4+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	NP-1	M
5008B1	4+0000	5+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	NP-1	M
5008B1	5+0000	5+0100	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	0,10	NP-1	M

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	
	REGULAR	
	MALO	4,50
TOTAL		**4,500**

Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color.

CONVENCIONES	
B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

5. COOPERATIVAS

5.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO RIONEGRO

De acuerdo con el cuadro de control de indicadores que se anexa al presente informe se evidencia que se cumplió con la disponibilidad en atender emergencias y eventualidades para el periodo. Se realizan los recorridos a la vía acatando todas las medidas de prevención.

5.2. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO LOS CHIGUANOS

De acuerdo con el cuadro de control de indicadores que se anexa al presente informe que se cumplió con la disponibilidad en atender emergencias y eventualidades para el periodo. Se realizan los recorridos a la vía acatando todas las medidas de prevención.

6. INFORME SST

El informe SST se presenta por aparte, este describe lo desarrollado por el componente en salud y seguridad en el trabajo, en el cual se detalla la información socializada a las cooperativas de trabajo asociado, la cual fue enviada por LA VIALIDAD, acerca sobre el cuidado de la tos, sobre el manejo de las migrañas, junto con el riesgo locativo – caídas al mismo nivel y sobre la campaña del día Mundial contra el cáncer, de igual forma se verifica los EPP, procedimientos y que se estén realizando los protocolos de bioseguridad debido a la variante Jn 1, en cuanto al lavado de manos en la jornada de la mañana y tarde, se especifica la capacitación realizada el mes de enero acerca señalización de calles y carreteras afectadas por eventos especiales, donde también se especifica si se presentan incidentes y accidentes laborales junto con el ausentismo por enfermedad de origen común.

CUADROS CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca

INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

PROGRAMACION ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA: CHIGUANOS | **CONTRATO No.** 3022 DE 2023 | **PERIODO:** ENERO

CARRETERAS: 50CN01: Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895; 5008B TOBIAGRANDE - UTICA: TRAMO SALIDA TÚNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADANEGRA; 5008B UTICA - GUADUERO TRAMO CRUCE QUEBRADANEGRA - EL CURAPO.

INDICADOR	COD.	semana del 01-04			Semana del 05-11			Semana del 12-18			Semana del 19-25			semana del 26-31		
		PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta
		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final	
Parcheo carreteras pavimentadas	257															
Bacheo carreteras afirmadas	285															
Limpieza de bermas pavimentadas	340															
Limpieza de borde	380															
Limpieza manual de cuneta en tierra	425	22+0000	27+0000	50CN01	35+0895	27+0000	50CN01				22+0000	19+0000	50CN01			
Limpieza de cunetas revestida	425				14+0000	06+0650	50CN01	06+050	00+0000	50CN01						
Limpieza zanjas de coronación.	432															
Limpieza encoles y/o descoles	434															
Limpieza encoles y/o descoles	434				14+0000	06+0650	50CN01	06+050	00+0000	50CN01						
Limpieza de obras	497				14+0000	06+0650	50CN01	06+050	00+0000	50CN01						
Mantenimiento rutinario de puentes	515															
Mantenimiento rutinario de puentes	515															
Limpieza y pintura de barandas.	548															
Limpieza y pintura de barandas.	548															
Limpieza de la calzada.	630							14+0000	04+0000	50CN01	04+0000	00+0000	50CN01			
Rocería y desmonte manual	630							14+0000	04+0000	50CN01	04+0000	00+0000	50CN01			
Retiro Derrumbes	630				23+0405	23+0690	50CN01	03+0200	11+0167	50CN01	11+0402	11+0670	50CN01			
Jardinería	643															
Reposición mojones de referencia	673															
Limpieza de muros y gaviones																
Pintura de mojones	675															
limpieza se señales y mojones	678															
Limpieza de señales y mojones (adecuar señales en mal estado)	678															
Reposición partes dañadas defensa met.	685															
Limpieza de defensas metálicas	686															
Limpieza de defensas metálicas																
Instalación de defensas metálicas	682															
Vigilancia	694	DISPONIBILIDAD EN TODOS LOS SECTORES														
Señalización horizontal (Pintura resaltos, Limpieza Box																
Emergencias	695	DISPONIBILIDAD EN TODOS LOS SECTORES														
Arborización	642															
Inventario Poda, corte y/o retiro de árboles	639															
Acompañamiento Vía																
Control Trafico								14+0000	04+0000	50CN01	04+0000	00+0000	50CN01			
limpieza de muros (demarcacion)																
limpieza de muros (demarcacion)																
Limpieza de muros y cabezotes																
Reporte atropellamiento a fauna		26+0449		50CN01	34+0179		50CN01	13+0765		50CN01	13+0630		50CN01			
RECUPERACION BANCADA																
limpieza de gaviones																
Capacitación																

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTA SUJETO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN INDICADOR LIMPIEZA DE BERMAS MINIMO 30CM DE BORDO DE PAVIMENTO.

Vo.Bo. Ingeniero Residente
WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
CONSORCIO ZONA NORTE
Administracion vial Territorial Cundinamarca

Reviso. Ingeniera Auxiliar
YESSICA TATIANA SANTOQUE LUGO
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración vial Territorial Cundinamarca

JOSÉ TEODULFO SALDAÑA
Representante Legal
CTA LOS CHIGUANOS
Contratista

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial 02 de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca
INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO.

COOPERATIVA: **CHIGUANOS**
CARRETERA: **50CN01: DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA; PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0490**
5008B TOBIA GRANDE - UTICA; SECTOR SALIDA TUNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA NEGRA
5008B UTICA - GUADUERO; CRUCE QUEBRADA NEGRA - EL CURAPO

CONTRATO No.3022 de 2023
MES: ene-24

ACTIVIDAD	TRAMO:			50CN01 PR																																5008B PR					
	JORNAL	CANT EJEC.	UNIDAD	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	1	2	3	4	5	6
Parcheo carreteras pavimentadas			M3																																									
Bacheo carreteras afirmadas			M																																									
Limpieza de bermas pavimentadas			M																																									
Limpieza manual de cunetas.			M																																									
Limpieza zanjas de coronación.			M																																									
Limpieza manual de cunetas en tierra			M																																									
limpieza de defensas metalicas			M																																									
limpieza de muros y gaviones			M																																									
Limpieza de obras			UND																																									
Limpieza encoles y/o descoles			UND																																									
Mantenimiento rutinario de puentes			UND																																									
Limpieza de la calzada.			M																																									
Rocería y desmonte manual.			HA																																									
Sello de fisuras en el disipador			CAN																																									
limpieza de señales y mojones (adecuar señales en mal estado)			M																																									
Señalización de la via			CAN																																									
control de trafico			M																																									
Despeje de Derrumbes			CAN																																									
Emergencias			JOR																																									
TOTALES	0																																										

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES
PROGRAMADO:
EJECUTADO:

Ingeniero Residente	Ing. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ	CONSORCIO ZONA NORTE Administración Vial Territorial Cundinamarca
Ingeniera Auxiliar	YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO	CONSORCIO ZONA NORTE Administración Vial Territorial Cundinamarca
	JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ	CTA CHIGUANOS Representante Legal

CONSORCIO ZONA NORTE

Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca

INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

PROGRAMACION ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA: RIO NEGRO — **CONTRATO No.** 3287 de 2023 — **MES:** ene-24

CARRETERAS: 5604: YACOPI - LA PALMA, PR 00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500

INDICADOR	*COD.*	*semana del 01 al 04 de ENERO*			*semana del 05 al 11 de ENERO*			*semana del 12 al 18 de ENERO*			*semana del 19-25 de ENERO*			*semana del 26-31 de ENERO*		
		PR		*Ruta*	*PR*		*Ruta*	*PR*		*Ruta*	*PR*		*Ruta*	*PR*		*Ruta*
		Inicial	*Final*		*Inicial*	*Final*		*Inicial*	*Final*		*Inicial*	*Final*		*Inicial*	*Final*	
Parcheo carreteras pavimentadas	257															
Bacheo carreteras afirmadas	285	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604			
Limpieza de bermas pavimentadas	340															
Limpieza de borde/ bordillo	380	00+000	06+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	22+0500	5604			
Limpieza manual de cunetas.	425	00+000	08+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	22+0500	5604			
Limpieza manual de cunetas en tierra		00+000	08+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	22+0500	5604			
Limpieza zanjas de coronación.	432															
Limpieza encoles y/o descoles	434							08+0000	08+0630	5604						
Limpieza de obras	497							08+0000	08+0630	5604						
Mantenimiento rutinario de puentes	515															
Limpieza y pintura de barandas.	548															
Despeje de derrumbes	625															
Limpieza de la calzada.	630	00+000	06+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	22+0500	5604			
Rocería y desmonte manual.	636	00+000	06+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	22+0500	5604			
Jardinería	643															
Reposición mojones de referencia	673															
Pintura de mojones	675															
Limpieza y pintura de linea amarrilla																
limpieza y pintura de muros y cabezotes de alcantarilla																
limpieza y pintura de lineas blancas																
Limpieza de señales y mojones.	678							08+0000	11+0000	5604	13+0000	19+0500	5604			
Reposición partes dañadas defensa met.	685															
Limpieza de defensas metálicas	686															
Instalación de defensas metálicas	682															
Vigilancia	694	EN TODOS LOS SECTORES														
Señalización horizontal (Pintura resaltos,																
Limpieza Box																
Emergencias	695	EN TODOS LOS SECTORES														
Arborización	642															
Inventario Poda, corte y/o retiro de árboles	639															
Limpieza de muros y gaviones																
Capacitación																

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTA SUJETO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN INDICADOR LIMPIEZA DE BERMAS MINIMO 30CM DE BORDO DE PAVIMENTO.

Vo.Bo. Ingeniero Residente CONSORCIO ZONA NORTE Administración Vial Territorial Cundinamarca	Ingenieria Auxiliar CONSORCIO ZONA NORTE Administración Vial Territorial Cundinamarca	JAIRO MAURICIO LOPEZ Representante Legal CTA RIO NEGRO

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial 02 de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca
INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO.

COOPERATIVA: **RIO NEGRO** — **CONTRATO No. 3287 de 2023**
CARRETERA: **5604: YACOPI - LA PALMA, PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500** — MES: **enero de 2024**

ACTIVIDAD	TRAMO:			5604 PR																							
	JORNAL	CANT EJEC.	UNIDAD	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Parcheo carreteras pavimentadas			M3																								
Bacheo carreteras afirmadas			M3																								
Limpieza de borde / bordillo			M																								
Limpieza de bermas pavimentadas			M																								
Limpieza manual de cunetas.			M																								
Limpieza de calzada.			M																								
Limpieza zanjas de coronación.			M																								
Limpieza encoles y/o descoles			M																								
Limpieza de obras			M																								
Demaración vial			UND																								
Arreglo de Muro			CAN																								
Rocería y desmonte manual.			Ha																								
Sello de fisuras en el disipador			CAN																								
Emergencias			CAN																								
Limpieza de Señalización			CAN																								
Limpieza de defensas metalicas			m																								
retiro de árboles			M3																								
retiro de derrumbes			M3																								
Emergencias			JOR																								
TOTALES																											

OBSERVACIONES: DISPONIBILIDAD PARA ATENDER CUALQUIER EVENTUALIDAD O EMERGENCIA EN LA VÍA

CONVENCIONES
PROGRAMADO:
EJECUTADO:

Interventor — **Ing. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS R**
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

Ingeniera — **Ing. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO**
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

JAIRO MAURICIO LOPEZ
CTA RIO NEGRO
Representante Legal

INFORMES SEMANALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 021	CÓDIGO	MSE-FR-20		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	04	01	2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No.	2746 de 2023		

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.DICIEMBRE 29 DE 2023 - DIA VIERNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza y envia el acta de costos N°5 correspondiente a la administración vial, se realiza oficio dirigido al ing . Gustavo Cepeda para la entrega de los informes de accidentalidad correspondientes al mes de octubre y noviembre del 2023, por lo que se envia el soporte del pantallazo del envio de la solicitud del reporte de los accidentes ocurridos en estos meses a la inspección de policia de La Palma, por lo que los formatos del accidente ocurrido en el mes de diciembre en la via 5604 en el PR 23+0400, se estarán realizando en el mes de enero para posteriormente enviar los al INVIA, se lleva la capacitación del mes de diciembre, sobre otros dispositivos para la regulación del tránsito en la oficina de La Palma de la administración vial

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 34+0350 al PR 35+0350, realizan otro tramo de limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 22+0800 hasta el PR 22+0977

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas, de alcantarillas, rocería y desmonte manual desde el PR 23+0500 hasta el PR 24+0500, realizan señalización de derrumbe en el PR 18+0725 y retiro de árbol en el PR 18+0725

2.DICIEMBRE 30 DE 2023 - DIA SABADO:Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, por lo que se inicia con el informe trimestral, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2023

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

3.DICIEMBRE 31 DE 2023 - DIA DOMINGO: Se realiza el oficio U236-ADMCUN-043-24, correspondiente a la solcitud del reporte de accidentalidad ocurrido en el mes de diciembre, dirigido hacia la inspección de policia de La Palma Cundinamarca, por lo que este se envia a La Vialidad para su respectiva revisión, aprobación y firma, esto con el objetivo de enviar lo el dia 02 de enero a la inspección, de igual forma se continua con el informe trimestral de octubre a diciembre de 2023

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

4.ENERO 01 DE 2024 - DIA LUNES (Festivo): Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

5.ENERO 02 DE 2024 - DIA MARTES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se envia el oficio al correo de la inspección de policia sobre la solicitud del reporte de accidentalidad ocurridos en el mes de diciembre, se inicia con los informes correspondientes al mes de diciembre, por lo que se verifican y completan los informes semanales, se finaliza el informe trimestral, por lo que se procede a realizar los oficios para la entrega del mismo, tanto al ing. Gustavo Cepeda, como al ing. Fabio Mojica

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan dos tramos de limpieza de cunetas y bacheo, el primer tramo desde el PR 22+0930 hasta el PR 23+0140 y el segundo tramo desde el PR 27+0250 hasta el PR 26+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de muro en el PR 00+0100, realizan limpieza de cunetas, calzada, rocería y desmonte manual desde el PR 00+0000 hasta el PR 00+0100

6.ENERO 03 DE 2024- DIA MIERCOLES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza los informes de interventoria correspondiente al mes de diciembre, a los contratos N°3022 y N°3287 de 2023, junto con el informe de la capacitación realizada, adjuntado asi el registro fotográfico y la respectiva lista de asistencia.

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo en dos tramos, el primer tramo se realiza desde el PR 23+0140 hasta el PR 23+0440 y el segundo tramo desde el PR 27+0250 hasta el PR 24+0950

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO:Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de muro en el PR 00+0300, realizan limpieza de cunetas, calzada, rocería y desmonte manual desde el PR 00+0100 hasta el PR 00+0000

7.ENERO 04 DE 2024 - DIA JUEVES:Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, por lo que se verifica que los microempresarios cumplan con los EPP necesarios para cada una de las actividades que se encuentran realizando, de igual forma se continua con los informes de diciembre, donde se ejecuta el informe mensual, el cual contine toda la información recopilada, junto con la programación y estado visual de la red vial, por lo que también se realiza el informe SST

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial,presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia +en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo en dos tramos, el primer tramo se realiza desde el PR 23+0440 hasta el PR 24+0000 y el segundo tramo desde el PR 24+0950 hasta el PR 24+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de muro en el PR 00+0400, realizan limpieza de cunetas, calzada, rocería y desmonte manual desde el PR 00+0600 hasta el PR 00+0800

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 11 (DIA) 1 (MES) 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en BOGOTÁ ,

_____ (Día en letras) días del mes de _____ (Mes en que se firma el acta) de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - DESPEJE DE AGUA Y ARREGLO DE CALZADA - PR 20+0100



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA - PR 27+0500



VÍA 50CN01 - BACHEO - PR 24+0400

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 23+0985



VÍA 5604 - DESMONTE MANUAL - PR 23+0950



VÍA 5604 - LIMPIEZA DE MURO - PR 00+0100

ADMINISTRACIÓN VIAL



RECORRIDO A LAS VÍAS A CARGO



CAPACITACIÓN A MICROEMPRESARIOS



REPORTE ATROPELLAMIENTO A FAUNA, RÉPTIL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 022	CÓDIGO	MSE-FR-20		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	11	01	2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No.	2746 de 2023		

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.ENERO 05 DE 2024 - DIA VIERNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se revisan cada uno de los informes del mes de diciembre y se envian a La Vialidad, para su respectiva, revisión, aprobación y firma, de igual forma se revisan los preavisos de terminación de contrato enviados por gestión humana, de igual forma se diligencia los formatos para informe trimestral del aplicativo SUKUBUN, donde se reportan siete eventos de atropellamiento a fauna en la via 50CN01, durante el periodo de octubre a diciembre, por lo que se especifica que en la via 5604 no se presentaron eventos

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de obra colmatada en el PR 34+0457, realizan retiro de derrumbe desde el PR 23+0650 hasta el PR 23+0690 y desde el PR 23+0405 hasta el PR 23+0450, llevan a cabo dos tramos de bacheo, el primer tramo se realiza desde el PR 23+0650 hasta el PR 23+0690 y el segundo tramo desde el PR 23+0405 hasta el PR 23+0450

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan bacheo en los PR 10+0850, PR 10+0900, PR 11+0080, PR 06+0980, PR 12+0150 y en el PR 11+0800

2.ENERO 06 DE 2024 - DIA SABADO: Se realiza los oficios para enviar la entrega de los informes al ing. Gustavo Cepeda, por lo que se realizan los oficios U236-ADMCUN- desde el 044 hasta el 050, junto con los respectivos informes y sus anexos, correspondientes a los informes de capacitación, informe mensual, Salud y seguridad en el trabajo de la administración vial, los informes de interventoria a los contratos 3022 y 3287 de 2023, los informes trimestrales del SUKUBUN y de las vias a cargo del periodo de octubre a diciembre, donde se especifica que son enviados a La Vialidad para su respectiva revisión, aprobación y firma, se envian firmados los preavisos de terminación de contrato a La Vialidad

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

3.ENERO 07 DE 2024 - DIA DOMINGO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a la via 5008B1

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

4.ENERO 08 DE 2024 - DIA LUNES (Festivo): Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

5.ENERO 09 DE 2024 - DIA MARTES: Se realiza el envió de los informes, firmados y aprobados por La Vialidad, asi que se envian al INVIAS, para obtener el respectivo radicado de los mismos, de igual forma se realiza una visita de campo a la via código 42613 correspondiente a La Torax - Guayabales de Yacopi, la cual presenta 18 km y se encuentra a 4.6 Km del camino Bilbao Theran Llano Mateo, para dar respuesta a la PQRS No.2023E-VUVR-042593, debido a la petición del señor Alexis Devia Leal, debido a que el dia 28 de diciembre del 2023, se presento un deslizamiento acabando a su paso, con los árboles, postes de la luz, viviendas y demás, por lo que procedemos a recurrir al lugar de los hechos, evidenciando que la via fue afectada, pero que la alcaldia de Yacopi en cabeza de la alcaldesa Zuced Escobar, ya se encontraba arreglando la misma, debido a que esto ocasionaba que no se pudiese ingresar alimentos, agua potable o medicamentos a las familias afectadas, por tanto se especifica esto y se envia a la ing. Téllez para que realice la respectiva gestión

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 34+0450 hasta el PR 34+0550, realizan limpieza de obra colmatada en el PR 34+0450, realizan otro tramo de limpieza de cunetas, calzada y de obras desde el PR 14+0000 hasta el PR 10+0700

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cuentas, calzada, rocería y desmonte manual desde el PR 00+0800 hasta el PR 01+0600

6.ENERO 10 DE 2024- DIA MIERCOLES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se evidencia unas observaciones en el informe SST del mes de diciembre, por lo que se procede a realizar la respectivas modificaciones y a enviar lo nuevamente

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 34+0550 hasta el PR 32+0750, realizan limpieza de obras desde el PR 35+0895 hasta el PR 32+0750, realizan limpieza de cunetas, obras y calzada desde el PR 10+0750 hasta el PR 06+0650, realizan reporte de atropellamiento a fauna de zarigueya en el PR 34+0179

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO:Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas, calzada, rocería y desmonte manual desde el PR 01+0600 hasta el PR 02+0100, realizan despeje de señales verticales en el PR 01+0100

7.ENERO 11 DE 2024 - DIA JUEVES:Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, en cada recorrido se les explica a las cooperativas acerca del reporte de atropellamiento a fauna, debido a que el aplicativo SUKUBUN, se debe adjuntar dos fotografias, una donde se evidencie el animal de cerca y otro donde se alcance a visualizar el entorno o la calzada donde ocurrió el evento, se les explica que se debe reportar, animales los cuales sean atropellados y estos queden muertos, lesionados o en su defecto que se observen en las vias a cargo, junto con que se especifique la hora del suceso y sobre todo la gestión que se realizo con los mismos, es decir si estos son desplazados hacia el costado de la calzada, para que este no obstruya el paso vehicular

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial,presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia +en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 27+0200 hasta el PR 27+0400

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas, calzada, rocería y desmonte manual desde el PR 02+0100 hasta el PR 03+0050

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 18 (DIA) 1 (MES) 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ , _____ (Dia en letras) días del mes de _____ Mes en que se firma el acta de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 10+0950



VÍA 50CN01 -LIMPIEZA DE OBRAS - PR 11+0800



VÍA 50CN01 - RETIRO DE DERRUMBE - PR 23+0650

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604- DESMONTE MANUAL, PARA DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL - PR 01+0100



VÍA 5604 - LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 02+0850



VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL - PR 03+0250

ADMINISTRACIÓN VIAL



VISITA DE CAMPO VÍA 42613 LA TORAX - GUAYABALES DE YACOPÍ, DEBIDO A DESLIZAMIENTO OCURRIDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023



TRABAJO DE OFICINA



SOPORTE RESPUESTA A PQRS Y ENVIO DE INFORMES MES DE DICIEMBRE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SECRETARIA GENERAL TÉCNICA** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 023**	**CÓDIGO**	**MSE-FR-20**		
		VERSIÓN	**2**		
		PÁGINA	**1**	**DE**	**1**

UNIDAD EJECUTORA:	**DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA**	**FECHA**	**18**	**01**	**2024**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**CUNDINAMARCA**	**CONTRATO No.**	**2746 de 2023**		

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.ENERO 12 DE 2024 - DIA VIERNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se particia en la reunión solicitada por la dirección territorial, para dialogar sobre las necesidades de las vias a cargo, por lo se lleva a cabo acompañamiento al director territorial de Cundinamarca, al ing. Gustavo Cepeda, durante un recorrido de las vias, donde se detalla la necesidad de mejorar la salida del puente Dindal, debido a que ya se realizo su respectivo mantenimiento, pero en la entrada la superficie, la cual se encuentra en pavimento rigido se evidencia dos baches de gran magnitud

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de obra colmatada en el PR 29+0000, realizan limpieza de obras desde el PR 03+0860 hasta el PR 00+0000, realizan retiro de derrumbes en los PR 09+0400 hasta el PR 09+0410, en los PR 03+0200 hasta el PR 03+0220, desde el PR 11+0125 hasta el PR 11+0135, desde el PR 11+0162 hasta el PR 11+0167, desde el PR 09+0075 hasta el PR 09+0085 y desde el PR 09+0300 hasta el PR 09+0315

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 04+0000 hasta el PR 05+0500, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 03+0000 hasta el PR 05+0000

2.ENERO 13 DE 2024 - DIA SABADO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido en la via 5604 para evidenciar los derrumbes que presenta estáy los cuales no fueron atentidos bajo el contrato 2778 de 2023

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

3.ENERO 14 DE 2024 - DIA DOMINGO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a la via 50CN01 para evidenciar los derrumbes que se presentan en la misma y los cuales no fueron atentidos bajo el contrato 2778 de 2023

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

4.ENERO 15 DE 2024 - DIA LUNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se solicita a las cooperativas de trabajo asociado, evidencien aquellas necesidades presentes en las vias a cargo de cada una de las mismas, para asi realizar un inventario de esto para asi solicitar lo por medio de oficios al INVIAS, de igual forma se socializa el material de apoyo enviado por La Vialidad sobre el cuidado de la tos

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan capacitación sobre brigadistas, llevan a cabo la elección del brigadista de cada grupo, realizan reunión COOPASO, socializan los resultados de los examenes laborales que se realizan de forma anual y dialogan sobre regresar a los protocolos de bioseguridad

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas en dos tramos, el primero desde el PR 03+0900 hasta el PR 04+0000, el segundo tramo desde el PR 05+0500 hasta el PR 06+0500, realizan limpieza de calzada desde el PR 00+0800 hasta el PR 01+0600, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 05+0000 hasta el PR 06+0500

5.ENERO 16 DE 2024 - DIA MARTES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, por lo que se evidencia que por la remoción de derrumbes bajo el contrato 2778 de 2023, se habia removido un poste de referencia, el cual no habia sido instalado, por lo que se especifica a la cooperativa Los Chiguanos la instalación del mismo, lo más pronto posible, junto con la recolección de las defensas métalicas que se utilizarón para la contención del talud superior, mientras se ejecutaba el contrato mencionado anteriormente

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan control de tráfico, limpieza de calzada, rocería y desmonte manual desde el PR 14+0000 hasta el PR 11+0000, realizan atropellamiento a fauna sobre un ave, la que al parecer es un buho en el PR 13+0765

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 06+0500 hasta el PR 08+0000, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 06+0500 hasta el PR 08+0500

6.ENERO 17 DE 2024- DIA MIERCOLES: Se realiza recorrido a la via 50CN01, especificamente el tramo de Dindal a Caparrapi, debido a la roceria y desmonte que se estaba realizando, para asi evidenciar que posibles peligros o riesgos que se encontraban tanto para los actores viales, como para los microempresarios, se verifica la ubicación de los dispositivos de canalización y los elementos de protección personal

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de calzada, control de tráfico, rocería y desmonte manual desde el PR 11+0000 hasta el PR 07+0700, inician con el protocolo de bioseguridad en el lavado de manos en la mañana y tarde

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO:Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 08+0000, hasta el PR 10+0000, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 08+0500 hasta el PR 10+0700

7.ENERO 18 DE 2024 - DIA JUEVES:Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se corrobora que en ambas cooperativas se encuentren cumpliendo los protocolos de bioseguridad, en cuanto al lavado de manos en las jornadas de mañana y tarde, debido a la variante Jn 1, por tanto se observa el procedimiento que están realizando junto con los elementos y productos que utilizan

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial,presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia +en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de calzada, control de tráfico, rocería y desmonte manual desde el PR 07+0700 hasta el PR 04+0000, continuan con el protocolo de bioseguridad en el lavado de manos en la mañana y en la tarde

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas, de calzada desde el PR 10+0000 hasta el PR 12+0000, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 11+0000 hasta el PR 13+0000, realizan limpieza de señales verticales desde el PR 08+0000 hasta el PR 11+0000, realizan limpieza de alcantarillas desde el PR 08+0000 hasta el PR 08+0630

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	**RESPONSABLES**
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 25 (DIA) 1 (MES) 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ ,

_____ **dias del mes de** _____ **de** _____

(Día en letras) **Mes en que se firma el acta** **(Año de firma del acta)**

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - RETIRO DE DERRUMBE - PR 09+0400



VÍA 50CN01 - CONTROL DE TRÁFICO - PR 11+0400



VÍA 50CN01 - ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL- PR 05+0300

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CALZADA - PR 05+0430



VÍA 5604 - LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 08+0820



VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL - PR 10+0690

ADMINISTRACIÓN VIAL



PARTICIPACIÓN REUNIÓN INVIAS



OBSERVACIÓN BACHES FINALIZANDO EL PUENTE DINAL PR 00+0000



RECORRIDO VÍAS A CARGO JUNTO CON EL DIRECTOR TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SECRETARIA GENERAL TÉCNICA** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 024**	**CÓDIGO**	MSE-FR-20		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	**FECHA**	25	01	2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	**CONTRATO No.**	2746 de 2023		

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

-

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.ENERO 19 DE 2024 - DIA VIERNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a la via 5604, en las actividades de roceria y desmonte manual, junto con el procedimiento que implementan para realizar bacheo, por lo que se está verificando tantos los peligros y riesgos que se pueden evidenciar, tanto para los actores viales como para los microempresarios, se observa si la distancia es la adecuada para la ubicación de los dispositivos de canalización y se evidencia si están portando adecuadamente los elementos de protección personal

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de calzada, control de tráfico, rocería y desmonte manual desde el PR 04+0000 hasta el PR 00+0000, continuan con los protocolos de bioseguridad en cuanto al lavado de manos en las jornada de la mañana y tarde, debido a la variante Jn 1

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 13+0000 hasta el PR 14+0100, realizan limpieza de cunetas, de calzada desde el PR 12+0000 hasta el PR 14+0000, realizan bacheo en el PR 13+0700

2.ENERO 20 DE 2024 - DIA SABADO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza visita de campo a la via 5008B1

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

3.ENERO 21 DE 2024 - DIA DOMINGO: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a la via 50CN01

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo

4.ENERO 22 DE 2024 - DIA LUNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se observa el memorando No.2024I-VBOG-002340, relacionado a la postulación de las vias, para la implementación de sistema de contención vehicular piloto, por lo cual se analiza el estado de las vias a cargo para asi brindar respuesta al mismo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan retiro de derrumbe en el PR 11+0402 hasta el PR 11+0412, realizan limpieza de cunetas de obras y bacheo desde el PR 28+0700 hasta el PR 27+0867, realizan reporte de atropellamiento a fauna en el PR 13+0630, el cual es una ave, continuan con el protocolo de bioseguridad en cuanto al lavado de manos en la jornada de la mañana y la tarde

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas, de calzada, rocería y desmonte manual desde el PR 14+0000 hasta el PR 16+0000

5.ENERO 23 DE 2024 - DIA MARTES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, durante el recorrido a las vias administradas se va observando y realizando el listado para evidenciar si las vias a cargo cumplen con los requisitos establecidos para ser postuladas, debido a que los tramos propuestos deben ser mayores a 5 kms y que el tramo no sufra de derrumbes u otros fenómenos geológicos, de igual forma se observa la resolución No.00138 del 23 de enero, la cual indica la suspensión de los procesos de selección bajo la modalidad de licitación pública

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, continuan retirando el derrumbe ubicado desde el PR 11+0402 hasta el PR 11+0412, realizan retiro de derrumbe desde el PR 11+0650 hasta el PR 11+0660, realizan limpieza de cunetas de obras y bacheo desde el PR 27+0867 hasta el PR 19+0000, continuan con el protocolo de bioseguridad en cuanto al lavado de manos en la jornada de la mañana y tarde

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo,realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 16+0000 hasta el PR 18+0000, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 16+0000 hasta el PR 18+0500

6.ENERO 24 DE 2024- DIA MIERCOLES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se brinda respuesta al memorando mencionado anteriormente sobre el plan piloto acerca de los sistemas de contención vehicular, por lo que se postula la via 50CN01 tanto en Dindal hacia Caparrapi, debido que se evidencian defensas metálicas incompletas desde el PR 09+0000 hasta el PR 14+00000 y se deja la observación que el tramo de Caparrapi hacia la Aguada, es el fundamental debido a que carece de defensas metálicas y la mayoria de este se encuentra cerca a un abismo esto desde el PR 23+0000 hasta el PR 35+0000, también se postula la via 5604 de Yacopi hacia La Palma, está desde el tramo PR 12+0000 hasta el PR 17+0000

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 19+0000 hasta el PR 20+0000, realizan retiro de derrumbe desde el PR 11+0664 hasta el PR 11+0670, realizan otro tramo de limpieza de cunetas y de obras desde el PR 14+0000 hasta el PR 11+0250, continuan con el protocolo de bioseguridad en cuanto al lavado de manos en la jornada de la mañana y tarde

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO:Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 18+0000 hasta el PR 19+0000, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 18+0500 hasta el PR 19+0500

7.ENERO 25 DE 2024 - DIA JUEVES:Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, donde se procede a observar si las cooperativas de trabajo asociado, se encuentran cumpliendo tanto con los elementos de protección personal, como con los protocolos de bioseguridad debido a la variante Jn 1, de igual forma se dialoga con las cooperativas debido a pronuncian su preocupación debido a la suspensión en el proceso de contratación, por lo que se les explica la situación y se les especifica que tengan paciencia

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial,presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 33+0030 hasta el PR 33+0100, realizan otro tramo de limpieza de cunetas y de obras desde el PR 11+0250 hasta el PR 07+0000, continuan con el protocolo de bioseguridad en cuanto al lavado de manos en las jornadas de la mañana y tarde

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican el reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de señalización vertical desde el PR 13+0000 hasta el PR 19+0500, realizan limpieza de cunetas desde el PR 19+0000 hasta el PR 19+0500

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	**RESPONSABLES**
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 01 (DIA) 2 (MES) 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ ,

_____ (Día en letras) **días del mes de** _____ (Mes en que se firma el acta) **de** _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - RETIRO DE DERRUMBE MANUAL- PR 11+0402



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE OBRAS - PR 11+0250



VÍA 50CN01 - BACHEO - PR 33+0030

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 14+0100



VÍA 5604 - LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL - PR 15+026



VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL - PR 15+0000


ADMINISTRACIÓN VIAL



RECORRIDO A LAS VÍAS A CARGO



SOCIALIZACIÓN RESOLUCIÓN SOBRE SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN



TRABAJO DE OFICINA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 025	CÓDIGO	MSE-FR-20		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	01	02	2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No.	2746 de 2023		

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.ENERO 26 DE 2024 - DIA VIERNES: Se presenta el reporte diario del estado de las vias a cargo, se envia a La Vialidad el informe trimestral del periodo de octubre a diciembre de 2023, para su respectiva revisión, aprobación y firma, por lo que este es enviado el mismo dia, por tanto se radica al INVIAS enviando lo al ing Gustavo Cepeda, se revisa las solicitudes de las cooperativas para suspender los contratos, de igual forma se socializa el material de apoyo enviado por La Vialidad sobre el manejo de migrañas

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS; Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 34+0340 hasta el PR 34+0400, realizan otro tramo de limpieza de cunetas y de obras desde el PR 07+0000 hasta el PR 04+0500, continuan con el protocolo de bioseguridad en cuanto al lavado de manos en las jornadas de mañana y tarde

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía , indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas de calzada, rocería y desmonte manual desde el PR 21+0500 hasta el PR 22+0500

2.ENERO 27 DE 2024 - DIA SABADO: Se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, por lo que se evidencia atropellamiento a fauna en el PR 11+0930, el cual es un mamifero conocido como zarigueya, de igual forma se evidencia un animal observado en el PR 11+0780 el cual se trataba de un réptil, el cual es una serpiente, nos aseguramos de que está cruce la calzada de forma segura, se toma el respecitvo video y registro fotografico, de igual forma se realizan los documentos para la suspensión de los contratos de las cooperativas de trabajo asociado N° 3022 y 3287 del 2023, junto con los documentos de la prórroga N°3 del contrato 2746 de 2023 correspondiente a la administración vial, por lo que se especifica que se envian a La Vialidad para su respectiva revisión, con el objetivo de enviar los el dia lunes al INVIAS

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;CONTRATO SUSPENDIDO

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: CONTRATO SUSPENDIDO

3.ENERO 28 DE 2024 - DIA DOMINGO: Se realiza el oficio U236-ADMCUN-057-24 dirigido a la inspectora de la policia Municipal de La Palma Cundinamarca, relacionado con la solicitud del reporte de accidentalidad ocurrida en el mes de enero de 2024, por lo que este se realiza y se envia a La Vialidad, con el objetivo de enviar lo una vez finalice el mes, para asi tener el soporte para el reporte de accidentalidad y para el informe mensual

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;CONTRATO SUSPENDIDO

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: CONTRATO SUSPENDIDO

4.ENERO 29 DE 2024 - DIA LUNES: Se envian al INVIAS los documentos de suspensión de los contratos de las cooperativas de trabajo asociado, junto con los documentos de prórroga de la administración vial, de igual forma se envia al ing. Douglas Bustos el informe de accidentalidad correspondiente a la accidentalidad del evento ocurrido en la via 50CN01 en el PR 11+0899, donde se presentó el choque de una flota Santa Fe y un motociclista

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;CONTRATO SUSPENDIDO

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: CONTRATO SUSPENDIDO

5.ENERO 30 DE 2024 - DIA MARTES: Se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se inicia con los informes de accidentalidad del mes de diciembre, por lo que durante el recorrido, se toma el registro fotográfico del lugar del evento para especificar en el informe, por lo que para esto se realizan los formatos de modelo de accidentes-SEI La Palma, debido a que se presentó en el PR 23+0400 de la via 5604, se realiza el formato complemento de accidentalidad, el informe de accidentalidad en archivo excel, de igual forma se observa el video enviado por La Vialidad de Axa Colpatria,acerca del riesgo locativo de las caidas al mismo nivel

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;CONTRATO SUSPENDIDO

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: CONTRATO SUSPENDIDO

6.ENERO 31 DE 2024- DIA MIERCOLES: Se continua con el informe de accidentalidad, por lo que se realiza el informe técnico del mes de diciembre, la lista de chequeo definida por la OAJ y los respectivos oficios dirigidos al ing. Gustavo Cepeda y Douglas Bustos, de igual forma se realiza el registro al aplicativo SUKUBUN de los eventos ocurridos durante el mes de enero, por lo que se inicia con el informe mensual

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;CONTRATO SUSPENDIDO

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: CONTRATO SUSPENDIDO

7.FEBRERO 01 DE 2024 - DIA JUEVES: Se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza el respectivo envió del oficio sobre la solicitud del reporte de accidentalidad al correo de la inspección de la policia de La Palma, de igual forma se envia a La Vialidad, el informe de accidentalidad del mes de diciembre, correspondiente a los archivos realizado los dias anteriores, de igual forma se envia el listado de puentes provisionales actualizados, donde se especifica las condiciones de los puentes que se encuentran a cargo de la administración vial, por lo que en este se presenta que para el puente Dindal se le realizo el debido mantenimiento el año pasado, pero que aún se solicita un nuevo punete, debido a que este tiene mas de 60 años y para el puente provisional ubicado en Rio Pata, que aún continua a la espera de los estudios definitivos junto con la construcción de una nueva estructura, se socializa el tema enviado por La Vialidad, acerca de la campaña del dia Mundial contra el cancer

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;CONTRATO SUSPENDIDO

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: CONTRATO SUSPENDIDO

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 08 (DIA) 2 (MES) 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ ,

_____ (Día en letras) días del mes de _____ (Mes en que se firma el acta) de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 05+0975



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE OBRAS - PR 06+0843



VÍA 50CN01 - BACHEO - PR 34+0340

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 21+0500



VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL - PR 21+0500



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS- PR 21+0770

ADMINISTRACIÓN VIAL



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ATROPELLAMIENTO A FAUNA PR 11+0930, ZARIGUEYA



REPORTE ATROPELLAMIENTO A FAUNA, DE ANIMALES FALLECIDOS Y OBSERVADOS AL SUKUBUN



RECORRIDO DE LAS VÍAS A CARGO
