INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Contrato de Interventoría INVIAS N° 2746 de 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9

INFORME MENSUAL
Periodo del 01 al 30 de abril del 2024

LA VIALIDAD
Ingenieros - Consultores

CONSORCIO ZONA NORTE

ALCIRA PAEZDURAN
INGENIERA CIVIL

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	02 de mayo del 2024	Elaboración de Informe



CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Firma	
	Nombre	Yessica Tatiana Sastoque Lugo
	Cargo	Ingeniera Auxiliar
REVISÓ Y APROBÓ	Firma	
	Nombre	William Leonel Casasbuenas Rodríguez
	Cargo	Ingeniero Residente
FECHA DE ENTREGA:		04 de mayo del 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA....7
1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO....7
1.2. OBJETIVO GENERAL....8
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS....8
1.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO....8
1.5. ASPECTOS TÉCNICOS....9
1.5.1. Visitas de rutina a las vías 5604,50CN01 y 5008B1....9
2. INFORMACIÓN TECNICA....10
2.1. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES....10
2.2. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE LAS COOPERATIVAS A CARGO:....10
2.3. ACCIDENTALIDAD....10
2.4. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA....11
2.5. ASPECTOS ECONÓMICOS:....15
2.6. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS....15
2.7. ASPECTOS AMBIENTALES....18
2.8. ASPECTOS DE GESTIÓN....19
2.9. INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL....19
2.9.1. Información general del contrato....19
3. ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.....20
4. ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)....21
5. COOPERATIVAS....26
5.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO RIONEGRO....26
5.2. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO LOS CHIGUANOS....26
6. INFORME SST....26

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Cuadros control indicadores mantenimiento rutinario
Anexo 2. Informes Semanales

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del contrato....7
Tabla 2. Vías a cargo de las Cooperativas para el mantenimiento rutinario....9
Tabla 3. Información General del contrato....19

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del Proyecto....9
Ilustración 2 Atropellamiento a Fauna Oso Hormiguero vía 5604 12
Ilustración 3 Atropellamiento a Fauna Serpiente vía 50CN01 12
Ilustración 4 Atropellamiento a Fauna Serpiente vía 5008B1 12
Ilustración 5 Atropellamiento a Fauna Serpiente vía 5604 13
Ilustración 6 Atropellamiento a fauna Sapo 13
Ilustración 7 Avistamiento de cría de Coragyps Atratus 13
Ilustración 8 Registro atropellamiento en aplicativo SUKUBUN 14
Ilustración 9 Participación capacitación cambios SUKUBUN 14
Ilustración 10 SUKUBUN (Avistamiento y atropellamiento de fauna)....15
Ilustración 11 Sección N°1 Plegable....17
Ilustración 12 Sección N°2 Plegable....17

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N° 2746 de 2023, que tiene por objeto la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9**; el Consorcio Zona Norte entrega el presente informe mensual con la descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

En este documento se presenta el resumen ejecutivo de las actividades realizadas por las microempresas, las cuales llevan a cabo el mantenimiento rutinario de las vías Yacopí- La Palma con código 5604, desde el PR0+0000 al PR 19+0500 y del PR 21+0500 al PR 24+0500, Puerto Salgar- Utica- Tobia Grande, desde el tramo El Curapo- Cruce Quebrada Negra desde el PR 0+0000 al PR 2+0000 y Tobiagrande-Utica, tramo cruce Quebrada Negra- salida Túnel de la Abuela desde el PR2+0600 al PR5+0100 con código 5008B1 y El Dindal- Caparrapí desde el PR0+0000 al PR 14+0000, de Caparrapí- La Aguada desde el PR 19+0000 al PR 35+0895 con código 50CN01, como también la inspección de los puentes que se encuentran en El Dindal PR 0+0014 y de Caparrapí- El Aguada sobre el río Pata de igual forma se específica las actividades que realizó la administración vial, donde se describen los mismas y se reporta el cumplimiento o incumplimiento por parte de las microempresas y contratistas con base en la entrega de los productos de acuerdo al contrato, los pliegos de condiciones y las responsabilidades frente al contratante Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Por consiguiente, se presenta actividades por parte de la administración vial, donde la principal es alertar oportunamente al INVIAS sobre sitios críticos que se presenten por diversas circunstancias, o en su defecto diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de las vías, encaminadas al paisajismo, preservación del medio ambiente y a la contaminación visual, de igual forma se debe mantener actualizado el sistema de referencia vial, y requerir al contratista de obra reponer postes de referencia (Señales SI-04) que hagan falta en la vía, junto con la actualización de los costos de insumos, salarios, tarifas generales de equipos y los que requieran, con la finalidad de emplearlos en la proyección de los Análisis de Precios Unitarios- APU de referencia del INVIAS, junto con la participación activa en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial- HERMES, por consiguiente el seguimiento y la respectiva inspección visual del estado de las vías y puentes para así evidenciar las necesidades que presentan cada una de estas, por lo tanto se lleva a cabo la supervisión a las obras de construcción que se desarrollan en ellas, también se llevan a cabo diversas capacitaciones mensuales con temas relacionados al mantenimiento rutinario, aspectos administrativos, de prevención y de economía solidaria, junto con el registro de accidentalidad y atropellamiento de fauna que se llegasen a presentar.

De igual forma se realiza el seguimiento y la interventoría a la ejecución de las labores que desarrollan las microempresas LOS CHIGUANOS y RIO NEGRO, las cuales son las encargas de llevar a cabo el mantenimiento rutinario de las vías 5604, 5008B1 y 50CN01.

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1. Generalidades del contrato

Generalidades	Interventoría
Razón Social	Consorcio Zona Norte
Nit	901.735.468-6
Número del contrato	INVIAS N° 2746 del 2023
Representante legal	Juan Manuel Alba Rojas
Número del Contacto	321-4521739
Valor Inicial del Contrato	$283.776.853,00
Dirección	Carrera 5 #5-08 La Palma Cundinamarca
Fecha de inicio	15 de agosto del 2023
Plazo Inicial Contrato	4 meses
Fecha de terminación	14 de diciembre del 2023
Prórroga N°1	Dieciocho (18) días
Fecha de terminación con Prórroga N°1	31 de diciembre de 2023
Valor adición N°1	$101.195.188,00
Valor adición N°2	$45.604.491,00
Valor adición N°3	$70.944.213,00
Valor total con adiciones	$501.520.745,00
Prórroga N°2	Un (1) mes
Fecha de terminación con Prórroga N°2	31 de enero de 2024
Prórroga N°3	Un (1) mes
Fecha de terminación con Prórroga N°3	29 de febrero de 2024
Prórroga N°4	Un (1) mes
Fecha de terminación con Prórroga N°4	31 de marzo de 2024
Prórroga N°5	Diez (10) días
Fecha de terminación con Prórroga N°5	10 de abril de 2024

Generalidades	Interventoría
Prórroga N°6	Veintidós (22) días
Fecha de terminación con Prórroga N°6	02 de mayo de 2024
Prórroga N°7	Diecisiete (17) días
Fecha de terminación con Prórroga N°7	19 de mayo de 2024

Fuente. Consorcio Zona Norte

1.2. OBJETIVO GENERAL

Entregar el informe del periodo comprendido del 01 al 30 de abril del 2024, de las actividades realizadas por la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9.


1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Brindar información de la supervisión y cumplimiento de los indicadores de Administración de mantenimiento vial en una longitud de 58,16 km y los recursos asignados están destinados para invertir en el departamento de Cundinamarca.
- Especificar la programación de las actividades ejecutadas durante el mes.
- Detallar el registro de accidentalidad y de atropellamiento a fauna.
- Detalle de los informes semanales.

1.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se sitúa en diferentes zonas, debido a que la red vial principal pasa por municipios de Cundinamarca de los cuales se encuentra ubicados en la provincia del bajo Magdalena desde el Puente de Dindal, hasta Caparrapí de allí hasta La Aguada, después continua en la provincia Rio Negro en la intersección desde el PR 18+0000, el cual se dirige desde Yacopí finalizando en La Palma, cabe especificar que hay diversos tramos que no se encuentran dentro de lo administrado, por lo que también se encuentra Útica- Guaduero el tramo El Curapo, Cruce Quebrada Negra y Tobiagrande- Utica por la salida del túnel de la Abuela, más adelante se detalla específicamente los kilómetros y los puntos de referencia que se administran.

Ilustración 1. Localización del Proyecto

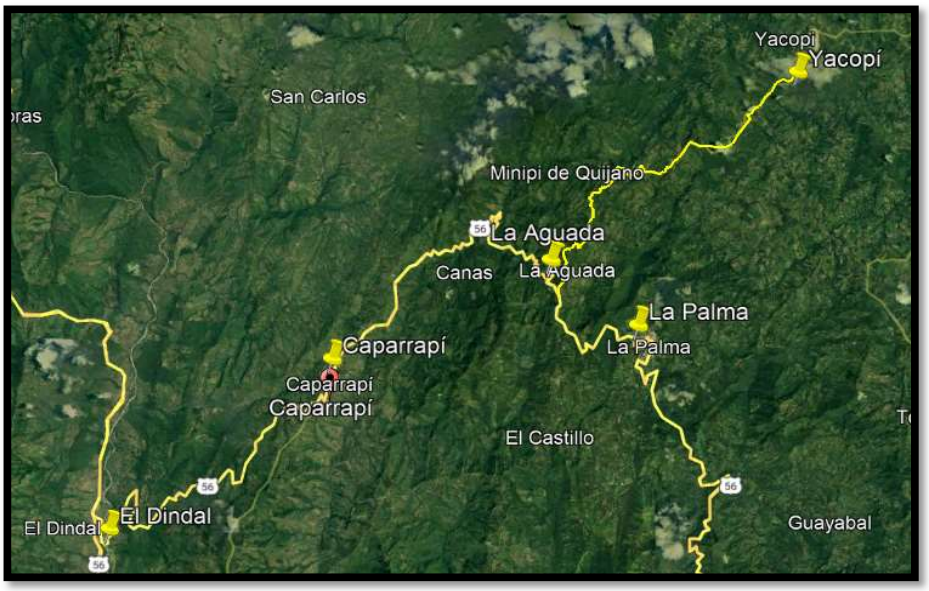

Fuente. Consorcio Zona Norte

1.5. ASPECTOS TÉCNICOS

Dentro de los aspectos técnicos se evidencia las actividades ejecutadas.

1.5.1. Visitas de rutina a las vías 5604,50CN01 y 5008B1

Se realizaron diversas visitas periódicas a las diferentes vías a cargo de la administración vial, con la finalidad de verificar el estado en el que se encuentran, por lo que también estar prestos y atentos para atender los eventos que afecten la movilidad y establecer las tareas de mantenimiento prioritario o ejecutar otras actividades para mantener en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad las vías a cargo, de las cuales son las siguientes:

Tabla 2. Vías a cargo de las Cooperativas para el mantenimiento rutinario

CÓDIGO	NOMBRE	SECTOR	COOPERATIVA
50CN01	Dindal- Caparrapí- La Aguada	Dindal- Caparrapí- La Aguada	Los Chiguanos
5008B1	El Curapo- Cruce Quebrada negra- Salida del Túnel de la Abuela	El Curapo- Cruce Quebrada negra	
		Cruce Quebrada negra- Salida del Túnel de la Abuela	
5604	Yacopí – La Palma	Yacopí – La Palma	Rio Negro

Fuente. Consorcio Zona Norte

2. INFORMACIÓN TECNICA

Se presentará la información técnica asociada a la programación de actividades de las cooperativas y de lo ejecutado por la administración vial, junto con la supervisión y cumplimiento de los indicadores, se especificará la accidentalidad, junto con diversos aspectos, tales como los económicos, ambientales, de gestión y la información asociada a cada una de las cooperativas.

2.1. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES

Se realiza la programación de las actividades de mantenimiento rutinario en las vías administradas; de igual manera la vigilancia se realiza de manera constante para que se encuentren cumpliendo con los EPP necesarios para ejecutar cada una de las actividades para las cooperativas RIO NEGRO Y LOS CHIGUANOS.


2.2. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DE LAS COOPERATIVAS A CARGO:

Se verificó que las dos cooperativas cumplieran con los monitoreos a la vía y las actividades programadas para el periodo 01 al 30 de abril del 2024.

2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del cual estamos informando no se presentaron accidentes en las vías administradas, por lo que se adjunta pantallazo de la respuesta de la inspección de policía de La Palma confirmado esto.

Ilustración 2. Pantallazo Respuesta accidentalidad Inspección de Policia

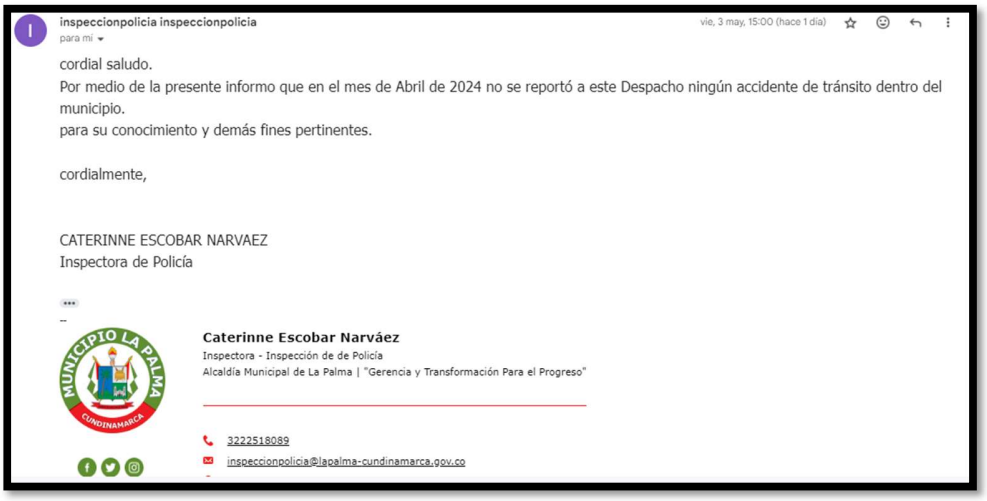

Fuente. Consorcio Zona Norte

2.4. ATROPELLAMIENTO DE FAUNA

Durante este mes, se presentaron cinco eventos de atropellamiento a fauna, donde se detalla que todos mueren por la colisión, por lo que se presenta un avistamiento, pero no se evidencian animales lesionados por tanto se especifica que los mismos se cargaron al aplicativo SUKUBUN, por lo que dentro de los mismos se describen los siguientes:

- Día Lunes 01 de abril: Se evidencia atropellamiento a mamífero, específicamente a un (Tamandua tetradactyla), oso melero u oso hormiguero, en la vía 5604, la cual conduce de Yacopí hacia La Palma en el PR 06+0950, aproximadamente a las 11:30 am.
- Día Lunes 15 de abril: Se evidencia atropellamiento a réptil, específicamente a una (Serpentes – Ophidia), serpiente, en la vía 50CN01, la cual conduce de Dindal hacia Caparrapí en el PR 07+0100, aproximadamente a las 7:15 am.
- Día Miércoles 17 de abril: Se evidencia atropellamiento a réptil, específicamente a una (Serpentes – Ophidia), serpiente, en la vía 5008B1, la cual conduce hacia El Curapo- Cruce Quebrada negra- Salida del Túnel de la Abuela, en la salida del túnel de la abuela aproximadamente a las 8:43 am.
- Día Jueves 18 de abril: Se evidencia atropellamiento a réptil, específicamente a una (Serpentes – Ophidia), serpiente, en la vía 5604, la cual conduce de Yacopí hacia La Palma en el PR 05+0640, aproximadamente a las 8:02 am.
- Día viernes 19 de abril: Se evidencia atropellamiento a anfibio, específicamente a un (Bufonidae), sapo, en la vía 50CN01, la cual conduce de Dindal hacia Caparrapí en el PR 07+0900, aproximadamente a las 7:30 am.
- Día lunes 22 de abril: Se presenta avistamiento de un Coragyps Atratus, donde se observa que es una cría de un buitre, el cual se encontraba solo, aproximadamente a las 7:30 am.

Ilustración 3 Atropellamiento a Fauna Oso Hormiguero vía 5604



Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 4 Atropellamiento a Fauna Serpiente vía 50CN01



Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 5 Atropellamiento a Fauna Serpiente vía 5008B1



Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 6 Atropellamiento a Fauna Serpiente vía 5604




Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 7 Atropellamiento a fauna Sapo



Fuente. Consorcio Zona Norte


Ilustración 8 Avistamiento de cría de Coragyps Atratus

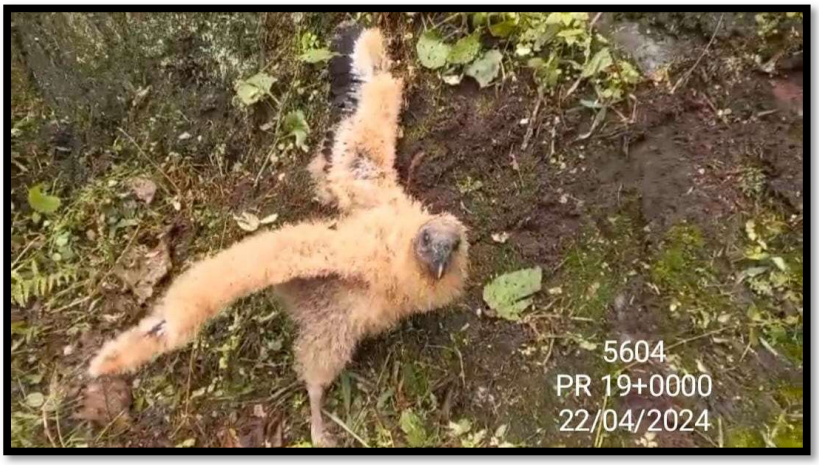

Fuente. Consorcio Zona Norte


Se especifica que se participa en la capacitación dirigida por la Subdirección de Sostenibilidad, sobre la explicación de los pasos a seguir para el ingreso al aplicativo SUKUBUN, debido a cambios en el mismo, donde se detalla que para evidenciar estos ajustes realizaron el cambio del color al logo junto con la adición en el nombre de avistamiento, por lo que a continuación se adjunta el pantallazo del registro de estos eventos en el aplicativo y de la asistencia en la capacitación, junto con el logotipo y el nombre actualizado.

Ilustración 9 Registro atropellamiento en aplicativo SUKUBUN

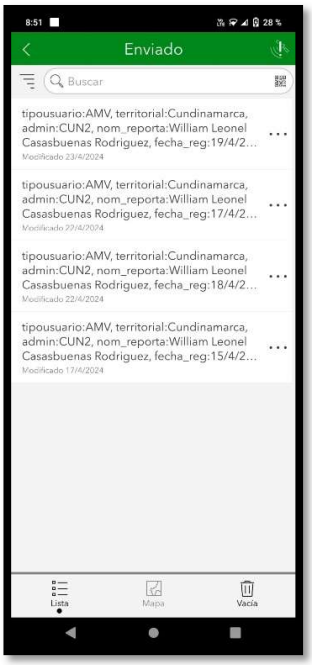

Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 10 Participación capacitación cambios SUKUBUN

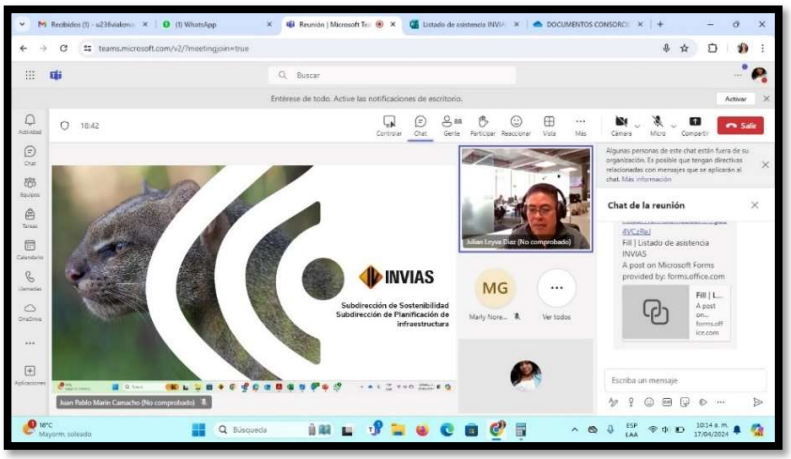

Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 11 SUKUBUN (Avistamiento y atropellamiento de fauna)



Fuente. inviasportaladmin

2.5. ASPECTOS ECONÓMICOS:

Durante el periodo la administración ha contado con los recursos suficientes para que el funcionamiento de la administración sea continuo y así poder atender todos y cada uno de los compromisos que implica el contrato.

2.6. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

- ✓ Se presenta el acta de costos No. 08 de la Administración vial, con sus correspondientes anexos de soporte y formatos como control de pagos seguridad social y hoja de ruta.

- ✓ Se elabora el acta de obra N.º 6 del contrato 3287 de 2023 de la Cooperativas de Trabajo Asociado RIO NEGRO que realizan el Mantenimiento Rutinario en las vías a cargo de esta administración, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo, con sus respectivos anexos.

- ✓ Se elabora el acta de obra N.º 6 del contrato 3022 de 2023 de la Cooperativa de Trabajo Asociado LOS CHIGUANOS que realizan el Mantenimiento Rutinario en las vías a cargo de esta administración, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo, con sus respectivos anexos.

- ✓ CONSORCIO ZONA NORTE está al día en el pago de aportes PARAFISCALES Y obligatorios.

- ✓ Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscal de las dos (2) cooperativas de trabajo asociado.

- ✓ Se confeccionan los seguimientos semanales en el periodo del presente informe del contrato de la administración.

- ✓ Se elabora el informe mensual del periodo marzo de 2024.

- ✓ Se elabora el informe de interventoría correspondiente al mes de marzo del contrato 3022 de 2023 correspondiente a la cooperativa de trabajo asociado Los Chiguanos.

- ✓ Se elabora el informe de interventoría correspondiente al mes de marzo del contrato 3287 de 2023 correspondiente a la cooperativa de trabajo asociado Rio Negro.

- ✓ Se elaboraron los reportes diarios del estado de las vías.

- ✓ Se solicita el informe de accidentalidad correspondiente al periodo de marzo de 2024 a la policía de tránsito.

- ✓ Se envían los documentos para la prórroga N°6 y adición N°3 del contrato 2746 de 2023 correspondientes a la administración vial, hasta el día 02 de mayo de 2024.

- ✓ Se envían los documentos para la prórroga N°7 del contrato 2746 de 2023 correspondientes a la administración vial, hasta el día 19 de mayo de 2024.

- ✓ Nos dirigimos a las alcaldías de Caparrapí, La Palma, Útica y Yacopí con el fin de radicar el impuesto del ICA del año 2023 y de inscribir al Consorcio en el mismo.

- ✓ Se realiza el formato de reporte de emergencias y sitios críticos, respondiendo al memorando No.2024I-VBOG-09058.

- ✓ Se envía informe SST correspondiente al mes de marzo.

- ✓ Se revisan, se realizan observaciones y se aprueban los informes SST de las cooperativas de trabajo asociado correspondiente al mes de marzo.

- ✓ Se realizan ajustes en el anteproyecto de las vías 5604 y 50CN01 y se envían al INVIAS.

- ✓ Se entregan los 500 plegables en las alcaldías y a cada uno de los actores viales que pasaban por la vía, se especifica que está actividad se ejecutó los últimos días de marzo y principios de abril, se especifica que se realiza informe de entrega del mismo, a continuación, se adjunta el diseño del plegable entregado.

Ilustración 12 Sección N°1 Plegable



Fuente. Consorcio Zona Norte

Ilustración 13 Sección N°2 Plegable



Fuente. Consorcio Zona Norte

- ✓ Se realiza la entrega del informe de accidentalidad del mes de marzo del año 2024.

- ✓ Se realiza capacitación e informe sobre LIVV “Lineamientos de Infraestructura Verde Vial” con énfasis en atropellamiento a fauna, donde se detalla el uso de las herramientas tales como lo es el SUKUBUN y HERMES a las cooperativas de trabajo asociado.

- ✓ Se participa en el foro de Gestión del riesgo, presentación de resultados a cargo de la Universidad de LA SALLE y la Universidad del Quindío, la cual fue apoyada por el INVIAS.

- ✓ Se participa en la capacitación a cargo de la Subdirección de Sostenibilidad, acerca de los cambios que se presentaron en el aplicativo SUKUBUN.

- ✓ Se envía informe trimestral SUKUBUN del periodo de enero a marzo, donde se envían 8 eventos reportados durante este periodo en la vía 50CN01.

- ✓ Se elabora oficio U236-ADMCUN-090-24 acerca de la solicitud de suministro de mezcla asfáltica para la vía 50CN01 la cual conduce de Dindal – Caparrapí desde el PR 00+0000 hasta el PR 14+0000.

- ✓ Se realiza inventario de patologías y baches que se presentan en la vía 50CN01, con el objetivo de conocer el volumen necesario para ejecutar el presupuesto del mismo.

- ✓ Se complementa archivo acerca de la información necesaria para la contratación de señalización, donde se solicita para la vía 5604 y 50CN01 demarcación horizontal, junto con defensas metálicas para la vía 50CN01.

- ✓ Se realiza oficio U236-ADMCUN-092-24 solicitando recursos para atender los diversos derrumbes que se han presentado en las vías 5604 y 50CN01, debido a las fuertes lluvias que se han evidenciado durante el mes de abril.

2.7. ASPECTOS AMBIENTALES

- ✓ Se vigila que las Cooperativas de trabajo asociado en sus labores cotidianas tengan presente la normatividad que rige en la parte ambiental, así como también en los diferentes presupuestos que se realizan se tiene presente que se deben cumplir las

normas y parámetros ambientales en la ejecución de proyectos y obras civiles en las vías 5008B1, 5604 y 50CN01.

✓ Se monitorea constantemente el cauce del rio Pata en el sitio de la pérdida de banca PR24+0400 del tramo 50CN01 con el objeto de establecer si hay caída de material a él y si representa algún peligro de represamiento.

2.8. ASPECTOS DE GESTIÓN

✓ Se realizan diversos oficios en los cuales se solicitan recursos para atender varias necesidades de las vías.

2.9. INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL

2.9.1. Información general del contrato

Tabla 3. Información General del contrato

CONTRATISTA:	CONSORCIO ZONA NORTE
OBJETO:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de INVIAS, de las direcciones territoriales Huila, Meta y Cundinamarca - lote 9
PROFESIONALES	
INGENIERO RESIDENTE	WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
NUMERO M.P.	25202177615 CND
INGENIERO AUXILIAR	YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO
NUMERO M.P.	091037-0645948 CND
PERSONAL AUXILIAR	
INSPECTOR SST	WENDY JULIETH ROMERO HERNANDEZ
INSPECTOR VIAL	MIGUEL ANGEL VERA GUIROGA
CONDUCTOR	JOSE ROBERTO SAAVEDRA
OFICINA:	La Palma, Cundinamarca
TELEFONO:	(031) 4776033
CELULARES:	3214521739 – 3142793734
EMAIL	u236vialcmarca@gmail.com
VEHICULOS	Camioneta Toyota modelo 2023 – Placa: GXV815

Fuente. Consorcio Zona Norte

3. ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las Cooperativas de Trabajo Asociado encargadas del Mantenimiento rutinario de las carreteras a cargo.

- ✓ Durante la ejecución del periodo, la administración vial estuvo atenta en la colaboración necesaria para efectuar el pago de aportes y demás actividades relacionadas con su trabajo de las dos (2) microempresas.

- ✓ La Administración Vial dispuso en coordinación con las Cooperativas de trabajo asociado, del personal disponible para eventuales percances presentados en cada sector, como caída de árboles, pequeños derrumbes, caída de rocas, control de tráfico etc.

- ✓ Se envía el informe Diario de Estado de las vías a cargo de esta Administración y de las novedades presentadas en las rutas, vía correo electrónico y los informes semanales presentados a la Territorial.

- ✓ Se supervisa a las cooperativas de trabajo asociado las actividades especiales programadas.

- ✓ Se responden los diferentes requerimientos de la DTCUN.

- ✓ Se realiza el control y seguimiento a las cooperativas de RIO NEGRO y LOS CHIGUANOS del correcto uso de los elementos de protección personal.

- ✓ Se monitorea el cauce del rio negro por precipitaciones debido a las fuertes lluvias.

4. ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CUADRO No 3

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

INGENIERO RESIDENTE: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ

PERIODO EVALUADO: ABRIL DE 2024

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
50CN01	0+0000	2+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	2+0000	4+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	4+0000	5+0185	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,19	P	R
50CN01	5+0185	5+0255	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,07	P-9	B
50CN01	5+0255	6+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,75	P	R
50CN01	6+0000	8+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	8+0000	10+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	10+0000	12+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,00	P	R
50CN01	12+0000	13+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,00	P	R
50CN01	13+0000	14+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,00	P	R

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	
	REGULAR	13,93
	MALO	
TOTAL		**13,93**

ADOQUIN	BUENO	0,07
	REGULAR	
	MALO	
TOTAL		**0,070**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
50CN01	19+000	19+0068	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,068	R	R
50CN01	19+068	19+0368	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,300	A	B
50CN01	19+368	21+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,822	A	B
50CN01	21+000	23+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,994	A	B
50CN01	23+000	24+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,998	A	B
50CN01	24+000	24+0400	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,400	A	B
50CN01	24+400	24+0600	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,200	A	B
50CN01	24+600	25+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,392	A	B
50CN01	25+000	27+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	1,979	A	B
50CN01	27+000	29+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,010	A	R
50CN01	29+000	31+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,083	A	R
50CN01	31+000	33+0000	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,007	A	M
50CN01	33+000	35+0716	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	2,728	A	M
50CN01	35+716	35+0895	El Dindal - Caparrapi - La Aguada	0,179	A	R

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	8,085
	REGULAR	4,272
	MALO	4,735
TOTAL		**17,092**

RESUMEN RIGIDO	BUENO	
	REGULAR	0,068
	MALO	
TOTAL		**0,068**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO

5604	0+000 00	0+0460	Yacopí - La Palma	0,46	P	B
5604	0+046 0	1+0000	Yacopí - La Palma	0,655	P	B
5604	1+000 0	1+0034	Yacopí - La Palma	0,041	P-9	M
5604	1+003 4	1+0122	Yacopí - La Palma	0,087	P	B
5604	1+012 2	4+0122	Yacopí - La Palma	3	P	R
5604	4+012 2	4+0157	Yacopí - La Palma	0,035	P-9	B
5604	4+015 7	4+0305	Yacopí - La Palma	0,148	P	B
5604	4+030 5	4+0328	Yacopí - La Palma	0,023	P-9	R
5604	4+032 8	5+0672	Yacopí - La Palma	1,354	P	B
5604	5+067 2	6+0018	Yacopí - La Palma	0,346	P-9	R
5604	6+001 8	6+0367	Yacopí - La Palma	0,349	P	R
5604	6+036 7	6+0872	Yacopí - La Palma	0,505	A	M
5604	6+087 2	7+0000	Yacopí - La Palma	0,125	P	R
5604	7+000 0	8+0000	Yacopí - La Palma	1,001	P	R
5604	8+000 0	9+0690	Yacopí - La Palma	1,694	P	R
5604	9+069 0	9+0727	Yacopí - La Palma	0,037	A	M
5604	9+072 7	10+0828	Yacopí - La Palma	1,092	P	R
5604	10+0828	10+0895	Yacopí - La Palma	0,067	A	M
5604	10+0895	11+0078	Yacopí - La Palma	0,193	P	R
5604	11+0078	11+0125	Yacopí - La Palma	0,047	A	M
5604	11+0125	11+0572	Yacopí - La Palma	0,447	P	R
5604	11+0572	12+0000	Yacopí - La Palma	0,433	A	M
5604	12+0000	12+0100	Yacopí - La Palma	0,100	P	R
5604	12+0100	12+0445	Yacopí - La Palma	0,345	A	M
5604	12+0445	12+0842	Yacopí - La Palma	0,397	P	R
5604	12+0842	12+0943	Yacopí - La Palma	0,101	A	M

5604	12+0 943	13+006 9	Yacopí - La Palma	0,126	P	R
5604	13+0 069	13+023 7	Yacopí - La Palma	0,168	A	M
5604	13+0 237	13+043 8	Yacopí - La Palma	0,201	P	M
5604	13+0 438	13+070 4	Yacopí - La Palma	0,266	A	M
5604	13+0 704	17+000 0	Yacopí - La Palma	3,29	P	B
5604	17+0 000	17+062 1	Yacopí - La Palma	0,621	P	R
5604	17+0 621	18+040 0	Yacopí - La Palma	0,75	A	R
5604	18+0 400	18+090 0	Yacopí - La Palma	0,5	P	B
5604	18+0 900	19+001 4	Yacopí - La Palma	0,161	A	M
5604	19+0 014	19+038 0	Yacopi - La Palma	0,366	P	R
5604	19+0 380	19+039 1	Yacopi - La Palma	0,011	A	M
5604	19+0 391	19+050 0	Yacopi - La Palma	0,109	A	M
5604	21+0 500	23+055 6	Yacopi - La Palma	2,05	P	B
5604	23+0 556	24+000 0	Yacopi - La Palma	0,454	P	B
5604	24+0 000	24+050 0	Yacopi - La Palma	0,345	P	B
				22,5000		

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	
	REGULAR	
	MALO	3,00
TOTAL		**3,000**

RESUMEN PAVIMENTADO	BUENO	9,343
	REGULAR	9,511
	MALO	0,201
TOTAL		**19,055**

ADOQUIN	BUENO	0,04
	REGULAR	0,37
	MALO	0,04
TOTAL		**0,445**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
5008B1	0+000 00	1+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	A	M
5008B1	1+000 00	2+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	A	M
5008B1	2+060 00	3+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	0,40	NP-1	M
5008B1	3+000 00	4+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	NP-1	M
5008B1	4+000 00	5+0000	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	1,00	NP-1	M
5008B1	5+000 00	5+0100	EL CURAPO - CRUCE QUEBRADA NEGRA - TUNEL DE LA ABUELA	0,10	NP-1	M

RESUMEN AFIRMADO	BUENO	
	REGULAR	
	MALO	4,50
TOTAL		**4,500**

Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color.

CONVENCIONES	
B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

5. COOPERATIVAS

5.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO RIONEGRO

De acuerdo con el cuadro de control de indicadores que se anexa al presente informe se evidencia que se cumplió con la disponibilidad en atender emergencias y eventualidades para el periodo. Se realizan los recorridos a la vía acatando todas las medidas de prevención.

5.2. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACO LOS CHIGUANOS

De acuerdo con el cuadro de control de indicadores que se anexa al presente informe que se cumplió con la disponibilidad en atender emergencias y eventualidades para el periodo. Se realizan los recorridos a la vía acatando todas las medidas de prevención.

6. INFORME SST

El informe SST se presenta por aparte, este describe lo desarrollado por el componente en salud y seguridad en el trabajo, en el cual se detalla la información socializada a las cooperativas de trabajo asociado, la cual fue enviada por LA VIALIDAD, sobre el equilibrio de la vida y el trabajo por el Copasst, campaña sobre el cuidado del agua, debido al racionamiento de agua que se ha presentado en el país debido al fenómeno del niño, todo lo que se debe saber sobre el glaucoma, información sobre el día de la tierra el cual se celebra el 22 de abril, junto la motivación para aumentar el empoderamiento, de igual forma se verifica los EPP, junto con las recomendaciones de señalizar los derrumbes que se han venido presentando durante el mes, seguido de la capacitación realizada enfocada en el componente SST en temas de nutrición, odontología y enfermería en pro de brindar consejos y respondes a dudas que presentan los microempresarios debido a que los temas se relacionaban a enfermedades tales como la hipertensión, la diabetes y otras.

CUADROS CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca

INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

PROGRAMACION ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA: CHIGUANOS | **CONTRATO No.** 3022 DE 2023 | **PERIODO:** ABRIL

CARRETERAS: 50CN01: Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895; 5008B TOBIAGRANDE - UTICA: TRAMO SALIDA TÚNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADANEGRA; 5008B UTICA - GUADUERO TRAMO CRUCE QUEBRADANEGRA - EL CURAPO.

INDICADOR	COD.	semana del 01-07			Semana del 08-14			Semana del 15-21			Semana del 22-30		
		PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta
		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final	
Parcheo carreteras pavimentadas	257												
Bacheo carreteras afirmadas	285							32+0232	28+0410	50CN01	32+0900	32+0800	50CN01
Limpieza de bermas pavimentadas	340												
Limpieza de borde	380				14+0000	10+0000	50CN01	10+0000	08+0000	50CN01	08+0000	00+0000	50CN01
Limpieza manual de cuneta en tierra	425										35+0895	33+0400	50CN01
Limpieza de cunetas revestida	425				35+0895	32+0232	50CN01	32+0232	28+0000	50CN01	08+0000	05+0790	50CN01
Limpieza de cunetas	425				14+0000	10+0000	50CN01	10+0000	08+0000	50CN01	08+0000	00+0000	50CN01
Limpieza de cunetas	425							00+0000	05+0000	5008B1			
Limpieza zanjas de coronación.	432												
Limpieza encoles y/o descoles	434	08+0000	00+0000	50CN01	14+0000	10+0000	50CN01	08+0575	08+0300	50CN01	08+0300	06+0300	50CN01
Limpieza encoles y/o descoles	434				35+0895	19+0000	50CN01	00+0000	05+0000	5008B1	31+0285	32+02900	50CN01
Limpieza de obras	497	08+0000	00+0000	50CN01	14+0000	10+0000	50CN01	08+0575	08+0300	50CN01	08+0300	06+0300	50CN01
Mantenimiento rutinario de puentes	515												
Mantenimiento rutinario de puentes	515												
Limpieza y pintura de barandas.	548												
Limpieza y pintura de barandas.	548												
Limpieza de la calzada.	630	14+0000	00+0000	50CN01				00+0000	05+0000	5008B1	13+0950	12+0800	50CN01
Roceria y desmonte manual	630	33+0600	35+0895	50CN01									
Roceria y desmonte manual	630	14+0000	00+0000	50CN01									
Retiro Derrumbes	630												
Jardineria	643												
Reposición mojones de referencia	673												
Limpieza de muros y gaviones													
Pintura de mojones	675												
limpieza se señales y mojones	678												
Limpieza de señales y mojones (adecuar señales en mal estado)	678												
Reposición partes dañadas defensa met.	685												
Limpieza de defensas metálicas	686												
Limpieza de defensas metálicas													
Instalación de defensas metálicas	682												
Vigilancia	694	DISPONIBILIDAD EN TODOS LOS SECTORES											
Señalización horizontal (Pintura resaltos, Limpieza Box													
Emergencias	695	DISPONIBILIDAD EN TODOS LOS SECTORES											
Arborización	642												
Inventario Poda, corte y/o retiro de árboles	639												
Acompañamiento Via													
Control Trafico		14+0000	00+0000	50CN01									
limpieza de muros (demarcacion)													
limpieza de muros (demarcacion)													
Limpieza de muros y cabezotes													
Reporte atropellamiento a fauna		07+0100		50CN01	07+0900		50CN01	09+0190		50CN01	Útica tunel de la abuela		5008B1
RECUPERACION BANCADA		30+0200	30+0210	50CN01									
limpieza de gaviones													
Capacitación													

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTA SUJETO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN INDICADOR LIMPIEZA DE BERMAS MINIMO 30CM DE BORDO DE PAVIMENTO.

William Casasbuenas

Vo.Bo. Ingeniero Residente
WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
CONSORCIO ZONA NORTE
Administracion vial Territorial Cundinamarca

Yessica Santoque L

Reviso. Ingeniera Auxiliar
YESSICA TATIANA SANTOQUE LUGO
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración vial Territorial Cundinamarca

Jose Teodulfo Saldaña

JOSÉ TEODULFO SALDAÑA
Representante Legal
CTA LOS CHIGUANOS
Contratista

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial 02 de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca
INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO.

COOPERATIVA: **CHIGUANOS** — **CONTRATO No.3022 de 2023**

CARRETERA: **50CN01: DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA; PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0490**
5008B TOBIA GRANDE - UTICA; SECTOR SALIDA TUNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA NEGRA
5008B UTICA - GUADUERO; CRUCE QUEBRADA NEGRA - EL CURAPO

MES: abr-24

ACTIVIDAD	TRAMO:			50CN01 PR																																				5008B PR					
	JORNAL	CANT EJEC.	UNIDAD	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	1	2	3	4	5	6
Parcheo carreteras pavimentadas			M3																																										
Bacheo carreteras afirmadas			M																																										
Limpieza de bermas pavimentadas			M																																									
Limpieza manual de cunetas.			M																																									
Limpieza zanjas de coronación.			M																																									
Limpieza manual de cunetas en tierra			M																																									
limpieza de defensas metalicas			M																																									
limpieza de muros y gaviones			M																																									
Limpieza de obras			UND																																									
Limpieza encoles y/o descoles			UND																																									
Mantenimiento rutinario de puentes			UND																																									
Limpieza de la calzada.			M																																									
Rocería y desmonte manual.			HA																																									
Sello de fisuras en el disipador			CAN																																									
limpieza de señales y mojones (adecuar señales en mal estado)			M																																									
Señalización de la via			CAN																																									
control de trafico			M																																									
Despeje de Derrumbes			CAN																																									
Emergencias			JOR																																									
TOTALES	0																																										

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES
PROGRAMADO:
EJECUTADO:

Ingeniero Residente	Ing. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ	CONSORCIO ZONA NORTE — Administración Vial Territorial Cundinamarca
Ingeniera Auxiliar	YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO	CONSORCIO ZONA NORTE — Administración Vial Territorial Cundinamarca
	JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ	CTA CHIGUANOS — Representante Legal

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca

INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

PROGRAMACION ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA: RIONEGRO | **CONTRATO No.** 3287 de 2023 | **MES:** abr-24

CARRETERAS: 5604: YACOPI - LA PALMA, PR 00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500

INDICADOR	COD.	semana del 01 al 04 de ABRIL			semana del 05 al 11 de ABRIL			semana del 12 al 18 de ABRIL			semana del 19 al 25 de ABRIL			semana del 25 al 30 de ABRIL		
		PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta	PR		Ruta
		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final		Inicial	Final	
Parcheo carreteras pavimentadas	257	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604
Bacheo carreteras afirmadas	285	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604	00+0000 21+0500	19+0500 24+0500	5604
Limpieza de bermas pavimentadas	340															
Limpieza de borde/ bordillo	380	00+0000	06+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	24+0500	5604	21+0500	24+0500	5604
Limpieza manual de cunetas.	425	00+0000	06+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	24+0500	5604	21+0500	24+0500	5604
Limpieza manual de cunetas en tierra		00+0000	06+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	24+0500	5604	21+0500	24+0500	5604
Limpieza zanjas de coronación.	432															
Limpieza encoles y/o descoles	434	00+0000	06+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	24+0500	5604			
Limpieza de obras	497	00+0000	06+0000	5604	06+0000	12+0000	5604	12+0000	19+0500	5604	21+0500	24+0500	5604			
Mantenimiento rutinario de puentes	515															
Limpieza y pintura de barandas.	548															
Despeje de derrumbes	625															
Limpieza de la calzada.	630	00+0000	04+0000	5604	04+0000	10+0000	5604	10+0000	16+0000	5604	16+0000	19+0500	5604	21+0500	24+0500	5604
Rocería y desmonte manual.	636	00+0000	04+0000	5604	04+0000	10+0000	5604	1+0000	16+0000	5604	16+0000	19+0500	5604	21+500	24+500	5604
Jardinería	643															
Reposición mojones de referencia	673															
Pintura de mojones	675															
Limpieza y pintura de linea amarilla																
limpieza y pintura de muros y cabezotes de alcantarilla																
limpieza y pintura de lineas blancas																
Limpieza de señales y mojones.	678															
Reposición partes dañadas defensa met.	685															
Limpieza de defensas metálicas	686															
Instalación de defensas metálicas	682															
Vigilancia	694	EN TODOS LOS SECTORES														
Señalización horizontal (Pintura resaltos,																
Limpieza Box																
Emergencias	695	EN TODOS LOS SECTORES														
Arborización	642															
Inventario Poda, corte y/o retiro de árboles	639															
Limpieza de muros y gaviones																
Capacitación																

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTA SUJETO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN INDICADOR LIMPIEZA DE BERMAS MINIMO 30CM DE BORDO DE PAVIMENTO.

Vo.Bo. Ingeniero Residente
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

Ingenieria Auxiliar
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

JAIRO MAURICIO LOPEZ
Representante Legal
CTA RIO NEGRO

CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial 02 de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cundinamarca
INVIAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO.

COOPERATIVA: **RIO NEGRO** — **CONTRATO No. 3287 de 2023**
CARRETERA: **5604: YACOPI - LA PALMA, PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500** — MES: **abril de 2024**

ACTIVIDAD	TRAMO:			5604 PR																						
	JORNAL	CANT EJEC.	UNIDAD	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Parcheo carreteras pavimentadas			M3																									
Bacheo carreteras afirmadas			M3																									
Limpieza de borde / bordillo			M																									
Limpieza de bermas pavimentadas			M																									
Limpieza manual de cunetas.			M																									
Limpieza de calzada.			M																									
Limpieza zanjas de coronación.			M																									
Limpieza encoles y/o descoles			M																									
Limpieza de obras			M																									
Demaración vial			UND																									
Arreglo de Muro			CAN																									
Rocería y desmonte manual.			Ha																									
Sello de fisuras en el disipador			CAN																									
Emergencias			CAN																									
Limpieza de Señalización			CAN																									
Limpieza de defensas metalicas			m																									
retiro de árboles			M3																									
retiro de derrumbes			M3																									
Emergencias			JOR																									
TOTALES																												

OBSERVACIONES: DISPONIBILIDAD PARA ATENDER CUALQUIER EVENTUALIDAD O EMERGENCIA EN LA VÍA

CONVENCIONES
PROGRAMADO:
EJECUTADO:

Interventor — **Ing. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS R**
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

Ingeniera — **Ing. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO**
CONSORCIO ZONA NORTE
Administración Vial Territorial Cundinamarca

JAIRO MAURICIO LOPEZ
CTA RIO NEGRO
Representante Legal

INFORMES SEMANALES

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 034

CÓDIGO	MSE-FR-20		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA — FECHA: 04 / 04 / 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — CONTRATO No.: 2746 de 2023

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.MARZO 29 DE 2024 - DIA VIERNES (FESTIVO): Se termina el informe de capacitación, por lo que se inicia con el informe mensual

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo
MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

2.MARZO 30 DE 2024 - DIA SABADO: Se continua con el informe mensual, donde se ajusta la tabla de información del contrato de la administración, junto con el ajuste de la información de los avistamientos de fauna y de los reportes de accidentalidad

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo
MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

3.MARZO 31 DE 2024 - DIA DOMINGO: Se continua con el informe mensual donde se especifica que se detalla las actividades realizadas por la adminnistración, junto con la revisión de la programacion de las actividades de mantenimiento rutinario

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo
MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

4.ABRIL 01 DE 2024 - DIA LUNES: Se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se envian los desprendibles de pago de la ing. Auxiliar y del conductor firmados a La Vialidad, según solicitud de los mismos, se envia al INVIAS el informe trimestral del SUKUBUN del periodo de enero a marzo, se finaliza con el informe mensual, de igual forma se imprimen los paquetes del pago del ICA con la finalidad del llevar los el dia siguiente a las alcaldias. se envian los oficios U236-ADMCUN-78-24 y U236-ADMCUN-79-24 a las inspecciones de policia de Caparrapi y La Palma, solicitando el reporte de accidentalidad del mes de marzo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 33+0600 hasta el PR 35+0895 junto con limpieza de obras desde el PR 08+0000 hasta el PR 04+0300
MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas y de obras desde el PR 00+0000 hasta el PR 01+0500, realizan despeje de arboles que se encontraban sobre la vía en el PR 11+0700

5.ABRIL 02 DE 2024 - DIA MARTES: Se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realizan los informes de interventoria de los contratos 3022 y 3287 de 2023, junto con los respectivos oficios para realizar la entrega de los informes, se toma captura de pantalla de la solicitud de reporte de accidentes a las inspecciones de policia, por lo que en este dia se revisan y detallan todos los informes con el objetivo de tener los listos para su aprobación, de igual forma nos dirigimos a las alcaldias de Caparrapi, La Palma y Yacopi, con la finalidad de dejar los paquetes del pago del ICA del año 2023, por lo que se solicita el radicado de los mismos

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual, junto con el control de tráfico y limpieza de calzada desde el PR 14+0000 hasta el PR 11+0600, junto con limpieza de obras desde el PR 04+0300 hasta el PR 00+0000
MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual, junto con limpieza de cunetas y despeje de pequeños derrumbes desde el PR 01+0500 hasta el PR 02+0400

6.ABRIL 03 DE 2024- DIA MIERCOLES: 5.FEBRERO 06 DE 2024 - DIA MARTES: El ing. residente revisa todos los informes con la finalidad de brindar observaciones y su respectiva aprobación, se buscan 4 predios en google earth, con la finalidad de evidenciar si estos se encuentran en jurisdicción del INVIAS, como lo es el predio rural denominado "EL GUARUMO", "EL EDÉN", "CAICEDONIA - LA CABAÑA - EL TOPACIO" y "EL RECUERDO", se realiza un resúmen financiero del contrato de la administración debido a confusiones con el INVIAS, donde especifican que para el acta N°8 se debe afectar el valor del recurso 11, el sobrante del recurso 21 e iniciar con el recurso 20, teniendo en cuenta asi cada registro presupuestal

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual, junto con control de tráfico y limpieza de calzada desde el PR 11+0600 hasta el PR 06+0900
MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual junto con limpieza de cunetas desde el PR 02+0400 hasta el PR 04+0500

7.ABRIL 04 DE 2024 - DIA JUEVES :Se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se envian los informes de capacitación, mesual, de interventoria y entrega de accidentalidad a La Vialidad, con la finalidad de solicitar la firma y para la respectiva revisión y aprobación, se inicia con el informe final del contrato 2746 de 2023, debido a que este tiene fecha de vencimiento el 10 de abril del presente año, por lo que se inicia con la recopilación de información

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual, junto con control de tráfico, limpieza de calzada y de cunetas desde el PR 06+0900 hasta el PR 03+0500
MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de calzada para despeje de derrumbes, por lo que se realiza acordonamiento junt con la señalización de los mismos desde el PR 21+0500 hasta el PR 23+0200, realizan charla con la profesional SST

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 11 (DIA) / 4 (MES) / 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en BOGOTÁ , _____ (Día en letras) días del mes de _____ (Mes en que se firma el acta) de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL- PR 34+0000



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE OBRA- PR 05+0190



VÍA 50CN01 - CONTROL DE TRÁFICO- PR 12+0200

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL- PR 00+0470




VÍA 5604- DESPEJE DE DERRUMBES- PR 22+0400




VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS- PR 02+0107


ADMINISTRACIÓN VIAL



TRABAJO DE OFICINA



RECORRIDO A LAS VÍAS A CARGO

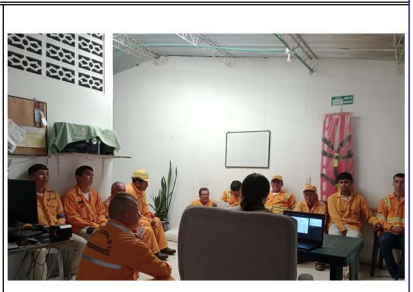

CHARLA COOPERATIVAS SST

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 035

CÓDIGO	MSE-FR-20		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	11	04	2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No.	2746 de 2023		

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.ABRIL 05 DE 2024 - DIA VIERNES: Se realizan las actas de costos de la administración vial y de las cooperativas de trabajo asociado Rio Negro y Los Chiguanos, por lo que procede a recopilar la información necesaria para la elaboración de las mismas, como el certificado de parafiscales, la revisión de las planillas de pago de aportes entre otros, se envian los informes de capacitación, mensual, de interventoria de los contratos y de accidentalidad al INVIAS, por lo que también se participa en el foro de gestión del riesgo, enfocado en la presentación de resultados desde las 8:00 am hasta las 12:00 pm, organizado por la universidad de LA SALLE, la universidad DEL QUINDIO, la cual era apoya por el INVIAS, se procede a realizar el informe SST correspondiente al mes de marzo

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan rocería y desmonte manual, junto con control de tráfico y limpieza de calzada desde el PR 03+0500 hasta el PR 00+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas desde el PR 17+0600 hasta el PR 18+0450, realizan bacheo y señalización en el PR 11+0600, realizan despeje de calzada debido a caida de árbol en el PR 13+0400

2.ABRIL 06 DE 2024 - DIA SABADO: Se continua con el informe final del contrato de administración vial, por lo que se resume las capacitaciones realizadas desde el inicio del mismo junto con el respectivo registro fotografico

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

3.ABRIL 07 DE 2024 - DIA DOMINGO: Se continua con el informe final del contrato 2746 de 2023, debido a que este vence el 10 de abril del presente año, por lo que se procede a especificar la información de la administración y de las cooperativas

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

4.ABRIL 08 DE 2024 - DIA LUNES: Se realiza recorrido a las vias administradas vía 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la vía 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, vía 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, de igual forma se realizan los documentos para la sexta prórroga y tercera adición del contrato de administración debido a que presentaba fecha de vencimiento para el 10 de abril del presente año, por lo que se realizan los documentos tales como, el acta de modificación N°7, unto con el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICI Y PRORG, junto con el oficio U236-ADMCUN-089-24 el cual es para la radicación de estos, por lo que en estos se solicitan una ampliación en tiempo hasta el 02 de mayo de 2024 y una adición de $70.944.213, se envian tanto a La Vialidad para la solicitud de la firma, revisión y aprobación de estos, se especifica que se envian al INVIAS, de igual forma se envía a La Vialidad el acta de costos aprobada por el ing. residente para continuar con la gestión del mismo, durante el recorrido se inicia con la repartición de los plegables correspondientes a la seguridad vial y protección de fauna a la alcaldía de La Palma y a todos aquellos actores viales que se encontraban en la vía

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de bordillo desde el PR 14+0000 hasta el PR 13+0250, realizan limpieza de obras en dos tramos, el primero desde el PR 14+0000 hasta el PR 13+0250 y el segundo desde el PR 35+0895 hasta el PR 32+0200

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada, despeje de derrumbes pequeños, junto con rocería y desmonte manual desde el PR 04+0500 hasta el PR 05+0000

5.ABRIL 09 DE 2024 - DIA MARTES: Se revisan los informes enviados por Rio Negro desde los meses de agostos de 2023 hasta enero de 2024, donde se les especifica diversas observaciones, realizan los ajustes, por lo que se proceden a enviar a la Ing. Yessica Téllez, se remite el informe SST a La Vialidad de forma editable y en PDF, junto con el oficio U236-ADMCUN-85-24, para solicitud de firma, revision y aprobación, este mismo día se envia al INVIAS, de igual forma se envia el oficio U236-ADMCUN-88-24, correspondiente a la entrega del informe de accidentalidad correspondiente al mes de marzo, pero este dirigo al ing. Douglas Bustos, se revisa el informe SST del mes de enero de la cooperativa Los Chiguanos, donde se les especifica diversas observaciones, con la finalidad de que estos realicen los debidos ajustes, se continua repartiendo los plegables de seguridad vial y protección de fauna en La Palma

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de bordillo, junto con limpieza de obras, desde el PR 13+0250 hasta el PR 12+0500, realizan el segundo tramo de limpieza de obras desde el PR 32+0200 hasta el PR 19+0000, realizan despeje de calzada, debido a caida de ramas en el PR 09+0975

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada, junto con rocería y desmonte manual desde el PR 04+0950 hasta el PR 07+0000

6.ABRIL 10 DE 2024- DIA MIERCOLES: 5.FEBRERO 06 DE 2024 - DIA MARTES: Se realiza recorrido a las vias administradas vía 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la vía 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, vía 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se revisan los informes SST de las cooperativas Rio Negro y Los Chiguanos, correspondientes al mes de marzo, se les brinda observaciones tales como actualizar la tabla de contenido, especificar la numeración y nombre de cada ilustración y anexar los documentos que especifican en el documento, por otra parte se realiza el resúmen financiero de los contratos de las cooperativas para especificar les los saldos restantes de cada registro presupuestal, con el objetivo de que estos los nombren en la factura, por lo que se realizan los ajustes en las actas de costos, especificamente en la afeetación presupuestal y en el informe financiero, se reparten los plegables tanto en la alcaldía de Yacopi y de Caparrapi, junto con cada uno de los actores viales que se encontraban en la vía

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de bordillo, junto con limpieza de obras, desde el PR 12+0500 hasta el PR 11+050, realizan el segundo tramo de limpieza de cunetas desde el PR 35+0895 hasta el PR 33+0550

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 07+0000 hasta el PR 07+0800, junto con rocería y desmonte manual desde el PR 07+0000 hasta el PR 08+0800

7.ABRIL 11 DE 2024 - DIA JUEVES : Se realiza el informe de entrega de plegable, debido a que los 500 plegables se entregaron a finales del mes de marzo y durante esta semana a las alcaldia de La Palma, Caparrapi y Yacopi, por lo que se detalla en el respectivo informe, se realizan los ajustes a las actas de las cooperativas y se envian a La Vialidad, junto con los separadores del acta N°8, para solicitud de la firma, revisión y aprobación, se envia el acta de costos N°8 al INVIAS, junto con la acta N°6 del CTO 3022 de 2023, se alcanza a enviar el acta N°6 del CTO 3287 de 2023 a La Vialidad en horas de la noche, debido a demoras con la factura

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de bordillo junto con limpieza de obras, desde el PR 11+0500 hasta el PR 11+0125, realizan limpieza de cunetas desde el PR 33+0550 hasta el PR 33+0400, realizan recuperación de bancada en el PR 30+0500, realizan despeje de calzada, debido a caida de ramas en el PR 11+0525

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de calzada desde el PR 07+0800 hasta el PR 08+0600, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 08+0800 hasta el PR 10+0800

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 18 (DIA) | 4 (MES) | 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ ,

_____ (Día en letras) días del mes de _____ Mes en que se firma el acta de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CUNETAS- PR 12+0680



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE OBRA COLMATADA- PR 27+0115



VÍA 50CN01 - DESMONTE MANUAL- PR 11+0525

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604- SEÑALIZACIÓN - PR 11+0600




VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL- PR 04+0450



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS- PR 08+0290


ADMINISTRACIÓN VIAL



TRABAJO DE OFICINA



RECORRIDO A LAS VÍAS A CARGO



ASISTENCIA FORO DE GESTIÓN DEL RIESGO "PRESENTACIÓN DE RESULTADO"

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 036

CÓDIGO	MSE-FR-20		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA	FECHA	18 / 04 / 2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	CONTRATO No.	2746 de 2023

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.ABRIL 12 DE 2024 - DIA VIERNES: Se envia el acta de costos N°6 del CTO 3287 de 2023 al INVIAS, para la respectiva revisión y fines pertinentes, se revisa que todos los eventos de avistamiento y atropellamiento a fauna se encuentren reportados en el SUKUBUN, debido a ajustes que va a reliazar el INVIAS, por lo que se envia mensaje especificando la asistencia en la capacitación debido al cambio de SUKUBUN a la subdirección de sostenibilidad, especificamente a Marly Norela Muñoz, se realizan ajustes en el informe final debido a cambios de fecha por los documentos de la prórrroga y adición al contrato de la administración

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas, de bordillo y de obras desde el PR 11+0125 hasta el PR 10+0000, realizan limpieza de cunetas desde el PR 33+0400 hasta el PR 32+0232

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas desde el PR 08+0600 hasta el PR 12+0000, realizan rocería y desmonte manual, junto con limpieza de obras encole y descole desde el PR 10+0800 hasta el PR 12+0000

2.ABRIL 13 DE 2024 - DIA SABADO: Se continuan con los ajustes del informe final del contrato de la administración vial, debido a cambios en las condiciones del mismo, se realiza visita a la via 5008B1, donde se evidencia que se debe realizar rocería y desmonte manual, por lo que se programa a la cooperativa Los Chiguanos, para que inicien con está actividad

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

3.ABRIL 14 DE 2024 - DIA DOMINGO: Se adjuntan en el informe final las fotografias correspondientes al mes de marzo y dias de abril, debido a cambios en las condiciones del contrato

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

4.ABRIL 15 DE 2024 - DIA LUNES: Se realizan los informes semanales N°34 y N°35, por lo que se recopila las fotografias y la información tanto de la administración, como de las cooperativas, de igual forma se realizan los pasos a seguir debido al Memorando No.2024I-VBOG-020028 cambio SUKUBUN Cundinamarca, debido a que actualizaron la contraseña para el ingreso al aplicativo y de igual forma especifican unos pasos a seguir para continuar con el mismo, por lo que se evidencia el cambio del color del logotipo y del nombre de este aplicativo, por lo que se les informa a las cooperativas sobre la importancia de estar al día con las actividades de mantenimiento rutinario, se les recomienda tomar más fotográfias, especificar las actividades que realizan durante los recorridos y el reporte de avistamiento y atropellamiento de fauna, debido a que el SUKUBUN ya incluye animales domésticos dentro del aplicativo, se continua con los ajustes del informe final del CTO 2746 de 2023

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 32+0232 hasta el PR 31+0100, realizan limpieza de bordillo y cunetas desde el PR 10+0000 hasta el PR 09+0900, realizan rocería y desmonte manual en la via 5008B1, reportan atropellamiento de una serpiente en el PR 07+0100

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas junto con desmonte manual desde el PR 12+0000 hasta el PR 12+0400

5.ABRIL 16 DE 2024 - DIA MARTES: Se observa la información envia por la ing. Yessica Téllez, sobre el informe trimestral de la vía 5008, se realiza el pago a seguros del estado para las pólizas que se tenian pendiente de subir al SECOP II, de la poliza 33-44-101241222 anexo 7 correspondiente a la prórroga hasta el 10 de abril, de igual forma el mismo número de poliza pero el anexo 8, correspondiente a la sexta prórroga y tercera adición, se realizan ajuste al anteproyecto para las vias 5604 y 50CN01, se realiza acompañamiento a las cooperativas de trabajo asociado revisando el informe de evaluación final, donde se evidencia que ambas cooperativas aparecen habiles para proceder con la respectiva adjudicación

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 30+0000 hasta el PR 31+0100, realizan limpieza de bordillo y de cunetas desde el PR 09+0900 hasta el PR 09+0650, continuan con la rocería y desmonte manual en la via 5008B1

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas junto con rocería y desmonte manual desde el PR 12+0400 hasta el PR 14+0000, realizan bacheo desde el PR 13+0650 hasta el PR 13+0700 y en el PR 12+0450

6.ABRIL 17 DE 2024- DIA MIERCOLES: 5.FEBRERO 06 DE 2024 - DIA MARTES: Se realiza recorrido a las vías administradas vía 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la vía 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, vía 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se revisan los otrosí modificatorios de los contratos aprobados para cada uno de los integrantes del Consorcio Zona Norte, con fecha de vencimiento hasta el 02 de mayo, se revisan las pólizas, se le toma captura de que se subieron al SECOP II y se envian a la ing. Yessica Téllez, con la finalidad de que informe para dar continuidad a la gestión, se participa en la capacitación ofrecida por la Subdirección de Sostenibilidad, acerca de los cambios que se hicieron en el aplicativo SUKUBUN e informando cuales son los erros frecuentes que se han reportado, se realiza la asistencia del mismo, se envia el archivo del anteproyecto definitivo para las vías 5604 y 50CN01, se reporta el atropellamiento a reptil, el cual es una serpiente, ubicada en el PR 07+0100 del día 15 de abril al aplicativo SUKUBUN, se dialoga con la ing. Yessica Téllez, sobre las necesidades de señalización en las vias, por lo que se le especifica que es esencial la demarcación vial en la vía 50CN01 de Dindal hacía Caparrapí desde el PR 00+0000 hasta el PR 14+0000, junto con defensas métalicas y para la via 5604 Yacopí hacia La Palma igualmente demarcación horizontal desde el PR 00+0000 hasta el PR 19+0500, exceptuando los tramos que se encuentran en afirmado

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas, de bordillo y bacheo desde el PR 30+0000 hasta el PR 28+0950, realizan limpieza de cunetas desde el PR 09+0650 hasta el PR 09+0300, continuan con la roceria en Útica, realizan reporte de atropellamiento a réptil en la vía 5008B1 a una serpiente en Útica - tunel de la abuela

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas desde el PR 14+0000 hasta el PR 14+0780, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 14+0000 hasta el PR 15+0000

7.ABRIL 18 DE 2024 - DIA JUEVES : Se revisan los anexos enviados por la subdirección de sostenibilidad, acerca de la reunión de sostenibilidad del aplicativo SUKUBUN, se realiza y envia a La Vialidad el oficio U236-ADMCUN-090-24, solicitando recursos para suministro de mezcla asfáltica para la via 50CN01 la cual conduce de Dindal - Caparrapi, debido a los baches y patologias que se han venido presentado, se realiza acompañamiento a las cooperativas en la reunión de la adjudicación de los contratos, donde especifican que está se cancela y se reprograma, se aprovecha para realizar charla SST y brindar información sobre diversos aspectos

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y bacheo desde el PR 28+0950 hasta el PR 28+0410, realizan limpieza de cunetas, de obras y de bordillo desde el PR 09+0300 hasta el PR 08+0575, realizan limpieza de obras en la via 5008B1

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas desde el PR 14+0780 hasta el PR 16+0100, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 15+0000 hasta el PR 16+0300

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 25 (DIA) / 4 (MES) / 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ ,

_____ (Día en letras) días del mes de _____ Mes en que se firma el acta de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 5008B1 - ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL- ÚTICA - TUNEL DE LA ABUELA



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA- PR 30+367



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CUNETAS- PR 10+0940

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS- PR 14+0500



VÍA 5604- ROCERÍA - PR 14+0500



VÍA 5604- DESMONTE MANUAL- PR 23+0700


ADMINISTRACIÓN VIAL



CHARLA SST



RECORRIDO A LAS VÍAS A CARGO



ASISTENCIA CAPACITACIÓN CAMBIOS SUKUBUN

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 037

CÓDIGO	MSE-FR-20		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA — FECHA: 25 / 04 / 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — CONTRATO No.: 2746 de 2023

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.ABRIL 19 DE 2024 - DIA VIERNES: Se realizan el formato en excel donde se especifica el inventario de baches y patologias presentes en la via 50CN01, la cual conduce de Dindal - Caparrapi desde el PR 00+0000 hasta el PR+ 14+0000, donde se consultan los APUs del periodo 2023-II, para la realización del presupuesto, nos dirigimos a la via 5008B1 Útica, para inspeccionar las actividades de rocería y de EPPs a los trabajadores, junto con la radicación del pago del impuesto ICA

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas desde el PR 28+0410 hasta el PR 28+0000, realizan limpieza de cunetas y de bordillos desde el PR 08+0575 hasta el PR 08+0000, realizan limpieza de cunetas y obras en la vía 5008B1 en Útica, realizan limpieza de calzada en el PR 08+0724 y en el PR 12+0900

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas desde el PR 16+0100 hasta el PR 18+0000, realizan rocería y desmonte manual desde el PR 16+0300 hasta el PR 18+0000

2.ABRIL 20 DE 2024 - DIA SABADO: Se adelanta el informe semanal N°36, recopilando la información junto con las respectivas fotografias, se realiza recorrido a la via 5604 para observar si se presenta alguna observación frente a la misma

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

3.ABRIL 21 DE 2024 - DIA DOMINGO: Se realiza visita a los sitios criticos presentados por las lluvias que se han presentado durante los últimos dias, por lo que nos dirigimos tanto a la via 50CN01 como a la 5604, para hagilizar la gestión y normalizar el paso vehicular

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, atienden vía de Caparrapí hacia la Aguada, debido a fuertes lluvias, se presenta acumulación de agua y obstrucción de la misma en los PR 32+0950 y PR 31+0100

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, se presentan diversos derrumbes en el PR 22+0450, en el PR 16+0300, en el PR 15+0350 y en el PR 12+0825, por lo que atienden la emergencia desplazando el material de los mismos hacia un costado de la calzada y ubicando señalización

4.ABRIL 22 DE 2024 - DIA LUNES: Se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, por lo que nos dirigimos a la alcaldia de Caparrapi a sellar el formulario del ICA del año 2023, junto con la solicitud de los documentos que se necesitan para inscribir al Consorcio Zona Norte en el ICA, de igual forma se realiza pausa activa en la oficina de la administración para la cooperativa Rio Negro y se les brinda información acerca de las lluvias frecuentes que se han estado presentado en el mes y que precauciones se deben tener y los procedimientos para atender los derrumbes que se presentan

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de bordillo desde el PR 08+0575 hasta el PR 07+0250, inician limpieza en Boxculvert, debido a que se encuentra colmatada en el PR 32+0900

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas junto con rocería y desmonte manual desde el PR 18+0000 hasta el PR 18+0390 y realizan bacheo en el PR 18+0000

5.ABRIL 23 DE 2024 - DIA MARTES: Se realizan los informes de interventoria de los contratos 3022 de 2023 correspondiente a la cooperativa de trabajo asociado Los Chiguanos y del contrato 3287 de 2023 de la cooperativa de trabajo asociado Rio Negro, por lo que se recopilan las fotografias correspondientes del mes, donde se especifica el informe de avance tanto de las cooperativas y de la administración en los mismos, junto con las tablas de avance fisico - financiero hasta el mes de marzo, de igual forma se recopilan las fotografias de seguimiento.

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de bordillo desde el PR 07+0250 hasta el PR 06+0500, realizan limpieza de encole y descole de tubería en el PR 07+0000, continuan con la limpieza del Boxculvert en el PR 32+0900

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas, despeje de pequeños derrumbes, rocería y desmonte manual desde el PR 18+0390 hasta el PR 18+0650

6.ABRIL 24 DE 2024- DIA MIERCOLES: 5.FEBRERO 06 DE 2024 - DIA MARTES: Se observa la respuesta al radicado 20241017776, donde atiende el oficio U236-ADMCUN-064-24 sobre la solicitud de la visita para poda de árboles, donde especifica que realizaran visita técnica el dia 25 de abril de 2024 con el objetivo de verificar los hechos expuestos, donde detallan que realiaran un informe técnico correspondiente y con fundamento en lo conceptuado se adoptarán las respectivas medidas, se realiza inventario de los derrumbes a la fecha para realizar oficio para gestionar remoción de los mismos, se recopila información de los atropellamientos de fauna de las vias en el SUKUBUN y se adelanta el informe mensual correspondiente al mes de abril

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y de bordillo desde el PR 06+0500 hasta el PR 05+0790, realizan limpieza de Boxculvert en el PR 06+0300, realizan limpieza de obra colmatada en los PR 31+0285 y en el PR 33+0100, continuan con la limpieza del Boxculvert en el PR 32+0900, debido a que se volvió acolmatar, realizan retiro de derrumbes en la vía PR 34+0100 y en el PR 34+0120, reportan derrumbes en el PR 31+0000, 34+0050, PR 35+0300, reportan obras colmatadas en el PR 33+0000 y en el PR 33+0100, reportan caída de árbol en el PR 34+0100

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan acordonamiento y señalización de diversos derrumbes de los cuales se encuentran los PR 12+0900, PR 12+0840, PR 14+0150 y en el PR 13+0300

7.ABRIL 25 DE 2024 - DIA JUEVES: Se realiza recorrido a las vias administradas via 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la via 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, via 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, Se evidencian los derrumbes en el PR 11+0900 y PR 13+0900, por lo que se les especifica a los Chiguanos que procuren desplazar el material lo que mas se pueda despejando el carril, de igual forma se evidencian los derrumbes que se presentan en la Aguada y las obras colmatadas junto con los derrumbes que se presentaron en la Palma, se atiende llamada del consejal Heiner Pinzón especificando la situación y gestión que se realiza para la remoción de los mismos, se realiza el sellado por parte de tesoreria al pago del ICA y se inscribe el Consorico al mismo.

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, reportan derrumbe en el PR 13+0900 y en el PR 11+0800 hasta el PR 11+0900, limpieza de calzada en el PR 12+0900, realizan limpieza de cunetas desde el PR 35+0895 hasta el PR 33+0400, continuan con la limpieza del box culvert en el PR 32+0900, realizan señalización de derrumbes en el PR 11+0900 y en el PR 13+0900, realizan limpieza de calzada desde el PR 13+0900 hasta el PR 13+0950, realizan limpieza de calzada desde el PR 12+0900 hasta el PR 12+0800, realizan retiro de árbol en el PR 11+0092

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas y despeje de derrumbes desde el PR 18+0650 hasta el PR 18+0950, realizan desmonte manaul desde el PR 15+0640 hasta el PR 18+0950

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 02 (DIA) / 5 (MES) / 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ , _____ (Dia en letras) días del mes de _____ Mes en que se firma el acta de _____ (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO


MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.

		
VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CALZADA Y OBRA COLMATADA- PR 32+0900	VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE OBRA COLMATADA- PR 33+0100	VÍA 50CN01 - RETIRO DE DERRUMBE- PR 34+0100

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500

		
VÍA 5604- ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL- PR 17+0600	VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 18+0460	VÍA 5604- SEÑALIZACIÓN DE DERRUMBES - PR 14+0150

ADMINISTRACIÓN VIAL

		
PAUSAS ACTIVAS	INFORMACIÓN Y ESPECIFICACIONES DEBIDO A LA OLA INVERNAL	RECORRIDO A LAS VÍAS ADMINISTRADAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 038

CÓDIGO	MSE-FR-20		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA — FECHA: 02 05 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — CONTRATO No.: 2746 de 2023

OBJETO DE CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO 2

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
ING. WILLIAM LEONEL CASASBUENAS (ING RESIDENTE AMV 02)	
ING. YESSICA TATIANA SASTOQUE LUGO (ING AUXILIAR AMV 02)	
WENDY JULIETH ROMERO HERNÁNDEZ (INSPECTOR SST)	
MIGUEL ANGEL VERA QUIROGA (INSPECTOR VIAL)	
JAIRO MAURICIO LOPEZ (REP LEGAL RIO NEGRO)	
JOSE TEODULFO SALDAÑA GONZALEZ (REP LEGAL LOS CHIGUANOS)	

II. OBJETO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NINGUNA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

-

V. TEMAS TRATADOS : Informe de actividades de AMV 02

1.ABRIL 26 DE 2024 - DIA VIERNES: Se realiza recorrido a las vías administradas vía 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la vía 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, vía 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realizan los documentos para la séptima prórroga, como el acta de modificación N°8, el formato de la solicitud de prórroga, junto con el oficio U236-ADMCUN-091-24, realizando la respectiva solicitud, se envía una inquietud y observaciones sobre el aplicativo SUKUBUN, debido a que no se deja subir emergencias al aplicativo SUKUBUN, seguido de esto se envían a La Vialidad para que revisen los mismos y se realice la aprobación, nos dirigimos a la alcaldía de Yacopí para solicitar el sello de tesorería en el formulario del pago del ICA y se inscribe el Consorcio a la base de datos de la misma, se realiza reporte de avistamiento de una cría de buitre al SUKUDUN, se asiste a la reunión de adjudicación de los contratos de las cooperativas, se realiza una reunión previa para organizar la capacitación correspondiente al mes de abril con el equipo profesional de la gobernación de Cundinamarca con el programa de la concurrencia

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan retiro de derrumbe en el PR 11+0900 al PR 11+0000, continuan con la limpieza del boxculvert en el PR 32+0900, realizan encauzamiento de aguas en la vía PR 32+0800 hasta el PR 32+0900, realizan bacheo en el PR 32+0800 al PR 32+0900, realizan encauzamiento de aguas en la vía PR 29+0250 hasta el PR 31+0000

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas desde el PR 18+0950 hasta el PR 19+0500 junto con desmonte manual y despeje de pequeños derrumbes

2.ABRIL 27 DE 2024 - DIA SABADO: Se realiza visita a la vía 5604 debido a los derumbes que se han presentado debido a la ola invernal para revisión de señalización en los mismos

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan reporte de derrumbes en el PR 09+0750, en el PR 09+0300, en el PR 08+0900, se desplazan aún costado de la calzada, se realiza limpieza de calzada desde el PR 08+0917 al PR 08+0950 y en el PR 08+0221 hasta el PR 08+0300, realizan retiro de árbol en el PR 04+0754, realizan retiro de piedras en la vía desde el PR 00+0642 hasta el PR 00+0750, realizan limpieza de calzada desde el PR 06+0726 hasta el PR 06+0800, realizan limpieza de calzada desde el PR 13+0900 hasta el PR 13+0950, realizan retiro de árbol en el PR 12+0241, realizan limpieza de calzada en el PR 03+0900 hasta el PR 04+0000, realizan señalización de derrumbes desde el PR 08+0900 hasta el PR 09+0750

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

3.ABRIL 28 DE 2024 - DIA DOMINGO: Se realiza visita a la vía 50CN01 debido a los derrumbes presentados en el Dindal y en La Aguada, para revisión de señalización y estado de las mismas

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

4.ABRIL 29 DE 2024 - DIA LUNES: Se organiza la capacitación con diversos temas, de los cuales son nutrición la cual hace enfasis en hábitos de vida saludable, lactancia materna en entorno laboral junto con desnutrición y sobre peso en los niños, odontologia con temas como la importancia del control dental/periodontal en pacientes con hipertensión, diabetes, cardiopatias y otras enfermedades, enfermeria en cuanto al lavado de manos, pautas de cuidado, signos y sintomas para la detección temprana de factores de riesgo asociado a hipertensión y diabetes, se envian los documentos de la septima prórroga al INVIAS, se realiza el oficio U236-ADMCUN-092-24 solicitando recursos para la remoción de movimientos en masa, se organiza la lista de asistencia de la capacitación

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan retiro de derrumbe desde el PR 08+0225 hasta el PR 08+0350, realizan limpieza de cunetas desde el PR 08+0051 hasta el PR 08+0225, realizan retiro de derrumbe desde el PR 31+0150 hasta el PR 31+0300, asisten a la capacitación en la oficina de La Pama de la administración vial

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas, rocería y desmonte manual desde el PR 21+0500 hasta el PR 22+0500, asisten a la capacitación en la oficinal de La Palma de la administración vial

5.ABRIL 30 DE 2024 - DIA MARTES: Se realiza recorrido a las vías administradas vía 50CN01 Dindal-Caparrapi-la Aguada desde el pr 00+0000 al pr 14+0000 y pr 19+0000 al pr 35+895, a la vía 5604 Yacopi a La Palma desde el pr 00+0000-19+0500 y 21+0500 al pr 24+0500, vía 5008B1 el Curapo-Tunel de la Abuela, se realiza visita de campo en el PR 13+0417, debido a una petición solicitada por el señor Edgar Fernando Vanegas, debido a la presencia de dos alcantarillas las cuales se encuentran afectando el predio del mismo, junto con la especificación de la presencia de un charco que se le ocasiona al frente de la vivienda, por lo que se procede a tomar fotografías y a especificar la que proceda a realizar el radicado de la petición, nos dirigimos nuevamente a la alcaldía de Caparrapi para que se nos especifique los documentos para inscribir el Consorcio al ICA, se revisa la página de INVIAS open data para evidenciar el registro de los eventos correspondientes al mes de abril en cuanto a avistamiento y atropellamiento a fauna, se procede a realizar los oficios U236-ADMCUN-093-24 y U236-ADMCUN-094-24, referente a la solicitud de reporte de accidentalidad dirigidos a la inspección de policia de Caparrapi y de La Palma

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan señalización de derrumbe en el PR 31+0160, continuan retirando derrumbe desde el PR 08+0225 hasta el PR 08+0350, realizan señalización desde el PR 31+0200 hasta el PR 35+0800 en sitios críticos cerca a abismos, realizan capacitación en habitos alimenticios por la profesional SST junto con la jornada de salud

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas junto con rocería y desmonte manual desde el PR 22+0500 hasta el PR 23+0500

6.MAYO 01 DE 2024- DIA MIERCOLES (FESTIVO): 5.FEBRERO 06 DE 2024 - DIA MARTES: Se realiza el informe de capacitación correspondientes a los temas de nutrición, odontología y enfermeria, por lo que se recopila la información, las fotografias y la asistencia para el mismo, junto con el acta de costos N°9 de la administración vial para su respectiva revisión

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo

7.MAYO 02 DE 2024 - DIA JUEVES: Se realizan las actas de costos N°7 a las cooperativas de trabajo asociado correspodientes al mes de abril, junto con las actas de costos N°8 correspondientes a los días 1 y 2 de mayo debido a la culminación de los contratos 3022 y 3287 de 2023, se revisan las planillas de pago de aportes y se realizan los respectivos paquetes, se pregunta al INVIAS del segundo registro presupuestal de la adición del año 2024 de la administración vial, se adelanta el informe semanal N°37

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS;Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan señalización de derrumbe en el PR 11+0400, realizan señalización en sitios críticos tales como los es en el PR 20+0600 hasta el PR 23+0600, terminan de retirar el derrumbe en el PR 08+0225

MICROEMPRESA 2: RIO NEGRO: Realizan recorrido al corredor vial, presentan disponibilidad para atender cualquier emergencia en la vía, indican reporte del estado del tiempo, realizan limpieza de cunetas junto con rocería y desmonte manual desde el PR 23+0500 hasta el PR 24+0500

VI. DESARROLLO TEMAS

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
-	-

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 09 (DIA) — 5 (MES) — 2024 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la Próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior se firma la Presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en BOGOTÁ ,

(Dia en letras) días del mes de (Mes en que se firma el acta) de (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

MICROEMPRESA 1: LOS CHIGUANOS: Vía 50CN01, Sector Dindal - Caparrapi PR00+0000 a PR14+0000 y Sector Caparrapi - La Aguada PR19+0000 a PR35+0895, vía 5008B1, sector el Curapo-cruce Quebrada Negra -Tunel de la Abuela.



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE OBRA COLMATADA - PR 32+0900



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CALZADA - PR 08+0221



VÍA 50CN01 - LIMPIEZA DE CUNETAS - PR 08+0510

MICROEMPRESA 2: RIONEGRO: Vía 5604, Sector PR00+0000 a PR19+0500 y PR21+0500 a PR24+0500



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS- PR 18+0950



VÍA 5604- DESMONTE MANUAL- PR 19+0150



VÍA 5604- LIMPIEZA DE CUNETAS- PR 23+0700

ADMINISTRACIÓN VIAL



REUNIÓN PREVIA PARA CAPACITACIÓN MES DE ABRIL



CAPACITACIÓN MES DE ABRIL



INTEGRACIÓN ABRIL AMV Y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
