INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
COMUNICACIONES - RECIBIDAS
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE:
Radicado: **10-812-2024-017377**
Fecha: 25/11/2024 - 07:41 AM
Remitente: TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S
Destinatario: NICOLAS SUAREZ CASALLAS
No.Folios: 2 Anexos: 17

Bogotá, D.C., 21 de noviembre de 2024. CO-026-TCI-IPES-INTER-QUIRIGUA

Señores:
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
Supervisora contrato

Referencia:

CONTRATO INTERVENTORIA No. No. C01.PCCNTR.5333353
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL"
CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.5291236
OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Asunto: **SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5291236 Y CONTRATO C01.PCCNTR.5333353**

Cordial saludo:

Una vez realizado todas las actividades que el contratista describe en su comunicado PCLPIPES11 -38, en el que se evidencia que se cumplió con todos los requerimientos de los términos de referencia para el inicio de obra, es importante mencionar que el día 13 de Noviembre se hacen presentes en las instalaciones de la Plaza de Mercado Distrital PDM Quiriguá el Director Wilfredo Grajales, la subdirectora María Andrea Solano y su equipo de trabajo junto con los ingenieros encargados de gestionar la obra,(Contratista de obra Consorcio Construir SERSAM e interventoría Técnicas colombianas de ingeniería SAS), con el fin de realizar la presentación del proyecto de cambio de cubierta de la plaza de mercado de Quiriguá.

De acuerdo a las intervenciones realizadas por parte de los comerciantes, cuerpo directivo del IPES, contratista e interventoría concluyen que se realizará una votación con el fin de determinar la fecha de inicio de la obra. Teniendo en cuenta los resultados de la votación solicitada por los comerciantes y avalada por la entidad, Instituto para la Economía Social (IPES), realizada el día sábado 16 de Noviembre de 2024; estuvo bajo la veeduría de los comerciantes Ciro Vega, Fanny Osorio, Karol Vanessa Baquero y por parte de la entidad los coordinadores Andrés Castellanos, Luis Fernando Mora, Administradora Paola Ardila Rubio, Profesional de Mercado Ángelo Miguel Cárdenas y profesional Ambiental Katherine Becerra Sarmiento donde se obtuvieron los siguiente resultados:

1. ¿Se continua con la ejecución de la obra? 28 votos
2. ¿Se suspende el contrato y se inicia obra el día 15 de enero de 2025? 47 votos

Dada esta mayoría de votos por la suspensión del contrato y en base a los acuerdos consignados en el acta del día 13 de noviembre de 2024, solicitamos que el contrato sea

suspendido hasta el día 15 de enero de 2025 ya que no existen las condiciones para la continuación de la ejecución del contrato.

De lo anterior vemos viable una suspensión del contrato hasta el día 15 de enero de 2025 esperando que existan las condiciones para el reinicio del contrato y en este sentido solicitamos a la entidad estudie el tema ya que se tendrían que suspender los contratos de obra y de interventoría, para cual solicitamos a la entidad nos otorgue esta solicitud

Cordialmente,

ING. MIGUEL EFRAÍN ROSERO POLO
ESP. EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN ESTRUCTURAS. MSC INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMICA

Anexo 19 (10102)

Carrera 26 A # 62-21
Teléfono: (57-1) 2 48 45 03
Celular: (57) 314 411 36 45
Bogotá – Colombia

Bogotá, 21 de noviembre 2024 PCLPIPES11 -38

Señores:
TECNICA COLOMBIANA DE INGENIERIA S.AS
Ing. Miguel Efraín Rosero

Asunto: solicitud de suspensión al Contrato CO1.PCCNTR.5291236

Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.5291236 que tiene por objeto "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL"

La presente comunicación tiene como objetivo manifestar la necesidad de realizar una suspensión al contrato de obra de la referencia por las siguientes razones:

- El día 30 de octubre de 2024 se realiza una reunión de socialización donde hacen presencia en las instalaciones de la Plaza Distrital de Mercado Quiriguá los Contratistas del consorcio de la obra, la subdirectora de la Subdirección de emprendimiento de servicios empresariales y comerciales junto con los ingenieros, arquitecto, apoyo a la administración y administradora de la plaza, con el fin de iniciar la socialización con los comerciantes de la primera fase a intervenir para el cambio de cubierta y comunicar la nueva modalidad que se va a tener para realizar este proceso, por lo anterior se les indica que se maneará la forma de ANDAMIOS TIPO PASARELA en cual va a evitar mover al comerciante a otras secciones de la plaza y así interrumpir sus labores en la época decembrina, Así mismo se les informa que la obra dará inicio el 15 de noviembre 2024 con una duración de dos meses, finalizando de esta manera el 15 de enero de 2025. Esta actividad se realizó solo con los comerciantes de la primera etapa de intervención de acuerdo al acta de reunión del día 30 de octubre de 2024 y donde los comerciantes firmaron el acta de reunión y aceptaron las condiciones expuestas.

- El día 5 de noviembre 2024 se firma acta de inicio teniendo en cuenta que los comerciantes de la primera fase habían aceptado las condiciones que fueron expuestas en la reunión de socialización del día 30 de octubre de 2024.

- El día miércoles 6 de Noviembre de 2024 hizo presencia en la plaza la profesional social Mayerly Reyes y el Residente Técnico, ingeniero Geovani Beltrán, por parte del Consorcio Construir SERSAM, con el acompañamiento de Jorge Zambrano en representación de la administración de la plaza, se realizó la entrega de los volantes informativos No 1 Información para el levantamiento de las actas de vecindad, actividad que se indicó a los comerciantes iniciaría el día 8 de noviembre de 2024.

  Durante la distribución de volantes se presentaron varios interrogantes sobre la intervención a realizar, los cuales fueron atendidos por la parte técnica, sin embargo, algunos comerciantes manifestaron que a ellos se les había dicho que el inicio de las obras seria en el mes de enero de 2025 y que ellos no estaban de acuerdo que estas obras se iniciaran en época decembrina por que se verían afectadas sus ventas ya que a pesar que se fuera a instalar una plataforma esto producía un efecto de temor a los compradores, al igual que los elementos soportes de estas plataformas producirían una interrupción en los pasillos, frente a esta inquietud se les aclaro que durante la socialización que había hecho el IPES en compañía del contratista e Interventoría, se había dejado claro que la fecha de inicio de intervenciones era el 15 de noviembre de 2024 y que la plataforma no presentaba ningún riesgo para los usuarios de la plaza , a pesar de estas explicaciones algunos comerciantes se negaron a firmar la planilla donde se evidenciaba la entrega del comunicado de la actividad de actas de vecindad. Al finalizar esta actividad se conoció un audio de parte de un comerciante, donde le sugería a sus compañeros no firmar

ningún documento hasta que la entidad les mostrara las pólizas de cumplimiento y que se realizara una socialización a todos los comerciantes de la plaza donde se informara todas la implicaciones del contrato respecto a su ejecución, tiempos de duración y fecha de inicio.

- El día viernes 8 de Noviembre del año en curso, con el objetivo de iniciar el levantamiento de actas de vecindad por locales, los profesionales del Consorcio Construir SERSAM (Social y Técnico) hicieron presencia en la plaza donde se reunieron con la administradora Paola Ardila y con Jorge, una vez en la oficina la administradora Paola Ardila informó que había seguido la divulgación de audios y mensajes donde le reiteraban a los comerciantes que no se fuera a firmar ningún tipo de documento hasta que no se hiciera la respectiva socialización con todos los comerciantes de la plaza y se mostraran las pólizas del contrato, a pesar de esto se dio inicio a la actividad en el local de Artesanías Raquireña donde la señora Rosa Vergel accedió a que se realizara el acta de vecindad, en los siguientes locales no fue posible realizar esta actividad ya que los comerciantes no estaban en disposición de dejar hacer las actas de vecindad hasta que no fueran atendidas las solicitudes que le estaban haciendo al IPES en cuanto a la realización de la socialización del proyecto a todos los comerciantes (con presencia de IPES, Contratista e Interventoría) en la que se muestren las pólizas, que garanticen que las obras sí se realizarán completamente, en virtud de lo descrito, el personal del contratista no pudo continuar con la actividad.

- El día 13 de Noviembre se hacen presentes en las instalaciones de la Plaza de Mercado Distrital PDM Quiriguá el Director Wilfredo Grajales, la subdirectora María Andrea Solano y su equipo de trabajo junto con los ingenieros encargados de gestionar la obra,(Contratista de obra Consorcio Construir SERSAM e interventoría Técnicas colombianas de ingeniería SAS), con el fin de realizar la presentación del proyecto de cambio de cubierta de la plaza de mercado de Quirigua

De acuerdo a las intervenciones realizadas por parte de los comerciantes, cuerpo directivo del IPES, contratista e interventoría concluyen que se realizará una votación con el fin de determinar la fecha de inicio de la obra

- Teniendo en cuenta los resultados de la votación solicitada por los comerciantes y avalada por la entidad, Instituto para la Economía Social (IPES), realizada el día sábado 16 de Noviembre de 2024; estuvo bajo la veeduría de los comerciantes Ciro Vega, Fanny Osorio, Karol Vanessa Baquero y por parte de la entidad los coordinadores Andrés Castellanos, Luis Fernando Mora, Administradora Paola Ardila Rubio, Profesional de Mercado Ángelo Miguel Cárdenas y profesional Ambiental Katherine Becerra Sarmiento donde se obtuvieron los siguiente resultados:

    1- Se continua con la ejecución de la obra? **28 votos**
    2- Se suspende el contrato y se inicia obra el día 15 de enero de 2025? **47 votos**

Dada esta mayoría de votos por la suspensión del contrato y en base a los acuerdos consignados en el acta del día 13 de noviembre de 2024, solicitamos que el contrato sea suspendido hasta el día 15 de enero de 2025 ya que no existen las condiciones para la continuación de la ejecución del contrato y a la fecha hemos perdido 15 días desde la firma del Acta de Inicio; sin poder realizar ninguna actividad de la parte social ni de ejecución de obra. Esta suspensión y la pérdida de tiempo no es atribuible al contratista.

Hacemos claridad que la obra se reiniciara bajo las condiciones técnicas que la entidad ordene ejecutar con sus respectivas implicaciones financieras a la realización del contrato.

Adjuntamos archivos

Plaza Quirigua socialización de obra 16-11-2024 17.21 pdf
JORNADA DE VOTACION-PDM QUIRIGUA.pdf

Atentamente,

YOLANDA PERICO
REPRESENTANTE LEGAL

Tema: SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN OBRA CAMBIO DE CUBIERTA PDM QUIRIGUA

Lugar: PDM QUIRIGUA	Fecha: 13-11-2024	Hora inicial: 3:00pm Hora Final: 5:30pm

Objetivo: Realizar la socialización y presentación de la obra que se tiene prevista realizar en la PDM Quirigua con los comerciantes.

Desarrollo:

Siendo las 3:15 pm se hacen presentes en las instalaciones de la Plaza de Mercado Distrital PDM Quirigua el Director Wilfredo Grajales, la subdirectora María Andrea Solano y su equipo de trabajo junto con los ingenieros que serán los encargados de gestionar la obra,(Contratista de obra Consorcio Construir SERSAM e interventoría Técnicas colombianas de ingeniería SAS), con el fin de realizar la presentación del proyecto de cambio de cubierta que se tiene prevista, debido a que la cubierta que se encuentra actualmente en la plaza de mercado es de material de asbesto la cual es perjudicial para la salud y no cumple con la normatividad vigente.

De acuerdo a lo anterior se inicia la socialización del proyecto con la participación de 37 comerciantes, en este espacio se abordaron los siguientes temas:

- Bienvenida y presentación de expositores
- Intervención del IPES
- Presentación del proyecto cambio de cubierta Plaza de Mercado Quirigua
- Metodología de Ejecución: Andamios Tipo Pasarela.
- Espacio para preguntas y respuestas de los comerciantes de la primera etapa.
- Definición de las actividades a realizar
- Cierre de la presentación del proyecto.

Se socializa a través de un render que dentro del proceso constructivo para la intervención del cambio de cubierta se ejecutaran las siguientes actividades: desmonte de teja de asbesto, desmonte de cerchas e instalación de anclajes en viga canal, instalación de perfilería estructural y finalmente instalación de teja arquitectónica y montaje de elementos eléctricos. Se

Por otro lado, se informa que la obra tiene una duración de 8 meses la cual se ejecutará en 4 fases; cada una de las tendrá una duración aproximada de 2 meses

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

para lo cual se utilizarán andamios tipo pasarela con el fin de no trasladar a los comerciantes a otras zonas de la plaza de mercado y así garantizar que estos puedan continuar con su actividad comercial sin interferencias.


De acuerdo a las intervenciones realizadas por parte de los comerciantes, cuerpo directivo del IPES, contratista e interventoría concluyen que se realizaran las siguientes actividades con el fin de determinar el inicio de la obra:

Se realizará una votación según sugerencia de los comerciantes, con la cual se definirá la continuidad de la obra en el mes de noviembre de 2024 o se suspenderá el contrato y se reiniciará el mismo a partir del 15 de enero de 2025.


La encuesta propuesta contiene las siguientes preguntas:
¿Se continua con la ejecución de obra? SI/NO
¿Se suspende el contrato y se inician obras el día 15 de enero de 2025? SI/NO

El día viernes 15 de noviembre de 2024 se socializará la respectiva acta de reunión de reunión de inicio del proyecto a cada comerciante de la plaza de mercado Quirigua, en la cual llevará adjunto el acta de inicio TCI Interventoría, acta de inicio Consorcio CONSTRUIR SERSAM,

El día sábado 16 de noviembre de 2024 los comerciantes realizarán las votaciones en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

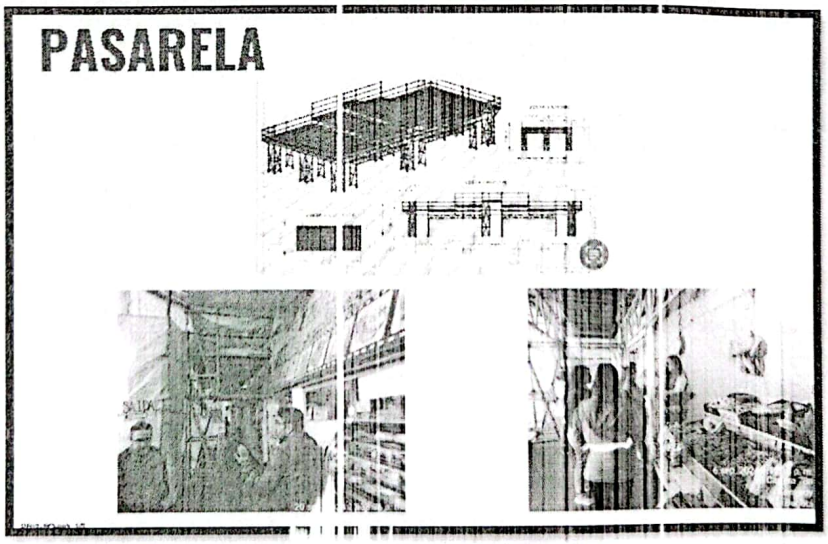

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

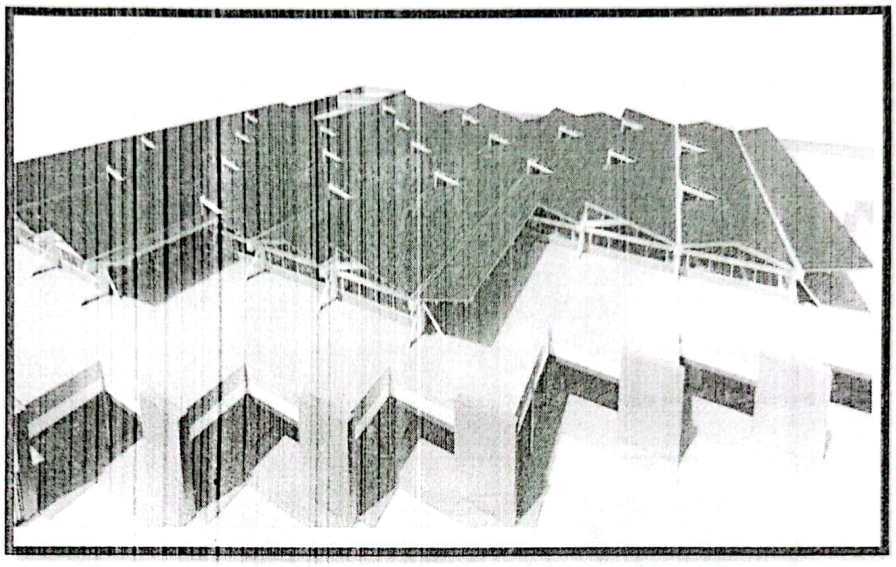


Así mismo, se informa a los presentes que la obra debe realizarse en la vigencia del año 2024, dando inicio a más tardar a finales del mes de noviembre del año en curso, en virtud de que el presupuesto asignado para la obra (aprobado desde la vigencia de 2023) de no ejecutarse se puede perder.

Los comerciantes reconocen la urgente necesidad que tienen de la obra y manifiestan estar de acuerdo con su realización, pero no iniciando este año 2024 en los meses de noviembre y diciembre, dada la gran afectación comercial que sufrirían, teniendo en cuenta la temporada navideña y la compra de productos que ya han hecho para ello. Proponen entonces que la obra inicie en enero de 2025, el día que el IPES considere conveniente.

Es importante destacar que los comerciantes manifiestan que, si desean que se ejecute la obra, teniendo en cuenta que ésta representa un beneficio para ellos, sin embargo, solicitan que la misma no se inicie este año sino no a partir de enero de 2025. Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, una vez escuchadas las inquietudes y propuestas de los comerciantes se decide en consenso realizar una votación con cada uno de los comerciantes que tienen puestos dentro de la plaza de mercado con el fin de definir si el proyecto del cambio de cubierta se iniciará en el mes de noviembre del presente año, o en el mes de enero 2025 aclarando por parte de los directivos del IPES que no se garantizan que los recursos estén aprobados para la próxima vigencia, ni la opción de la plataforma tipo pasarela, por lo que los comerciantes tendrían que ser reubicados temporalmente en otras secciones disponible de la plaza de mercado.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

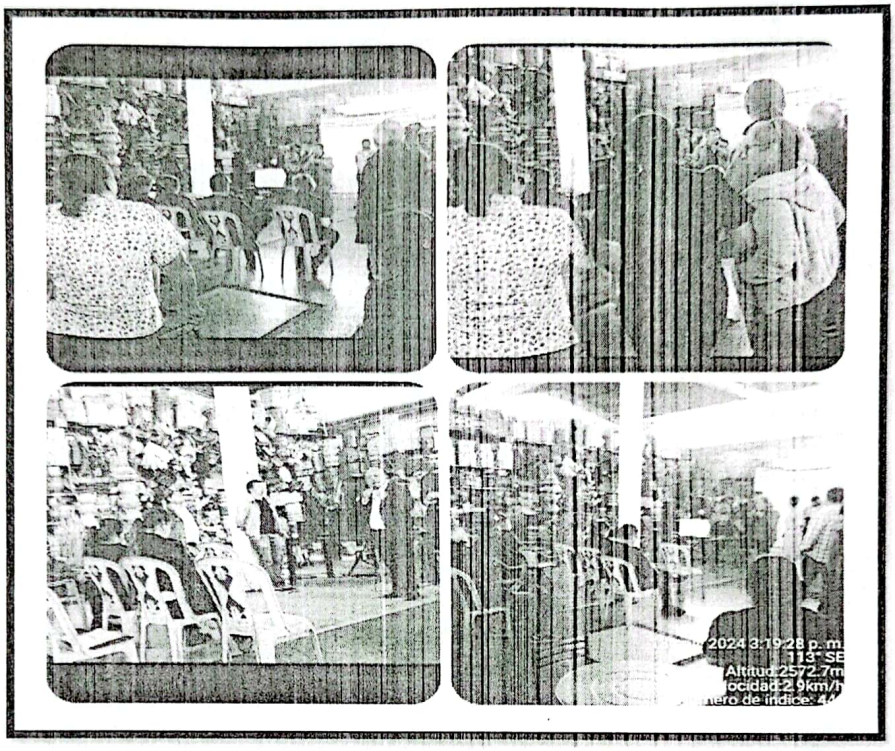

Se socializa con los asistentes que en los siguientes enlaces pueden encontrar toda la información referente al proyecto de obra del cambio de cubierta de la plaza Quirigua, la cual es una información de carácter público, por lo cual todos los ciudadanos pueden acceder a dicha información.

CONTRATO DE OBRA:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4659875&isFromPublicArea=True&isModal=False

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4753134&isFromPublicArea=True&isModal=False

LINK PÓLIZAS

De acuerdo a las intervenciones realizadas por parte de los comerciantes, cuerpo directivo del IPES, contratista e interventoría concluyen que se realizaran las siguientes actividades con el fin de determinar el inicio de la obra:

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

1- Se realizará una votación según sugerencia de los comerciantes, con la cual se definirá la continuidad de la obra en el mes de noviembre de 2024 o se suspenderá el contrato y se reiniciará el mismo a partir del 15 de enero de 2025.

La encuesta propuesta contiene las siguientes preguntas:

- ¿Se continua con la ejecución de obra? SI/NO
- ¿Se suspende el contrato y se inician obras el día 15 de enero de 2025? SI/NO

2- El día viernes 15 de noviembre de 2024 se socializará la respectiva acta de reunión de inicio del proyecto a cada comerciante de la plaza de mercado Quirigua, en la cual llevará adjunto el acta de inicio TCI Interventoría, acta de inicio Consorcio CONSTRUIR SERSAM,

3- El día sábado 16 de noviembre de 2024 los comerciantes realizarán las votaciones en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Finalmente se reitera que, una vez realizado el conteo de votos, se define que el proyecto inicie en enero del 2025, no se garantizan los recursos para la ejecución del mismo ni la opción de la plataforma tipo pasarela, por lo que los comerciantes tendrían que ser reubicados temporalmente en otras secciones disponible de la plaza de mercado.

Se da por terminada la socialización siendo las 5:53 pm

Decisiones	Responsables	Fechas

Compromisos	Responsables	Fechas

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Edgar Romero			3015088813	
LISANDO Espinosa.			3124783118	
Aurelio Sepulveda Basaldua			3106800498	
RUBEN Sanchez			311-838-6922	
Rosa Maria Gaona			3118682880	
Juan Felipe Rivera			3114914887	
Rosa maia Cano			3215481117	
Alvaro Torres Angulo			3142628043	
Andres Cortes			3134331839	
Jorge Ivan Rodriguez			3015805215	
[illegible]			3125426476	
Ciro Vega			3115141381	

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

✓	Alice		3118094222	
✓	José Guerrero		3008147562	
✓	Isabel Salam		21003368	
✓	Sanny		5758099	
✓	Yenma		5176072	
✓	Jhon Castellanos.		1019.008.413	
✓	Carolina Roa		1014254665	Carolina Roa
✓	Matthu Gabau		3105864863	
✓	Nestor Gonzalez		3125561849	
✓	Alfredo Ramos		3203630081	
✓	Adriana Acevedo		3715505652	Adriana A
✓	Karol Boquero		3115505652	~~Karol B~~
✓	Luz Quintero		3115505652	~~Luz Q~~

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

NOMBRE	CC O NIT	TELEFONO	FIRMA
[illegible]	40.022741	local.	189
Samuel Bohórquez	4'129635	1 y 2	
Anderson Mauricio Parra	1.053764567	155/156	
Ignacio PADILLA	79'236763	120-178	
YOLANDA TORRES.	39544397	Local 120-160	
Griselda Sanchez.	41799223.	local 116-115 114-106-151	
Amanda Rusinque	2'327705	19	
Flor Herrera	1053684321	129-131-132	Flor Herrera.
Rosa María Gaviria	23637281.	130 - 129 - 100.	
Luis Alberto Hernandez	3226106	67 68	
[illegible]	52343856	83-84-95-3104326075	
Elvira Bala.	40031422.	082.	3192074130 Elvira balón
Mayra Gladys Rol	152 y	153	3115817227

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA
[illegible]	20.367.799	3144802282	[signature]
Ana lucia celeida			
Amparo Roto	41'596420		Amparo Roto
José Tomas			José Tomas Romero.
[illegible]	11638882		[signature]
Sara	38286695		[signature]
Diana Garcia	1014211215		[signature]
[illegible]	3107934076		[signature]
luis carlos S.	1019056139.	3114467670	luis carlos Sanchez
MARGARITA GUEVARA	41630802	3212302605	MARGARITA GUEVARA.
Glma Soler	52.199.258	3141227168	Glma soler Moreno
MARIA DEL TRANSITO	41315626	3203922345	CRISTIAN N.
Jacqueline Garcia.	1007153095	3115052315	Jacqueline.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA	
Luz Marina Mori.		313 259 05 54		
Jefferson Jesid		313 2590554		
Alexandra		313 8150143		
[illegible]	1776361	3118736996		
Ashid Gl		300 3806[illegible]		
Luis Sarabia	1128018O	-		
OFELIA ESCOBAR		3207610281		
Andres Mauricio Castellanos C	1020755587	3114773157		
[illegible]	80055583	3133094474		
Luis Ramon de Mora R	80176956	310-482-2019		
Paola E Adlar	1014907-1	3115708122		

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

NOMBRE			CEDULA	FIRMA
Gladys Armenta			52338212	
Angelica Diaz			39622258	
Mª BLANCA MUÑOZ			41.511.165 Bta	
Maritelmira Aucket			41'302.197	
Wilfredo Aldana			79059678	
Maria Dory Franco			52052754	
Ismeo fon			41718086	
Jenny Patricia Tobar			52327880 Bta	
Pedro Luis Castro			10'500.668	
Ermes Pinzon				Ermes
Gladys Muñoz			24.192.284	
Diosila Cruz			3	
Angie Catalina Gomez.			1019058463.	

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Tema: JORNADA DE VOTACION Y CONTEO PARA DECISIÓN DE PROYECTO DE OBRA CAMBIO DE CUBIERTA PDM QUITIGUA

Lugar: PDM QUIRIGUA	Fecha: 16-11-2024	Hora inicial: 2:00pm Hora Final: 4:00pm

Objetivo: Realizar la socialización y presentación de la obra que se tiene prevista realizar en la PDM Quirigua con los comerciantes.

1. Saludo
2. Jornada de Votación
3. Conteo de Votos
4. Decisión
5. Despedida

Desarrollo:

Siendo las 2:00 pm se inicia con la jornada de votación con los comerciantes de la Plaza de Mercado Distrital Quirigua con el fin de determinar el mes en que va a dar inicio el proyecto del cambio de cubierta, en la cual los comerciantes pudieron votar por las siguientes opciones:

1- Se continua con la ejecución de la obra?
2- Se suspende el contrato y se inicia obras el día 15 de enero de 2025?



Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023



Siendo las 4:00 pm se hace cierre a la jornada de votación, y se procede a realizar el conteo respectivo en compañía de los veedores de los comerciantes el señor Ciro Vega, Fanny Osorio, Karol Vanessa Baquero y por parte del Instituto para la Economía Social IPES, los coordinadores Andrés Castellanos, Luis Fernando Mora, Administradora Paola Ardila Rubio, Profesional de Mercado Ángelo Miguel Cárdenas y Profesional Ambiental Katherine Becerra Sarmiento. Determinando la siguiente decisión:

Powered by CamScanner



1- Se continua con la ejecución de la obra?: **28 votos**
2- Se suspende el contrato y se inicia obras el día 15 de enero de 2025?: **47 votos**

Para un total de 75 comerciantes que participaron en la jornada de votación.

Por otro lado se contrarresta con las firmas del acta de la socialización y se evidencia que 4 comerciantes no firmaron la respectiva acta por la que no se tendrán en cuenta en el conteo respectivo. Sin embargo se aclara que los que no firmaron habían votado por que se realizará la obra en diciembre por lo que no se altera la decisión tomada para que la obra se realice el 15 de enero 2025.

Se da por terminada la jornada siendo las 4:50 pm

Decisiones	Responsables	Fechas

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
CIRO VEGA	COMERCIANTE	Vegaciro7@gmail.com	3115141381	
Angelo Cadena	IPES	Yeiro1@hotmail.com	3133099474	
Paola Adiar	IPES SESEC	Pdmarquez@ipes.gov.co	3115708122	
Andres Mauricio Castellanos C	IPES SESEC	amcastellanosc@ipes.gov.co	3114773157	
Luis Fernando Mora Rodriguez	IPES SESEC	lfmoral@ipes.gov.co	3048620019	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			

Calle 19 N° 10-44
PBX (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
EMPRENDIMIENTO
Instituto para la Economía Social

Powered by CamScanner
