ESTABILIZA
ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTÉCNICAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 216

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081461834 que habilita desde FE 212 hasta FE 500. Vence 2025-10-12

ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTECNIC

Nit 900843037 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7110 10.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
NIT	800223337 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 49 No 44 - 94	Medellín	3004466058

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA, CONTRATO : CO 82 DE 2024, ACTA DE CORTE # 6, C.C 1163. PROFESIONAL B: JULIAN MORENO VELASQUEZ

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2024	18/12/2024	ORIN DE LOS REYES TORRES HERNAND	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
147	EJECUCION DE PERFORACIONES E INSTALACION DE INCLINOMETROS PARA EL SISTEMA MONITOREO POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN EDU 20242013861 19-11-2024	1	1	Und.	12.125.000	19%	2.303.750	12.125.000

Valor en Letras 1

TRECE MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.125.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.303.750**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.428.750**
RETEFUENTE	**727.500**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**13.701.250**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2024 17:07:09

CALLE 36 NO. 82A -21 Teléfono 3223519 Medellín

Correo Electrónico

CUFE: 2e1a056c6d87f117bb1e59a215ba964c1209d983cd504631269c5d72a6693a13cbc092f93b5ff7cd5b40bf5db5197b94--Expedición:18/11/2024 05:42 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE FACTURACION ELECTRONICA**		
Código:	Versión:	Fecha:	Página 1

CONTRATISTA: ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTECNICAS S.A.S.

CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NUMERO	AÑO
	CONSULTORÍA	CO 82 DE 2024	2024

OBJETO: EJECUCIÓN DE PERFORACIONES E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETROS PARA EL SISTEMA MONITOREO POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

PERÍODO DESDE: 19 de octubre de 2024 HASTA: 18 de noviembre de 2024

VALOR FACTURA: $ 14,428,750

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato, po tal motivo se autoriza la generacion de la factura electronica

Para constancia se expide el presente certificado el lunes 18 de noviembre, 2024

Julián Moreno Velásquez	
PROFESIONAL	**PROFESIONAL: FIRMA**
Diana Arenas Hernandez	
APOYO A LA SUPERVISIÓN (cuando aplique)	**APOYO A LA SUPERVISIÓN: FIRMA**

edu® Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**		
Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18	Página 1 de 2

CONTRATISTA: ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTECNICAS S.A.S.

No DEL CONTRATO: CO 82 DE 2024

OBJETO: EJECUCIÓN DE PERFORACIONES E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETROS PARA EL SISTEMA MONITOREO POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

PERÍODO DESDE: 19 de octubre de 2024 HASTA: 18 de noviembre de 2024

EN DESARROLLO DEL CONVENIO No: CI 101299 de 2024

VALOR PAGO: $ 14,428,750

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato.

Certifico que he recibido el correspondiente informe Parcial

De conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones $ 14,428,750

82

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la presente cuenta.

Disponibilidad	Compromiso	Nro. Factura/Cta. Cobro	Valor
551	82	FE 216	$ 9.532.922
853	15849	FE 216	$ 4.895.828

Para constancia se expide el presente certificado el Lunes 18 de noviembre, 2024

SUPERVISOR

Nota: En los casos que se requiera el supervisor del contrato tiene la potestad de definir la firma o visto bueno de los apoyos necesarios (apoyo a la supervisión o administrativo del convenio…).

edu® Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**		
Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18	Página 2 de 2

RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTO	FONDO	DP	CP	VALOR
23SNE0020346010301-2350205	CI 101299 de 2024		551	82	$ 9.532.922
23SNE0020346010301-2350205	CI 101299 de 2024		853	15849	$ 4.895.828.

Empresa de Desarrollo Urbano Municipio de Medellín	Contrato Nº: CO 82 de 2024	Contratista:	Interventor	Profesional B	ACTA Nº: 6
	Objeto: "EJECUCIÓN DE PERFORACIÓNES PARA LA INSTALACIÓN DE INCLINOMETROS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DEL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA- COMUNA 13 EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	ESTABILIZA SAS	GEOGAM S.A.S	JULIAN MORENO VELASQUEZ	
		Representante Legal	Representante Legal	Apoyo a la Supervisión	Período de facturación
		DANIEL E. HERNÁNDEZ ATENCIO	MARCO FIDEL GAMBOA R	DIANA ARENAS	
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	V/Inicial: $ 265.171.884	V/Adición Nº 1: $ 57.517.223	Otrosí V/Adición Nº 1:	V/Final: $ 322.689.107	
	V/Anticipo: $ -	Plazo Adicional Nº 1:		Plazo Final: 243 días	19/10/2024 - 18/11/2024
	Plazo Inicial: 243 días				

Condiciones Originales del Contrato						Modificación de Cantidades		Condiciones Actualizadas		Acta Nº 1		Acta Nº 2		Acta Nº 3		Acta Nº 4		Acta Nº 5		Acta Nº 6 (presente acta)		Acumulado Contratual		Saldo Contractual	
Item	Descripción	Un	Cant	V/Unitario	V/Parcial	+	-	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor
1	SUELOS																								
1,1	EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO																								
1,1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	día	2,00	$ 722.808	$ 1.445.616			2,00	$ 1.445.616	1,00	$ 722.808	0,0	$ -	0,0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,0	$ 722.808	1,0	$ 722.808
1,1,2	Servicio de perforación de barrenos en material fino granular. Incluye Mano de obra, materiales y equipos. Los consultores en conjunto con la interventoría determinaran el tipo de exploración a desarrollar. Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica.	m	200,00	$ 105.000	$ 21.000.000	13,33		213,33	$ 22.399.650	53,00	$ 5.565.000	86,7	$ 9.100.350	73,7	$ 7.734.300	0	$ -	0	$ -	0	$ -	213,3	$ 22.399.650	0,0	$ -
1,1,3	Servicio de perforación de barrenos en material denso o rocoso . Avance con barrena NQ e n material tipo suelo o con fragmentos de roca. Incluye Mano de obra, materiales. Los consultores en conjunto con la interventoría determinaran el tipo de exploración a desarrollar.Este ítem incluye los demás requerimientos	m	100,00	$ 190.000	$ 19.000.000	6,67		106,67	$ 20.267.300	26,50	$ 5.035.000	43,3	$ 8.233.333	36,8	$ 6.998.967	0	$ -	0	$ -	0	$ -	106,7	$ 20.267.300	0,0	$ -
1,1,4	Suministro e instalación de tubería ABS 70mm. Snap Seal	m	300,00	$ 249.900	$ 74.970.000			300,00	$ 74.970.000	56,00	$ 13.994.400	148,0	$ 36.985.200	89,5	$ 22.366.050	0	$ -	0	$ -	0	$ -	293,5	$ 73.345.650	6,5	$ 1.624.350
1,1,5	Tapón superior e inferior para tubería ABS de 70mm	un	10,00	$ 278.460	$ 2.784.600			10,00	$ 2.784.600	2,00	$ 556.920	5,0	$ 1.392.300	3,0	$ 835.380	0	$ -	0	$ -	0	$ -	10,0	$ 2.784.600	0,0	$ -
1,1,6	Instalación de inclinómetro hasta 30 m de profundidad: Incluye suministro de cemento, fabricación de lechada, elemento de protección en mampostería, tapa de acero y candado.	un	10,00	$ 874.650	$ 8.746.500			10,00	$ 8.746.500	1,00	$ 874.650	6,0	$ 5.247.900	3,0	$ 2.623.950	0	$ -	0	$ -	0	$ -	10,0	$ 8.746.500	0,0	$ -
1,1,7	Lectura inicial de los inclinómetros instalados	un	10,00	$ 1.049.580	$ 10.495.800			10,00	$ 10.495.800		$ -	5,0	$ 5.247.900	2,0	$ 2.099.160	3,00	$ 3.148.740	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 10.495.800	0,00	$ -
1,1,8	Transporte, lectura e informe de campo para seguimiento sobre los inclinómetros instalados.	un	10,00	$ 999.600	$ 9.996.000			10,00	$ 9.996.000		$ -		$ -	3,0	$ 2.998.800	7	$ 6.997.200	0	$ -	0	$ -	10,0	$ 9.996.000	0,0	$ -
1,1,9	Lecturas semanal de seguimiento periódico de los 10 inclinómetros instalados durante 6 meses. Incluye informe de campo de la instrumentación con los resultado y con concepto geotecnico e interpretación del compartamiento de las excavaciones.	un	24,00	$ 1.600.000	$ 38.400.000			24,00	$ 38.400.000		$ -		$ -	0,7	$ 1.120.000	7,2	$ 11.520.000	4	$ 6.400.000	5	$ 8.000.000	16,9	$ 27.040.000	7,1	$ 11.360.000
1,1,10	Transporte de Equipos. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos.	un	4,00	$ 535.000	$ 2.140.000			4,00	$ 2.140.000	2,00	$ 1.070.000		$ -	2,0	$ 1.070.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	4,0	$ 2.140.000	0,0	$ -
1.1.11	Servicio de REVESTIMIENTO en terrenos heterogeneos suelo o roca. Revestimiento en HWT o similar. Incluye suministro de polimero	ml		$ 288.661	$ -	150,00		150,00	$ 43.299.150		$ -		$ -	118,0	$ 34.061.998	0	$ -	0	$ -	0	$ -	118,0	$ 34.061.998	32,0	$ 9.237.152
1.1.12	Servicio de cementado de perforación para estabilización del frente. Incluye suministro de cemento e inyección del grouting	ml		$ 118.385	$ -	20,00		20,00	$ 2.367.700		$ -		$ -	20,0	$ 2.367.700	0	$ -	0	$ -	0	$ -	20,0	$ 2.367.700	0,0	$ -
1,2	ELABORACIÓN DE INFORMES																								
1,2,1	Informe de instrumentación INICIAL: Desarrollo de informe de resultados e interpretación de lecturas de monitoreo Análisis asociado a l a respuesta del talud-Incluye conclusiones preliminares y recomendaciones de manejo	informe	1,00	$ 1.650.000	$ 1.650.000			1,00	$ 1.650.000		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 1.650.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,0	$ 1.650.000	0,0	$ -
1,2,2	Informe de instrumentación FINAL de lecturas periódicas: Resumen detallado de las lecturas de instrumentación con interpretación geotécnica. Consolida las lecturas acumuladas y se emite concepto geotécnico referente al comportamiento de las excavaciones	informe	6,00	$ 4.125.000	$ 24.750.000			6,00	$ 24.750.000		$ -	0,0	$ -	0,0	$ -	2	$ 8.250.000	1	$ 4.125.000	1	$ 4.125.000	4,0	$ 16.500.000	2,0	$ 8.250.000
1,2,3	Informe de Asesoría técnica para adecuación de la zona intervenida en proceso de retrollenado de acuerdo a recomendación dada en el informe de geotecnia	informe	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000			1,00	$ 2.500.000		$ -	0,0	$ -	0,0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,0	$ -	1,0	$ 2.500.000
1,3	OTROS																								
1,3,1	Celaduría de Equipos. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos.	global	1	$ 4.955.000	$ 4.955.000		1	-	$ -	0,20	$ 991.000	0,5	$ 2.477.500	0,3	$ 1.486.500	-1	-$ 4.955.000	0	$ -	0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -
1,4	ACTIVIDAD ADICIONAL																								
1,4,1	Transporte de personal en camioneta para las labores de perforación e instalación de los inclinómetros. Este transporte incluye todos los movimientos de personal requeridos hasta la instalación de los inclinometros	global	0	$ 4.955.000	$ -	1,00		1,00	$ 4.955.000	0,00	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -	1	$ 4.955.000	0	$ -	0	$ -	1,0	$ 4.955.000	0,0	$ -
Subtotal Valor Básico					$ 222.833.516				$ 271.167.316		$ 28.809.778		$ 68.684.483		$ 87.412.805		$ 29.915.940		$ 10.525.000		$ 12.125.000		$ 237.473.006		$ 33.694.310
% IVA		19%			$ 42.338.368				$ 51.521.790		$ 5.473.858		$ 13.050.052		$ 16.608.433		$ 5.684.029		$ 1.999.750		$ 2.303.750		$ 45.119.871		$ 6.401.919
Costo Total incluido IVA					$ 265.171.884				$ 322.689.106	10,62%	$ 34.283.636	25,33%	$ 81.734.535	32,24%	$ 104.021.238		$ 35.599.969		$ 12.524.750		$ 14.428.750	87,57%	$ 282.592.877	12,43%	$ 40.096.229
Adición No 1					$ 57.517.223																				
Costo Total incluido IVA + Adiciones:					$ 322.689.107																				
Valor a pagar:											$ 34.283.636		$ 81.734.535		$ 104.021.238		$ 35.599.969		$ 12.524.750		$ 14.428.750				

DANIEL E. HERNÁNDEZ ATENCIO
Representante Legal
ESTABILIZA SAS
Contratista

MARCO FIDEL GAMBOA
Representante Legal
GEOGAM S.A.S
Interventoría

DIANA ARENAS
Apoyo a la Supervisión

JULIAN MORENO VELASQUEZ
Profesional B EDU

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**MEMORIA CANTIDADES ACTA DE PAGO**	
Código: F-M-07-008	Fecha de aprobación:	Versión:01

No Contrato:	**CO 82 de 2024**	**MEMORIA N°**	**4,00**
Objeto Contrato	**"EJECUCIÓN DE PERFORACIÓNES PARA LA INSTALACIÓN DE INCLINOMETROS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DEL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA- COMUNA 13 EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"**		
Actividad contractual	**Perforaciones para la instalación de inclinómetros.**		

Especialidad		**Topografía**	**X**	**Geotecnia**		**Hidrologia**		**Modelación Hidraulica**		**Diseño hidráulico**		**Estructuras**		**Pavimentos**		**Ambiental**

GRAFICOS Y/O ESQUEMAS

PLANO DE REFERENCIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD	CANTIDAD COBRADA	ÁREA (m2)	CANTIDAD EJECUTADA
1,1,9	Lecturas semanal de seguimiento periódico de los 10 inclinómetros instalados durante 6 meses. Incluye informe de campo de la instrumentación con los resultado y con concepto geotecnico e interpretación del compartamiento de las excavaciones.	un	24,00	$ 5,00		**16,90**

Instrumento	Lectura 0				Lectura 1			Lectura 2		Lectura 3		Lectura 4	Lectura 5	Lectura 6	Lectura 7	Lectura 8	Lectura 9	Lectura 10	Lectura 11	Lectura 12	Lectura 13	Lectura 14	Lectura 15	Lectura 16	Lectura 17	Total lecturas de seguimiento
	8-jun	6-jul	19-jul	22-jul	6-jul	19-jul	23-jul	22-jul	3-ago	2-ago	3-ago	9-ago	16-ago	24-ago	30-ago	6-sep	13-sep	20-sep	28-sep	5-oct	12-oct	19-oct	26-oct	7-nov	9-nov	
IN01			X			X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						12
IN02			X			X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						12
IN03				X			X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
IN04		X				X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17
IN05		X				X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17
IN06	X				X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17
IN07	X				X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17
IN08	X				X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17
IN09	X				X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17
IN10	X				X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					13

















OBSERVACION:

DANIEL E. HERNÁNDEZ ATENCIO	**MARCO FIDEL GAMBOA**	**DIANA ARENAS**
Elaboró	Aprobó	Visto Bueno

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**MEMORIA CANTIDADES ACTA DE PAGO**	
Código: F-M-07-008	Fecha de aprobación:	Versión:01

No Contrato:	**CO 82 de 2024**	**MEMORIA N°**	**4,00**
Objeto Contrato	**"EJECUCIÓN DE PERFORACIÓNES PARA LA INSTALACIÓN DE INCLINOMETROS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DEL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA- COMUNA 13 EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"**		
Actividad contractual	**Perforaciones para la instalación de inclinómetros.**		

Especialidad		**Topografía**	X	**Geotecnia**		**Hidrologia**		**Modelación Hidraulica**		**Diseño hidráulico**		**Estructuras**		**Pavimentos**		**Ambiental**

GRAFICOS Y/O ESQUEMAS

PLANO DE REFERENCIA

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDAD	CANTIDAD COBRADA	ÁREA (m2)	CANTIDAD EJECUTADA
1,2,2	Informe de instrumentación FINAL de lecturas periódicas: Resumen detallado de las lecturas de instrumentación con interpretación geotécnica. Consolida las lecturas acumuladas y se emite concepto geotécnico referente al comportamiento de las excavaciones	informe	6,00	$ 1,00		4,00

ESTABILIZA
ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTÉCNICAS

Medellín. Noviembre 08/2024 **IN-CL 04-1163-R0**

EDU
INTERVENTORÍA DEL PROYECTO
INGENIEROS
MARCO GAMBOA RAMIREZ
JULIAN MORENO
Cordial Saludo

ASUNTO: Contrato N°4600101299 de 2024: Informe de consolidado de lecturas de instrumentación mensual.

En atención a los compromisos adquiridos, se presenta a continuación el resumen de las actividades llevadas a cabo en el cuarto mes de trabajos en el contrato. El presente documento registra los hallazgos más relevantes en cada una de las actividades contractuales y adicionalmente se reportan los aspectos más representativos.

INFORME CONSOLIDADO DE LECTURAS N°	4
FECHA DE INICIO(AA/MM/DD)	2024-10-08
FECHA FIN (AA/MM/DD)	2024-11-07
MES N°	4

Quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes.

Cordialmente;

DANIEL E. HERNÁNDEZ A-
Representante Legal
E-mail: .gerencia@estabiliza.co
ESTABILIZA S.A.S.
Carrera 80 N° 39-159-Oficina 703
Medellín - Colombia
www.estabiliza.co

ESTABILIZA
ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTÉCNICAS

INCLINÓMETROS ESCOMBRERA	IN-CL 04-1163-R0
CLIENTE: EDU	FECHA :2024-11-07

2. INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA - INCLINÓMETROS

En este capítulo se describen los avances generales de las lecturas de instrumentación y se realiza un análisis global del consolidado de los datos recopilados durante el mes.

2.1. LECTURAS DE LOS INSTRUMENTOS

En la siguiente sección se presentan las lecturas de seguimiento de cada uno de los inclinómetros.

Para el tercer informe consolidado se incluyen las siguientes lecturas:

Tabla 2. Resumen fecha de lecturas

Instrumento	Informe 13	Informe 14	Informe 15	Informe 16
IN01	-	-	-	-
IN02	-	-	-	-
IN03	12/10/2024	19/10/2024	26/10/2024	07/11/2024
IN04	12/10/2024	19/10/2024	26/10/2024	07/11/2024
IN05	12/10/2024	19/10/2024	26/10/2024	07/11/2024
IN06	12/10/2024	19/10/2024	26/10/2024	07/11/2024
IN07	12/10/2024	19/10/2024	26/10/2024	07/11/2024
IN08	12/10/2024	19/10/2024	26/10/2024	07/11/2024
IN09	12/10/2024	19/10/2024	26/10/2024	07/11/2024
IN10	12/10/2024	-	-	-



OBSERVACION:

DANIEL E. HERNÁNDEZ ATENCIO	**MARCO FIDEL GAMBOA**	**DIANA ARENAS**
Elaboró	Aprobó	Visto Bueno
ESTABILIZA SAS	GEOGAM S.A.S	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLÍN

GEO-024-2024

Medellín, 19 de noviembre de 2024.

Ingeniero
JULIAN MORENO
Supervisor contrato CO 83 de 2024
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU

ASUNTO: Aprobación acta de pago 06 ESTABILIZA SAS

Cordial saludo ingeniero,

Por medio de la presente y como consta en el acta de pago 06 de la empresa ESTABILIZA SAS firmada por la interventoría, se aprueba la citada acta del contrato 082 de 2020 por un valor de $ 14,428,750

Quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes.

Marco Gamboa Ramírez
Ingeniero Geólogo. Esp SIG
MSc.Ciencias de la Tierra
300 218 49 94
Calle 24 sur 38-91 apto 410
Envigado- Antioquia

ESTABILIZA
ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTÉCNICAS

NIT.900.843.037 - 4

DANIEL ELIAS HERNANDEZ ATENCIO identificado con cedula de ciudadanía # **10.776.243** de Montería en mi condición de representante legal de **ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTECNICAS S.A.S** identificada con NIT **900.843.037 - 4**, bajo la gravedad de juramento, certifico que nos encontramos a paz y salvo con el pago de la seguridad social y parafiscales en los últimos (6) seis. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ALDRIN DE LOS REYES TORRES HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía #**78.748.686**, y con tarjeta profesional No.**94793 - T** de la Junta Central de Contadores de Colombia,en mi condición de Contador Público de **ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTECNICAS S.A.S** identificada con NIT **900.843.037 - 4**, luego de examinar de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social y parafiscales en los últimos (6) seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Medellín, a los 18 días del mes de noviembre de 2024.

DANIEL ELIAS HERNANDEZ ATENCIO
Representante Legal
Estudios Adecuaciones Geotécnicas s.a.s

ALDRIN TORRES HERNANDEZ
ContadorPúblico
T.P 94793 - T

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-13, 02:58:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73704033

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 13/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTUDIOS Y ADECUACIONES	**Nombre Sucursal**	RIESGO 5	**Código Sucursal**	1
Documento	NI900843037	**Dirección**	CR 80 #39 - 159 OFICINA 415		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3223519		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HERNANDEZ ATENCIO DANIEL ELIAS	**Identificación**	CC 10776243		
Total Afiliados	10	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE


Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007316235	LUIS ADRIAN LEAL URREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.857.760	$ 297.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.857.760	$ 74.400	6,960	$ 1.857.760	$ 129.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.857.760	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.500
CC 1036675363	SARA PINEDA ROLDAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.561.670	$ 249.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.561.670	$ 62.500	6,960	$ 1.561.670	$ 108.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.561.670	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.600
CC 10776243	DANIEL ELIAS HERNANDEZ ATENCIO	01	00														X			0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 650.000	$ 104.000	(EPS010) EPS SURA	$ 650.000	$ 26.000	0,000	$ 650.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000
CC 10776243	DANIEL ELIAS HERNANDEZ ATENCIO	01	00																	0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 650.000	$ 104.000	(EPS010) EPS SURA	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF04) COMFAMA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 11901021	RAFAEL EMILIO MONTERROSA BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1216713015	JHON JAMINTON BEDOYA GONZALEZ	01	00		X															0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.249.336	$ 199.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.249.336	$ 50.000	6,960	$ 1.249.336	$ 87.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.249.336	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.900
CC 15385166	JOSE ANIBAL VALENCIA BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.857.760	$ 297.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.857.760	$ 74.400	6,960	$ 1.857.760	$ 129.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.857.760	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.500
CC 26109799	CLARA INES ATENCIO JIMENEZ	01	03														X			0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 650.000	$ 26.000	0,000	$ 650.000	$ 0	(CCF16) COMFACOR	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000
CC 26109799	CLARA INES ATENCIO JIMENEZ	01	03																	0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 650.000	$ 26.000	0,522	$ 650.000	$ 3.400	(CCF16) COMFACOR	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.400
CC 50919937	OSIRIS INES HERNANDEZ ATENCIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF16) COMFACOR	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 78034511	MANUEL SEGUNDO GALVAN MARQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	6,960	$ 1.750.000	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
CC 78748686	ALDRIN DE LOS REYES TORRES HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.776.526	$ 15.076.526	$ 15.076.526	$ 15.076.526	$ 2.204.400	$ 603.300	$ 833.700	$ 603.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.244.700	$ 0	$ 4.244.700

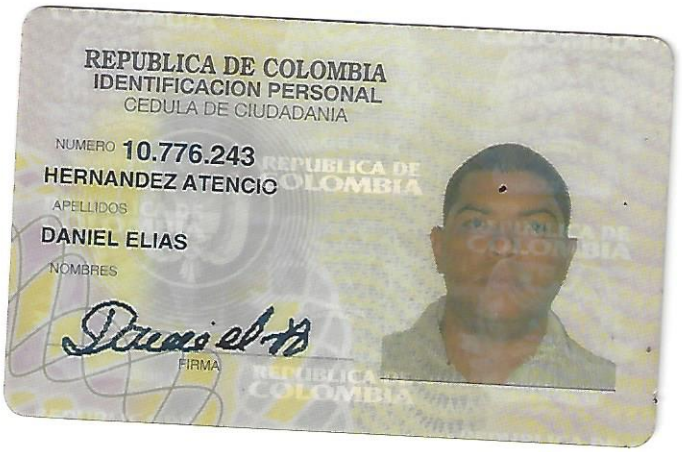
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.776.243
HERNANDEZ ATENCIO
APELLIDOS
DANIEL ELIAS
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1983

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

AB+ G.S. RH

M SEXO

08-MAY-2001 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0100100-00792234-M-0010776243-20160223 0048575722G 1 2091074002

Certificado Bancario

Lunes, 21 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTECNICAS SAS identificado(a) con NIT 900843037, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	00941647391	2015/04/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
