LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE - PCMU DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

JUAN DE JESÚS GUERRERO GOMEZ, identificado con **NIT** No. **19486315**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **CONCURSO DE MÉRITOS CON PRECLASIFICACIÓN No. 4242/2023**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 128.984.000,00 "CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
1131523	C-3302-1603-14-0-3302073-02	A-02-02-02-005-004-02-9	$ 128.984.000,00
T O T A L			**$ 128.984.000,00**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 29 días del mes de noviembre de 2024

EUGENIA SERPA ISAZA
COORDINADOR(A) DEL GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE - PCMu
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4242 DE 2023
REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LOS JARDINES Y ALGUNOS INMUEBLES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INFORME DE DESMONTAJE Y TRASLADO BIENES MUEBLES
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION 2
II. CAPILLA 4
Bienes muebles desmontados y trasladados manualmente 4
Bienes de formato pequeño 4
Bienes de formato mediano 7
Bienes de formato grande 8
Bienes muebles que no se desmontan, ni trasladan 9
III. CIRCULACIONES EXTERIORES 12
Generalidades del procedimiento de desmonte 12
Desmonte de las obras formato pequeño 13
Sagrada familia 13
Busto José del Carmen Acosta 15
Placa conmemorativa 17
Escultura de la Hermana Fundadora 21
Novicia 23
Desmonte de las obras formato mediano 24
Virgen de Lourdes 24
Asunción de la virgen 26
Virgen del Carmen policromada, estanque 29
Desmonte de las obras formato grande 30
Arcángel San Rafael 30
Escultura de la Virgen y el Nino 33
Bienes pendientes por desmontar 37
Campanas y Rosa de los vientos 37
Escultura San José 37
Bombonas de lámparas y material fílmico 38

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com *Teléfonos: 2438799 - 3138451987*

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4242 DE 2023
REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LOS JARDINES Y ALGUNOS INMUEBLES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INFORME DE DESMONTAJE Y TRASLADO BIENES MUEBLES
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

I. INTRODUCCION

El presente documento se desarrolla en el marco de la ejecución del 4242 de 2023 suscrito entre el MINISTERIO DE CULTURA y JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ, cuyo objeto es "Realizar acciones de conservación, desmontaje, traslado y almacenamiento de bienes muebles de los jardines y algunos inmuebles del complejo hospitalario San Juan De Dios"

Los bienes muebles que se atienden bajo este objeto contractual hacen parte de la colección del complejo hospitalario San Juan de Dios, declarado Bien de Interés cultural del ámbito Nacional (BICNAL) por medio de la Ley 735 de 2002, y algunos otros elementos se encuentran declarados Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional por medio de la Resolución 0395 de 2006 "Por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados en el territorio Colombiano" elaborados antes del 31 de diciembre del año 1920 y que de acuerdo con la valoración cultural y patrimonial son bienes culturales muebles de especial interés y representatividad para el país en virtud de los valores histórico, estético y simbólico que revisten

Conforme la información que reposa en el anexo técnico del contrato "…*La colección forma parte integral del conjunto ya que fueron elaborados para el mismo en distintas épocas. Aquellos ubicados en las áreas en espacio abierto, han sido referentes espaciales y culturales en el desarrollo e historia del complejo hospitalario.*

Los ubicados en la capilla, dan cuenta de las actividades religiosas que allí se desarrollaban cuando este inmueble tenía este carácter. En general la colección de bienes muebles forma parte de la trayectoria del Complejo y, por tanto, independientemente de su declaratoria, son bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la Nación…[1]"

En cumplimiento del artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio y Memoria adelanta los procesos tendientes a la

[1] Ministerio de Cultura. (2023). Estudios Previos Definitivos Proceso MC-SA-094-2023

conservación del patrimonio cultural mueble de la Nación para recuperar sus valores y garantizar su preservación en el tiempo.

De acuerdo con las inspecciones realizadas previamente, los bienes objeto de este contrato se encuentran en regular y mal estado de conservación principalmente por afectaciones medioambientales de los bienes que se encuentran en espacios exteriores y no cuentan con mantenimiento periódico. En cuanto a los bienes interiores además de la falta de mantenimiento en algunos bienes se evidencian malas prácticas de almacenamiento, factores que tanto en los bienes expuestos en las zonas exteriores como en las interiores han ocasionado la pérdida y daño de algunos de estos y sus elementos asociados.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante la ejecución del presente contrato se busca la protección y conservación de los bienes muebles del complejo hospitalario por medio acciones de desmontaje, intervención de tipo conservación, embalaje adecuado y almacenamiento con el fin de prevenir daños o pérdidas mayores durante la ejecución de los diferentes estudios e intervenciones de obra civil, arquitectónicas, urbanas y paisajísticas que se realizan actualmente en todo el complejo hospitalario y que se desarrollen en un futuro cercano. Se espera lograr con estas acciones, evitar que, además de empeorar el regular y mal estado de conservación en que se encuentran estos bienes, brindar medidas de protección, considerando que se desconoce el tiempo que estarán embalados estos bienes.

El presente documento contiene el informe de desmontaje de los bienes muebles ubicadas en la Capilla y en las circulaciones exteriores del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y el traslado de los bienes al espacio asignado como taller provisional en el inmueble denominado "Convento" ubicado al interior del mismo complejo, lugar donde se realizarán las acciones de conservación requeridas y, posteriormente se embalaron y guardaron en las respectivas unidades de almacenamiento.

II. CAPILLA

Bienes muebles desmontados y trasladados manualmente

Al interior de la capilla se evidenciaron esculturas cuyo desmonte no requirió ningún tipo de acciones que requieran cortes o maniobras especiales para el traslado.

Los bienes fueron trasladados de manera manual usando guantes, overol y botas de seguridad. Todas las acciones de desmonte y traslado fueron dirigidas por el restaurador de bienes muebles y con el apoyo permanente de dos auxiliares de restauración garantizando la correcta manipulación de cada uno de los bienes y su integridad en el trayecto.

Bienes de formato pequeño

Estos bienes que por sus características de volumen y peso fueron trasladados de manera manual y su manipulación fue realizada por un auxiliar de restauración.

No.	Titulo	Código
1	Vía crucis primera estación: Jesús es condenado a muerte	Capilla_04
2	Vía crucis segunda estación: Jesús con la cruz a cuestas	Capilla_05
3	Vía crucis tercera estación: Jesús cae por primera vez	Capilla_06
4	Vía crucis cuarta estación: Jesús encuentra a su santa madre	Capilla_07
5	Vía crucis quinta estación: Jesús es ayudado por el cirineo	Capilla_08
6	Vía crucis sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús	Capilla_09
7	Vía crucis séptima: estación Jesús cae por segunda vez	Capilla_10
8	Vía crucis octava estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén	Capilla_11
9	Vía crucis novena estación: Jesús cae por tercera vez	Capilla_12
10	Vía crucis décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras	Capilla_13
11	Vía crucis decimoprimera estación: Jesús es clavado en la cruz	Capilla_14
12	Vía crucis decimosegunda estación: Jesús muerto en la cruz	Capilla_15
13	Vía crucis decimotercera estación: Descendimiento de Jesús	Capilla_16
14	Niño Dios	Capilla_37
15	Virgen	Capilla_38
16	José	Capilla_39
17	Pastor con oveja (en el hombro)	Capilla_40
18	Pastor anciano	Capilla_17
19	Hombre a caballo con gaita	Capilla_18

20	Pastor con oveja 2	Capilla_44
21	Aguatera	Capilla_58
22	Pastor con oveja (costado izquierdo)	Capilla_41
23	Campesina holandesa	Capilla_42
24	Pastor anciano	Capilla_43
25	Burro	Capilla_59
26	Escultura novicia	Capilla_45
27	Pila de agua bendita (2 unidades)	Capilla_21 Capilla_21_ER001





Fotografía 1 y 2 Desmonte y traslado bienes muebles de formato pequeño en Capilla





Fotografía 3 y 4 Bienes trasladados de Capilla a espacio de taller de conservación temporal en "Convento"

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***




Fotografía 5 y 6 Bienes trasladados de Capilla a espacio de taller de conservación temporal en "Convento"

Dentro de los bienes de pequeño formato se encuentran las dos piletas de agua bendita adosadas al muro del costado oriental de la capilla, estos dos elementos al estar insertos en el muro fue necesario realizar su liberación para lo que mediante el uso de un cincel pequeño y martillo se eliminó el mortero evidente en el muro, para luego hacer el retiro manual de la misma.





Fotografía 7, 8 y 9 Liberación y desmonte de piletas en capilla y trasladadas al espacio de taller de conservación temporal en "Convento"

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Bienes de formato mediano

Para estas obras de formato mediano como las esculturas de San Juan de Dios y Santo Domingo de Guzmán, el traslado se realizó manualmente por dos auxiliares de restauración.

No.	Titulo	Código
28	Escultura Santo Domingo de Guzmán	Capilla_57
29	Escultura San Juan de Dios	Capilla_03
30	Pila bautismal (¿?)	Capilla_20





Fotografía 10, 11 y 12 Bienes formato mediano en Capilla




Fotografía 13, 14 y 15 Bienes formato mediano en Capilla taller de conservación temporal en "Convento" posterior al traslado

Para el caso de los pedestales en madera de las obras San Juan de Dios y Santo Domingo de Guzmán, estos fueron trasladados también al espacio designado en el convento para ser almacenados allí, aunque estos elementos no hacen parte de los bienes contractuales, se considera importante que se encuentren

almacenados allí para las futuras decisiones de manejo y administración que se den a los mismos.



Fotografía 16 Pedestales trasladados de Capilla a espacio de taller de conservación temporal en "Convento"

De igual forma se realizó el traslado de un tercer pedestal de similares características y material que se encontraba en la capilla sin imagen o escultura sobre ella.

Bienes de formato grande

Para el caso de los elementos de gran formato y cuyo peso era mayor y no es de fácil traslado manual por los auxiliares, fueron descendidos y transportados sobre un carro tipo plataforma pequeño con soporte de 400 Kg, operado por 2 auxiliares de restauración de manera controlada y bajo la dirección del restaurador de bienes muebles

No.	Titulo	Código
31	Mediófono	Capilla_30
32	Armonio	Capilla_31
33	Elementos arquitectónicos	Capilla_56





Fotografía 17 y 18 Elementos arquitectónicos en Capilla trasladados a taller de conservación temporal en "Convento"





Fotografía 19 y 20 Traslado Armonio y Mediofono desde Capilla a taller de conservación temporal en "Convento"

Bienes muebles que no se desmontan, ni trasladan

Se trata de bienes muebles adosados a los muros de la capilla y el retablo mayor que serán protegidos in situ. Dado que, una vez evaluadas las condiciones actuales de implantación de estos bienes no es viable realizar el retiro de los mismos.

Sobre esos bienes se realizarán acciones de conservación in situ, asi como la respectiva protección.

No	CODIFICACIÓN	Identificación	Fotografía de referencia
34	Capilla_19	Querubines conjunto (2)	

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

35	Capilla_01	Retablo mayor en mármol	
36	Capilla_02	Escultura del Sagrado Corazón	
37	Capilla_01_ER001	Evangelistas: San Mateo	
38	Capilla_01_ER002	Evangelistas: San Marcos	

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com *Teléfonos: 2438799 - 3138451987*

39	Capilla_01_ER003	Evangelistas: San Lucas	
40	Capilla_01_ER004	Evangelistas: San Juan	
41	Capilla_01_ER005	Sagrario	
42	Capilla_33	Placa 1	
43	Capilla_32	Placa 2	

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

III. CIRCULACIONES EXTERIORES

Las obras que se encuentran emplazadas en las áreas libres son en su gran mayoría obras escultóricas de bulto redondo de figuras humanas representadas en diferentes formatos, así encontramos imágenes de cuerpo entero, bustos, conjuntos de figuras como es el caso de la Sagrada Familia, adicionalmente encontramos una placa conmemorativa y una pileta.

Una vez definido el traslado de las obras debido al deficiente estado de conservación que en la actualidad la mayoría de ellas presenta producto de la exposición a agentes medioambientales adversos a la materialidad de estas, condiciones que representan un alto riesgo para la estabilidad, integridad y permanencia del conjunto escultórico.

El objetivo del desmonte de estas obras es el de realizar todos los procesos técnicos de conservación preventiva para detener y controlar los factores de deterioro, así como las acciones dirigidas a estabilizar y consolidar aquellas zonas o elementos en riesgo de desprendimiento.

Luego de realzados los tratamientos de conservación se busca realizar el adecuado almacenaje técnico de las obras, almacenaje que se mantendrá hasta tanto se hayan realizado las obras de intervención de los diferentes inmuebles que componen el conjunto hospitalario.

Generalidades del procedimiento de desmonte

La mayoría de los obas se encuentran emplazadas sobre pedestales o hermas a los cuales se hayan fijadas principalmente mediante el uso de morteros de cemento. Exceptuando de estas la escultura de san Rafael, obra ejecutada en metal, la cual se encuentra fijada con el uso de tronillos insertos en la peana.

Otro aspecto a tener en cuenta en el desmonte de las obras lo constituye el tamaño y el material con el cual fueron elaboras, factores que condicionan el peso y la maniobrabilidad de las mismas y que aunado a la altura a la que se encuentran determinaron los requerimientos logísticos para el desmonte.

En estas condiciones que decidió que el desmonte se realizaría iniciando con las obras que podían ser retiradas manualmente sin mayores requerimientos de tipo logístico, así como transportadas por medios básicos como carretilla, hasta el inmueble donde se realizan los procesos de conservación y posterior embalaje.

En general este tipo de obras se encontraban fijadas con morteros de cemento dispuesto en el contorno de la base, con espesores que no superaban los tres centímetros de espesor, motivo por el cual resultaba sencillo el proceso de eliminación y liberación de las obras así fijadas.

No obstante lo anterior, se decidió realizar el retiro de este tipo de morteros mediante cortes con discos diamantadados, con el fin de reducir al máximo eventualidades generadas por vibraciones o golpes que pudiesen afectar la integridad de las esculturas, en especial las peanas o bases de las esculturas, todas vez que por lo general este tipo de elementos son huecas, conformada por paredes o estratos delgados.

Previo al desmonte de cada obra se realizó el registro detallado de cada una de ellas, con el fin de establecer el estado de condición de la obra antes del desmonte, información a partir de la cual se asumirán las responsabilidades y se plantearán alternativas para resolver cualquier afectación que eventualmente se presente.

Desmonte de las obras formato pequeño

Sagrada familia

Se trata de un conjunto de tres figuras humanas de cuerpo entero conformando un único volumen dispuesto sobre una peana moldurada que formalmente se ajusta a las curvaturas generadas por las vestimentas de los personajes representados. El conjunto escultórico se encontraba colocado sobre una columna rectangular elaborada en ladrillo y mortero de arena cemento, adherida a esta con mortero de la misma naturaleza al utilizado en la pega de los ladrillos.

Para este caso, como ya se señaló se realizó un corte a lo largo de la línea en el contorno en el borde inferior de la peana, con lo cual fue posible liberar la obra de la base, sin mayores eventualidades.

Es importante señalar que los ladrillos de la parte superior de la columna utilizada como pedestal, se encontraban sueltos, lo que facilito del retiro de la escultura. Una vez desmontada la obra fue trasladada manualmente hasta el taller para los procesos de conservación.

La obra no presentó ninguna novedad respecto a la integridad física o de conservación de los estratos de acabado superficial.



Fotografía 21 Detalle corte escultura Sagrada Familia






Fotografía 22, 23, 24 y 25 Desmonte y traslado de escultura

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Busto José del Carmen Acosta

Se trata de un busto de bulto redondo elaborado en bronce, representación de una figura masculina que se encuentra empotrado en un pedestal hecho en mampostería de ladrillo, enchapado en piedra arenisca.





Fotografía 26 y 27 Busto José del Carmen Acosta

El traslado de esta obra solo incluye el busto, toda vez que las características constructivas del pedestal podrían conllevar eventuales afectaciones a la integridad física del mismo, por lo cual se consideró que resulta menos riesgoso que este permanezca en ese lugar.

Para el desmonte se realizó inicialmente un corte en el mortero en el cual se encuentra inmerso el busto, paralelo borde inferior de la escultura, con el uso de un disco diamantado, generando inicialmente una regata a partir de la cual se fue eliminando este estrato, sin tocar prácticamente el busto, toda vez que con golpes suaves, este se desprendía de la superficie de bronce, posteriormente mediante la aplicación de presión ejercida a través de una palanca, la escultura quedo prácticamente suelta del pedestal.

Se procedió entonces al descenso manual del busto para su traslado al taller, para lo cual se utilizó una estiba con ruedas.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com *Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598*

La obra no presentó ninguna novedad respecto a la integridad física o de conservación de los estratos de acabado superficial.







Fotografía 28, 29 y 30
Desmonte y traslado de escultura

Placa conmemorativa

Hace referencia a una placa conmemorativa de bronce instalada en el año de 1966, loa cual se encentraba adosada al muro de acceso de la torre central. La placa se encontraba instalada mediante pernos insertos aproximadamente 5 cm dentro del muro, posiblemente con un mortero de cemento puro.



Fotografía 31 Vista general placa en muro

El proceso para el desprendimiento de la placa fue realmente fácil toda vez que al parecer la placa fue instalada con las perforaciones rellenas de cemento, por lo que no es posible confirmar que los mismos queden asegurados adecuadamente, en tal sentido, los chazos, dado que son metálicos no siempre quedan fijos, tal es caso de la presente placa, motivo por el que, con la aplicación de una simple palanca, esta se desensamblo quedando completamente liberada.





Fotografía 32 y 33 Desmonte de placa

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***





Fotografía 34 y 35 Desmonte y traslado de placa

La obra no presentó ninguna novedad respecto a la integridad física o de conservación de los estratos de acabado superficial.

Busto Santiago Samper

Se trata de un busto de bulto redondo elaborado en bronce, representación de una figura masculina que se encuentra empotrado en un pedestal hecho en mampostería de ladrillo, enchapado en piedra arenisca. A diferencia de la obra anterior, este busto presenta uno o varios espigos que los fijan al interior de una placa de piedra arenisca dispuesta a modo de tapa superior del pedestal, esto es, no presenta mortero en contorno al borde inferior de la escultura, sino que fue fijada en la parte central, directamente en la piedra.







Fotografía 36, 37 y 38 Detalle busto Santiago Samper

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com *Teléfonos: 2438799 - 3138451987*

Para esta escultura igualmente se decidió que solo se trasladaría en busto, en tanto que el pedestal se dejaría en el sitio.

Debido a que los elementos de fijación se encuentran inmersos en el centro la placan de piedra, motivo por el cual no se tenía acceso directo a éstos, resultaba prácticamente imposible realizar la liberación de la obra, sin tocar la placa de piedra de la base.

Se realizo inicialmente una exploración por uno de los vértices donde se presenta un faltante de la piedra, con el fin de establecer las condiciones de adherencia de esta placa al pedestal y se pudo establecer que la misma fue adherida en toda la superficie, por lo cual no era posible su liberación a través del corte del mortero de pega, adicionalmente, se dese señalar que la placa de piedra presentaba una alta inconsistencia debido a factores fundamentalmente de su conformación natural ya que se trata de una piedra sedimentaria, veteada y muy porosa lo que aunado a la gran cantidad de lluvias que se han presentado en los días previos al proceso de desmonte, la convertían en un material altamente frágil, condiciones por las que resultaba prácticamente imposible garantizar su integridad en el proceso de desmonte, circunstancias que efectivamente conllevaron a que esta placa se fracturara en el proceso de liberación del busto.

Cabe señalar que esta placa no hace parte integral de la escultura de bronce, por lo cual se podrá se restituida en el momento de una futura instalación de la escultura.





Fotografía 39 y 40 Detalle exploración placa busto Santiago Samper

El desmonte fue realizado manualmente y posteriormente trasladada al taller en una estiba de madera con rodachines.







Fotografía 41, 42 y 43 Detalle desmonte y traslado busto Santiago Samper

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Escultura de la Hermana Fundadora

Se trata de un busto en mármol blanco en representación de figura femenina la cual se encuentra emplazada sobre una columna circular en piedra, que a su vez se encuentra ubicada en un pedestal elaborado en mampostería de ladrillo recubierto con mortero arena – cemento. Complementa esta obra una placa de bronce alusiva al momento de instalación de la obra

La obra se encontraba adosada a la columna de piedra mediante un mortero de pega compuesto de arena cemento, dispuesto en el contorno inferior de la base.





Fotografía 44 y 45 Escultura Hermana fundadora

La obra presenta un gran faltante en la base, mismo que fue resanado con el mismo mortero con el que fue adherido a la base de piedra, mismo por el cual se realizó el procedimiento de liberación de la escultura mediante la realización de un corte con disco diamantado, luego de lo cual, con suaves golpes en la línea de corte, se logró desprender la escultura de la base, posteriormente se realizó el desmonte manual de la obra y se trasladó de igual manera al taller.

Resulta importante señalar la fragilidad evidenciada en el mármol (posiblemente factor que pudo ser el origen de la perdida que se observa en la parte inferior de la base) lo cual origino el desprendimiento de un pequeño fragmento del borde, por lo anterior se recomienda realizar la consolidación en esta parte de la escultura mediante la aplicación de silicato de etilo.

Por lo anterior se realizó el corte del mortero de cemento en el contorno de la unión con el pedestal mediante el uso de un disco diamantado de corte que permitirse liberar la escultura con la menor vibración posible.




Fotografía 46 y 47 Detalle corte de mortero

A continuación, se realizó el desmonte manual de la escultura y se trasladó al taller para su posterior intervención de conservación. Igualmente se realizó el retiro de la placa de bronce la cual se encontraba fijada en el fuste de la columna mediante cuatro tornillos, los cuales fueron retirados sin ninguna dificultad. Esta placa será colocada conjuntamente con el busto en la caja de embalaje correspondiente, una vez se realicen los procesos de conservación preventiva a los que haya lugar realizar.




Fotografía 48 y 49 Detalle retiro de placa

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***




Fotografía 50 y 51 Detalle retiro de placa y obra en taller

Salvo el pequeño fragmento que se desprendió en la zona de la base, la obra no presentó ninguna novedad respecto a la integridad física o de conservación de los estratos de acabado superficial.

Novicia

Dado que la escultura obra se hallaba en la inmediaciones de un inmueble que se encuentra en intervención de restauración, los contratistas a cargo de dicha la obra habían elaborado una caja en tablas de madera ordinaria donde fue resguardada la obra.

Se trata de una escultura de bulto redondo que representa una figura femenina de cuerpo entero en posición orante. Cabeza y mirada hacia arriba, ojos color café. Brazo derecho doblado hacia el pecho con la mano abierta y el brazo izquierdo estirado hacia el frente con su mano medio cerrada.

La obra por su tamaño presenta bajo peso, por lo cual su manipulación y traslado resulto viable de forma manual por un auxiliar de restauración.





Fotografía 52, 53 y 54 Detalle traslado escultura

Desmonte de las obras formato mediano

Virgen de Lourdes

Escultura de bulto redondo en representación de una figura femenina de cuerpo entero, en posición pedestre y que reposa en una peana circular de piedra la cual se encuentra fijada a una columna de piedra mediante un mortero de arena cemento.




Fotografía 55 y 56 Detalle escultura Virgen de Lourdes

De acuerdo con las exploraciones realizadas, el mortero de arena cemento utilizado en la adherencia de los elementos escultóricos fueron aplicados en el contorno de las peanas, por lo que los mismos pueden ser retirados mediante en corte con disco diamantado.

En estas condiciones se procedió a realizar el corte, quedando liberada completamente la escultura, con lo cual se procedió a realizar el desmonte manual de la obra y el posterior traslado en una estiba de madera adecuada con rodachines.



Fotografía 57, 58, 59 y 60 Detalle desmonte escultura Virgen de Lourdes

El proceso de descenso y traslado la obra no presentó ninguna novedad respecto a la integridad física o de conservación de los estratos de acabado superficial.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***







Fotografía 61, 62 y 63 Detalle traslado escultura Virgen de Lourdes

Asunción de la virgen

Escultura de bulto redondo en representación de una figura humana de cuerpo entero, con los brazos abiertos, posada sobre nubes con querubines. El conjunto se encuentra sobre una base cuadrada que se emplaza sobre un pedestal paralelepípedo de piedra. La escultura se encuentra fijada al pedestal mediante un mortero de arena cemento.





Fotografía 64 y 65 Vista general y detalle zona de unión escultura

Inicialmente se realizó una exploración dirigida a evaluar las condiciones de fijación de la escultura donde se pudo establecer la existencia de un estrato a modo de franja de arena cemento, sobre la cual se colocó la escultura, la cual presenta base hueca de paredes gruesas que dan estabilidad a la escultura. La inspección realizada determino que era factible retirar el estrato de arena cemento mediante el uso de un cincel y maceta.





Fotografía 66 y 67 Proceso liberación escultura



Fotografía 68 Base hueca de la escultura

Para el procedimiento de descenso de la escultura, se aprovechó la existencia de un punto de apoyo en el árbol próximo a la escultura, lo que permitió descender la

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

escultura hasta el nivel del piso, con total seguridad para la obra, posteriormente se realizó el traslado manual de la escultura hasta el taller







Fotografía 69, 70 y 71 Detalle traslado escultura

Durante el proceso de descenso y traslado la obra no presentó ninguna novedad respecto a la integridad física o de conservación de los estratos de acabado superficial.

Virgen del Carmen policromada, estanque

Dado que la escultura obra se hallaba en la inmediaciones de un inmueble que se encuentra en intervención de restauración, el sitio donde ésta se encontraba había sido cubierto con una polisombra con el fin de resguarda la escultura, sin embargo, se evidenció un avanzado nivel de deterioro de los materiales constitutivos de la escultura.

Se trata de una escultura de bulto redondo que representa dos figuras humanas una de ellas correspondiente a una mujer de cuerpo entero que en su regazo lleva un niño de cuerpo entero, este conjunto se encuentra elaborado en yeso con refuerzo de yute y reposa en un soporte de madera, la obra se encuentra emplazada en una nicho de piedra, en malas condiciones de conservación.

El conjunto escultórico presenta bajo peso, por lo cual su manipulación y traslado resulto viable de forma manual, previas acciones para evitar el desprendimiento de elementos sueltos o mayores afectaciones a las superficie pictóricas que aún se conservan.





Fotografía 72, 73 y 74 Detalle traslado escultura

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

Desmonte de las obras formato grande

Arcángel San Rafael

Escultura de bulto redondo en representación de una figura masculina de cuerpo entero, en formato vertical, emplazada en un pedestal de concreto al cual se fija mediante cuatro tornillos en cada uno de los vértices.



Fotografía 75, 76, 77 y 78 Vista general y detalle zona de unión escultura con tornillos

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Una vez realizado el montaje del andamio multidireccional se instalaron manilas y poleas asegurados a las horizontales de forma tal que se pudiese descender la escultura de forma segura.



Fotografía 79 Armado de andamios certificados

Se retiraron los las tuercas de los tornillos y se procedió a desplazar la escultura al borde del pedestal, donde se levanta ligeramente y se comienza el descenso mediante las manilas, una vez a nivel del suelo, se vio la necesidad de contar con un equipo que permitiera el traslado de la escultura hasta el inmueble del convento donde se encuentra el taller.

Por lo anterior se contrató un montacargas de 3,5 toneladas con el fin de izar la escultura y realizar el traslado de la escultura, para ello se instaló la escultura sobre una estiba de madera que permitiese el traslado de la obra con total seguridad para esta, si bien se planteó la posibilidad de trasladar la obra en posición vertical, se tuvo en cuenta que la irregularidad del piso y la necesidad de subir en solventar la presencia de algunos desniveles, no permitían garantizar la estabilidad de la escultura, motivo por el cual se decidió realizar el traslado con la obra en sentido horizontal, siempre soportado en las estiba de madera.




Fotografía 80 y 81 Traslado de escultura con montacargas

La escultura fue entonces trasladada hasta la entrada del convento, donde, ante la imposibilidad e improcedencia de ingresar el montacargas, la obra fue trasladada a otra estiba y con el uso de un estibador, se trasladó al interior del convento, donde en la actualidad se encuentra colocado sobre las estiba.




Fotografía 82 y 83 Ingreso escultura con estibador a Convento

Durante el proceso de descenso y traslado la obra no presentó ninguna novedad respecto a la integridad física o de conservación de los estratos de acabado superficial.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Escultura de la Virgen y el Nino

Escultura de bulto redondo que representa dos figuras humanas una de ellas correspondiente a una mujer de cuerpo entero que en su regazo lleva un niño de cuerpo entero, este conjunto se encuentra emplazado en una columna de piedra que a su vez se soporta en una base rectangular en igualmente en construida en piedra, al centro de una pileta circular.




Fotografía 84 y 85 Vista general y detalle zona de unión escultura

La escultura se encontraba fijada a la columna de piedra mediante una torta de mortero de arena cemento en la cual fue puesta, generando al interior de la misma una especie de espigo que aportaba estabilidad a la escultura, adicionalmente se observó la instalación de ladrillos los cuales ayudaban a complementar la función de dicha estructura.

Se realizaron exploraciones en el área del mortero de unión identificando la línea inferior de la peana y las condiciones constructivas de la misma y la posibilidad para realizar la liberación de la escultura, evidenciado que la base no estaba vinculada a la torta de cemento y por lo tanto el procedimiento para la liberación de la escultura podía ser realizado mediante el corte del cemento en la unión con la peana.

Se realizó la instalación del sistema de andamio multidireccional consistente en dos secciones de con extensiones laterales para una mayor estabilidad de la estructura. En la parte superior de instalo una diferencial con capacidad de una tonelada, a la cual se enganchó la escultura ala que previamente se había

adecuado reatas y un arnés a la altura de los hombros, rodeando el cuerpo a la altura de los brazos, de tal forma que se garantizara la mayor estabilidad de la escultura durante el descenso.

Se procedió entonces a realizar el corte en sentido horizontal utilizando para ello un disco de corte diamantado, posteriormente se realizó el desprendimiento de la torta al interior de la peana, hasta donde la estabilidad de la misma así lo permitiese.




Fotografía 86 y 87 Proceso liberación escultura

A continuación se realizaron maniobras de izaje sucesivas que permitiesen soltar la torta de cemento al interior de la peana, hasta que esta quedo completamente suelta y la escultura liberada para proceder al descenso de la escultura.

El proceso de descenso se realizó paulatinamente, colocando la escultura en diferentes plataformas, toda vez que se requería trasladar la diferencial hacia el frente de la fuente, de tal modo que permitiese la maniobrabilidad de la escultura a la vez que ir desplazándola hacia el frente de la pileta.







Fotografía 88, 89, 90, 91 y 92 Proceso liberación y descenso de la escultura

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

Una vez colocada la escultura a nivel del piso se vio la necesidad de contar con un equipo para el manejo de objetos pesados, máxime si se tenía en cuenta las deficientes condiciones del terreno por donde se debía realizar el traslado de la escultura.

En estas condiciones se consideró la posibilidad de utilizar el equipo de montacargas utilizado en el traslado de la escultura del arcángel san Rafael, en iguales condiciones en el uso de estibas de madera. Se realizo entonces una inspección previa paras verificar las condiciones del piso y la reacción al paso del montacargas, evidenciado que el mismo soportaba el paso de este equipo, sin mayor afectación de los elementos del piso.

Dadas las dimensiones de la escultura, la misma fue colocada en sentido horizontal para proceder al traslado, sin embargo, la presencia de bases de piedra el borde de la circulación llevo a que la maniobra del montacargas quedara sobre el terreno de tierra donde el mismo quedo atascado, dado que la rueda de tracción quedo enterrada en la tierra. Lo anterior obligo a contar con otro equipo que permitiese sacar el montacargas de sitio donde quedo enterrado. En estas condiciones de considero la posibilidad de descargar la escultura en el estibador y trasladarlo en este hasta el convento y así se realizó, quedando la escultura en estiba s de madera en el patio del convento.

Pese a las condiciones del traslado de la obra y de las incidencias presentadas, el proceso de descenso y traslado la obra no presentó ninguna novedad respecto a la integridad física o de conservación de los estratos de acabado superficial de la obra.



Fotografía 93 Obra trasladada en el edificio Convento

Bienes pendientes por desmontar

A la fecha se encuentran pendientes por desmontar los siguientes elementos:

Campanas y Rosa de los vientos

En el campanario de la Capilla se evidencian posiblemente 3 campanas a las cuales no hay un acceso peatonal por la Capilla, y en el remate se evidencia la rosa de los vientos.

La única manera para acceder a estas es a través de elevación mediante una plataforma de elevación con escalera que tenga la altura requerida para esta maniobra. A la fecha se encuentran adelantado las gestiones correspondientes con el Cuerpo Oficial de Bomberos del sector a fin de contar con el apoyo en este recurso, razón por la que el desmonte efectivo de estos bienes dependerá del acceso a este sector.

Escultura San José

La escultura de San José que se encuentra en el Edificio Ancianato, se encuentra adosada a un pedestal pequeño en concreto. El desmonte se programa entre el 5 y 9 de diciembre de 2024, mientras se obtienen las autorizaciones de acceso al inmueble.



Fotografía 94 Escultura San José en Ancianato y línea de corte propuesta

En términos generales el plan de desmonte para esta escultura consiste en realizar el corte con pulidora y disco diamantado de la obra y separarlo del pedestal en concreto, conforme a la línea de corte demarcada en la fotografía 94.

Una vez cortada la escultura se procederá a realizar el montaje de una estructura de andamios certificados con reforzamiento y una diferencial con la que se realizará el izaje y desplazamiento de la obra. Posteriormente la misma se ubicará sobre una estibadora para el desplazamiento.

Bombonas de lámparas y material fílmico

De acuerdo con la información suministrada por el ente gestor en el mezanine de la Sacristía de la Capilla se encuentra una caja con unas bombonas de lámparas y una caja de material fílmico, de estos elementos estamos a la espera de la entrega de dichos elementos por parte del ente gestor.

Sobre estos elementos se realizará la respectiva rotulación, limpieza superficial y almacenamiento en cajas de conservación, para que las mismas se depositen en el espacio asignado al interior del inmueble Convento.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4242 DE 2023
REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LOS JARDINES Y ALGUNOS INMUEBLES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INFORME ACCIONES DE CONSERVACION BIENES MUEBLES
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION 7
II. GENERALIDADES 9
III. CAPILLA 9
ESCULTURA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 9
Procesos realizados: 9
- Limpieza superficial en seco 9
- Limpieza de húmedo 12
- Protección 15

ESCULTURA SAN JUAN DE DIOS 16
Procesos realizados 16
- Limpieza superficial en seco 16
- Limpieza de húmedo 19

VÍA CRUCIS 24
PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 24
Procesos realizados: 24
- Limpieza superficial en seco 24
- Limpieza de húmedo 26
- Limpieza de las cruces 28

SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS 29
Procesos realizados 29
- Limpieza superficial en seco 29
- Limpieza de húmedo 30
- Limpieza de las cruces 31

TERCERA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 32
Procesos realizados 32
- Limpieza superficial en seco 32
- Limpieza de húmedo 34
- Adhesión de fragmentos 34
- Aplicación de resanes 36

CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU SANTA MADRE 38
Procesos realizados 38

- Limpieza superficial en seco 38
- Limpieza de húmedo 39
- Adhesión de fragmentos 39
- Aplicación de resanes 41
- Limpieza de las cruces 42

QUINTA ESTACIÓN: JESUS AYUDADO POR EL CYRENEO 42

Procesos realizados 42

- Limpieza superficial en seco 42
- Limpieza de húmedo 45
- Limpieza de las cruces 47

SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUAGA EL ROSTRO DE JESÚS 48

Procesos realizados 48

- Limpieza superficial en seco 48
- Limpieza de húmedo 50

SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 52

Procesos realizados 52

- Limpieza superficial en seco 52
- Limpieza de húmedo 53
- Limpieza de las cruces 55

OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 55

Procesos realizados 55

- Limpieza superficial en seco 55

NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 59

Procesos realizados 59

- Limpieza superficial en seco 59
- Limpieza de húmedo 61

DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 63

Procesos realizados 63

- Limpieza superficial en seco 63
- Limpieza de húmedo 65

DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 66

Procesos realizados 66

- Limpieza superficial en seco 66
- Limpieza de húmedo 68

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS MUERTO EN LA CRUZ 69

Procesos realizados 69

- Limpieza superficial en seco 69
- Limpieza de húmedo 70
- Limpieza de las cruces 72

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN: DESCENDIMIENTO DE JESÚS 73
Procesos realizados 73
- Limpieza superficial en seco 73
- Adhesión de fragmentos 73
- Aplicación de resanes 75
- Limpieza de húmedo 78
- Limpieza de las cruces 79

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR 79
Procesos realizados 79
- Limpieza superficial en seco 79
- Limpieza de húmedo 80

FIGURA DE PESEBRE: MÚSICO/HOMBRE A CABALLO CON GAITA 84
Procesos realizados 84
- Limpieza superficial en seco 84
- Limpieza de húmedo 85

PILA AGUA BENDITA (X2) 88
Procesos realizados 88
- Desmontaje de las piletas 88
- Eliminación de material agregado 90
- Limpieza en seco 90

PILA BAUTISMAL 92
Procesos realizados 92
- Se separaron sus partes 92
- Limpieza superficial 92

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 93
Procesos realizados 93
- Limpieza superficial en seco 93
- Limpieza de húmedo 94

FIGURA DE PESEBRE: NIÑO JESÚS 96
Procesos realizados: 96
- Limpieza superficial en seco 96
- Limpieza de húmedo 97
- Adhesión de fragmentos 98

FIGURA DE PESEBRE: JOSÉ 100
Procesos realizados 100
- Limpieza superficial en seco 100
- Limpieza de húmedo 101

FIGURA DE PESEBRE: VIRGEN 103
Procesos realizados 103

- Limpieza superficial en seco 103
- Limpieza de húmedo 104

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR CON OVEJA COSTADO IZQUIERDO 107

Procesos realizados 107

- Limpieza superficial en seco 107
- Limpieza de húmedo 108

FIGURA DE PESEBRE: CAMPESINA CON CANASTAS 109

Procesos realizados 109

- Limpieza superficial en seco 109
- Limpieza de húmedo 110
- Adhesión de fragmentos 112

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR ANCIANO CON SOMBRERO EN EL PECHO..... 114

Procesos realizados 114

- Limpieza superficial en seco 114
- Limpieza de húmedo 115
- Adhesión de fragmentos 116

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR CON SOMBRERO CUBRIENDO PARTE DEL ROSTRO 118

Procesos realizados 118

- Limpieza superficial en seco 118
- Limpieza de húmedo 119

ESCULTURA PASTORCITA ARRODILLADA 121

Procesos realizados 121

- Limpieza superficial en seco 121
- Limpieza de húmedo 122
- Adhesión de fragmentos 124

FIGURA DE PESEBRE: AGUATERA 126

Procesos realizados 126

- Limpieza superficial en seco 126
- Limpieza de húmedo 126

FIGURA DE PESEBRE: BURRO 128

Procesos realizados 128

- Limpieza superficial en seco 128
- Limpieza de húmedo 129

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR CON OVEJA EN EL HOMBRO 131

Procesos realizados 131

- Limpieza superficial en seco 131
- Limpieza de húmedo 131
- Adhesión de fragmentos 132

MEDIOFONO 134

Procesos realizados **134**
- Limpieza superficial en seco 134

ARMONIO **134**
Procesos realizados **134**
- Limpieza superficial en seco 134

QUERUBINES **135**
Procesos realizados **135**
- Limpieza superficial en seco 135
- Limpieza de húmedo 135

NOVICIA **136**
Procesos realizados **136**
- Limpieza superficial en seco 136
- Limpieza de húmedo 136

RETABLO MAYOR Y ELEMENTOS RELACIONADOS **137**
Retablo mayor en mármol 137
Escultura del Sagrado Corazón 137
Evangelistas: San Mateo 137
Evangelistas: San Marcos 137
Evangelistas: San Lucas 137
Evangelistas: San Juan 137
Sagrario 137
Procesos realizados **137**
- Limpieza superficial en seco 137
- Limpieza de húmedo 139

PLACA A LA MEMORIA DE LOS BENEFACTORES DE LA CAPILLA **140**
Procesos realizados: **140**
- Limpieza superficial en seco 140
- Limpieza en húmedo 140

PLACA A LA MEMORIA DE LA MADRE ANTYME **141**
Procesos realizados: **141**
- Limpieza superficial en seco 141
- Limpieza en húmedo 141

IV. CIRCULACIONES EXTERIORES **142**
Arcángel San Rafael **142**
Escultura Sagrada familia **142**
Virgen con el niño **142**
Escultura Hermana fundadora y placa alusiva **142**
Escultura Asunción de la virgen **142**
Busto Masculino Santiago Samper **142**

Fuente en memoria de Cecilia Cordovez **142**
Virgen María / Nuestra Señora de Lourdes **142**
Virgen del Carmen policromada, estanque **142**
Escultura Novicia **142**
Busto profesor José del Carmen Acosta **142**
Placa conmemorativa "Promoción medica de 1941" **142**
Procesos realizados **142**
- Limpieza superficial en seco 142
- Limpieza de húmedo 142
- Capa de protección 143

Registro fotográfico **143**
V. BIENES PENDIENTES DE ACCIONES DE CONSERVACION **145**
Campanas y Rosa de los vientos **145**
Escultura San José **146**
Bombonas de lámparas y material fílmico **146**
VI. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE **147**
Almacenamiento de Vía Crucis **148**
Almacenamiento de esculturas y mobiliario **149**
Protección de elementos arquitectónicos **150**
Protección de bienes adosados a muros **151**
Protección del altar mayor de la capilla **152**
Registro fotográfico **153**
VII. INSTALACIÓN DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN **154**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4242 DE 2023
REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LOS JARDINES Y ALGUNOS INMUEBLES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INFORME ACCIONES DE CONSERVACION BIENES MUEBLES
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

I. INTRODUCCION

El presente documento se desarrolla en el marco de la ejecución del 4242 de 2023 suscrito entre el MINISTERIO DE CULTURA y JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ, cuyo objeto es "Realizar acciones de conservación, desmontaje, traslado y almacenamiento de bienes muebles de los jardines y algunos inmuebles del complejo hospitalario San Juan De Dios"

Los bienes muebles que se atienden bajo este objeto contractual hacen parte de la colección del complejo hospitalario San Juan de Dios, declarado Bien de Interés cultural del ámbito Nacional (BICNAL) por medio de la Ley 735 de 2002, y algunos otros elementos se encuentran declarados Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional por medio de la Resolución 0395 de 2006 "Por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados en el territorio Colombiano" elaborados antes del 31 de diciembre del año 1920 y que de acuerdo con la valoración cultural y patrimonial son bienes culturales muebles de especial interés y representatividad para el país en virtud de los valores histórico, estético y simbólico que revisten

Conforme la información que reposa en el anexo técnico del contrato "…*La colección forma parte integral del conjunto ya que fueron elaborados para el mismo en distintas épocas. Aquellos ubicados en las áreas en espacio abierto, han sido referentes espaciales y culturales en el desarrollo e historia del complejo hospitalario.*

Los ubicados en la capilla, dan cuenta de las actividades religiosas que allí se desarrollaban cuando este inmueble tenía este carácter. En general la colección de bienes muebles forma parte de la trayectoria del Complejo y, por tanto, independientemente de su declaratoria, son bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la Nación…[1]"

En cumplimiento del artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio y Memoria adelanta los procesos tendientes a la

[1] Ministerio de Cultura. (2023). Estudios Previos Definitivos Proceso MC-SA-094-2023

conservación del patrimonio cultural mueble de la Nación para recuperar sus valores y garantizar su preservación en el tiempo.

De acuerdo con las inspecciones realizadas previamente, los bienes objeto de este contrato se encuentran en regular y mal estado de conservación principalmente por afectaciones medioambientales de los bienes que se encuentran en espacios exteriores y no cuentan con mantenimiento periódico. En cuanto a los bienes interiores además de la falta de mantenimiento en algunos bienes se evidencian malas prácticas de almacenamiento, factores que tanto en los bienes expuestos en las zonas exteriores como en las interiores han ocasionado la pérdida y daño de algunos de estos y sus elementos asociados.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante la ejecución del presente contrato se busca la protección y conservación de los bienes muebles del complejo hospitalario por medio acciones de desmontaje, intervención de tipo conservación, embalaje adecuado y almacenamiento con el fin de prevenir daños o pérdidas mayores durante la ejecución de los diferentes estudios e intervenciones de obra civil, arquitectónicas, urbanas y paisajísticas que se realizan actualmente en todo el complejo hospitalario y que se desarrollen en un futuro cercano. Se espera lograr con estas acciones, evitar que, además de empeorar el regular y mal estado de conservación en que se encuentran estos bienes, brindar medidas de protección, considerando que se desconoce el tiempo que estarán embalados estos bienes.

El presente documento contiene el informe de las acciones de conservación realizadas sobre los bienes muebles ubicadas en la Capilla y en las circulaciones exteriores del Complejo Hospitalario San Juan de Dios que fueron desmontados y trasladados al espacio asignado como taller provisional en el inmueble denominado "Convento" ubicado al interior del mismo complejo, y una vez allí se procedió a realizar las acciones de conservación requeridas y, posteriormente se embalaron y guardaron en las respectivas unidades de almacenamiento.

II. GENERALIDADES

Las acciones de conservación y las descritas en las especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el artículo 2.4.1.4.5 del decreto 1080 de 2015, que define los tipos de acciones e intervenciones para BIC muebles, dentro de las cuales se encuentran las acciones de emergencia y recuperación que son las acciones que se realizan de manera urgente sobre un conjunto de bienes cuando exista riesgo inminente de pérdida, sea por afectación biológica activa u otra eventualidad, que, sin importar su origen haya afectado directamente el bien. Estas acciones deben emplear materiales compatibles con la naturaleza del bien y no generar afectaciones químicas o físicas que modifiquen sus valores. Por lo tanto, el futuro contratista deberá ejecutar el contrato que llegare a suscribirse con las disposiciones de conservación contenidas en el Decreto 1080 de 2015.

III. CAPILLA

A continuación, se presenta el informe relacionado a las acciones de conservación realizadas para los bienes de este espacio

ESCULTURA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Se eliminó la abundante suciedad superficial depositada en toda la superficie de la escultura utilizando brocha suave, de arriba hacia abajo entrando a los recodos de las formas que tiene la escultura.

  Al finalizar esta limpieza se pudo evidenciar mejor el grado de deterioro que presenta, ya que en varias partes se mezcla el polvo con la capa pictórica pulverulenta o sin adherencia. De otra parte, se aprecian mejor sus características y valores estéticos.



Fotografía 1. Limpieza en seco, cuello



Fotografía 2. Limpieza en seco, hábito zona frontal



Fotografía 4. Limpieza en seco, mano derecha y libro



Fotografía 3. Limpieza en seco, mano derecha y libro

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 7. Limpieza en seco, zona superior



Fotografía 8. Limpieza en seco, zona superior



Fotografía 5. Limpieza en seco, en mangas, zonas internas



Fotografía 6. Limpieza en seco, túnica

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 9. Limpieza en seco, manto, costado izquierdo



Fotografía 10. Limpieza en seco y eliminación de telaraña en la peana

- **Limpieza de húmedo:** Se aplicó agua con genapol al 01%, con hisopos ligeramente húmedos. Se logró eliminar la suciedad adherida a la capa de color en encarnaciones y hábito en el blanco y el negro; sobre las decoraciones con dorado, se aplicó thinner para manchas muy oscuras y luego varsol sobre la decoración de los bordes del hábito y la capa. Se logra evidenciar el trabajo delicado de esta escultura.



Fotografía 12. Limpieza en húmedo. Ojo



Fotografía 11. Limpieza en húmedo, cuello



Fotografía 16. Limpieza en húmedo en cabeza y cuello.



Fotografía 14. Limpieza en húmedo en cabeza y cuello.



Fotografía 13. Limpieza en húmedo, palma de mano izquierda



Fotografía 15. Limpieza en húmedo, mano izquierda

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***




Fotografía 17. Limpieza en húmedo, manto frontal



Fotografía 19.Limpieza en húmedo, hábito zona posterior



Fotografía 20. Limpieza en húmedo, peana

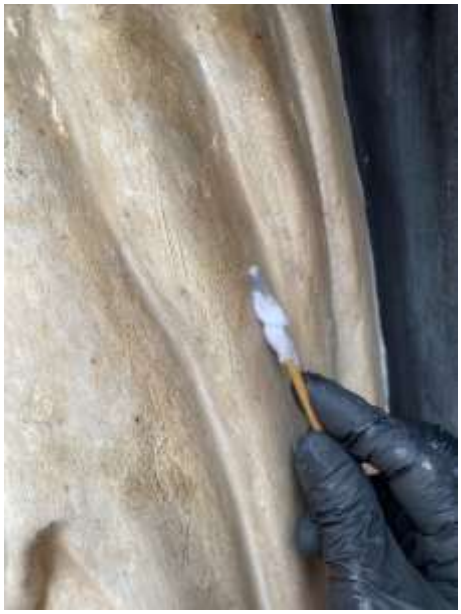

Fotografía 18. Limpieza en húmedo, manto frontal

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Protección:** se aplicó una ligera capa de cera microcristalina, a fin de proteger los acabados de deterioros generados del medio ambiente.



Fotografía 21. Final anverso (11/2024)



Fotografía 22. Final reverso (11/2024)

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 23. Final costado derecho escultura (11/2024)



Fotografía 24. Final costado izquierdo escultura (11/2024)

ESCULTURA SAN JUAN DE DIOS

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Para eliminar la suciedad pulverulenta localizada en toda la superficie, se utilizó brocha suave y con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo se fue retirando este polvillo. Fue necesario utilizar brochas pequeñas en las zonas profundas. Una vez finalizado este proceso se pudo evidenciar que la escultura está en regular estado de conservación. Se eliminaron las marcas de lápiz con borrador de nata, sin embargo, se evidencia incisiones profundas.



Fotografía 25. Limpieza en seco, cabeza



Fotografía 26. Limpieza en seco, cuello

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 27. Proceso de limpieza en seco.



Fotografía 28. Proceso de limpieza en seco.



Fotografía 30. Zona superior, antes de la limpieza.



Fotografía 29. Zona superior, después de la limpieza.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com *Teléfonos: 2438799 - 3138451987*


- **Limpieza de húmedo:** Utilizando hisopo húmedo con una mezcla de agua y Genapool al 0,1%, se procedió a eliminar la suciedad adherida a la superficie de la escultura. La obra no cuenta de capa de protección, pero los colores de encarnación y habito son de buena calidad y estabilidad. Este proceso se utilizó para eliminar la suciedad de la peana y del elemento de madera del símbolo que porta en frente. En zonas de las encarnaciones con manchas acentuadas, únicamente se insistió con hisopo humedecido con la misma mezcla enunciada. Por último, se aplicó cera microcristalina a fin de protegerla de humedades y otros agentes de deterioro.



Fotografía 34. Limpieza en húmedo, reverso



Fotografía 33. Limpieza en húmedo, anverso.

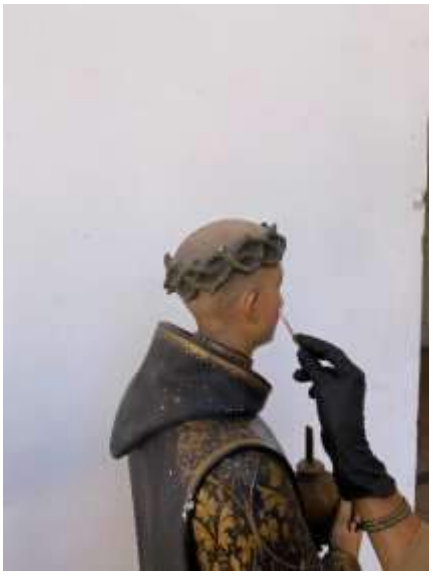

Fotografía 32. Limpieza en húmedo, encarnados rostro.



Fotografía 31. Limpieza en húmedo, encarnados rostro.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 38. Limpieza en húmedo, reverso.



Fotografía 37. Limpieza en húmedo, zonas de bajo relieve.



Fotografía 36. Limpieza en húmero, granada



Fotografía 35. Limpieza en húmero, granada

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 39. Limpieza en húmedo, reverso.



Fotografía 40. Limpieza en húmedo, reverso.



Fotografía 41. Limpieza en húmedo, zonas de bajo relieve, detalles.



Fotografía 42. Limpieza en húmedo, peana.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 43. Final anverso (11/2024)



Fotografía 44. Final reverso (11/2024)

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 45. Final costado derecho escultura (11/2024)



Fotografía 46. Final costado izquierdo escultura (11/2024)

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

VÍA CRUCIS

A continuación se describen los procesos realizados para cada uno de los trece (13) pasos que fueron encontrados en la Capilla del Complejo Hospitalario.

Todos los Pasos del Viacrucis cuentan con una cruz realizada en madera que se instala en la parte superior del remate de cada paso. Algunos pasos no la tienen, otros presentan fragmentado la parte donde se instala la cruz. Curiosamente aparece la Cruz del Paso XIV, pero el paso no está en la Capilla.

TITULO	¿Tiene cruz?	
	SI	NO
Vía crucis primera estación: Jesús es condenado a muerte	X	
Vía crucis segunda estación: Jesús con la cruz a cuestas	X	
Vía crucis tercera estación: Jesús cae por primera vez		X
Vía crucis cuarta estación: Jesús encuentra a su santa madre	X	
Vía crucis quinta estación: Jesús es ayudado por el cirineo	X	
Vía crucis sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús		X
Vía crucis séptima: estación Jesús cae por segunda vez	X	
Vía crucis octava estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén	X	
Vía crucis novena estación: Jesús cae por tercera vez	X	
Vía crucis décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras		X
Vía crucis decimoprimera estación: Jesús es clavado en la cruz		X
Vía crucis decimosegunda estación: Jesús muerto en la cruz	X	
Vía crucis decimotercera estación: Descendimiento de Jesús (fragmentos¿?)	X	
Vía crucis decimocuarta estación **Observación:** el paso no esta en el inmueble, únicamente se encontró la cruz	X	

PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.

En zonas con material agregado como cintas adhesivas y material diverso fuertemente adherido a la superficie, se utilizó bisturí para ser retirado mecánicamente.



Fotografía 47. Limpieza en seco, anverso



Fotografía 48. Paso I antes de la limpieza en seco



Fotografía 49. Paso I después de la limpieza en seco, se elimina suciedad y telarañas

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 50. Proceso de limpieza en húmedo



Fotografía 51. Proceso de limpieza en húmedo



Fotografía 52. Proceso de limpieza en húmedo. La mitad izquierda ya se encuentra limpia, en comparación de la mitad derecha.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Limpieza de las cruces:** La limpieza se realizó, con hisopo humedecido en agua con genapol al 1% a fin de retirar la suciedad adherida. Posteriormente con Thinner se eliminaron manchas de pintura de vinilo y de esmalte blanco. Se eliminó material agregado con bisturí de forma mecánica por último se aplicó varsol para terminar de eliminar manchas blanquecinas.



Fotografía 53. Fotografía final anverso



Fotografía 54. Fotografía final, reverso

SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.



Fotografía 55. Limpieza en seco, anverso de la escultura, marco



Fotografía 56. Limpieza en seco anverso de la escultura, imagen central

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com *Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598*




Fotografía 58. Limpieza en seco, anverso de la escultura, imagen central, detallles



Fotografía 57. Limpieza en seco, reverso de la escultura

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.

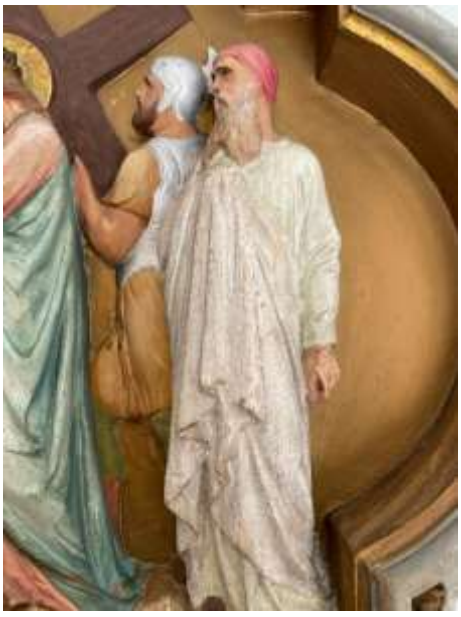

Fotografía 59. Proceso de limpieza en húmedo



Fotografía 60. Proceso de limpieza en húmedo

- **Limpieza de las cruces:** La limpieza se realizó, con hisopo humedecido en agua con genapol al 1% a fin de retirar la suciedad adherida. Posteriormente con Thinner se eliminaron manchas de pintura de vinilo y de esmalte blanco. Se eliminó material agregado con bisturí de forma mecánica por último se aplicó varsol para terminar de eliminar manchas blanquecinas.



Fotografía 61. Fotografía final anverso



Fotografía 62. Fotografía final, reverso

TERCERA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.



Fotografía 63. Limpieza en seco, anverso



Fotografía 64. Limpieza en seco, detalles anverso



Fotografía 65. Limpieza en seco, reverso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 66. Proceso de limpieza en húmedo



Fotografía 67. Proceso de limpieza en húmedo

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato*", en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. Se sostienen el tiempo necesario para su adhesión. Este proceso ofreció muy buen resultado.



Fotografía 68. Retiro de esparadrapo para unión de fragmentos



Fotografía 69. Limpieza de zonas de unión



Fotografía 70. Retiro de esparadrapo para unión de fragmentos



Fotografía 71. Aplicación de adhesivo (cianocrilato)

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 73. Sujeción de zonas mientras reacciona el adhesivo, se mantienen unidas los fragmentos



Fotografía 74. Resanes de yeso

- **Aplicación de resanes:** En los resanes se aplicó "*yeso piedra*", en especial en el Paso XIII. En este proceso, se utilizó una vasija plástica flexible, en donde se prepara la cantidad de yeso y agua, hasta lograr una mezcla homogénea que fluya en las uniones y reemplace los faltantes estructurales tanto del marco como del relieve. Esta mezcla debe estar en proceso de fraguado, ni muy líquido, ni muy sólido, preferiblemente en el punto "plástico" que permita moldear la zona para luego pulir y darle continuidad a la forma ya sea del marco o del relieve.



Fotografía 75. Resanes de yeso



Fotografía 76. Final anverso



Fotografía 77. Final reverso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU SANTA MADRE

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.



Fotografía 78. Limpieza en seco anverso



Fotografía 79. Limpieza en seco anverso

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 81. Proceso de limpieza en húmedo



Fotografía 80. Proceso de limpieza en húmedo

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato*", en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. Se sostienen el tiempo necesario para su adhesión. Este proceso ofreció muy buen resultado.



Fotografía 83. Retiro de esparadrapo en zona de unión de fragmentos



Fotografía 84. Retiro de esparadrapo en zona de unión de fragmentos



Fotografía 82. Limpieza de zonas de unión



Fotografía 85. Limpieza de zonas de unión

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 86. Aplicación de adhesivo en zonas de unión. Remate superior



Fotografía 87. Aplicación de adhesivo en zonas de unión. Remate superior

- **Aplicación de resanes:** En los resanes se aplicó "*yeso piedra*", en especial en el Paso XIII. En este proceso, se utilizó una vasija plástica flexible, en donde se prepara la cantidad de yeso y agua, hasta lograr una mezcla homogénea que fluya en las uniones y reemplace los faltantes estructurales tanto del marco como del relieve. Esta mezcla debe estar en proceso de fraguado, ni muy líquido, ni muy sólido, preferiblemente en el punto "plástico" que permita moldear la zona para luego pulir y darle continuidad a la forma ya sea del marco o del relieve.



Fotografía 88. Resanes en yeso

- **Limpieza de las cruces:** La limpieza se realizó, con hisopo humedecido en agua con genapol al 1% a fin de retirar la suciedad adherida. Posteriormente con Thinner se eliminaron manchas de pintura de vinilo y de esmalte blanco. Se eliminó material agregado con bisturí de forma mecánica por último se aplicó varsol para terminar de eliminar manchas blanquecinas.



Fotografía 89. Final anverso



Fotografía 90. Final reverso

QUINTA ESTACIÓN: JESUS AYUDADO POR EL CYRENEO

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.
  En zonas con material agregado como cintas adhesivas y material diverso fuertemente adherido a la superficie, se utilizó bisturí para ser retirado mecánicamente.



Fotografía 92: Limpieza en seco anverso



Fotografía 91. Limpieza en seco anverso, detalles.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 93. Limpieza en seco, reverso



Fotografía 94. Limpieza en seco, reverso.



Fotografía 95. Limpieza en seco, marco



Fotografía 96. Limpieza en seco, Cruz

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 97. Limpieza en húmedo, remate superior



Fotografía 98. Resultado de la limpieza en húmedo



Fotografía 102. Limpieza en húmedo fondo de la imagen central.



Fotografía 101. Resultado de la limpieza en húmedo.



Fotografía 100. Limpieza en húmedo zona inferior de la imagen central.



Fotografía 99. Resultado de la limpieza en húmedo, zona inferior.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Limpieza de las cruces:** La limpieza se realizó, con hisopo humedecido en agua con genapol al 1% a fin de retirar la suciedad adherida. Posteriormente con Thinner se eliminaron manchas de pintura de vinilo y de esmalte blanco. Se eliminó material agregado con bisturí de forma mecánica por último se aplicó varsol para terminar de eliminar manchas blanquecinas.



Fotografía 103. Fotografía final anverso



Fotografía 104. Fotografía final, reverso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUAGA EL ROSTRO DE JESÚS

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.
  En zonas con material agregado como cintas adhesivas y material diverso fuertemente adherido a la superficie, se utilizó bisturí para ser retirado mecánicamente.



Fotografía 105. Limpieza en seco, anverso.



Fotografía 106. Limpieza en seco, anverso, marco.



Fotografía 108. Limpieza en seco, anverso, detalles imagen central.



Fotografía 109. Limpieza en seco, detalle imagen central.



Fotografía 107. Limpieza en seco, reverso.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 111. Limpieza en húmedo, remate superior.



Fotografía 110. Limpieza en húmedo, imagen central.



Fotografía 112. Limpieza en húmedo, imagen central.



Fotografía 113. Resultado de limpieza, imagen central.



Fotografía 114. Fotografía final anverso



Fotografía 115. Fotografía final reverso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.



Fotografía 116. Limpieza en seco, anverso.



Fotografía 117. Limpieza anverso, zona central.



Fotografía 118. Limpieza en seco, figura central, detalles.



Fotografía 119. Limpieza en seco, reverso.

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 120. Limpieza en húmedo, marco.



Fotografía 121. Limpieza en húmedo, imagen central.



Fotografía 122. Limpieza en húmedo, imagen central.



Fotografía 123. Limpieza en húmedo, fondo en imagen central.



Fotografía 124. Limpieza en húmedo, fondo en imagen central.

- **Limpieza de las cruces:** La limpieza se realizó, con hisopo humedecido en agua con genapol al 1% a fin de retirar la suciedad adherida. Posteriormente con Thinner se eliminaron manchas de pintura de vinilo y de esmalte blanco. Se eliminó material agregado con bisturí de forma mecánica por último se aplicó varsol para terminar de eliminar manchas blanquecinas.



Fotografía 125. Fotografía final anverso



Fotografía 126. Fotografía final reverso

OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.

  En zonas con material agregado como cintas adhesivas y material diverso fuertemente adherido a la superficie, se utilizó bisturí para ser retirado mecánicamente.





Fotografía 128. Limpieza en seco, anverso, imagen central



Fotografía 129. Limpieza en seco, marco



Fotografía 130. Limpieza en seco, anverso. Imagen central

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***





- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida.

  En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 133. Limpieza en húmedo, marco



Fotografía 135. Limpieza en húmedo, remate superior.



Fotografía 134. Limpieza en húmedo, imagen central.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Limpieza de las cruces:** La limpieza se realizó, con hisopo humedecido en agua con genapol al 1% a fin de retirar la suciedad adherida. Posteriormente con Thinner se eliminaron manchas de pintura de vinilo y de esmalte blanco. Se eliminó material agregado con bisturí de forma mecánica por último se aplicó varsol para terminar de eliminar manchas blanquecinas.



Fotografía 137. Final anverso



Fotografía 136. Final reverso

NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco**: Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.

  En zonas con material agregado como cintas adhesivas y material diverso fuertemente adherido a la superficie, se utilizó bisturí para ser retirado mecánicamente.



Fotografía 140. Limpieza en seco, anverso, marco.



Fotografía 141. Limpieza en seco, anverso.



Fotografía 139. Limpieza en seco, anverso, imagen central.



Fotografía 138. Limpieza en seco, imagen central.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 142. Limpieza en seco, reverso.



Fotografía 143. Limpieza en seco, reverso.

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó.



Fotografía 144. Limpieza en húmedo, marco.



Fotografía 145. Limpieza en húmedo, marco.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 146. Limpieza en húmedo, imagen central.



Fotografía 147. Limpieza en húmedo, imagen central.

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato*", en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. Se sostienen el tiempo necesario para su adhesión. Este proceso ofreció muy buen resultado.

- **Limpieza de las cruces:** La limpieza se realizó, con hisopo humedecido en agua con genapol al 1% a fin de retirar la suciedad adherida. Posteriormente con Thinner se eliminaron manchas de pintura de vinilo y de esmalte blanco. Se eliminó material agregado con bisturí de forma mecánica por último se aplicó varsol para terminar de eliminar manchas blanquecinas.



Fotografía 149. Fotografía final anverso



Fotografía 148. Fotografía final reverso

DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.



Fotografía 151. Limpieza en seco, marco.



Fotografía 150. Limpieza en seco, anverso, fondo.



Fotografía 152. Limpieza en seco, imagen central.



Fotografía 155. Limpieza en seco, anverso.



Fotografía 154. Limpieza en seco, reverso.



Fotografía 153. Limpieza en seco, reverso.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 157. Limpieza en húmedo, marco



Fotografía 158. Limpieza en húmedo, zona inferior.



Fotografía 156. Limpieza en húmedo, marco.



Fotografía 159. Resultado de la limpieza en húmedo



Fotografía 160. Fotografía final anverso



Fotografía 161. Fotografía final reverso

DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.



Fotografía 162. Limpieza en seco, marco.



Fotografía 163. Limpieza en seco, marco.



Fotografía 165. Limpieza en seco, fondo, zona central.



Fotografía 164. Limpieza en seco, imagen central.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 167. Limpieza en seco, reverso.



Fotografía 166. Limpieza en seco, reverso.

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 168. Fotografía final anverso



Fotografía 169. Fotografía final reverso

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS MUERTO EN LA CRUZ

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.



Fotografía 173. Limpieza en seco, imagen central.



Fotografía 172. Limpieza en seco, marco.



Fotografía 170. Limpieza en seco, imagen central.



Fotografía 171. Limpieza en seco, reverso.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 174. Limpieza en húmedo, marco.



Fotografía 175. Limpieza en húmedo en imagen central.



Fotografía 176. Limpieza en húmedo en imagen central.



Fotografía 177. Limpieza en húmedo en imagen central.



Fotografía 178. Limpieza en húmedo en imagen central.



Fotografía 179. Limpieza en húmedo en marco, cara interior.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Limpieza de las cruces:** La limpieza se realizó, con hisopo humedecido en agua con genapol al 1% a fin de retirar la suciedad adherida. Posteriormente con Thinner se eliminaron manchas de pintura de vinilo y de esmalte blanco. Se eliminó material agregado con bisturí de forma mecánica por último se aplicó varsol para terminar de eliminar manchas blanquecinas.



Fotografía 180. Limpieza en húmedo anverso



Fotografía 181. Limpieza en húmedo reverso



Fotografía 182. Fotografía final anverso



Fotografía 183. Fotografía final reverso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN: DESCENDIMIENTO DE JESÚS

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad con movimientos secuenciales de arriba hacia abajo hasta eliminar la suciedad pulverulenta en cada paso por anverso y reverso. Insistiendo en los bajo relieves en donde se requirió de brochas de distintos tamaños a fin de poder eliminar la suciedad localizada en los pliegues y partes profundas.

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato*", en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. Se sostienen el tiempo necesario para su adhesión. Este proceso ofreció muy buen resultado.



La unión de fragmentos en el paso XIII, permitió visualizar mejor la forma de construcción original de cada paso y sus acabados. Se puede deducir que la construcción de los pasos se realizó con molde en 2 etapas, la primera para los marcos todos iguales y del mismo tamaño. Y la segunda etapa, el ensamblaje de las escenas al centro de los marcos, logradas en alto relieve y ajustadas al tamaño y forma de los marcos. Todo en yeso.





Fotografía 184, 185 y 186. Unión de fragmentos imagen central.



Fotografía 188. Unión de fragmentos, reconstrucción del marco. Vista frontal



Fotografía 187. Unión de fragmentos, reconstrucción del marco. Vista por el reverso.



Fotografía 189. Unión de fragmentos, vista por el reverso



Fotografía 190. Unión de fragmentos. Reconstrucción de la escultura completa.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

A fin de recuperar la estabilidad estructural de este Paso, se aplicaron bandas de yeso al reverso. Estas, se humedecieron y se colocaron de borde a borde cubriendo completamente la superficie, con la mano se acomodaron de manera que se ajustaran a la forma irregular de esta superficie. Al secado se adhieren completamente y consolidan los fragmentos que fueron unidos previamente.



Fotografía 191. Aplicación de bandas de yeso por el reverso

- **Aplicación de resanes:** En los resanes se aplicó "*yeso piedra*", en especial en el Paso XIII. En este proceso, se utilizó una vasija plástica flexible, en donde se prepara la cantidad de yeso y agua, hasta lograr una mezcla homogénea que fluya en las uniones y reemplace los faltantes estructurales tanto del marco como del relieve.

  Esta mezcla debe estar en proceso de fraguado, ni muy líquido, ni muy sólido, preferiblemente en el punto "plástico" que permita moldear la zona para luego pulir y darle continuidad a la forma ya sea del marco o del relieve.



Fotografía 192. Inicio de resanes por el reverso., para mayor estabilidad estructural de la escultura.



Fotografía 193. Proceso de aplicación de resanes por el reverso.



Fotografía 195. Procesos de aplicación de resanes por el reverso.



Fotografía 194. Aplicación de resanes por anverso en zonas de faltantes.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 196. Aplicación de resanes en zonas de unión.



Fotografía 197. Aplicación de resanes por anverso en zonas de faltantes.



Fotografía 198. Aplicación de resanes por anverso en zonas de faltantes.



Fotografía 199. Aplicación de resanes por anverso en zonas de faltantes.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, es de anotar que la pintura de color en el acabado, no cuenta con capa de protección y se evidencia poca adhesividad al sustrato, lo que dificulta la limpieza. Por lo anterior se decidió utilizar *hisopos húmedos*. En zonas manchadas no se notó. Luego se agregó *genapol* al agua en un 0,1%, y se observó mejor resultado para retirar suciedad adherida. En manchas de pintura de aceite, se aplicó hisopos con thinner, para retirar manchas puntuales. En materiales muy duros, se obtuvo un buen resultado, humedeciendo con hisopo y luego retirando el material con bisturí.



Fotografía 201. Limpieza en húmedo en zona superior, remate.



Fotografía 202. Limpieza en húmedo en zona central, posterior a los resanes



Fotografía 200. Resultado de la limpieza en húmedo, zona central



Fotografía 203. Resultado de la limpieza en húmedo, zona central

- **Limpieza de las cruces:** La limpieza se realizó, con hisopo humedecido en agua con genapol al 1% a fin de retirar la suciedad adherida. Posteriormente con Thinner se eliminaron manchas de pintura de vinilo y de esmalte blanco. Se eliminó material agregado con bisturí de forma mecánica por último se aplicó varsol para terminar de eliminar manchas blanquecinas.

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizó brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 204. Limpieza en seco, zona superior, cabeza.



Fotografía 205. Limpieza en seco, zona superior, cuello, oveja.



Fotografía 206. Limpieza en seco, zona inferior.



Fotografía 207. Limpieza en seco, zona inferior.

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie.

  Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.

  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 208. Limpieza en húmedo, encarnados rostro.



Fotografía 209. Limpieza en húmedo barba



Fotografía 210. Limpieza en húmedo cabello



Fotografía 211. Limpieza en húmedo manto

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 212. Limpieza en húmedo



Fotografía 213. Limpieza en húmedo pierna derecha



Fotografía 214. Limpieza en húmedo brazo derecho



Fotografía 215. Limpieza en húmedo manto

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 219. Final anverso



Fotografía 218. Final reverso



Fotografía 217. Final lateral derecho



Fotografía 216. Final lateral izquierdo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

FIGURA DE PESEBRE: MÚSICO/HOMBRE A CABALLO CON GAITA

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 220. Limpieza en seco, zona posterior de la escultura



Fotografía 221. Limpieza en seco, zonta frontal de la escultura



Fotografía 223. Limpieza en seco, zona inferior de la escultura



Fotografía 222. Limpieza en seco, peana.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.

  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 224. Proceso de limpieza en húmedo



Fotografía 225. Proceso de limpieza en húmedo



Fotografía 226. Proceso de limpieza en húmedo



Fotografía 227. Proceso de limpieza en húmedo



Fotografía 228. Limpieza en húmedo peana



Fotografía 229. Limpieza en húmedo peana

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato*", en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. En algunos casos se colocó "*espigo o alma*" adherida a las dos partes a unir para de garantizar que esta adherencia fuera estable. Este proceso ofreció muy buen resultado.



Fotografía 230. Proceso de aplicación de adhesivo.



Fotografía 231. Proceso de unión de fragmentos



Fotografía 232. Final averso



Fotografía 233. Final reverso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 234. Final costado derecho



Fotografía 235. Final costado izquierdo

PILA AGUA BENDITA (X2)

Procesos realizados:

- **Desmontaje de las piletas:** Se procedió a retirar estos elementos del lugar donde se encontraban adheridas al muro. Se emplearon cinceles y martillos para realizar corte y desbaste del muro alrededor de las piletas, ya que estos elementos están tallados en un solo bloque con una pestaña que se encontraba anclada al muro.



Fotografía 237. Proceso de desmontaje de la pileta del costado izquierdo, uso de herramienta menor



Fotografía 236. Proceso de desmontaje de la pileta del costado izquierdo, uso de herramienta menor

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 241. Desmontaje de la pila del costado izquierdo



Fotografía 240. Proceso de desmontaje de la pileta del costado derecho, uso de herramienta menor



Fotografía 239. Proceso de desmontaje de la pileta del costado izquierdo, uso de herramienta menor



Fotografía 238. Desmontaje de la pileta del costado izquierdo, uso de herramienta menor

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Eliminación de material agregado:** Para retirar el material agregado, se utilizó, motor especializado, martillo y cincel. Estos procesos se realizaron con sumo cuidado ya que se trata de material original delicado y fino.



Fotografía 242. Eliminación de material agregado empleando herramienta menor



Fotografía 243. Eliminación de material agregado



Fotografía 244. Eliminación de materia agregado empleando mototool

- **Limpieza en seco:** Utilizando brocha suave de retira la suciedad hasta eliminar la suciedad pulverulenta por ambas caras de las pilas. Se emplean bisturí para eliminar material agregado puntualmente (pintura, restos de veladora).



Fotografía 248. Eliminación de suciedad empleando brocha, zona de montaje



Fotografía 247. Eliminación de suciedad empleando brocha, zona interna



Fotografía 246. Eliminación de suciedad empleando brocha, reverso



Fotografía 245.Uso de bisturí para eliminar material agregado puntual

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

PILA BAUTISMAL

Procesos realizados:

- **Se separaron sus partes**: la base y la taza para poder ser trasladas.
- **Limpieza superficial**: Se realizó limpieza superficial con brocha suave y se eliminó material agregado.



Fotografía 249. Detalle anverso taza limpia



Fotografía 250. Detalle reverso taza limpia



Fotografía 251. Detalle final pila limpia

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada.



Fotografía 252. Limpieza en seco, empleando brochas.



Fotografía 253. Limpieza en seco, empleando brochas.



Fotografía 254. Limpieza en seco, empleando brochas.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado.

  Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite. En las zonas con salpicaduras de pintura, se empleó visturía para mejorar la eliminación del material pictórico.



Fotografía 257. Limpieza en húmedo



Fotografía 258. Limpieza en húmedo



Fotografía 256. Eliminación de salpicaduras



Fotografía 255. Eliminación de salpicaduras

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 259. Imagen general de los pilares (15 unidades) posterior a procesos de conservación



Fotografía 260. Imagen general de las bases (6 unidades) posterior a procesos de conservación

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

FIGURA DE PESEBRE: NIÑO JESÚS

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 262. Limpieza en seco,



Fotografía 261. Limpieza en seco



Fotografía 263. Limpieza en seco

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.
  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 266. Limpieza en húmedo, retirando suciedad



Fotografía 267. Limpieza en húmedo, retirando suciedad



Fotografía 265. Limpieza en húmedo, compresa para retirar adhesivo.



Fotografía 264. Limpieza en húmedo, compresa para retirar adhesivo.

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato",* en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. En algunos casos se colocó "*espigo o alma*" adherida a las dos partes a unir para de garantizar que esta adherencia fuera estable. Este proceso ofreció muy buen resultado.



Fotografía 271. Perforación para para espigo



Fotografía 270. Perforación para para espigo



Fotografía 269. Unión de fragmentos, empleando adhesivo. Se incluyó espigo



Fotografía 268. Unión de fragmentos, empleando adhesivo. Se incluyó espigo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 275. Final anverso



Fotografía 274. Final reverso



Fotografía 273. Final costado derecho



Fotografía 272. Final costado izquierdo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

FIGURA DE PESEBRE: JOSÉ

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 278. Limpieza en seco



Fotografía 277. Limpieza en seco



Fotografía 276. Limpieza en seco, zona inferior

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.



Fotografía 282. Limpieza en húmedo, fisura en manto.



Fotografía 281. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 279. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 280. Proceso de limpieza en húmedo y faltante de soporte.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 284. Final anverso



Fotografía 283. Final reverso



Fotografía 285. Final costado derecho



Fotografía 286. Final costado izquierdo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

FIGURA DE PESEBRE: VIRGEN

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 290. Limpieza en seco



Fotografía 288. Limpieza en seco



Fotografía 289. Limpieza en seco



Fotografía 287. Limpieza en seco

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.



Fotografía 291. Proceso de limpieza en húmedo, cuello.



Fotografía 292. Proceso de limpieza en húmedo, túnica.



Fotografía 293. Proceso de limpieza en húmedo, manto.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 294. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 295. Proceso de limpieza en húmedo.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 296. Final anverso



Fotografía 297. Final reverso



Fotografía 299. Final costado derecho



Fotografía 298. Final costado izquierdo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR CON OVEJA COSTADO IZQUIERDO

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 303. Limpieza en seco



Fotografía 302. Limpieza en seco



Fotografía 301. Limpieza en seco



Fotografía 300. Limpieza en seco

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.

  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 307. Limpieza en húmedo



Fotografía 306. Limpieza en húmedo



Fotografía 305. Final anverso



Fotografía 304. Final reverso



Fotografía 309. Final costado derecho



Fotografía 308. Final costado izquierdo

FIGURA DE PESEBRE: CAMPESINA CON CANASTAS

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 311. Limpieza en seco escultura.



Fotografía 310. Limpieza en seco cabeza y pañoleta.



Fotografía 313. Limpieza en seco, peana.



Fotografía 312. Limpieza en seco, peana.

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.
  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 314. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 318. Limpieza en húmedo.



Fotografía 317. Limpieza en húmedo



Fotografía 316. Limpieza en húmedo.



Fotografía 315. Limpieza en húmedo, peana.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 319. Resultado de la limpieza en húmedo, rostro.



Fotografía 320. Resultado de la limpieza en húmedo

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato*", en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. En algunos casos se colocó "*espigo o alma*" adherida a las dos partes a unir para de garantizar que esta adherencia fuera estable. Este proceso ofreció muy buen resultado.



Fotografía 322. Perforación para instalación de espigo.



Fotografía 321. Instalación de espigo para unión de fragmentos.



Fotografía 323. Proceso de adhesión de fragmentos.



Fotografía 324. Resultado de la unión de fragmentos.



Fotografía 325. Final anverso



Fotografía 326. Final reverso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 328. Final costado derecho



Fotografía 327. Final costado izquierdo

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR ANCIANO CON SOMBRERO EN EL PECHO

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.




Fotografía 330. Limpieza en seco



Fotografía 329. Limpieza en seco

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

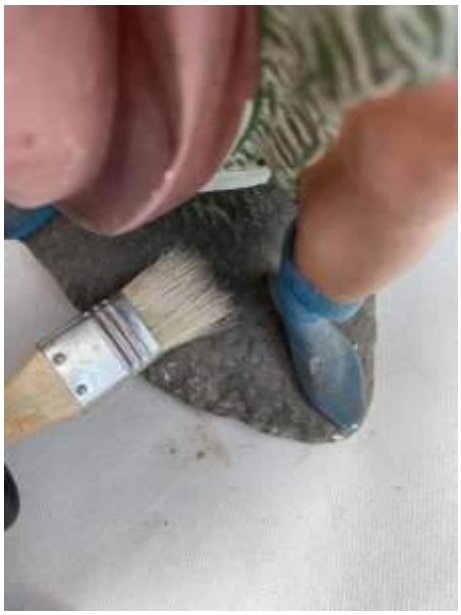

Fotografía 331. Limpieza en seco peana.

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.

  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 332. Limpieza en húmedo figura



Fotografía 333. Limpieza en húmedo, peana.

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato",* en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. En algunos casos se colocó "*espigo o alma*" adherida a las dos partes a unir para de garantizar que esta adherencia fuera estable. Este proceso ofreció muy buen resultado.



Fotografía 335. Limpieza de cortes para aplicación de adhesivo



Fotografía 334. Preparación de superficies para unión de fragmentos

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com *Teléfonos: 2438799 - 3138451987*



Fotografía 336. Unión de fragmentos



Fotografía 338. Final anverso



Fotografía 337. Final reverso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 340. Final costado derecho



Fotografía 339. Final costado izquierdo

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR CON SOMBRERO CUBRIENDO PARTE DEL ROSTRO

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 342. Limpieza en seco



Fotografía 341. Limpieza en seco

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado.

  Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.

  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 343. Limpieza en húmedo.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 344. Final anverso



Fotografía 345. Final reverso



Fotografía 346. Final costado derecho



Fotografía 347. Final costado izquierdo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

ESCULTURA PASTORCITA ARRODILLADA

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 351. Limpieza en seco, imagen.



Fotografía 350. Limpieza en seco, imagen.



Fotografía 349. Limpieza en seco, zona inferior imagen.



Fotografía 348. Limpieza en seco, zona inferior imagen.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.
  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 354. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 353. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 352. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 355. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 356. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 358. Proceso de limpieza en húmedo.



Fotografía 357. Proceso de limpieza en húmedo.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato",* en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. En algunos casos se colocó "*espigo o alma*" adherida a las dos partes a unir para de garantizar que esta adherencia fuera estable. Este proceso ofreció muy buen resultado.



Fotografía 360. Proceso de adhesión de fragmentos.



Fotografía 361. Proceso de adhesión de fragmentos.



Fotografía 359. Proceso de adhesión de fragmentos.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 363. Final anverso



Fotografía 362. Final reverso



Fotografía 364. Final costado derecho



Fotografía 365. Final costado izquierdo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

FIGURA DE PESEBRE: AGUATERA

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 366. Limpieza en seco



Fotografía 367. Limpieza en seco

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie.

  Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.

  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.



Fotografía 369.. Limpieza en húmedo



Fotografía 368. Resultado de limpieza en húmedo



Fotografía 370. Final anverso



Fotografía 371. Final reverso

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 373. Final costado derecho



Fotografía 372. Final costado izquierdo

FIGURA DE PESEBRE: BURRO

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 374. Limpieza en seco burro

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 376. Limpieza en seco, peana



Fotografía 375. Limpieza en seco, peana

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.



Fotografía 378. Limpieza en húmedo



Fotografía 377. Limpieza en húmedo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 379. Final anverso



Fotografía 380. Final posterior



Fotografía 381. Final costado derecho



Fotografía 382. Final vista superior



Fotografía 383. Final costado izquierdo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

FIGURA DE PESEBRE: PASTOR CON OVEJA EN EL HOMBRO

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.



Fotografía 385. Limpieza en seco



Fotografía 384. Limpieza en seco

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.

  Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***



Fotografía 387. Limpieza en húmedo figura



Fotografía 386. Limpieza en húmedo, peana.

- **Adhesión de fragmentos:** En la adhesión, se parte de la limpieza de las zonas a pegar, se aplicó "*cianacrilato*", en cada una de las superficies a adherir. Y luego se colocan es su lugar las partes, de manera que coincidan y se acoplen muy bien. En algunos casos se colocó "*espigo o alma*" adherida a las dos partes a unir para de garantizar que esta adherencia fuera estable. Este proceso ofreció muy buen resultado.



Fotografía 389. Unión de fragmentos



Fotografía 388. Unión de fragmentos

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***



Fotografía 390. Final anverso



Fotografía 393. Final reverso



Fotografía 392. Final costado derecho



Fotografía 391. Final costado izquierdo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

MEDIOFONO

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial y se acomodaron tablas sueltas.



Fotografía 394 Mediofono

ARMONIO

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial y se acomodaron tablas sueltas.



Fotografía 395 Armonio

QUERUBINES

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas.



Fotografía 397. Limpieza en seco



Fotografía 396. Limpieza en seco

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.



Fotografía 399. Limpieza en húmedo



Fotografía 398. Limpieza en húmedo

NOVICIA

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas.



Fotografía 401. Limpieza en seco



Fotografía 400. Limpieza en seco

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie.



Fotografía 402. Limpieza en húmedo



Fotografía 403. Limpieza en húmedo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

RETABLO MAYOR Y ELEMENTOS RELACIONADOS

Las acciones de conservación que se relacionan a continuación fueron desarrolladas para los bienes que se detallan en la tabla a continuación y que se encuentran adosados al retablo mayor, realizando la conservación in situ, así como se respectiva protección.

No	CODIFICACIÓN	Identificación
1	Capilla_01	Retablo mayor en mármol
2	Capilla_02	Escultura del Sagrado Corazón
3	Capilla_01_ER001	Evangelistas: San Mateo
4	Capilla_01_ER002	Evangelistas: San Marcos
5	Capilla_01_ER003	Evangelistas: San Lucas
6	Capilla_01_ER004	Evangelistas: San Juan
7	Capilla_01_ER005	Sagrario

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Mediante el uso de aspiradora en las zonas lisas del retablo, así como en los laterales y costado posterior, incluyendo los nichos donde se encuentran las esculturas. Sobre las molduras y elementos tallados del retablo así como en las esculturas del Sagrado Corazón, los 4 evangelistas y el sagrario se realizó limpieza en seco con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas.





Fotografía 404, 405 y 406 Limpieza con aspiradora en retablo



Fotografía 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 415 Limpieza con brochas en retablo y esculturas

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas. Esta limpieza se realizó específicamente en las esculturas del Sagrado Corazón, los 4 evangelistas y el sagrario.



Fotografía 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 y 424 Limpieza en húmedo esculturas

PLACA A LA MEMORIA DE LOS BENEFACTORES DE LA CAPILLA

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco**: Mediante el uso brocha suave se retira la suciedad superficial de la placa.



Fotografía 425. Limpieza en seco

- **Limpieza en húmedo**: Con agua más genapol al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando la capa de suciedad adherida.





Fotografía 426 y 427 Limpieza en húmedo

PLACA A LA MEMORIA DE LA MADRE ANTYME

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco**: Mediante el uso brocha suave se retira la suciedad superficial de la placa.




Fotografía 428 y 429 Limpieza en seco

- **Limpieza en húmedo**: Con agua más genapol al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando la capa de suciedad adherida.




Fotografía 430 y 431 Limpieza en húmedo

IV. CIRCULACIONES EXTERIORES

A continuación, se desarrollan los procesos ejecutados ara las obras en espacio público que se relaciona en la tabla siguiente:

1	**Arcángel San Rafael**	**Zona exterior _05**
2	**Escultura Sagrada familia**	**Zona exterior _06**
3	**Virgen con el niño**	**Zona exterior _02**
4	**Escultura Hermana fundadora y placa alusiva**	**Convento_02**
5	**Escultura Asunción de la virgen**	**Zona exterior _07**
6	**Busto Masculino Santiago Samper**	**Zona exterior _01**
7	**Fuente en memoria de Cecilia Cordovez**	**Zona exterior _03**
8	**Virgen María / Nuestra Señora de Lourdes**	**Zona exterior _04**
9	**Virgen del Carmen policromada, estanque**	**Edificio Mantenimiento_05**
10	**Escultura Novicia**	**Edificio Mantenimiento_04**
11	**Busto profesor José del Carmen Acosta**	**Zona exterior _10**
12	**Placa conmemorativa "Promoción medica de 1941"**	**Zona_exterior_11**

Procesos realizados:

- **Limpieza superficial en seco:** Con brocha suave se retira la suciedad superficial, lo que permite observar la suciedad acumulada depositada en los pliegues y bajo relieves de las esculturas. Para poder acceder a estos intersticios se utilizaron brochas pequeñas y redondas.

- **Limpieza de húmedo:** Se realizaron pruebas de limpieza, con agua más *genapol* al 0,1%, aplicada con hisopos en movimientos circulares repetidos a fin de ir retirando esta capa de suciedad adherida. Ofreció buen resultado. Las piezas con acabados lustrosos y consistentes ofrecieron mejor resultado con este solvente, mientras otras se mostraron sensibles y presentan pulverulencia en la superficie. Se hicieron pruebas con etanol, que se aplicó en suciedad que se presenta un poco grasosa, se aplicó thinner en manchas evidentes de pintura a base de aceite y varsol para eliminar polvo de yeso o residuos de manchas de pasmado en la capa pictórica de algunas piezas.

Se aprecia en varias de estas esculturas que la suciedad ha penetrado mucho, tanto que ha alterado los colores del acabado y no permite eliminarlo.

- **Capa de protección:** Se realizó la aplicación de una capa de amonio cuaternario aplicado con aspersor sobre las esculturas que presentaban deterioros biológicos y que fueron removidos mediante la limpieza en húmedo, esta capa se aplico de manera particular sobre las esculturas de la Sagrada familia y Asunción de la virgen.

Registro fotográfico



Fotografía 432, 433, 434 y 435 Limpieza en seco y húmedo

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***










Fotografía 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 y 443 Acciones de conservación sobre bienes exteriores desmontados y trasladados

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***







Fotografía 444, 445, 446, 447 y 448 Acciones de conservación sobre bienes exteriores desmontados y trasladados

V. BIENES PENDIENTES DE ACCIONES DE CONSERVACION

A la fecha se encuentran pendientes por ejecutar acciones de conservación sobre los bienes que no se han podido desmontar y trasladar:

Campanas y Rosa de los vientos

En el campanario de la Capilla se evidencian posiblemente 3 campanas a las cuales no hay un acceso peatonal por la Capilla, y en el remate se evidencia la rosa de los vientos.

La única manera para acceder a estas es a través de elevación mediante una plataforma de elevación con escalera que tenga la altura requerida para esta maniobra. A la fecha se encuentran adelantado las gestiones correspondientes con el Cuerpo Oficial de Bomberos del sector a fin de contar con el apoyo en este

recurso, razón por la que el desmonte efectivo de estos bienes dependerá del acceso a este sector.

De ser factible el traslado, se realizarán las acciones de conservación que estas requieran, entre estas: limpieza superficial en seco; limpieza en húmedo y, en caso de requerirse acciones de pasivación.

Escultura San José

La escultura de San José que se encuentra en el Edificio Ancianato, se encuentra adosada a un pedestal pequeño en concreto. El desmonte se programa entre el 5 y 9 de diciembre de 2024, mientras se obtienen las autorizaciones de acceso al inmueble.



Fotografía 449 Escultura San José en Ancianato

Una vez realizado el desmonte y traslado, se realizarán las acciones de conservación que estas requieran, entre estas: limpieza superficial en seco; limpieza en húmedo.

Bombonas de lámparas y material fílmico

De acuerdo con la información suministrada por el ente gestor en el mezanine de la Sacristía de la Capilla se encuentra una caja con unas bombonas de lámparas y una caja de material fílmico, de estos elementos estamos a la espera de la entrega de dichos elementos por parte del ente gestor.

Sobre estos elementos se realizará la respectiva rotulación, limpieza superficial y almacenamiento en cajas de conservación, para que las mismas se depositen en el espacio asignado al interior del inmueble Convento.

VI. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

"El propósito de todo embalaje es proteger los objetos del medio externo. Es fundamental que el embalaje se haga con materiales adecuados para aislar los bienes del polvo, de las variaciones de humedad y temperatura y de la iluminación."

En atención al objetivo principal de este contrato se presenta de manera general las consideraciones que se tuvieron en cuenta para el diseño de los embalajes de la colección. Es importante aclarar que el objetivo de este embalaje es el de proteger las obras en el sitio asignado, durante el tiempo que duren los trabajos de restauración de los inmuebles del complejo San Juan de Dios.

- De acuerdo con la forma, dimensiones, peso y volumen del objeto, se presentarán las propuestas de embalaje.
- La selección de materiales responderá con aspectos de compatibilidad de materiales entre la obra y el embalaje, así como su estabilidad en el tiempo.
- Se seleccionarán materiales durables, considerando que se desconoce el tiempo en el que se mantendrán los bienes desmontados.

Consecuente con esta condición, el embalaje de las obras se realiza en guacales con láminas de OSB *(La lámina OSB (Oriented Strand Board) es un tipo de tablero de madera estructural fabricado con virutas orientadas y prensadas con resinas adhesivas. Es conocido por su fuerza, durabilidad y estabilidad dimensional, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones comerciales y residenciales, incluyendo techos, paredes, suelos y estructuras de soporte)* debidamente acondicionadas para cumplir con las exigencias de preservación de los bienes muebles.


Se utilizaron láminas de espuma de polietileno conformada de micro-almohadillas llenas de aire y cuya función es servir de material amortiguante de impactos, aislante térmico, impermeable y de protección contra golpes, vibraciones, cargas puntuales, rayones y humedad.

Cada guacal fue elaborado de acuerdo con la tipología de obras, tal como se relaciona en párrafos siguientes. Por último, se detalla el sistema de protección insitu para los bienes muebles que no se desmontan, ni se trasladan, específicamente en la Capilla a saber: retablo mayor, las placas adosadas al muro del costado sur y los querubines.


Almacenamiento de Vía Crucis

Previo al almacenamiento cada uno de los 13 pasos fue envuelto en tela quirúrgica cuyo objetivo es, por una parte, proteger la obra de abrasiones y por otra aislar un eventual acceso del polvo.

Al interior de la caja se dispuso, cada pieza de Vía Crucis en posición vertical, empleando como capas intermedias, una lámina de yumbolon con espesor de 5 mm, cuya función es la de aislar cada uno de los bienes se colocó una lámina de 5 cm de espesor cada tres elementos, para brindar mayor estabilidad y soporte, de tal forma que se limite al máximo su movimiento. En la zona central de cada vía crucis se colocó guata para protección de las imágenes del diseño de la zona central.

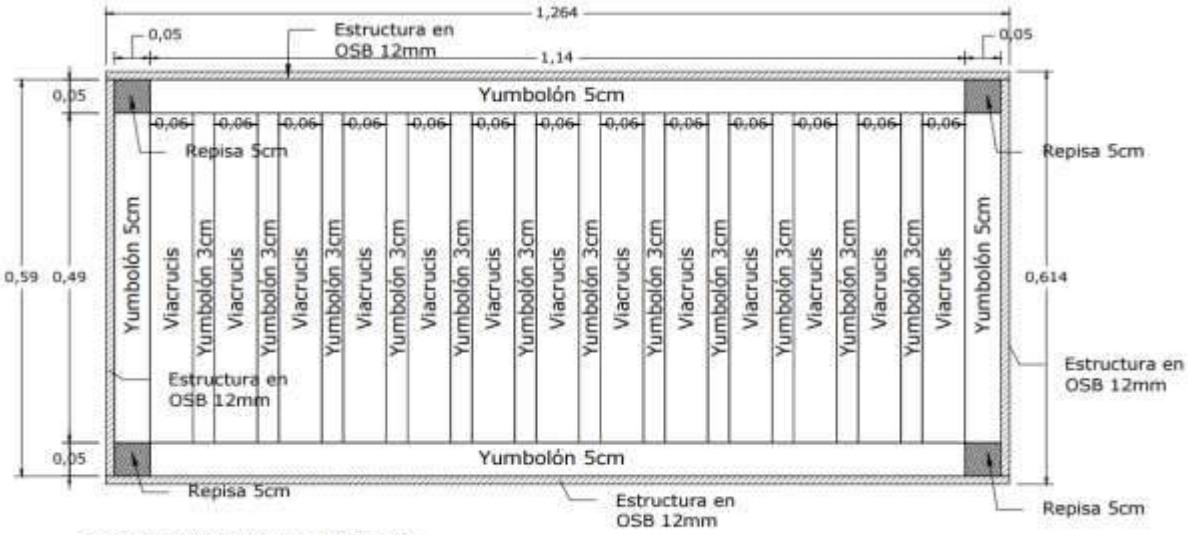

Caja de embalaje para Vía Crucis
Vista en planta

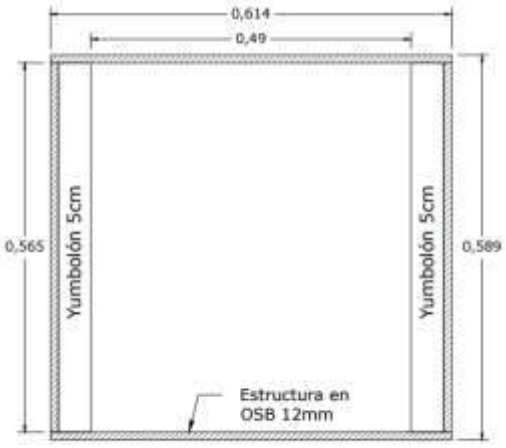

Caja de embalaje para Vía Crucis
Corte Transversal


Almacenamiento de esculturas y mobiliario

Cada una de las cajas de embalaje fueron fabricadas con superficies de sección suficiente para soportar el peso de las esculturas y la distribución de cargas que se puedan ejercer sobre las obras.

Cada caja propiamente se elaboró con láminas de OSB de 15 mm de espesor, reforzadas en bordes y esquinas con listones secciones de OSB de 10 cm de espesor de 12 mm, para compensar las tensiones que en diferentes sentidos se pueden producir, especialmente durante el transporte (en caso de transportarse a futuro). Estos elementos fueron fijados con tornillos autorroscantes para madera.


Con el fin de mantener el guacal en forma vertical, se instalaron en uno de los lados más angostos, listones cuadrados de madera, con sección de 8 X 8 cms, a treinta (30) cm de borde, a modo de patines y cuya función es adicionalmente la de permitir, por una parte, aislar la caja del contacto directo con el suelo y por otra, facilitar el desplazamiento del guacal (en caso de transportarse a futuro).

Para el caso de los elementos de formato pequeño como las piezas de pesebre, y algunas de formato mediano fueron embalados dentro de una misma unidad de almacenamiento (caja), con separadores en espuma de 5 cm (yumbolon) entre cada elemento.

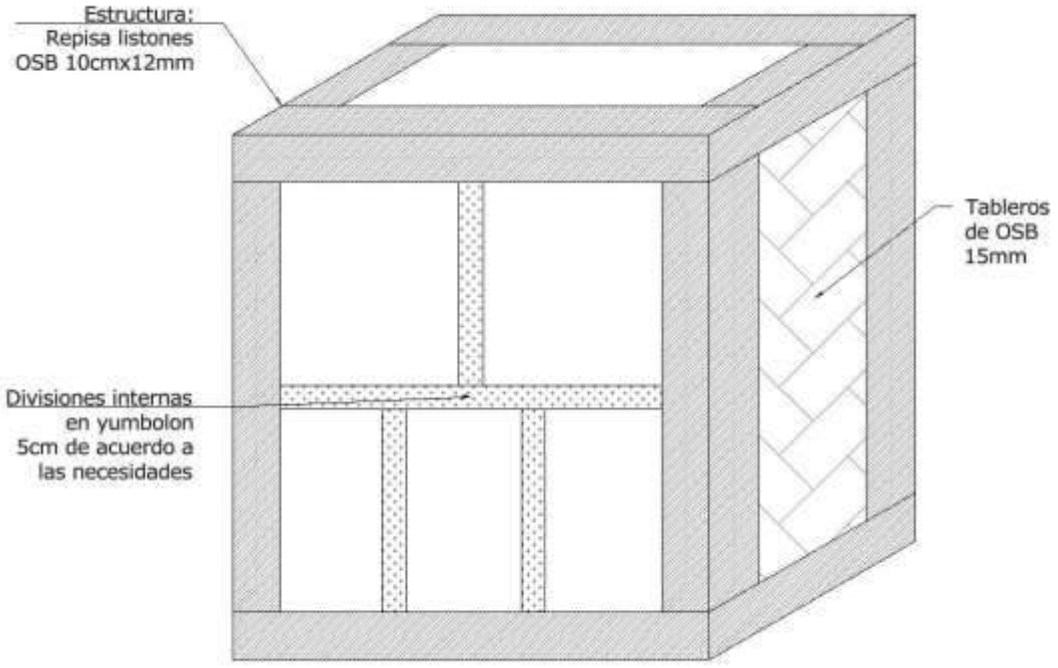

Como medida preventiva se colocaron pequeñas cantidades de sílica gel con indicador en bolsas de tela, con el fin de controlar eventuales humedades al momento de cerrar las cajas.

La tapa de la caja será fijada mediante tornillo autorroscantes para madera, actividad que solo será ejecutada una vez la supervisión verifique en conjunto los elementos de cada unidad de almacenamiento y se proceda al sello de las mismas. Como paso final cada uno de los guacales o cajas de embalaje serán marcados en el exterior con los pictogramas correspondientes a:

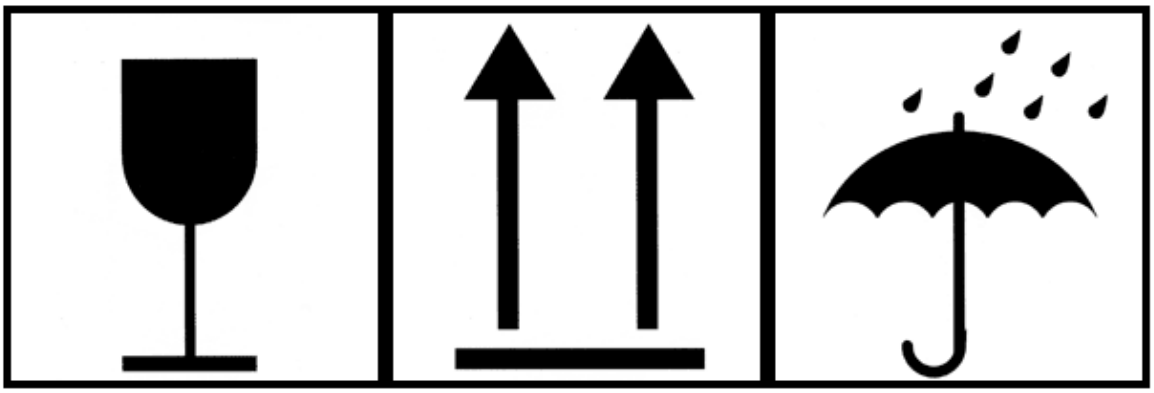

De igual forma, estos contendrán el nombre y la fotografía de la(s) obra(s) que se encuentra(n) en su interior, actividades que se desarrollarán entre el 9 y 12 de diciembre de 2024.

Protección de elementos arquitectónicos

Para los elementos arquitectónicos que se encontraban en Capilla se realizó la protección con film alveolar (plástico flexible y transparente)





Fotografía 450 y 451 Imagen general de los elementos arquitectónicos: pilares (15 unidades) y bases (6) unidades

Protección de bienes adosados a muros

Para los elementos adosados a los muros de la capilla (querubines y placas) que no fueron desmontados, la protección se realizara mediante la adicionar por el contorno de la pieza listones de madera de 5 x 5 cms los cuales serán adosados al muro mediante el uso de tornillos y chazos.

Posteriormente el bien a proteger será cubierto con tela quirúrgica y/o plástico burbuja. Como paso final el bastidor generado al contorno de la obra, se procederá a instalar una lámina de OBS de 5 mm para proteger completamente la obra de golpes. Estas actividades se ejecutarán entre 2 y 7 de diciembre de 2024.

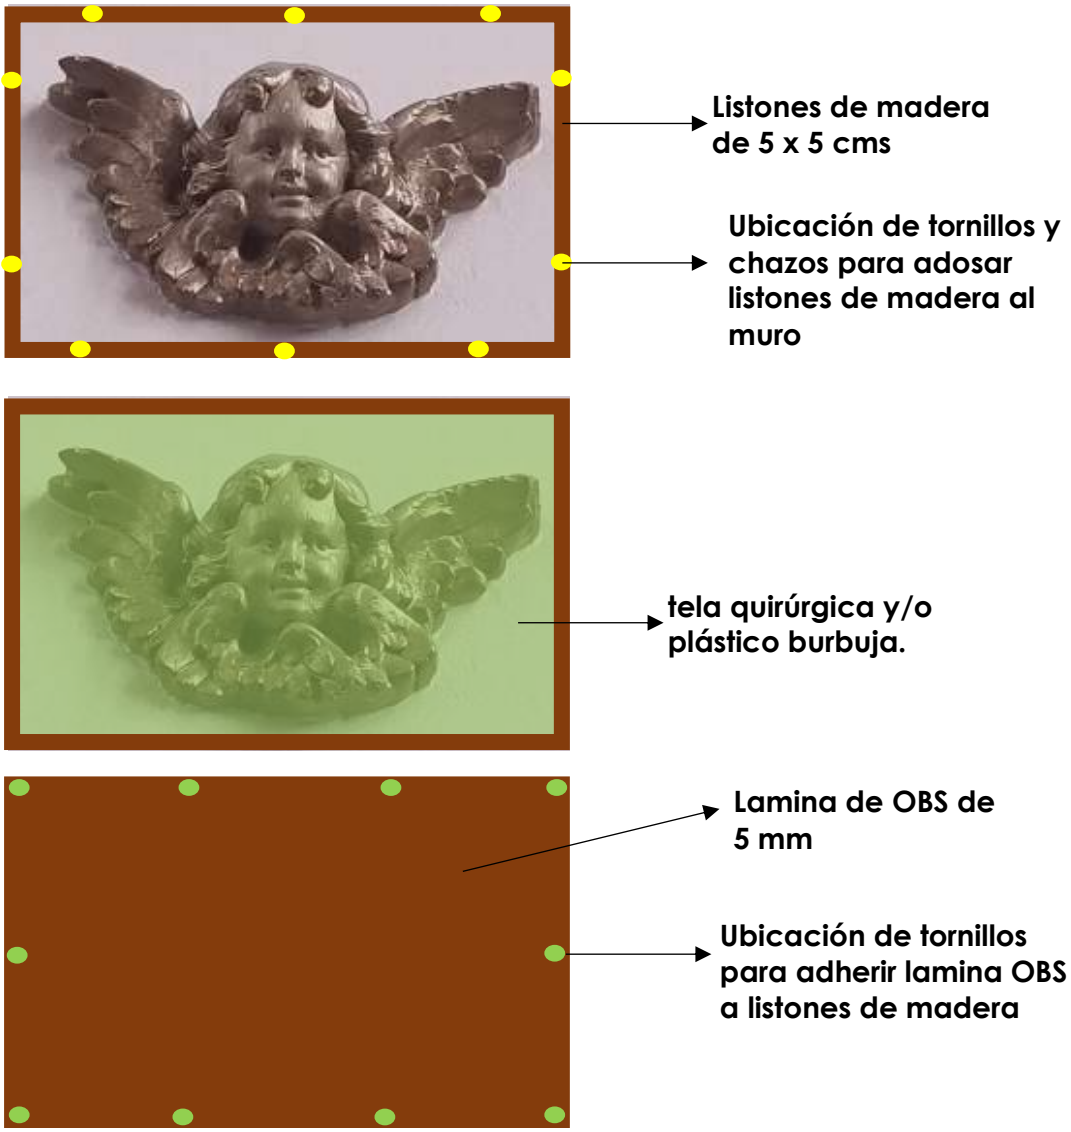


Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

Protección del altar mayor de la capilla

La protección del retablo se realiza mediante la construcción que asume la conformación del retablo a través de módulos por cada sección del retablo, comenzando con la escalinata inferior.

El sistema de protección es un cerramiento construido en láminas de aglomerado OBS adosado una estructura elaborada en repisas de pino canadiense aserrado. Se realizaron cajas en las repisas para una mayor rigidez de la estructura y se fijan con tornillos autorroscantes. Todos los elementos que tienen contacto con las superficies de las placas de enchape del altar se van aislando mediante secciones de yumbolón de espesor acorde a la forma y localización de punto de contacto.

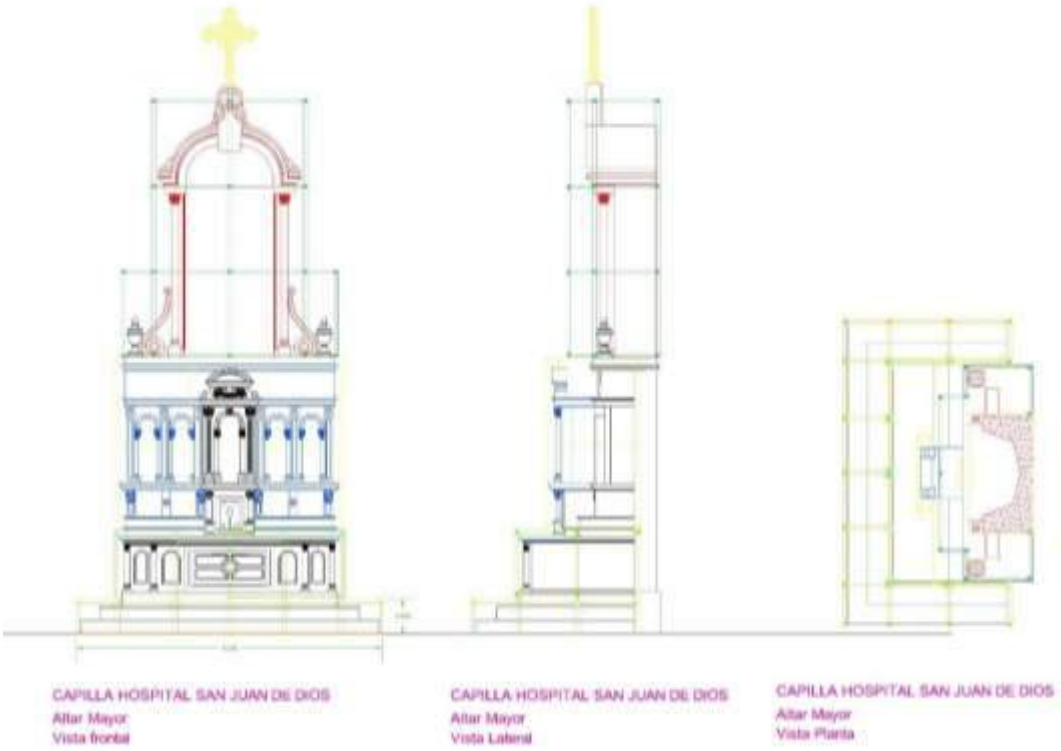

Esta actividad se encuentra en ejecución y espera culminarse el 5 de diciembre de 2024. Una vez terminado el sistema de protección se colocará impresa información de advertencia en referencia a que, si bien el sistema es estructuralmente resistente, no se debe permitir que los operarios que vayan a realizar actividades en la intervención de este inmueble, se paren, apoyen o utilicen esta estructura para colocar materiales o productos que puedan afectar tanto la integridad del retablo como del sistema de protección.

Registro fotográfico










Fotografía 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 y 459 Registro fotográfico general unidades de almacenamiento y embalaje

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

VII. INSTALACIÓN DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la relevancia y valor socio cultural de la colección de bienes muebles del San Juan De Dios, en cada uno de los elementos desmontados se realizó la instalación de las fichas de identificación de cada pieza con el fin de comunicar a la comunidad las acciones que se realizaron y dar la seguridad que se encuentran resguardadas y protegidas durante las obras que se adelantan en el complejo y hasta que se finalicen estas obras. Las fichas fueron elaboradas en banner de 3 onzas en tamaño 35 x 50 cms.







Fotografía 460, 461, 462, 463 y 464 Registro fotográfico general banners informativos instalados

CERTIFICACIÓN DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De conformidad con lo señalado en Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, JUAN DE JESÚS GUERRERO GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.486.315 de Bogotá como proponente/contratista persona natural y, NOHRA PATRICIA GAITÁN COPETE identificada con cedula de ciudadanía No. 51.720.137 de Bogotá en mi calidad de Contadora del señor JUAN DE JESÚS GUERRERO GÓMEZ con NIT 19.486.315-1 certificamos bajo la gravedad de juramento que por la vigencia actual y desde el mes de mayo de 2024 se aplicaron las normas legales vigentes en cuanto a la liquidación y pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y no hubo lugar a practicarlos puesto que en concordancia con la forma de contratación por servicios, no existe relación laboral entre el personal contratado y el proponente, y por lo tanto a la fecha se encuentra totalmente a paz y salvo. De igual manera con Aportes Parafiscales de la Caja de Compensación, SENA, ICBF y FIC.

Sin embargo, Juan de Jesús Guerrero Gómez realiza sus aportes personales a seguridad social en salud, pensión y ARL.


PERSONAL A CARGO
Manifestamos bajo la gravedad de juramento que JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ no tiene personal a cargo y por ende no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud, riesgos laborales y aportes parafiscales

ACUERDOS DE PAGO
Manifestamos bajo la gravedad de juramento que JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ a la fecha NO PRESENTA ACUERDO DE PAGO con ninguna entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Bogotá D.C., noviembre 28 de 2024



NOHRA PATRICIA GAITÁN C.
Contador Público
T. P. No. 19025-T



JUAN DE JESÚS GUERREO G
CC 19.486.315

Bogotá D.C., noviembre 28 de 2024


CALCULO DE INGRESO BASE DE COTIZACIÓN

Conforme al artículo 3.2.7.5 del Decreto 1601 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social - bajo el esquema de presunción de costos para las actividades profesionales, científicas y técnicas se realiza el cálculo del ingreso base de cotización para el tercer pago del contrato 4242-2023 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Cultura y Juan de Jesús Guerrero Gómez:

Valor facturado (Antes de IVA)	$ 108.389.915,97
% Presunción de costos - Actividades profesionales, científicas y técnicas	61,90%
Calculo presunción de costos según artículo 3 de la resolución 209 de 2020	$ 67.093.357,99
VALOR NETO PARA CALCULO DEL IBC	$ 41.296.557,98
VALOR IBC (40% del valor neto)	$ 16.518.623,19

Nota: Los aportes de Juan de Jesús Guerrero Gómez se realizan sobre el IBC anteriormente señalado, para los periodos de ejecución reportados a saber: noviembre de 2024.

Sin otro particular, se expide el presente documento a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2024.



JUAN DE JESÚS GUERRERO GÓMEZ
Contratista
Representante Legal



NOHRA PATRICIA GAITÁN C
Contador

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.720.137**

GAITAN COPETE

APELLIDOS

NOHRA PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1958**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-SEP-1982 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00241663-F-0051720137-20100617 0022303931A 2 1200760301



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

19025-T

NOHRA PATRICIA
GAITAN COPETE
C.C. 51.720.137
RESOLUCION INSCRIPCION 2356-T FECHA 1-X-87
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

00025341



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BDE3C3CE939A48D5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NOHRA PATRICIA GAITAN COPETE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51720137 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19025-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7947196736**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1039720837

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 31.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 31.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 402.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 402.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7947196736**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1039720837

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD					ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 19486315	GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	19486315	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 402.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950801608**		TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1081876687

NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7947196736	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/11/12

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.600.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.600.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 1.902.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.902.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 140.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 140.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.643.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.643.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19486315
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 1D 28 30	TELÉFONO:	2438799
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Artes plásticas y visuales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950801608**			TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/28			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1081876687
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7947196736			FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA	2024/11/12

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.435.100	$ 0	$ 0	$ 82.600	$ 82.600	$ 0	$ 0	$ 2.600.300	$ 0	$ 2.600.300
SUBTOTALES:										**$ 2.600.300**	**$ 0**	**$ 2.600.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.902.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.902.400	$ 0	$ 0	$ 1.902.400
SUBTOTALES:													**$ 1.902.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.902.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 140.800	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 140.800
SUBTOTALES:									**$ 140.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 19486315	GUERRERO GOMEZ JUAN DEJESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO							A											25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	19486315	$ 31.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 19486315	GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO							C		01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 16.519.000	$ 2.643.100	$ 82.600	$ 82.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.808.300	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 16.519.000	$ 2.064.900	$ 0	$ 2.064.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 16.519.000	19486315	$ 172.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 19486315	GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO							R		01-30									25-14 COLPENSIONES	0	$ 15.219.000	$ 2.435.100	$ 82.600	$ 82.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.600.300	EPS001-ALIANSALUD S.A.	0	$ 15.219.000	$ 1.902.400	$ 0	$ 1.902.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 15.219.000	19486315	$ 140.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 4.643.500**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **28/11/2024**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **19486315**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488422131604**
Fecha de apertura	**02/07/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a4ae7755832c8b54f5f4e489c8f0b0a5a0b75c45783486074184bb595403ac17b8b3428a6e62dff05b7b7b9e620270d0

Número de Factura: FE-87
Fecha de Emisión: 28/11/2024
Fecha de Vencimiento: 28/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS
Nombre Comercial: GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS
Nit del Emisor: 19486315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9005

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 6 11 73 OF 301
Teléfono / Móvil: 6012438799
Correo: jdejguerrerog@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE CULTURA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830034348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 8 # 8 - 55
Teléfono / Móvil: 3424100
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Tercer pago del 40 por ciento del contrato 4242 de 2023 correspondiente a informe de desmontaje y acciones de conservacion sobre los bienes muebles del Complejo Hospitalario San Juan de Dios	NIU	1,00	$ 108.389.915,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.594.084,03	19.00			$ 108.389.915,97

Notas Finales

#$33-01-01; Contrato 4242-2023; eserpa@mincultura.gov.co #$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2024 15:38:51
Documento validado por la DIAN:
28/11/2024 15:38:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			108389915.97
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			108389915.97
IVA			20594084.03
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			20594084.03
Total neto factura (=)			128984000
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	128984000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		108.389.915,97
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		108.389.915,97
IVA		20.594.084,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		20.594.084,03
Total neto factura (=)		128.984.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$128.984.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764081718228 Rango desde: 85 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-04-17
