INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA	
Número del Contrato:	**MC-MT-021-2024**
Objeto:	**ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DETASCO, BOYACÁ.**
Fecha de suscripción del contrato:	18 de octubre de 2024
Contratante:	MUNICIPIO DE TASCO NIT N°: 891.856.131-3 R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA
Nombre Contratista:	JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ SÁNCHEZ C.C. N°: 74.377.871 DE DUITAMA
Supervisor:	FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
Valor fiscal:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.951.199).
Plazo:	QUINCE (15) DÍAS.
Fecha de Inicio:	21 de octubre de 2024
Fecha de terminación inicial:	04 de noviembre de 2024
Fecha de recibo final:	05 de noviembre de 2024
Avance Físico:	100.00 %
Avance Financiero:	100.00 %
ADICIONES AL CONTRATO (Si aplica)	
Valor adicional:	N/A
Motivo:	N/A
Fecha de suscripción:	N/A
Valor total contrato:	N/A
PRORROGA (Si aplica)	
Período autorizado:	N/A
SUSPENSIÓN DEL PLAZO (Si aplica)	
Fecha de suspensión 01:	N/A
ESTADO ACTUAL	
Valor Total Ejecutado (Según actas)	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.951.199).

1) CONTROL TÉCNICO

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas en el presente contrato con el registro fotográfico correspondiente.

Algunas de las actividades desarrollas fueron hechas en el predio contiguo a la subestación eléctrica del municipio, predio en que actualmente se desarrollan las actividades relacionadas con mercados y ferias ganaderas, las demás actividades son netamente de oficina.


REGISTRO FOTOGRÁFICO.

ÍTEM:	
ACTIVIDAD:	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTÉCNIA




FOTO N° 1


ÍTEM:	2.0
ACTIVIDAD:	DISEÑO ARQUITECTÓNICO

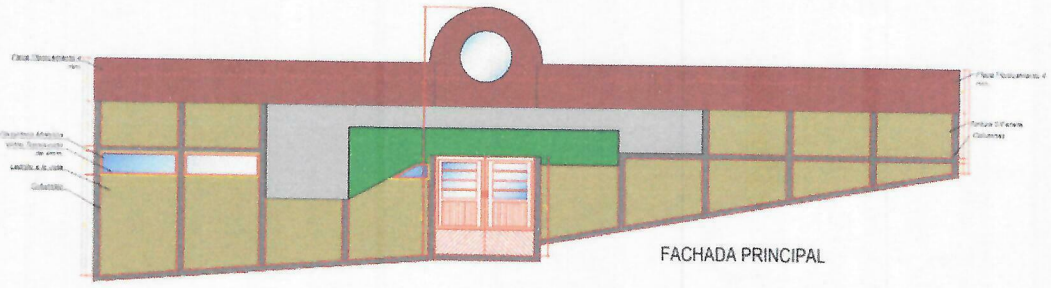

FACHADA PRINCIPAL



FACHADA ORIENTE EXTERNA



FACHADA NORTE

FOTO N° 2

ÍTEM:	3.0
ACTIVIDAD:	DISEÑO ESTRUCTURAL

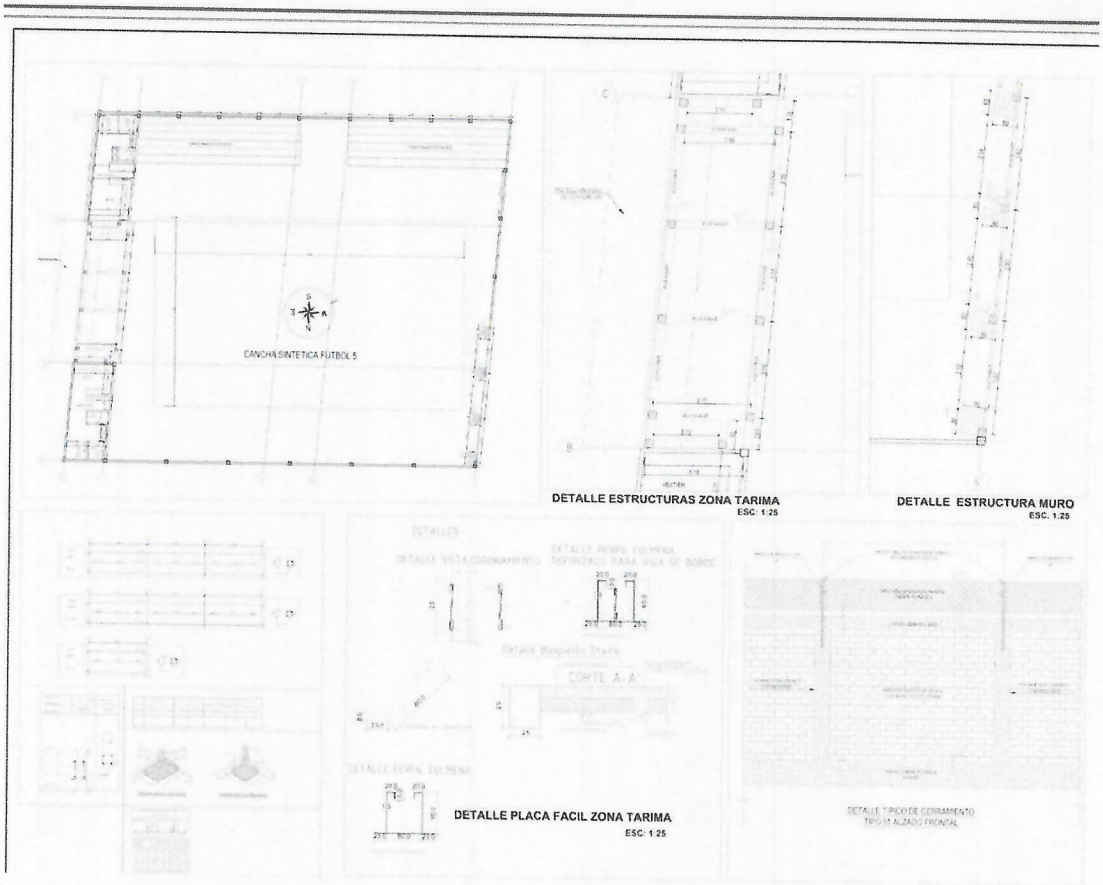


FOTO N° 3

ÍTEM:	4.0
ACTIVIDAD:	DISEÑO HIDROSANITARIO.

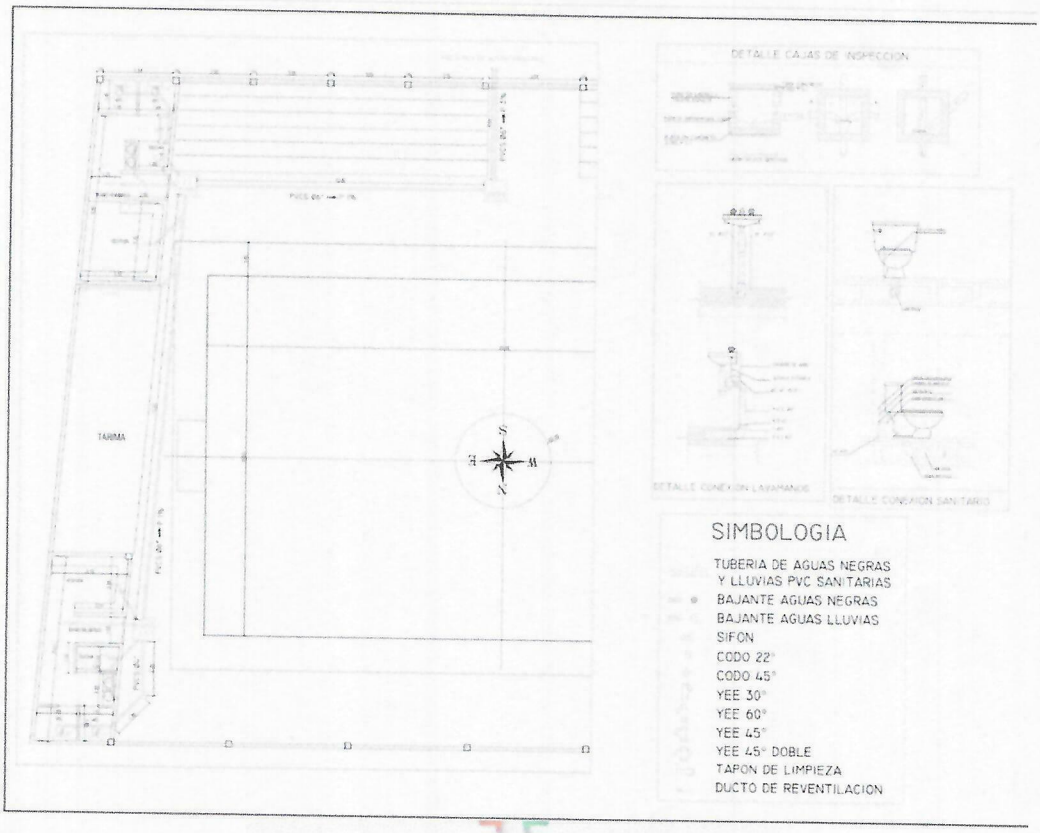


FOTO N° 4

ÍTEM:	5.0
ACTIVIDAD:	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TASCO BOYACA

ITEM	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	INC. POR DISTANCIA (5%)	VALOR TOTAL
1		OBRAS PRELIMINARES					15.828.440,75
1,1	1.01.10	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	M3	28,58	$197.409,42	$0,00	5.641.961,22
1,2	3.13.16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	M3	16,97	$264.644,88	$0,00	4.491.023,61
1,3	1.01.33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	50,88	$13.629,00	$0,00	693.443,52
1,4	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	60,50	$51.943,58	$0,00	3.142.586,59
1,5	1.01.54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	35,84	$11.929,22	$0,00	427.543,24
1,6	1.01.24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	149,96	$9.548,43	$0,00	1.431.882,56
2		INSTALACIONES HIDROSANITARAS					10.575.204,63
2,1	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	14,00	$112.957,53	$5.647,88	1.660.475,69
2,2	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	6,00	$480.785,87	$24.039,29	3.028.950,98
2,3	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	17,60	$54.934,97	$2.746,75	1.015.198,25
2,4	2.04.56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	10,00	$112.576,80	$5.628,84	1.182.056,40
2,5	1.06.41	TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	34,53	$77.259,14	$3.862,96	2.801.146,01
2,6	1.06.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	1,00	$270.593,94	$13.529,70	284.123,64
2,7	1.06.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	1,00	$574.527,30	$28.726,37	603.253,67
3		FILTROS DE SUBDRENAJE					10.018.777,67

PRESUPUESTO | M1.1 | M1.2 | M1.3 | M1.4 | M1.5 | M1.6 | M2.1 | M2.2 | M2.3 | M2.4 | M2.5

FOTO N° 5

Durante la ejecución del presente contrato se cumplió con las actividades contempladas sin ninguna eventualidad.

FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
Secretario de Planeación y Obras Públicas
