Espacio para
Logo Corporativo

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
NIT 24.575.150-1
CR 25 41-16 ED CAMINO REAL
Tel: (606) 3128507430
Calarca - Colombia
lcardonamarin23@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CMLE 15

Señores	MUNICIPIO DE FILANDIA		
NIT	890.001.339-5	**Teléfono**	(606) 7582195 - Ext. 000
Dirección	CL 20 13-22 CAD	**Ciudad**	Filandia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2024, 12:34
Expedición	17/12/2024, 13:13
Vencimiento	17/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Bruto	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	17,075,347.00	0 %	0.00	0 %	17,075,347.00	17,075,347.00
2	ADMINISTRACION 29.33%	1.00	5,016,737.00	0 %	0.00	0 %	5,016,737.00	5,016,737.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	170,753.00	0 %	0.00	0 %	170,753.00	170,753.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	853,767.00	0 %	0.00	0 %	853,767.00	853,767.00

Total items: 4

Total Bruto	23,116,604.00
Total a Pagar	23,116,604.00

Valor en Letras: Veintitres millones ciento dieciseis mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 23,116,604.00

Observaciones: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTALACION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084563508 aprobado en 20241202 prefijo CMLE desde el número 12 al 25 Vigencia: 6 Meses** - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: e6c3063034a872d378486f98c81e977d1a7c03a3bb5d8d5902974308b66a331acdb0cf188608a473821e095f9bf4cb3f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Correspondencia Despachada
Vigencia: 2024 - Consecutivo: D-10554
Fecha Rad: 16/12/2024-03:09 PM
Destinatario: LUZ EDINETH CARDONA MARIN-(ARMENIA)
Remitente: Luz Adriana Carmona Ortega-Subsidio Familiar
CONSTANCIA PAGO APORTES

151.4.1

Armenia,

Comfenalco Quindío

LA SUSCRITA COORDINADORA DE SUBSIDIO FAMILIAR
DE COMFENALCO QUINDIO

A PETICIÓN DEL INTERESADO
HACE CONSTAR QUE:

La contratista CARDONA MARIN LUZ EDINETH identificado con Nit. 24575150-1 canceló a esta Caja de Compensación Familiar la suma de CIEN MIL SETECIENTOS PESOS MTCE ($ 100.700), por concepto de aportes correspondientes al 4%, por los siguientes periodos:

- Año (2024) por los meses de noviembre y diciembre por un valor de $100.700

La contratista suscribió contrato de obra No 001 DE 2024 con la entidad MUNICIPIO DE FILANDIA identificada con Nit 890001339-5

Para constancia se firma a los 16 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

LUZ ADRIANA CARMONA ORTEGA
Coordinadora de Subsidio Familiar

Transcriptor: María Alexandra Martínez

NO TIENE VALIDEZ PARA EFECTOS TRIBUTARIOS
NO ES VALIDO PARA EFECTOS DE AFILIACIÓN EN OTRA CAJA DE COMPENSACIÓN

VIGILADO Supersubsidio

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Armenia - Quindío

Recibo de Caja No: 122078625

LIQUIDACION PAGO DE APORTES - FIC SECTOR CONSTRUCCION

FECHA: 16/Dic/2024 No: 510

DATOS BASICOS

Nombre o razón social: CARDONA MARIN LUZ EDINETH
Nit: 24576168 Actividad económica: CONSTRUCCIÓN Caja de compensación: xxxxxxxxxx
Dirección: CARRERA 23 41-66 (CALARCA) Ciudad: CALARCA Teléfono: 7434163

DETALLE DEL APORTE AL SENA

Año	Meses	Número de contrato	Contratante	Valor de la nómina	Valor del aporte
2024	12 12 12 12 12 12	CO 001-2024-78	MUNICIPIO DE FILANDIA		

Total a pagar al SENA $ _____

DETALLE DE APORTE AL FIC

Año	Meses	Tipo de obra a realizar	Ingre	Valor del contrato	Valor del pago
2024	12 12 12 12 12 12	MEJ Y MTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIV	A	PLANILLAS	162.500

Total a pagar al FIC $ 162.500

Total a pagar aportes SENA + FIC $ 162.500

PAGO EN EFECTIVO

Son: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones: LIQUIDA CO 001-2024 POR $57.288.963 MPIO DE FILANDIA

ELABORADO

AUTORIZADO

Liquida contrato Nº CO-001-2024 $ 57'288.963

Armenia, 17 de diciembre de 2024


PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

LUZ EDINETH CARDONA MARIN identificada con 24.575.150, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de formación Profesional para la industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por los últimos seis (6) meses en vista de la ejecución del contrato de obra 2023-014 lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ANA ELIZABETH CAMACHO VARON identificado con **41.916.726** y con Tarjeta Profesional **52859-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de **LUZ EDINETH CARDONA MARIN** identificada con cedula de ciudadanía 24.575.150 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Armenia, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la Ingeniera, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto de la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la Ingeniera durante los últimos seis (6) meses en vista de la ejecución del contrato de obra lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En consecuencia, se firma a los diecisiete (17) día de diciembre de dos mil veinticuatro 2024.





LUZ EDINETH CARDONA MARIN

CC. 24.575.150 Calarca, Quindío

ANA ELIZABETH CAMACHO VARON

CC. 41.916.726 Armenia, Q.

T.P. 52859-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1Z8C4DB5E61F0371

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA ELIZABETH CAMACHO VARON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41916726 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 52859-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

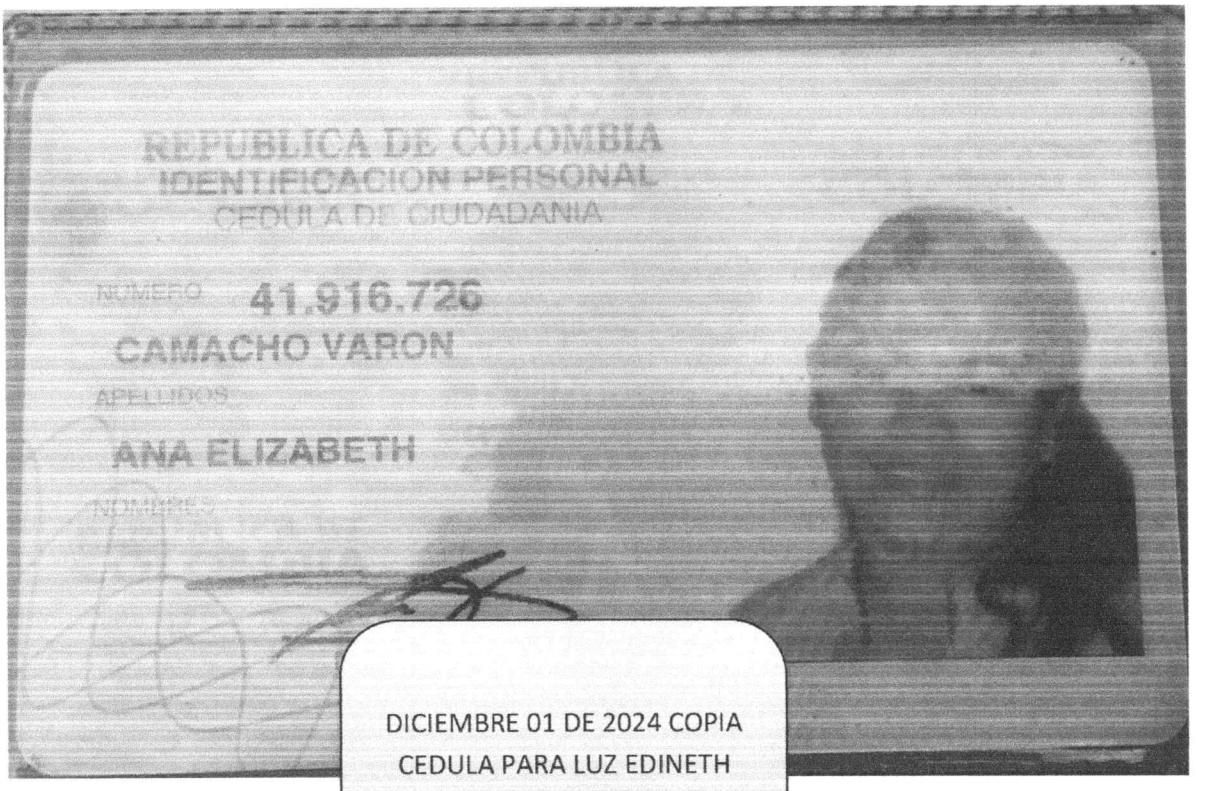
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.916.726


CAMACHO VARON

APELLIDOS

ANA ELIZABETH

NOMBRES

DICIEMBRE 01 DE 2024 COPIA CEDULA PARA LUZ EDINETH CARDONA MARIN PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

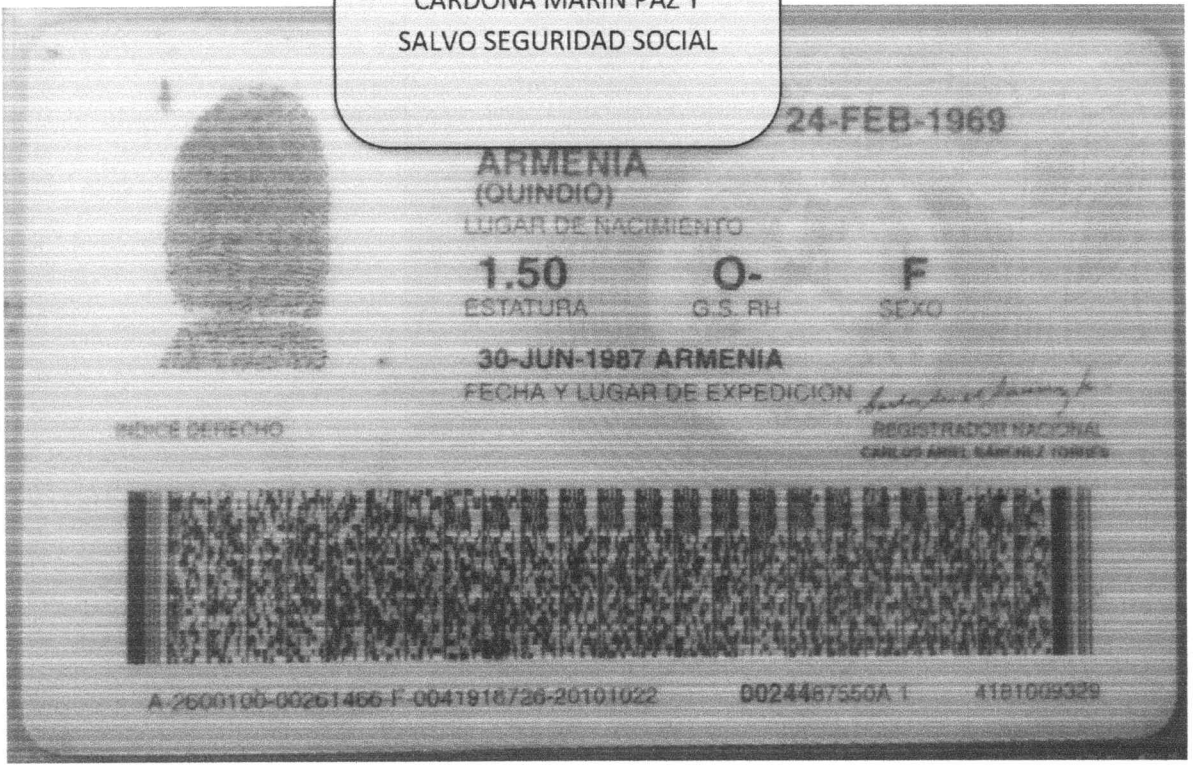
24-FEB-1969

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O-
G.S. RH

F
SEXO

30-JUN-1987 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2600100-00261466-F-0041916726-20101022 0024467550A 1 4181009329



DICIEMBRE 01 DE 2024 COPIA
TARJETA PARA LUZ EDINETH
CARDONA MARIN PAZ Y SALVO
SEGURIDAD SOCIAL

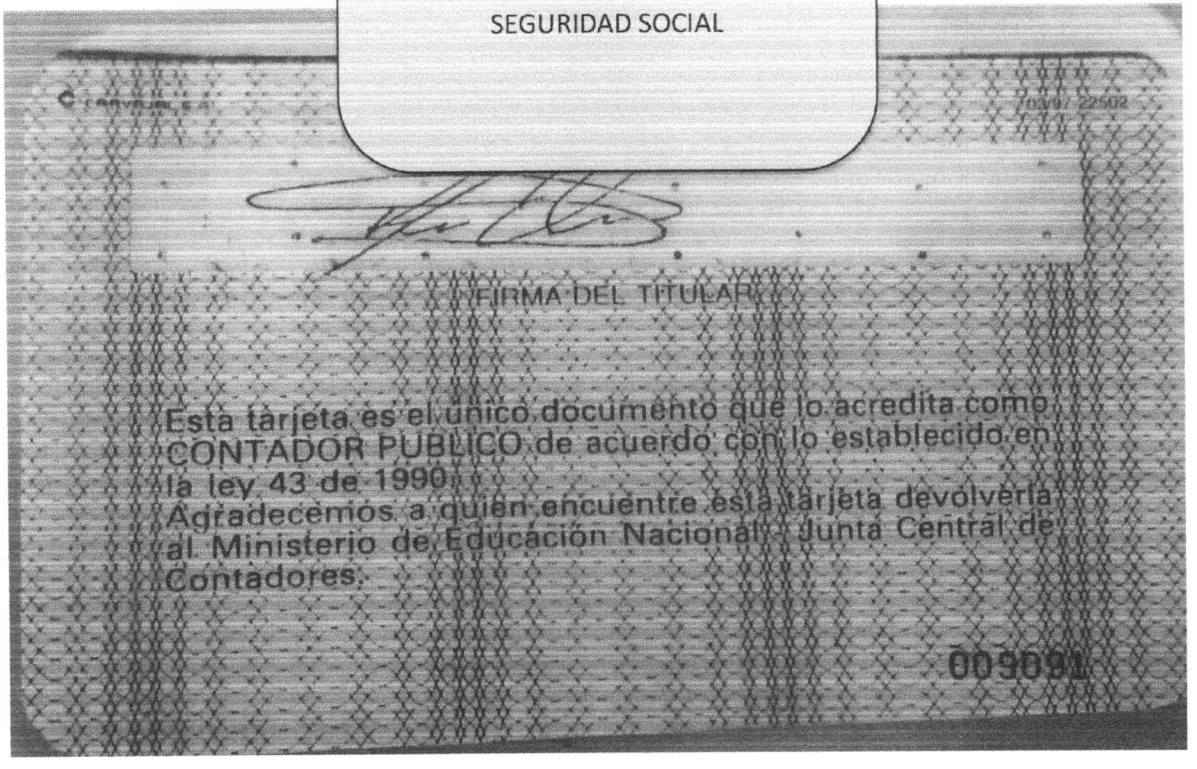

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24575150		CARDONA MARIN LUZ EDINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 25 41-16 AP 401 ED CAMINO REAL	CALARCA-QUINDIO	7434750	S1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	43214309	9477838549	I	2024/12/12	2024/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
1	CC	24575150	CARDONA LUZ	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24575150		CARDONA MARIN LUZ EDINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 25 41-16 AP 401 ED CAMINO REAL	CALARCA-QUINDIO	/434/50	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	43214309	9477838549	I	2024/12/12	2024/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$384,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$384,100	$0	$0	$384,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41956140		MURILLO HERNANDEZ LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Los Libertadores Maz P casa 1	ARMENIA-QUINDIO	7340208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1098129352	9478454861	I	2024/12/10	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$542,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,600	$0	$0	$244,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$244,600	$0	$0	$244,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$106,500	$0	$0	$106,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$106,500	$0	$0	$106,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$191,100	$0	$0	$191,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$191,100	$0	$0	$191,100
TOTAL				1	$542,200	$0	$0	$542,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41956140		MURILLO HERNANDEZ LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Los Libertadores Maz P casa 1	ARMENIA-QUINDIO	7340208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1098129352	9478454861	I	2024/12/10	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$542,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	41956140	MURILLO HERNANDEZ LINA MARIA									X									25-14	30	$1,528,739	$244,600	EPS005	30	$1,528,739	$191,100		0	$0	$0	14-11	30	$1,528,739	$106,500	0	$0	$0	No	$542,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,528,739	$244,600			$1,528,739	$191,100			$0	$0			$1,528,739	$106,500		$0	$0		$542,200

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-13. 06:30:40 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74662081

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 02/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ EDINETH CARDONA MARIN		
Documento	NI24575150	**Dirección**	CR 25 #41 - 16 EDIFICIO CAMINO REAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7327455
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALARCA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal	CARDONA MARIN LUZ EDIETH	**Identificación**	CC 24575150
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7545520	CARLOS ALBERTO ORTIZ POVEDA	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 9773244	JOHN ANGEL PIRABAN CASTELLANOS	01	00	X																0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 780.000	$ 124.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.560.000	$ 1.560.000	$ 1.560.000	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 62.400	$ 108.600	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.000	$ 0	$ 483.000

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-12. 10:29:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 75015788

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 12/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ EDINETH CARDONA MARIN		
Documento	NI24575150	**Dirección**	CR 25 #41 - 16 EDIFICIO CAMINO REAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7327455
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALARCA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal	CARDONA MARIN LUZ EDIETH	**Identificación**	CC 24575150
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET T P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7545520	CARLOS ALBERTO ORTIZ POVEDA	01	00		X																0	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 433.334	$ 17.400	6,960	$ 433.334	$ 30.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
CC 9772922	JOHN FABER ORTIZ LONDOÑO	01	00	X	X																0	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 9773244	JOHN ANGEL PIRABAN CASTELLANOS	01	00		X																0	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 433.334	$ 69.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 433.334	$ 17.400	6,960	$ 433.334	$ 30.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 953.335	$ 953.335	$ 953.335	$ 953.335	$ 152.700	$ 38.300	$ 66.500	$ 38.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.800	$ 0	$ 295.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ALCALDIA DE FILANDIA
SECRETARÍA DE PLANEACION

CONTRATO DE OBRA No. CO 001-2024 SPL
ACTA FINAL

OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCTIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO**
CONTRATO DE OBRA N°:	**CO 001-2024 SPL**
CONTRATISTA:	**LUZ EDINETH CARDONA MARIN**
REPRESENTANTE:	**LUZ EDINETH CARDONA MARIN**
CEDULA O NIT N°:	**24.575.150**
VALOR INICIAL:	**$ 57.288.963,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ - 0%**
VALOR ADICIONAL:	**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 57.288.963,00**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**30 Días**
FECHA DE INICIACIÓN:	**15/11/2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**-**
PLAZO PRORROGA:	**-**
FECHA DE REINICIACIÓN:	**-**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**14/12/2024**

En la Alcaldia de Filandia , se reunieron: WERNWER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ en calidad de Supervisor, LUZ EDINETH CARDONA MARIN en calidad de contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta Final		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
	1. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE EL PARAISO															
1,1	Recorrido de cubierta	M2	342,00	$ 11.387,00	$ 3.894.354	106,22		448,22	$ 11.387,00	$ 5.103.881,00	448,22	$ 5.103.881,00		$ -	448,22	$ 5.103.881,00
1,2	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	270,00	$ 51.882,39	$ 14.008.245		-64,25	205,75	$ 51.882,39	$ 10.674.802,00	205,75	$ 10.674.802,00		$ -	205,75	$ 10.674.802,00
1,3	Suministro e instalación de Caballete fijo en fibrocemento	ML	20,00	$ 55.646,96	$ 1.112.939		-3,47	16,53	$ 55.646,96	$ 919.844,00	16,53	$ 919.844,00		$ -	16,53	$ 919.844,00
1,4	Desmonte de cielo raso, Incluye estructura	M2	118,00	$ 12.619,00	$ 1.489.042	23,63		141,63	$ 12.619,00	$ 1.787.229,00	111,86	$ 1.411.561,00	30,89	$ 389.801,00	142,75	$ 1.801.362,00
1,5	Cielo raso en placa super board y perfiles de aluminio	M2	118,00	$ 72.237,00	$ 8.523.966		-79,13	38,87	$ 72.237,00	$ 2.807.852,00	9,10	$ 657.357,00	30,89	$ 2.231.401,00	39,99	$ 2.888.758,00
1,6	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	M2	118,00	$ 16.502,00	$ 1.947.236	32,72		150,72	$ 16.502,00	$ 2.487.181,00	0,00	$ -	151,84	$ 2.505.664,00	151,84	$ 2.505.664,00
1,7	Revisión y reparación instalaciones para lavaplatos	UND	1,00	$ 92.682,00	$ 92.682			1,00	$ 92.682,00	$ 92.682,00	1,00	$ 92.682,00		$ -	1,00	$ 92.682,00
NP-1	Cielo raso en PVC Incluye estructura de soporte	M2	0,00	$ 62.324,00		102,06		102,06	$ 62.324,00	$ 6.360.787,00	102,06	$ 6.360.787,00		$ -	102,06	$ 6.360.787,00
				SubTotal	**$ 31.068.464**					**$ 30.234.258,00**		**$ 25.220.914,00**		**$ 5.126.866,00**		**$ 30.347.780,00**
	2, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE MESA ALTA															
2,1	Recorrido de cubierta	M2	231,00	$ 11.387,00	$ 2.630.397	129,12		360,12	$ 11.387,00	$ 4.100.661,00		$ -	360,00	$ 4.099.320,00	360,00	$ 4.099.320,00
2,2	Cielo raso en PVC Incluye estructura de soporte	M2	129,00	$ 62.324,00	$ 8.039.796		-6,76	122,24	$ 62.324,00	$ 7.618.486,00		$ -	122,24	$ 7.618.486,00	122,24	$ 7.618.486,00
2,3	Suministro e instalación de vidrios espesor 4 mm.	M2	16,00	$ 36.156,00	$ 578.496		-9,62	6,38	$ 36.156,00	$ 230.675,00		$ -	6,38	$ 230.675,00	6,38	$ 230.675,00
				Sub Total	$ 11.248.689					**$ 11.949.822,00**		**$ -**		**$ 11.948.481,00**		**$ 11.948.481,00**
	SUBTOTAL OBRAS EJECUTADAS RURALES				**$ 42.317.153**											
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)				**$ 42.317.153**					**$ 42.184.080,00**		**$ 25.220.914,00**		**$ 17.075.347,00**		**$ 42.296.261,00**
	ADMINISTRACIÓN:	29,38%	$		12.432.780					$ 12.393.683,00		$ 7.409.905,00		$ 5.016.737,00		$ 12.426.641,00
	IMPREVISTOS:	1,00%	$		423.172					$ 421.841,00		$ 252.209,00		$ 170.753,00		$ 422.963,00
	UTILIDAD:	5,00%	$		2.115.858					$ 2.109.204,00		$ 1.261.046,00		$ 853.767,00		$ 2.114.813,00
	TOTAL A.I.U		**$**		**14.971.810**					**$ 14.924.726,00**		**$ 8.923.160,00**		**$ 6.041.257,00**		$ 14.964.417,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO (B)															
	VALOR TOTAL (A+B)		**$**		**57.288.963**					**$ 57.108.808,00**		**$ 34.144.074,00**		**$ 23.116.604,00**		**$ 57.260.678,00**

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 57.288.963,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 23.116.604,00**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**$ 23.116.604,00**
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$ 28.285,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
SALDO POR LIBERAR:	**$ 28.285,00**

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (profesional a cargo), en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. Nota: El contratista presentó **CERTIFICADO** del contador público Titulado ANA ELIZABETH CAMACHO VARON con **tarjeta profesional N° 52859-T** donde certifica que LUZ EDINETH CARDONA MARIN con CEDULA. **24575150** , identificado(a) con número de cédula 38.262.232, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar,y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

Se firma la presente acta, a los 19 días del mes de diciembre del año 2024

Elaboró:

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
CONTRATISTA

Visto Bueno:


WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE PLANEACION
SUPERVISOR


Memoria Calculo de Cantidades

Item	Capitulo	Actividad	Unidad		Cantidad Total
2,2	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE MESA ALTA	CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUTURA DE SOPORTE	M2		122,24

Numero	Tramo	Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	Area/Volumen	Acumulado	Observacion
1	AUALA ESCOLAR 1	9,10	6,00			54,60	54,60	
2	AUALA ESCOLAR 2	8,90	6,00			53,40	108,00	
3	HABITACION	4,25	3,35			14,24	122,24	
	TOTAL						122,24	

Esquema

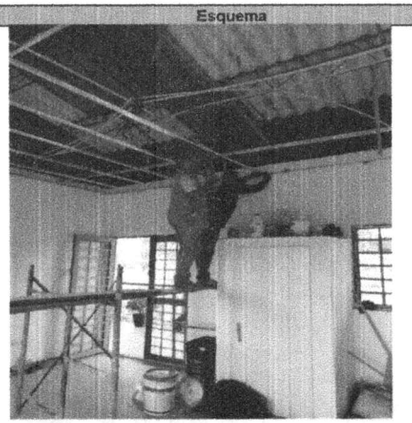

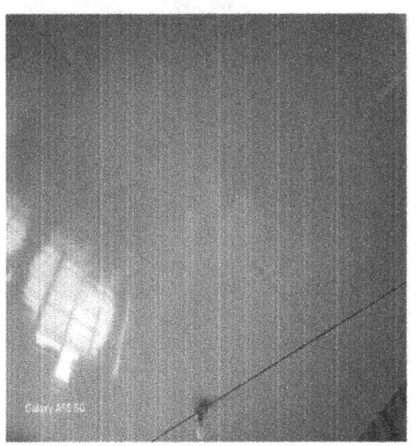

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
Contratista


WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ
Supervisor


Memoria Calculo de Cantidades

Item	Capitulo	Actividad	Unidad		Cantidad Total
2,1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE MESA ALTA	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2		360,00

Numero	Tramo	Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	Area/Volumen	Acumulado	Observacion
1	ESCUELA EN I	36,00	10,00			360,00	360,00	
	TOTAL						360,00	

Esquema

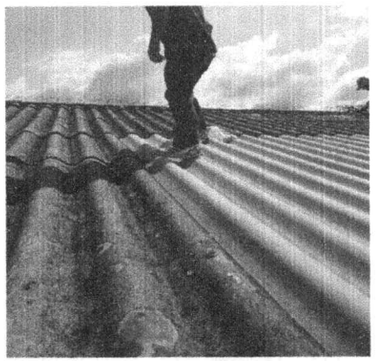

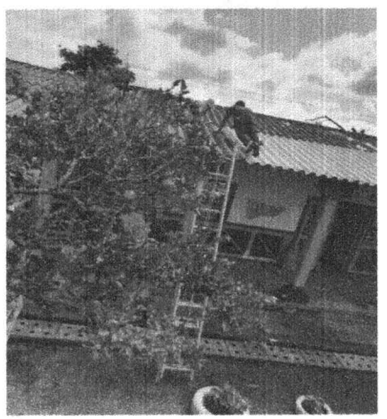

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
Contratista


WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ
Supervisor


Memoria Calculo de Cantidades

Item	Capitulo	Actividad	Unidad		Cantidad Total
1,6	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE EL PARAISO	PINTURA EN VINILO BAJO PLACA O CIELO RASO	M2		151,84

Numero	Tramo	Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	Area/Volumen	Acumulado	Observacion
1	AULA ESCOLAR 1	9,48	6,42			60,86	60,86	
2	AULA ESCOLAR 2	9,36	6,42			60,09	120,95	
3	Cielo raso corredor sector cancha	4,88	2,70			13,18	134,13	
4	Cielo raso corredor sector cancha	3,66	2,70			9,88	144,01	
5	Cielo raso corredor sector cancha	2,44	2,70			6,59	150,60	
4	Cielo raso corredor sector cancha	0,46	2,70			1,24	151,84	
	TOTAL						151,84	

Esquema

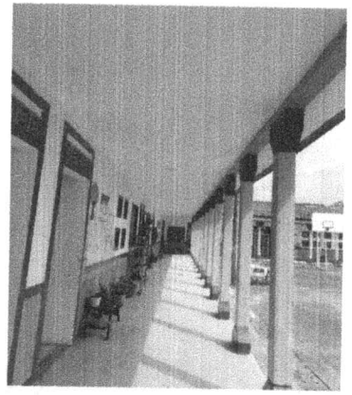

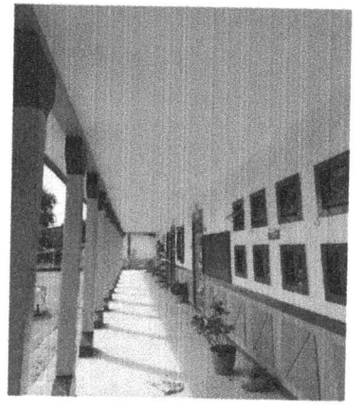

LUZ EDINETH GARDONA MARIN
Contratista

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ
Supervisor


Memoria Calculo de Cantidades


Item	Capitulo	Actividad	Unidad		Cantidad Total
1,5	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE EL PARAISO	Cielo raso en placa super board y perfiles de aluminio	M2		30,89

Numero	Tramo	Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	Area/Volumen	Acumulado	Observacion
			Acta 1					
1	AULA 1	2,44	1,22			2,98		
		1,50	0,80			1,20		
		1,20	0,60			0,72		
2	AULA 2	2,30	0,80			1,84		
		0,50	0,50			0,25		
		1,30	0,70			0,91		
		1,50	0,80			1,20		
			Acta 2					
1	Cielo raso corredor sector cancha	4,88	2,70			13,18	13,18	
2	Cielo raso corredor sector cancha	3,66	2,70			9,88	23,06	
3	Cielo raso corredor sector cancha	2,44	2,70			6,59	29,65	
4	Cielo raso corredor sector cancha	0,46	2,70			1,24	30,89	

Acumulado Actas Anteriores	9,10
Presente Acta	30,89
TOTAL	39,99

Esquema

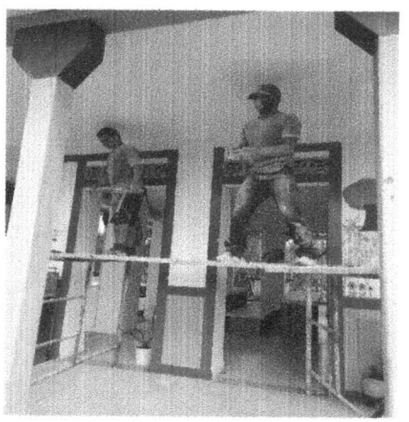

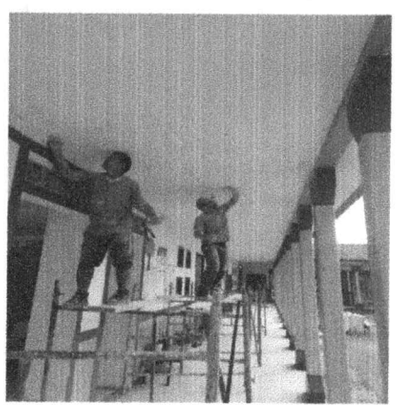

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
Contratista

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ
Supervisor


Memoria Calculo de Cantidades

Item	Capitulo	Actividad	Unidad		Cantidad Total
2,3	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE MESA ALTA	SUMINISTRO E INSTALACON DE VIDRIOS ESPESOR 4MM	M2		6,38

Numero	Tramo	Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	Area/Volumen	Acumulado	Observacion
1	AULA ESCOLAR 1	0,83		0,80	2,00	1,33	1,33	
2	AULA ESCOLAR 2	0,83		0,80	1,00	0,66	1,99	
3	AULA ESCOLAR 3	0,83		0,80	6,00	3,98	5,97	
4	AULA ESCOLAR 3	0,82		0,25	2,00	0,41	6,38	
						TOTAL	6,38	

Esquema



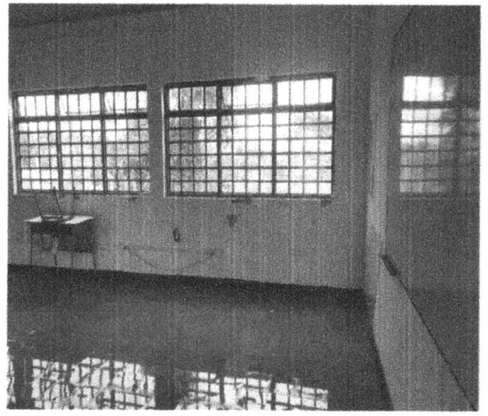

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
Contratista

WERNER MAURICIO MONTOYA FERNANDEZ
Supervisor


Memoria Calculo de Cantidades


Item	Capitulo	Actividad	Unidad		Cantidad Total
1,4	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE EL PARAISO	Desmonte de cielo raso, Incluye estructura	M2		30,89

Numero	Tramo	Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	Area/Volumen	Acumulado	Observacion
			Acta 1					
1	AULA 1	2,44	1,22			2,98	2,98	
2	AULA 2	2,30	0,80			1,84	4,82	
3	CORREDOR LATERAL DERECHO	20,60	2,40			49,44	54,26	
4	CORREDOR POSTERIOR	24,00	2,40			57,60	111,86	
			Acta 2					
1	Cielo raso corredor sector cancha	4,88	2,70			13,18	13,18	
2	Cielo raso corredor sector cancha	3,66	2,70			9,88	23,06	
3	Cielo raso corredor sector cancha	2,44	2,70			6,59	29,65	
4	Cielo raso corredor sector cancha	0,46	2,70			1,24	30,89	

Acumulado Actas Anteriores	111,86
Presente Acta	30,89
TOTAL	142,75

Esquema

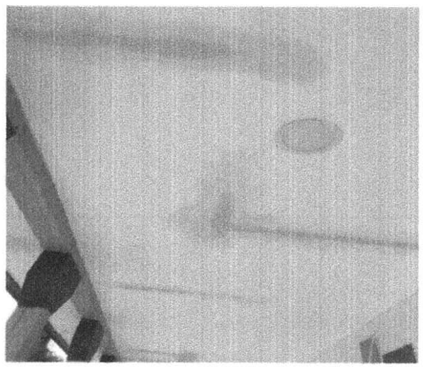

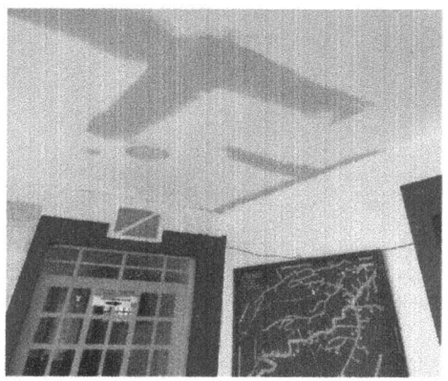

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
Contratista

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ
Supervisor

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

FECHA Noviembre 26 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Estado del tiempo	Horas de lluvia (señale con una X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente 1	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso 1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se traslada el personal a la institucion Educativa San Jose Sede Mesa Alta con su equipo de trabajo.
- Se realiza el desmonte de la estructura en madera para cielo raso del Aula escolar.

Personal: 1 maestro y 1 Ayudante

Equipo: Andamios y Herramienta menor.

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

FECHA Noviembre 27 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)																								
Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso
	1					1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se da inicio a la instalación de la estructura de soporte para cielo raso en PVC en Aula #1.
- Se realiza inspección de la cubierta en eternit para determinar materiales para recorrido de la misma

Personal: 1 maestro 1 ayudante.

Equipo: Andamios, Arnes, Slings escalera y herramienta menor

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

FECHA Noviembre 28 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso
	1					1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se continua con la instalacion de la estructura de soporte en aulas 1 y 2 y se inicia la instalacion del cielo raso en PVC.
- Se da inicio a la actividad de recorrido de cubierta

Personal: 1 maestro, 1 Ayudante.

Equipo: Andamios, Arnes, Eslingas, escalera y herramienta menor

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista — CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional — SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

FECHA Noviembre 29 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)																								
Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso
	1					1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se termina la instalacion de la estructura de soporte. para cielo raso en aulas y habitacion en la casera.
- Se continua con la instalacion de cielo raso en PVC.

Personal: 1 maestro, 1 ayudante.

Equipo: Andamios, telenas y herramienta menor.

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

Página 1 de 1

FECHA Noviembre 30 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso
	1					1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se termina la instalacion de cielo raso en PVC en aulas y habitación de la casera.

- Se continua con el recorrido de cubierta: alineando, amarrando y se cambian ó instalan tejas nuevas en fibrocemento - en la alcoba de la casera y en aula.

Equipo: Andamios, Arnes, Slingas y herramienta menor.

Personal: 1 maestro, 1 ayudante

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista — CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional — SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

FECHA Diciembre 2 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Estado del tiempo	Horas de lluvia (señale con una X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente 1	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso 1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se termina el recorrido de cubierta en teja de fibro cemento en la Institución Educativa San Jose Sede Mesa Alta.

- Se toman las medidas de los vidrios en las ventanas de las aulas. para. la Construcción

Personal: 1 maestro, 1. ayudante

Equipo: Escalera, Arnes, Eslingas y herramienta menor

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

FECHA Diciembre 3 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Estado del tiempo	Horas de lluvia (señale con una X)																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso
	1					1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se instalan los vidrios en las ventanas en las aulas o salones de la Institucion Educativa. San Jose Sede Mesa Alta.

- Se realiza limpieza en el area de remodelacion.

Equipo: Herramienta Menor

Personal: Instaladores de los vidrios

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

FECHA Diciembre 4 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso
	1					1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se inicia el desmonte por ramas del cielo raso en los corredores de la Institucion Educativa San Jose Sede El Paraiso.

Equipo: Destornillador, Taladro y Equipo Menor

Personal: 1 maestro, 1 Ayudante

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

FECHA Diciembre 5 / 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)																								
Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso
	1					1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se inicia instalación de cielo raso en placa super board. en los corredores. al lado de la cancha. en la Institución Educativa.

Personal: = 1 maestro, 1 Ayudante

Equipo: Andamios y herramienta menor

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ. Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

Página 1 de 1

FECHA Diciembre 6 de 2024 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL **FECHA:** NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)																								
Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente 1	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso 1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se termina la instalación de cielo raso en placa super board. en corredores de la Institución Educativa sede el paraiso.

Personal: 1 maestro, 1 Ayudante

Equipo: Andamios y herramienta menor

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

Página 1 de 1

FECHA Diciembre 9 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente 1	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso 1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se da inicio a la actividad de pintura con vinilo bajo Placa en cielo raso en los corredores en la institución Educativa San Jose sede el Paraiso.

Equipo = 1 andamios, teleras, extensor para pintura y herramienta menor

Personal = 1 maestro, 1 ayudante

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE FILANDIA

Página 1 de 1

FECHA Diciembre 10 de 2024 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: CO 001-2024 SPL FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)																								
Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra	Ing Residente	AUX. ING	Maestro	Oficiales	Ayudantes	Otros: siso
	1					1

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA

- Se termina la pintura con vinilo bajo Placa. en cielo raso. en los corredores.

- Se realiza limpieza en las areas intervenidas en la Institucion Educativa

Personal = 1 maestro, 1 ayudante

Equipo = Andamios, telinas, extensor y herramienta menor

Firma

LUZ EDINETH CARDONA MARIN, contratista

CONTRATISTA

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ, Profesional

SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

LUZ EDINETH CARDONA MARIN

LECM

INFORME TECNICO DE OBRA FINAL
CO 001-2024 SPL

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO FILANDIA"

MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO
NIT:899.999.034-1

DICIEMBRE 2024

CARRERA 25 No. 41-16 APTO 504 CALARCA *CEL* *3128507430* *EMAIL* *lcardonamarin@hotmail.com*

1. TABLA DE CONTENIDO

1. TABLA DE CONTENIDO 2
2. INTRODUCION 3
3. OBJETO 3
5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 3
4.1 Descripción general del proyecto ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.2 Alcance del contrato ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.3 Localización 4
5. GENERALIDADES DEL CONTRATO 7
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
5.2 POLIZAS DEL CONTRATO 8
6. ENTREGA DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA INICIACION DE LA OBRA 8
7. ESTADO INICIAL DE OBRA 9
8. AVANCE DE OBRA 10
9. INDICACORES GENERALES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
10. INFORME FINANCIERO DE LA OBRA 12
11. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 13
12. BITACORA 13
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13

2. INTRODUCION

El informe de obra final cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTODE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"** se presenta a la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal – Filandria Quindío y se explica de forma clara el desarrollo de las obras ejecutadas del contrato de obra **CO 001-2024 SPL**, el cual tiene fecha de inicio 15 Noviembre de 2024 hasta el día 14 de Diciembre 2024, haciendo el correspondiente seguimiento a las obras ejecutadas de manera técnica, administrativa, financiera y legal del periodo.
Se han realizado visitas de supervisión técnica en los diferentes puntos a ejecutar en las actividades de recorrido de cubierta, cielo raso en PVC y suministro e instalación de vidrios en la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE MESA ALTA, en las que se han generado acciones de coordinación y supervisión por parte del equipo de trabajo de la supervisión técnica de la Alcaldía, con el acompañamiento del equipo contratista. Finalmente se están desarrollando las actividades contractuales cumpliendo con las especificaciones técnicas financieras y jurídicas contratadas.

3. OBJETO

El presente documento está consolidado por las características, avance y desarrollo del proyecto que tiene por Objeto **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"** en el municipio de Filandria departamento de Quindío contrato de obra No. CO 001-2024 SPL, suscrito con la Alcaldía de Filandria; se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Generalidades del Proyecto; descripción del proyecto, condiciones del contrato de obra civil, seguimiento y evaluación de los planes, especificaciones, equipos, personal utilizado por el contratista, avance del proyecto y estado financiero, entre otros.

4 GENERALIDADES DEL PROYECTO

4.1 Descripción general del proyecto

La obra pública a desarrollar consta de las siguientes actividades de construcción: RECORRIDO DE CUBIERTA, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE

CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO EN FIBROCEMENTO, DESMONTE DE CIELO RASO, CIELO RASO EN PLACA SUPER BOARD, PINTURA CON VINILO BAJO PLACA O CIELO RASO, REVISION Y REPARACION INSTALACIONES PARA LAVAPLATOS, CIELO RASO EN PVC Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS ESPESOR 4 mm. Estas actividades se encuentran enmarcadas dentro del siguiente objeto contractual: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTODE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA**

4.2 Alcance del contrato

1. Ejecución actividades preliminares dentro de las que se incluyen Suministro e instalación de cubierta en teja fibrocemento
2. Recorrido de Cubierta
3. Suministro e instalación de caballete fijo
4. Desmonte de cielo raso existentes en super board
5. Resane Cielo raso
6. Pintura con vinilo bajo placa
7. Revisión y reparación instalaciones para lavaplatos
8. Cielo raso en PVC
9. Instalación de vidrios

4.3 Localización

El lugar de ejecución del contrato es en los siguientes puntos del municipio de Filandia.

- INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE EL PARAISO



CARRERA 25 No. 41-16 APTO 504 CALARCA *CEL* *3128507430* *EMAIL* *lcardonamarin@hotmail.com*

- INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE MESA ALTA



CARRERA 25 No. 41-16 APTO 504 CALARCA *CEL* *3128507430* *EMAIL* *lcardonamarin@hotmail.com*

5. GENERALIDADES DEL CONTRATO

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No	CO 001-2024 SPL
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"
CONTRATISTA	LUZ EDINETH CARDONA MARIN CEDULA: 24575150
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE FILANDIA
VALOR	$ 57.28.963
PLAZO	Treinta días
ANTICIPO 30%	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	15/ NOVIEMBRE /2024
FECHA DE TERMINACION	14/ DICIEMBRE/ 2024
% EJECUCION A LA FECHA	**100%**


5.2 POLIZAS DEL CONTRATO

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	15/11/2024	15/06/2025	$11.457.793,00	X
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	15/11/2024	215/12/2027	$8.593.345,00	X
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15/12/2024	15/12/2029	$11.457.793.00	X
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	15/11/2024	15/12/2024	$260.000.000.00	X

6. ENTREGA DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA INICIACION DE LA OBRA

Por parte de la Alcaldía del Municipio de Filandria, fue entregado al contratista el presupuesto y algunos documentos descargables por la plataforma del Secop II, adicionalmente se compartió información de manera digital a través de correo electrónico, nombres y contactos del área de contratación y Supervisor de Obra.


7. ESTADO INICIAL DE OBRA

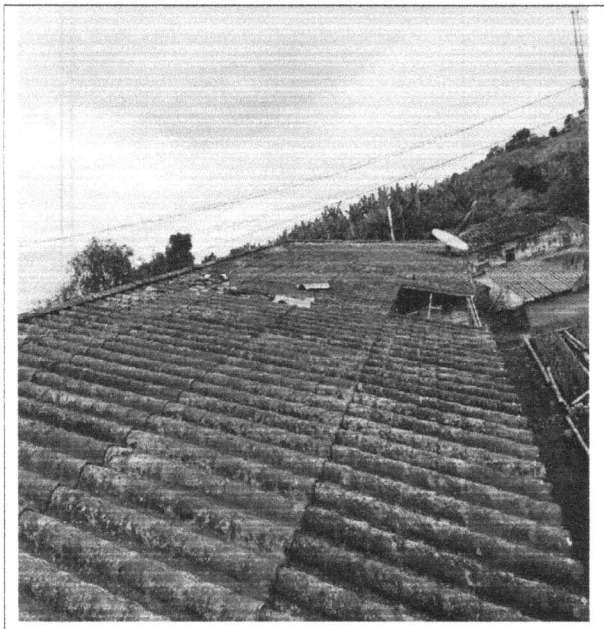

CUBIERTA EN TEJA ESPAÑOLA



CUBIERTA CORREDOR POSTERIOR

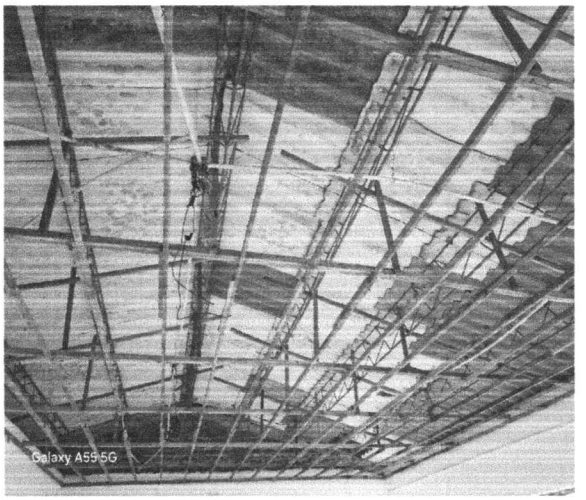

AULA INSTITUCION EDUCATIVA SEDE MESA ALTA




VENTANERIA AULA MESA ALTA

8. AVANCE DE OBRA



RECORRIDO DE CUBIERTA MESA ALTA

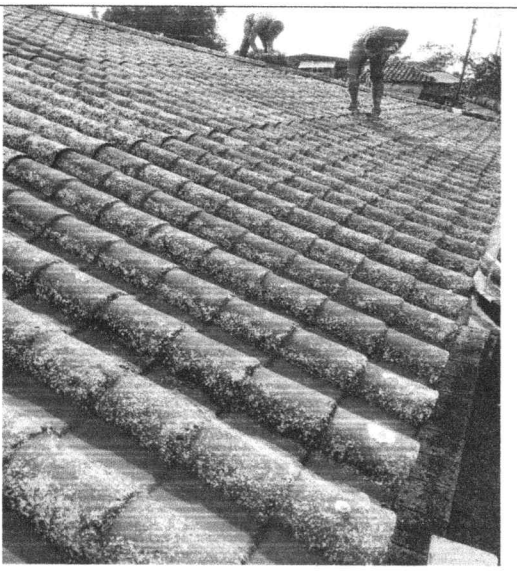


RECORRIDO DE CUBIERTA MESA ALTA



RECORRIDO DE CUBIERTA MESA ALTA



RECPRRIDO DE CUBIERTA MESA ALATA

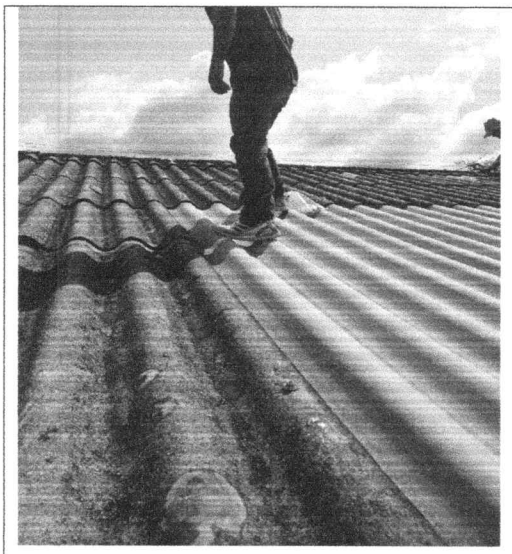

RECORRIDO CE DUBIERTA MESA ALTA



RECORRIDO DE CUBIERTA MESA ALTA




INSTALACION PERFILES DE ALUMINIO



INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC AULA #1

CARRERA 25 No. 41-16 APTO 504 CALARCA *CEL* *3128507430* *EMAIL* *lcardonamarin@hotmail.com*

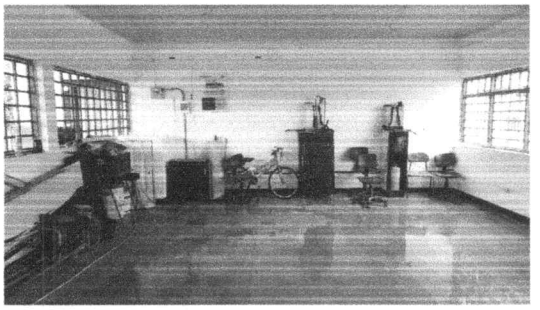	
INSTALACION CIELO RASO AULAS	**INSTALACION VIDRIOS**

9. NFORME FINANCIERO DE LA OBRA

CONDICIONES ORIGINALES	
VALOR INICIAL	**$ 57.288.963**
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS
FECHA INICIACION	15 NOVIEMBRE 2024
OBRA EJECUTADA	
Anticipo de Obra (30%)	**N/A**
Acta de Obra No 1	**$ 34.144.074.00**
Acta de Obra Final	**$ 23.116.604.00**

10. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA	LUZ EDINETH CARDONA MARIN
CEDULA: 24575150	

CONTRATISTA	LUZ EDINETH CARDONA MARIN
PROFESIONAL EN SALUD EN EL TRABAJO	LINA MARIA MURILLO HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA	LUZ EDINETH CARDONA MARIN

11. BITACORA

El Contratista entrega a la entidad un libro de bitácora para la obra cuyo es **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA", hasta** el 14 de diciembre del año 2024 y firmada por los ingenieros autorizados.
Ing. contratista: ING LUZ EDINETH CARDONA MARIN
Ing. supervisor de la entidad: WERNER MAURICIO MONTOYA RAMIREZ

12. ACTAS DE COMITÉ

A la fecha de presentación de este informe se han generado los siguientes documentos:

- Actas de reuniones y visitas de obra

La supervisión realizo la revisión de las cantidades de obras ejecutadas. Las memorias serán entregadas con los trámites de actas correspondientes.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El informe Final de obra se presenta a la Alcaldía del Municipio de Filandria el desarrollo de las obras ejecutadas en el contrato de Obra No. CO 001-2024 SPL **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"** por lo que se generan las siguientes conclusiones y recomendaciones.

En las visitas de supervisión técnica en los puntos intervenidos, se generaron acciones de coordinación con el equipo de supervisión de la Alcaldía y equipo contratista de acuerdo a visitas y recorridos de obra realizados se pueden identificar todas las actividades consignadas en el presupuesto de obra y cumplir con las especificaciones técnicas suministradas por la entidad.

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
Contratista
MP No 66202-28176

CARRERA 25 No. 41-16 APTO 504 CALARCA *CEL* *3128507430* *EMAIL* *lcardonamarin@hotmail.com*

Lina María Murillo Hernández
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
linam1003@hotmail.com - linam1003@gmail.com
3206603513 - 7340208

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG- SST

CONTRATISTA

LUZ EDINETH CARDONA MARIN

2024

Lina María Murillo Hernández
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
linam1003@hotmail.com - linam1003@gmail.com
3206603513 - 7340208

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONTRATISTA: LUZ EDINETH CARDONA MARIN

CEDULA: 24.575.150

REPRESENTANTE LEGAL: LUZ EDINETH CARDONA MARIN

CONTRATO DE OBRA: CO 001 – 2024 SPL

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE FILANDIA (QUINDÍO)

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2024

PROFESIONAL SST: LINA MARÍA MURILLO HERNÁNDEZ

Lina María Murillo Hernández
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
linam1003@hotmail.com - linam1003@gmail.com
3206603513 - 7340208

INTRODUCCIÓN


El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) es tomado como herramienta básica e indispensable para mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los empleados de ***LUZ EDINTEH CARDONA MARIN***, por lo tanto es una estrategia de tipo preventivo, orientado a mejorar la seguridad, bienestar, productividad y en general un clima organizacional saludable.

ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se rinde informe de actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo por contratista ***LUZ EDINETH CARDONA MARIN*** dando cumplimiento a la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Resolución 4272 de 2021 y demás legislación aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo

SEGURIDAD SOCIAL


- Se realizó el respectivo pago de aportes de la empresa LUZ EDINETH CARDONA MARIN por medio de operador enlace operativo para el periodo pensión mes 11- salud mes 12 planilla No 74662081



Lina María Murillo Hernández
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
linam1003@hotmail.com - linam1003@gmail.com
3206603513 - 7340208

SEGURIDAD INDUSTRIAL


- Se realiza reposición y verificación del uso de Elementos de Protección Personal (Casco, Guantes, Gafas), quedando registrado en acta de entrega.

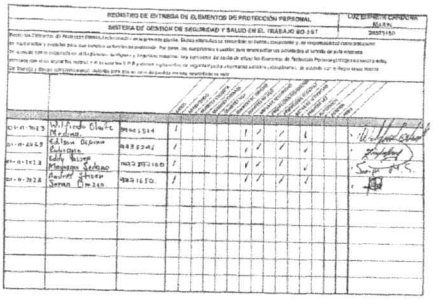

- Verificación de actividades de pintura, Desmonte e instalación de cielo raso, recorrido de cubierta, instalacion de vidrios y socialización de Analisis de Trabajo Seguro.



- Se realiza inspección de equipos y herramientas utilizadas en cada una de las actividades.

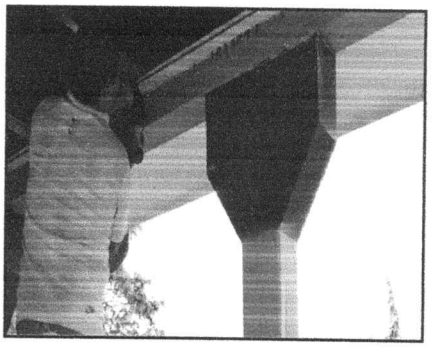

Lina María Murillo Hernández
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
linam1003@hotmail.com - linam1003@gmail.com
3206603513 - 7340208

CAPACITACIONES

Capacitación a trabajadores

- Autocuidado
- Riesgo químico en el uso de pintura
- Riesgo Físico, exposición al sol

Reporte e Investigación de accidentes

No se presentaron eventos de accidentes laborales, por lo tanto no se han realizado investigaciones.

Registro de Ausentismo y Accidentalidad

DESCRIPCIÓN	MES	DIAS INCAPACIDAD
Daños a la propiedad	0	0
Accidentes leves	0	0
Accidentes graves	0	0
Accidentes fatales	0	0
TOTAL	0	0

Índices de Accidentalidad

DESCRIPCIÓN	MES	DIAS INCAPACIDAD
Índice de frecuencia	0	0
Índice de severidad	0	0
I.L.I	0	0

Lina M Murillo H

Lina María Murillo Hernández
Profesional en Salud Ocupacional
Lic. 0964/2015 SSDQ
