

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MANTENIMIENTO SEDE LA CRUZ**	**47 días**	**lun 28/10/24**	**mar 31/12/2**	
2		FECHA ACTA DE INICIO	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	
3		VISITAS DE OBRA	2 días	jue 14/11/24	vie 15/11/24	2FC+13 días
4		**INICIO**	**21 días**	**mar 3/12/24**	**mar 31/12/2**	
5		INICIO	0 días	mar 3/12/24	mar 3/12/24	3FC+11 días
6		**PRELIMINARES**	**17 días**	**mar 3/12/24**	**mié 25/12/2**	
7		DESMONTE DE CIELORRASO	4 días	mar 3/12/24	vie 6/12/24	5
8		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	3 días	mar 3/12/24	jue 5/12/24	7CC
9		DESMONTE DE CUBIERTA	7 días	vie 6/12/24	lun 16/12/24	8
10		DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE				
11		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	7 días	vie 6/12/24	lun 16/12/24	9CC
12		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	7 días	mar 17/12/24	mié 25/12/24	11
13		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**10 días**	**lun 16/12/24**	**lun 30/12/24**	
14		MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24	12
15		MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	11
16		BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG				

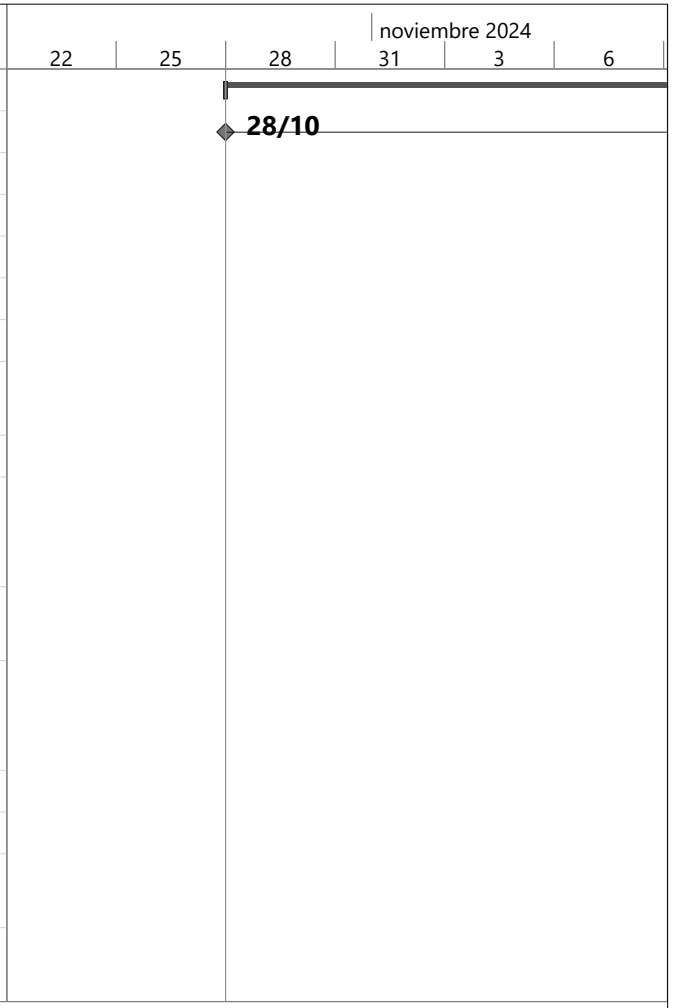

Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
17		MANTENIMIENTO DE MUEBLE				
18		**CIELORRASOS**	**1 día**	**mar 3/12/24**	**mar 3/12/24**	
21		**CUBIERTAS**	**10 días**	**mar 17/12/24**	**lun 30/12/24**	
22		CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO				
23		TEJA DE FIBROCEMENTO P7 N				
24		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	7 días	mar 17/12/24	mié 25/12/24	9
25		BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"				
26		CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	5 días	mar 24/12/24	lun 30/12/24	24CC+5 días
27		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	5 días	mar 24/12/24	lun 30/12/24	26CC
28		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**7 días**	**vie 6/12/24**	**lun 16/12/24**	
29		LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	7 días	vie 6/12/24	lun 16/12/24	11CC
30		**PINTURAS**	**9 días**	**mar 17/12/24**	**vie 27/12/24**	
31		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	7 días	mar 17/12/24	mié 25/12/24	24CC
32		BARNIZ SOBRE MUEBLES				
33		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	9 días	mar 17/12/24	vie 27/12/24	29

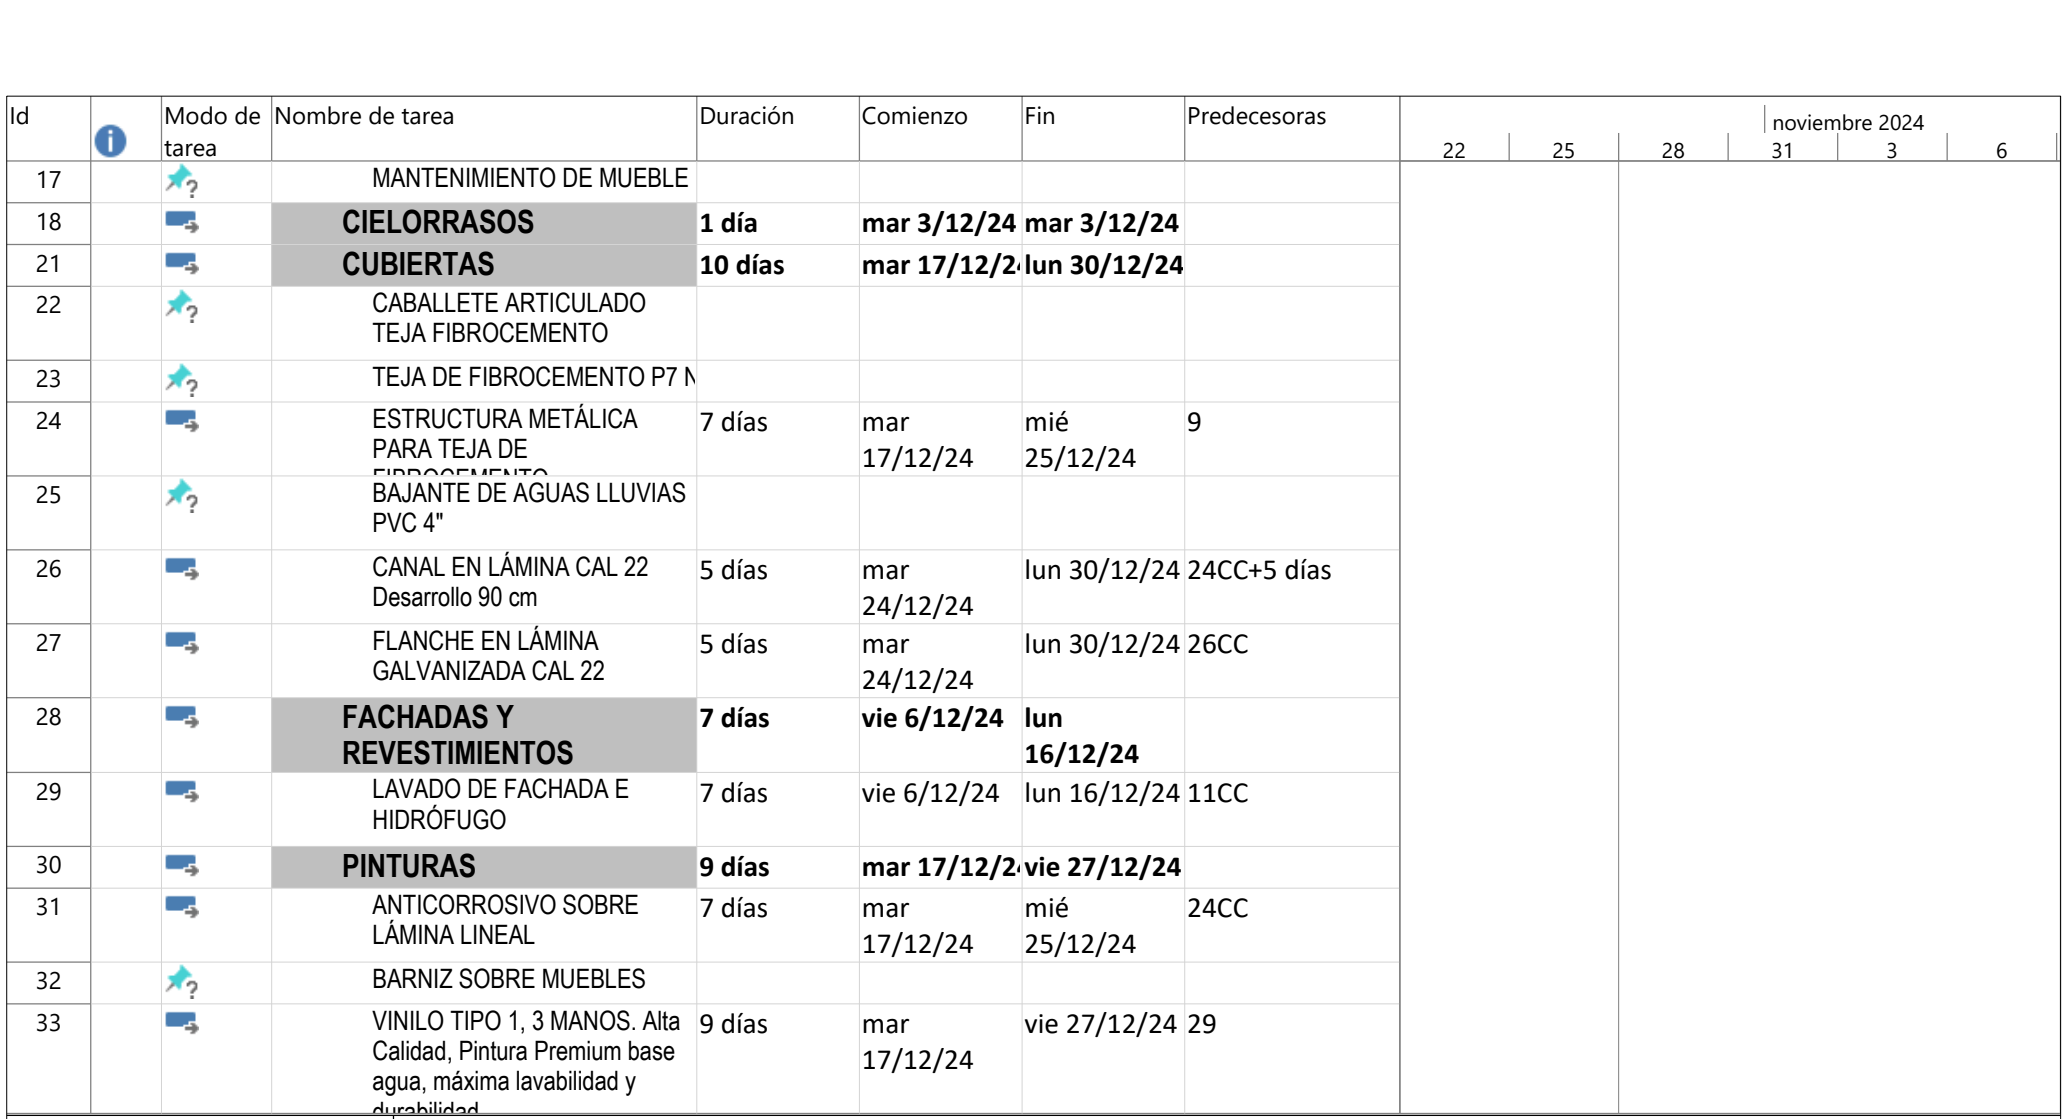

Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
34		RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES, se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes, dos manos	7 días	mar 17/12/24	mié 25/12/24	31CC
35		**PISOS**	**0 días**	**mar 3/12/24**	**mar 3/12/24**	
36		POYO COCINA 55X10CM				
37		**RED ELÉCTRICA**	**3 días**	**jue 26/12/24**	**lun 30/12/24**	
38		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24	14CC
39		**RED HIDRÁULICA**	**5 días**	**mar 17/12/2**	**lun 23/12/24**	
40		CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA				
41		JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO				
42		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	5 días	mar 17/12/24	lun 23/12/24	29
43		**RED SANITARIA**	**0 días**	**mar 3/12/24**	**mar 3/12/24**	
47		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**lun 30/12/24**	**lun 30/12/24**	
48		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24	33
49		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24	48CC
50		**NO PREVISTOS**	**16 días**	**lun 9/12/24**	**lun 30/12/24**	




Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
51		CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	6 días	lun 23/12/24	lun 30/12/24	7FC+10 días
52		TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	8 días	mar 17/12/24	jue 26/12/24	24CC
53		LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24	14CC
54		SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24	53CC
55		LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24	54CC
56		MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	5 días	mar 24/12/24	lun 30/12/24	26CC
57		DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	2 días	lun 9/12/24	mar 10/12/24	7
58		DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	2 días	mié 11/12/24	jue 12/12/24	57
59		PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24	58FC+8 días
60		MARCO METALICO PARA PUERTA 0,76-1,10M	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24	59CC
61		FIN	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	24;38;42;48;49;51



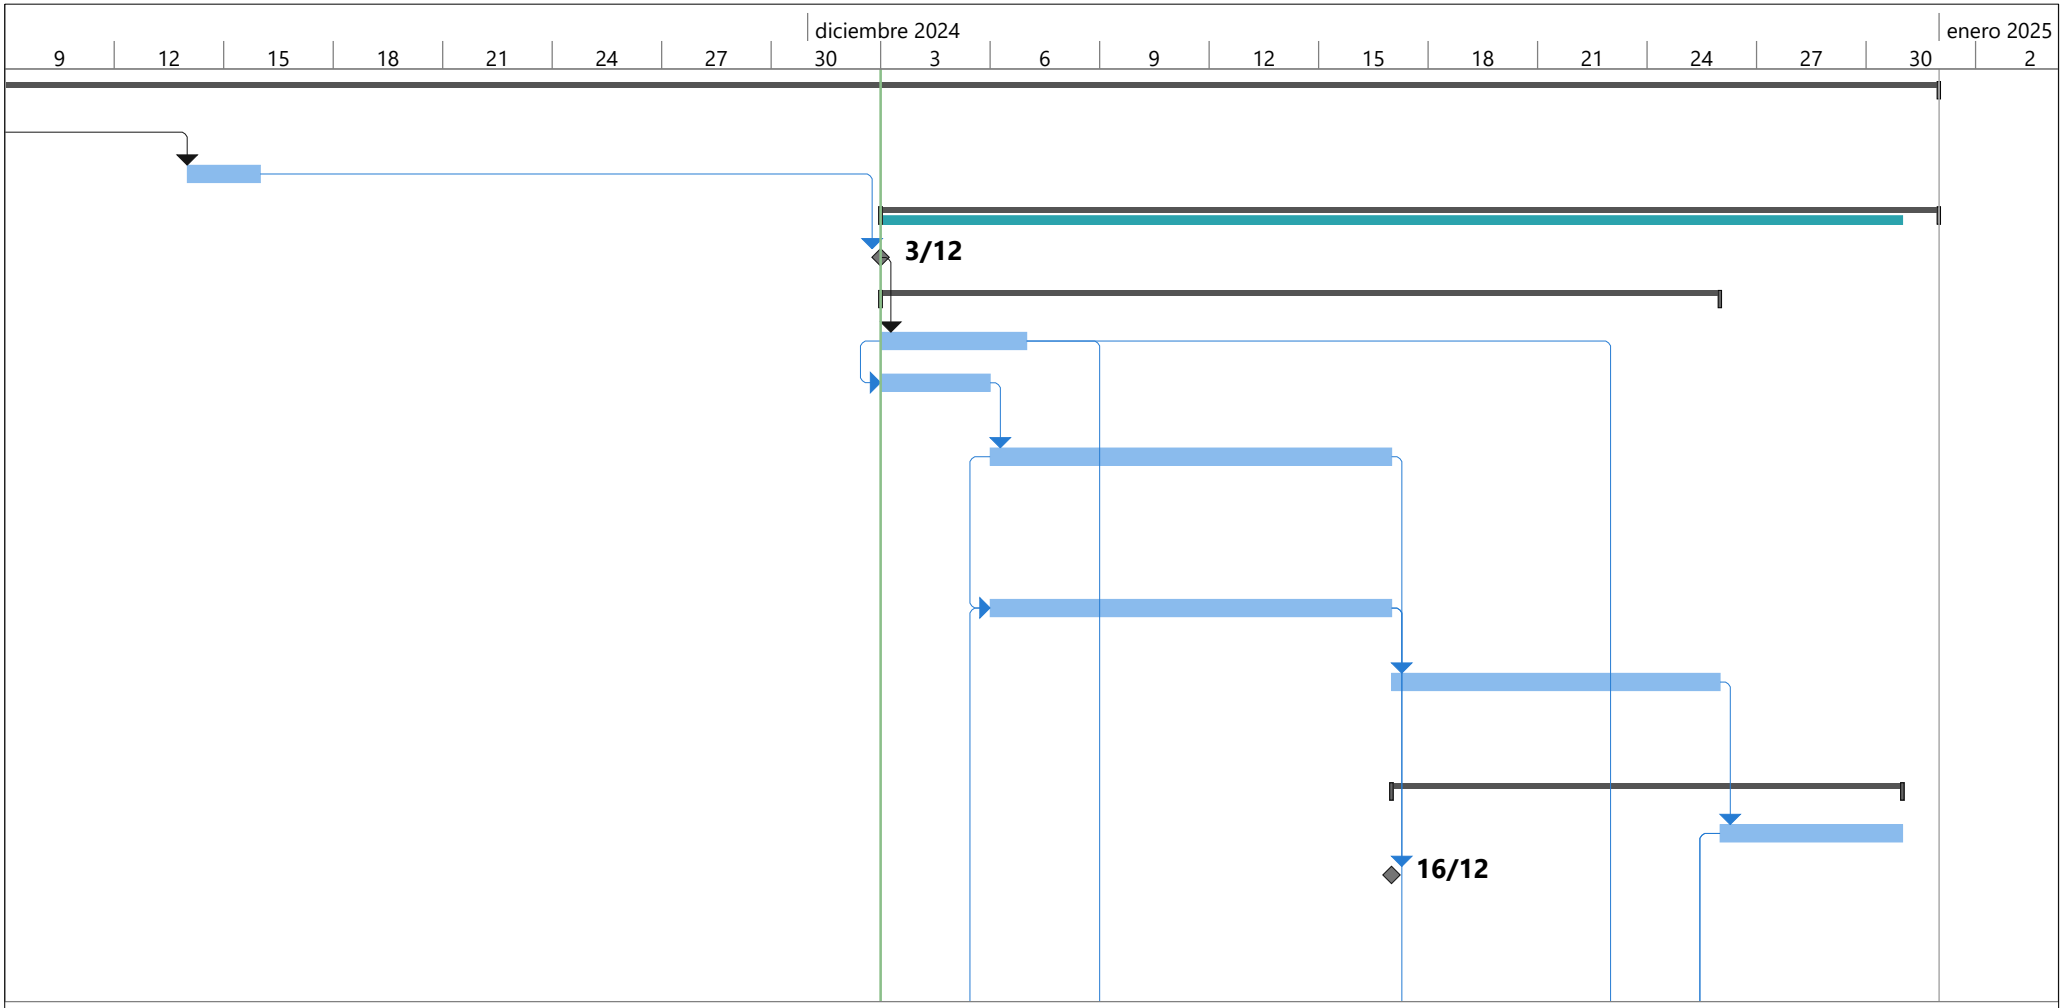


Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

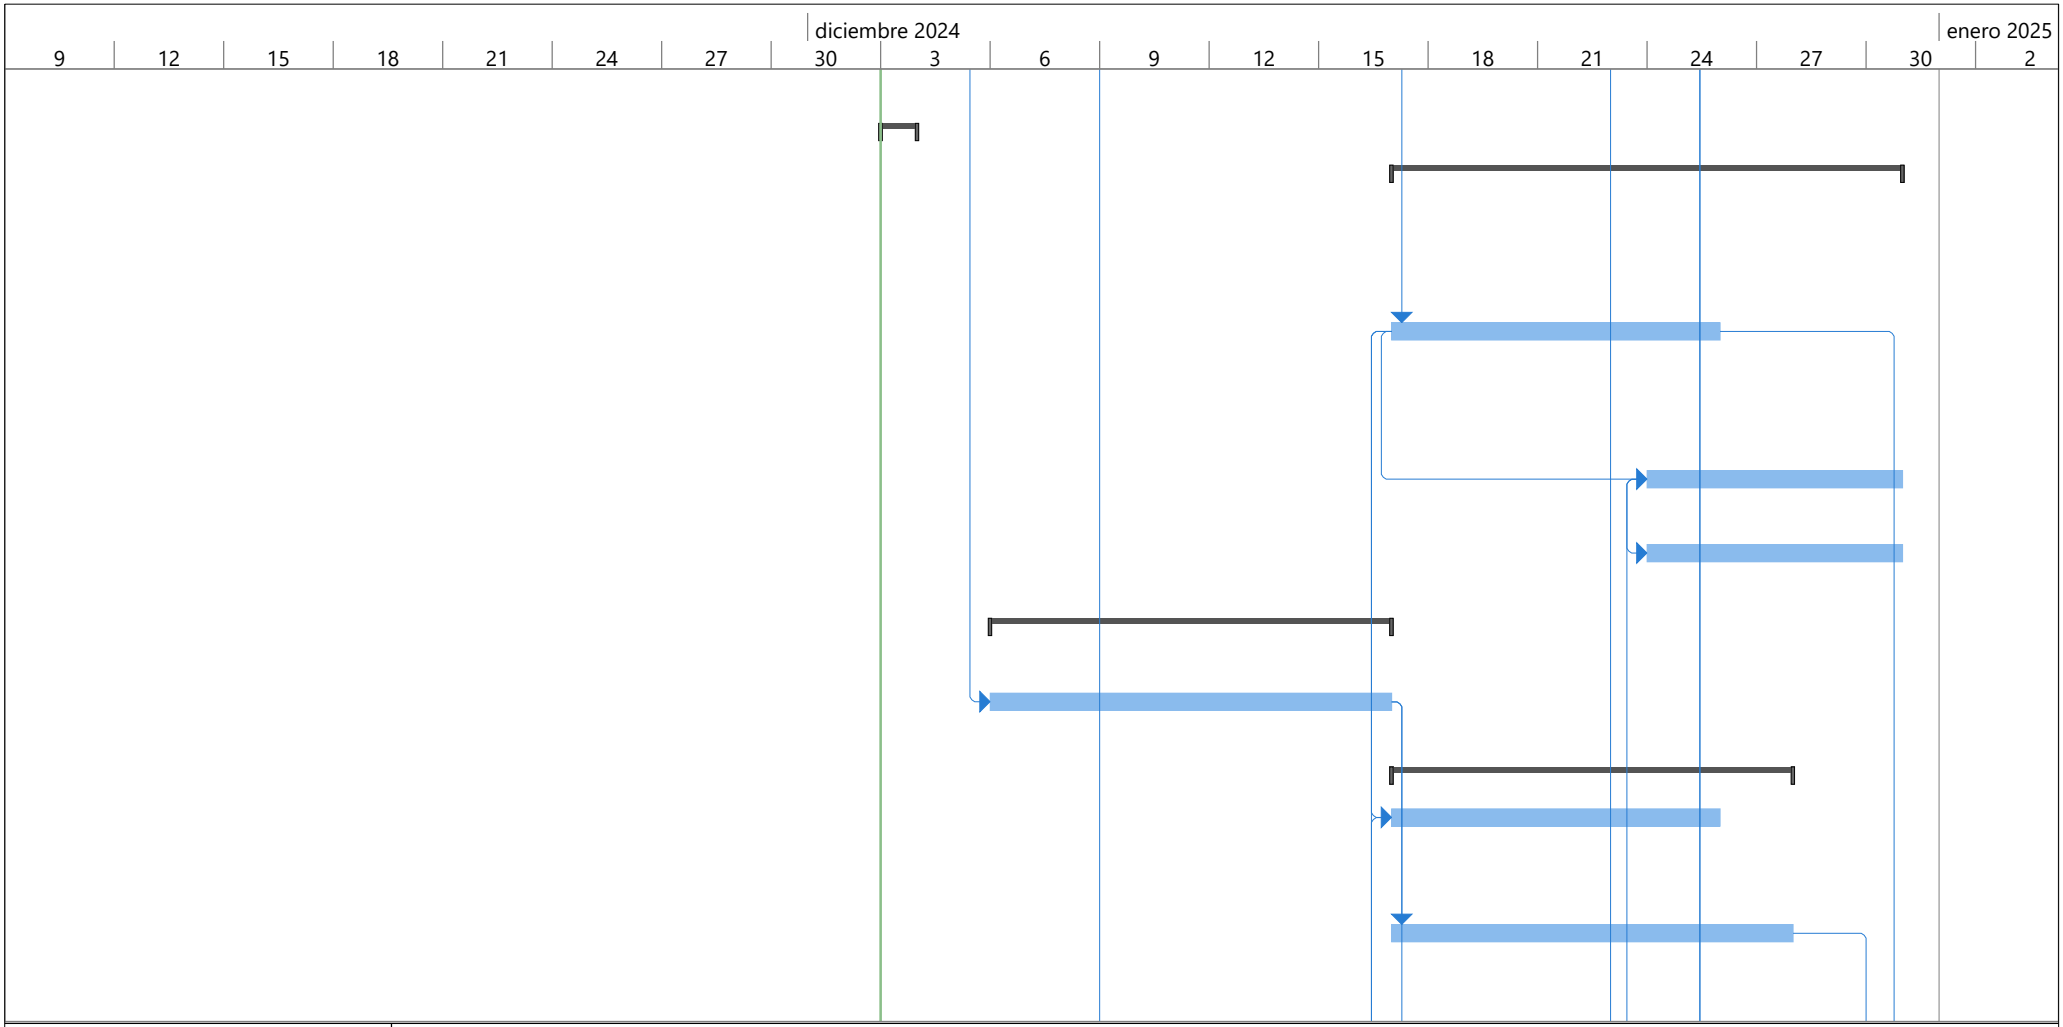


Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

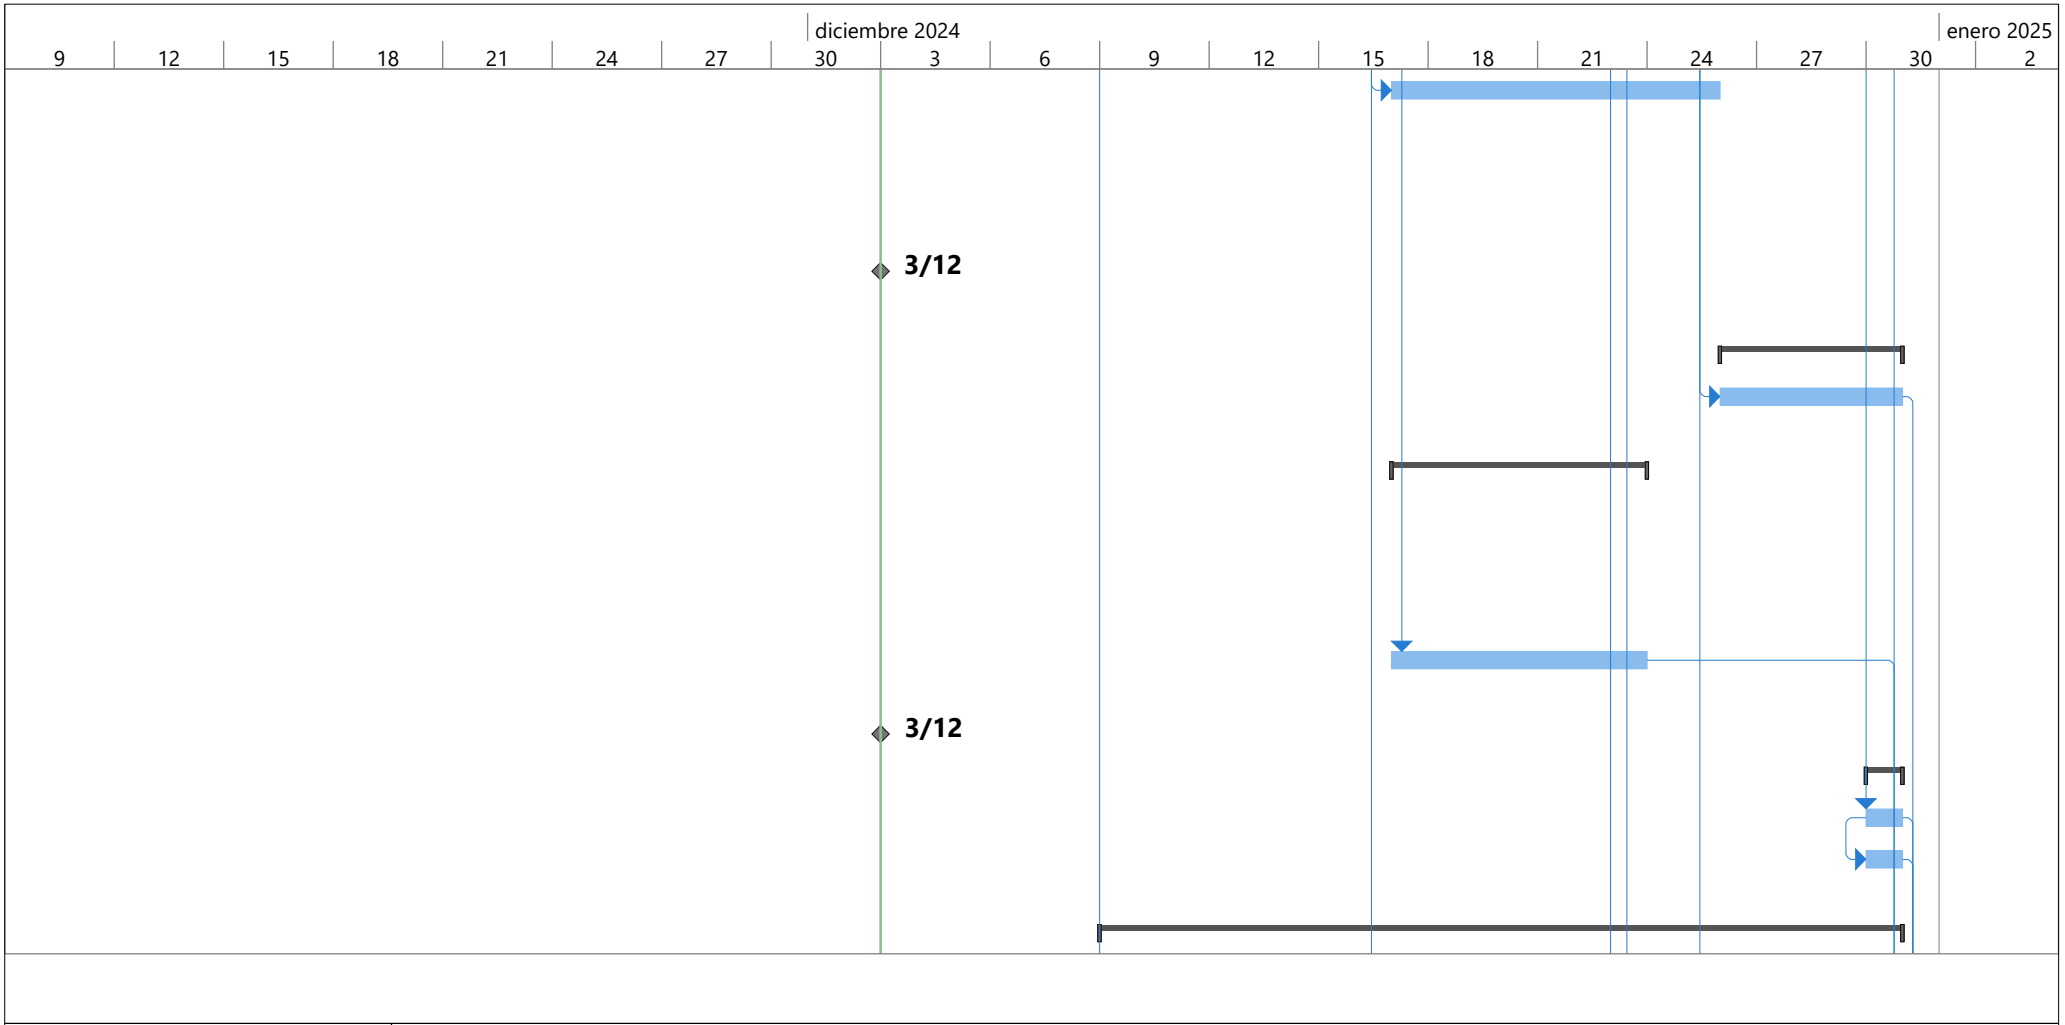


Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

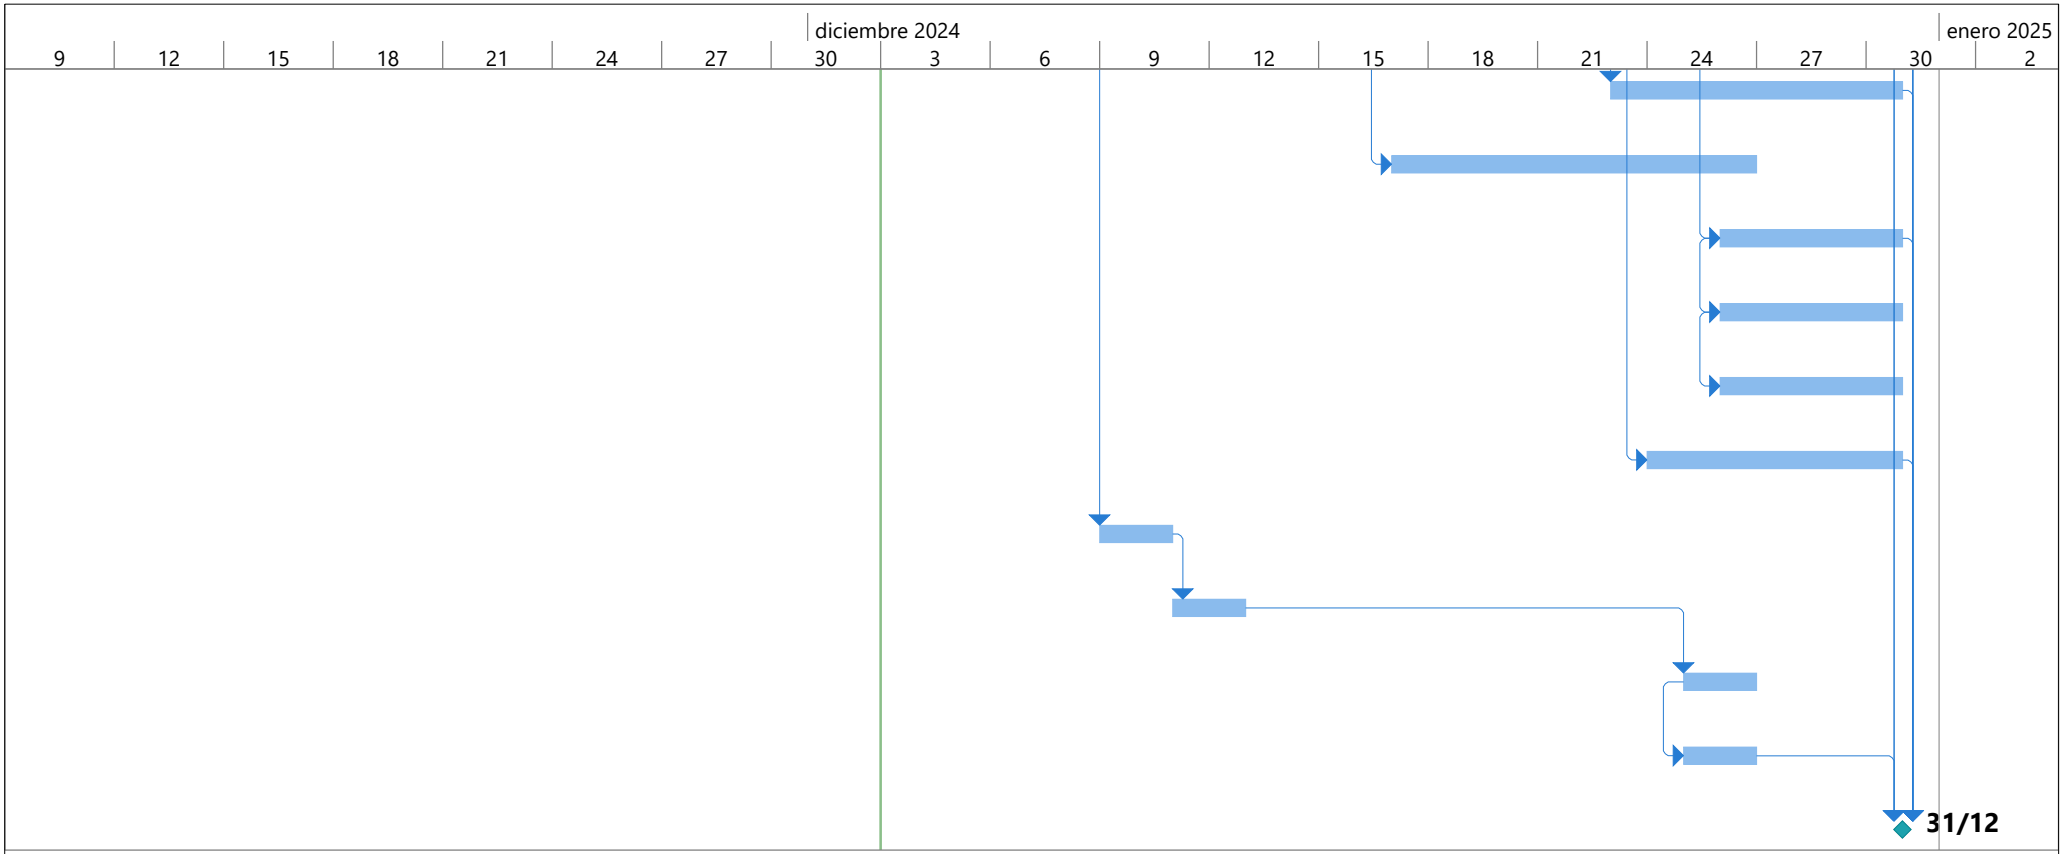


Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

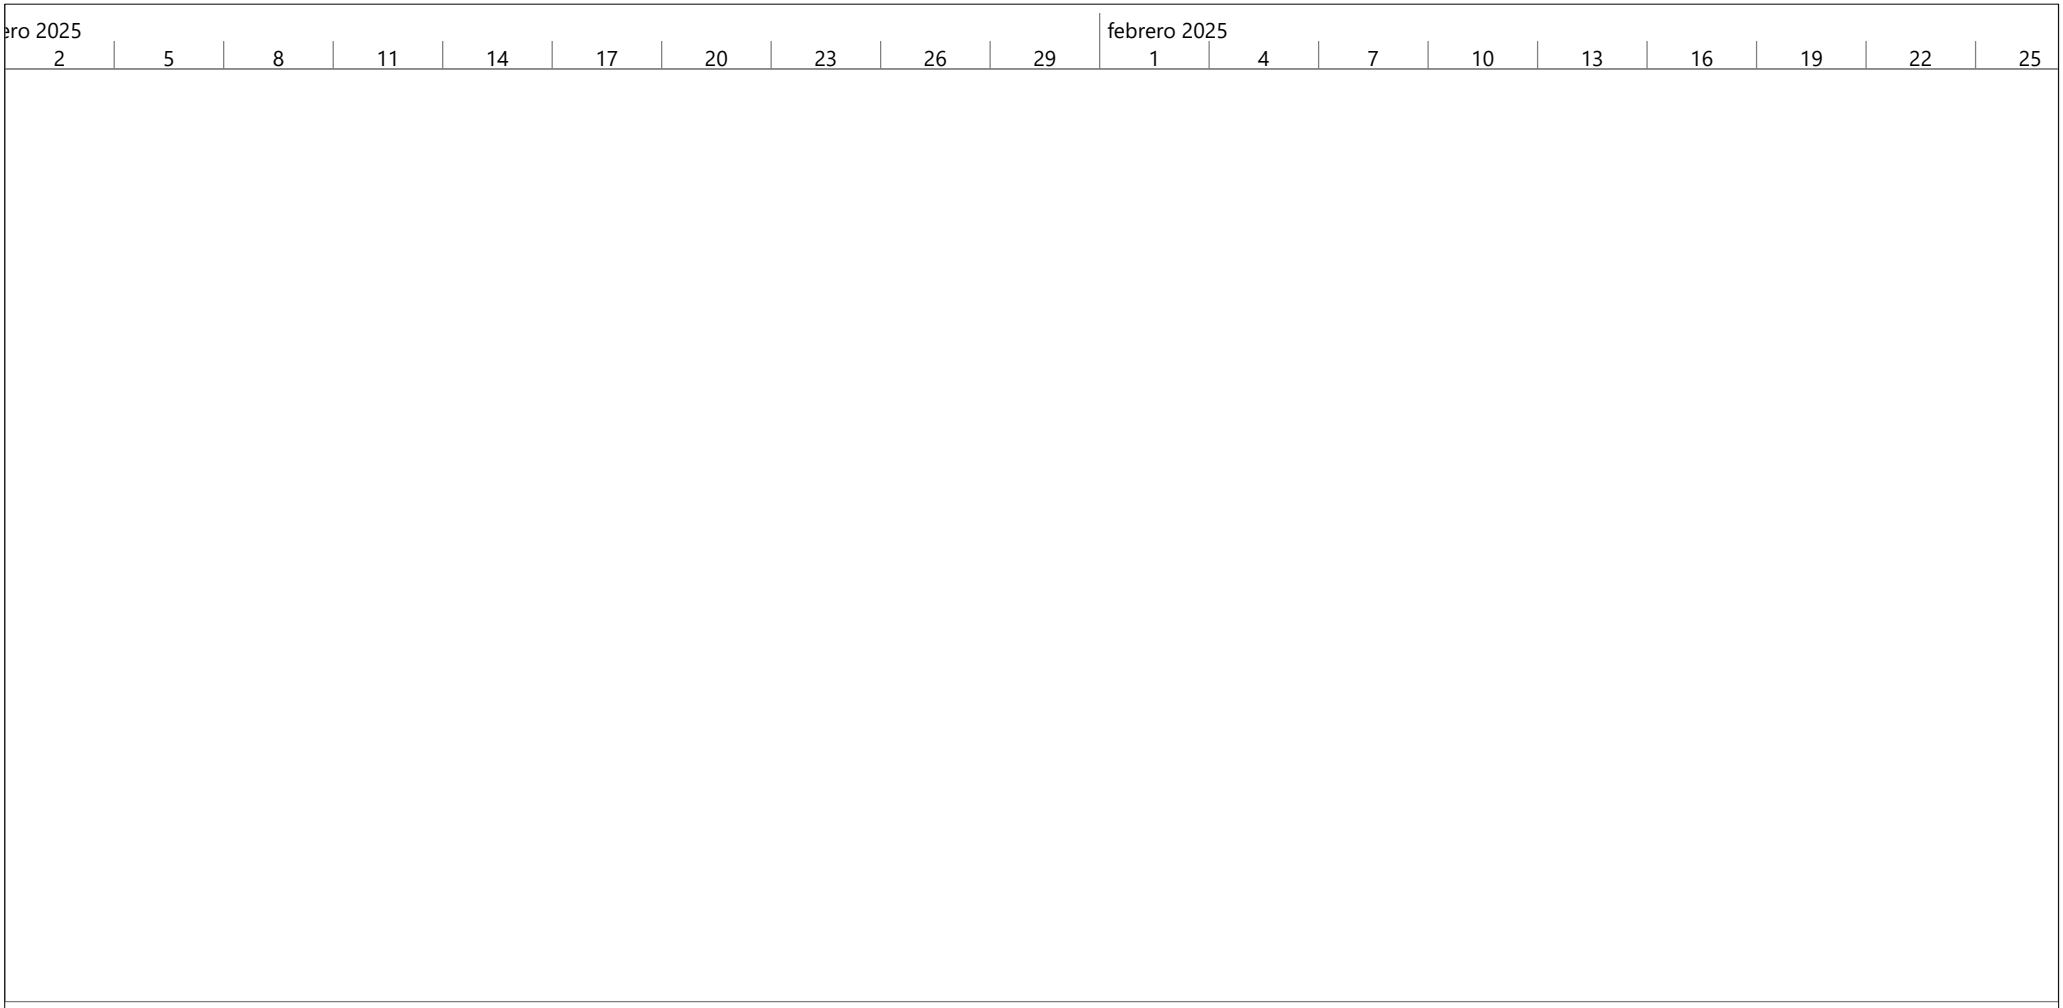


Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

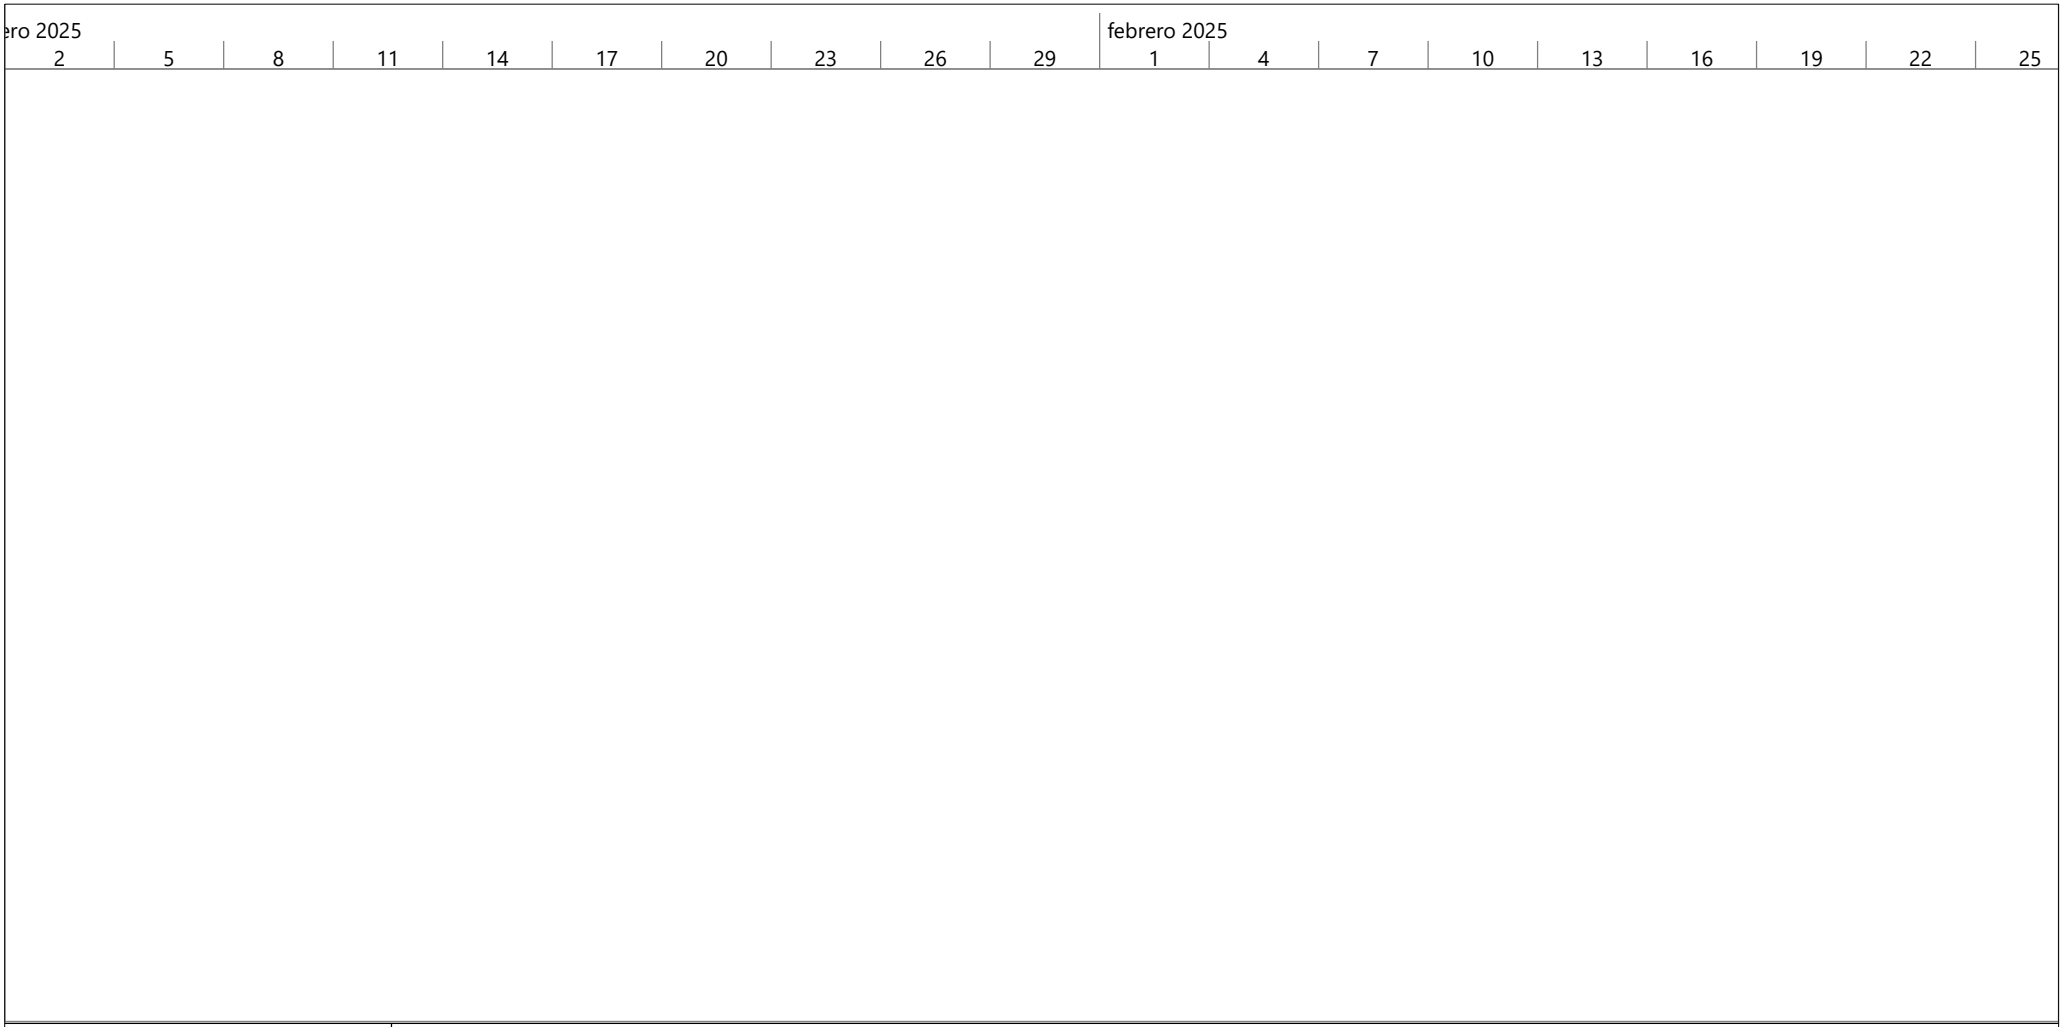


Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

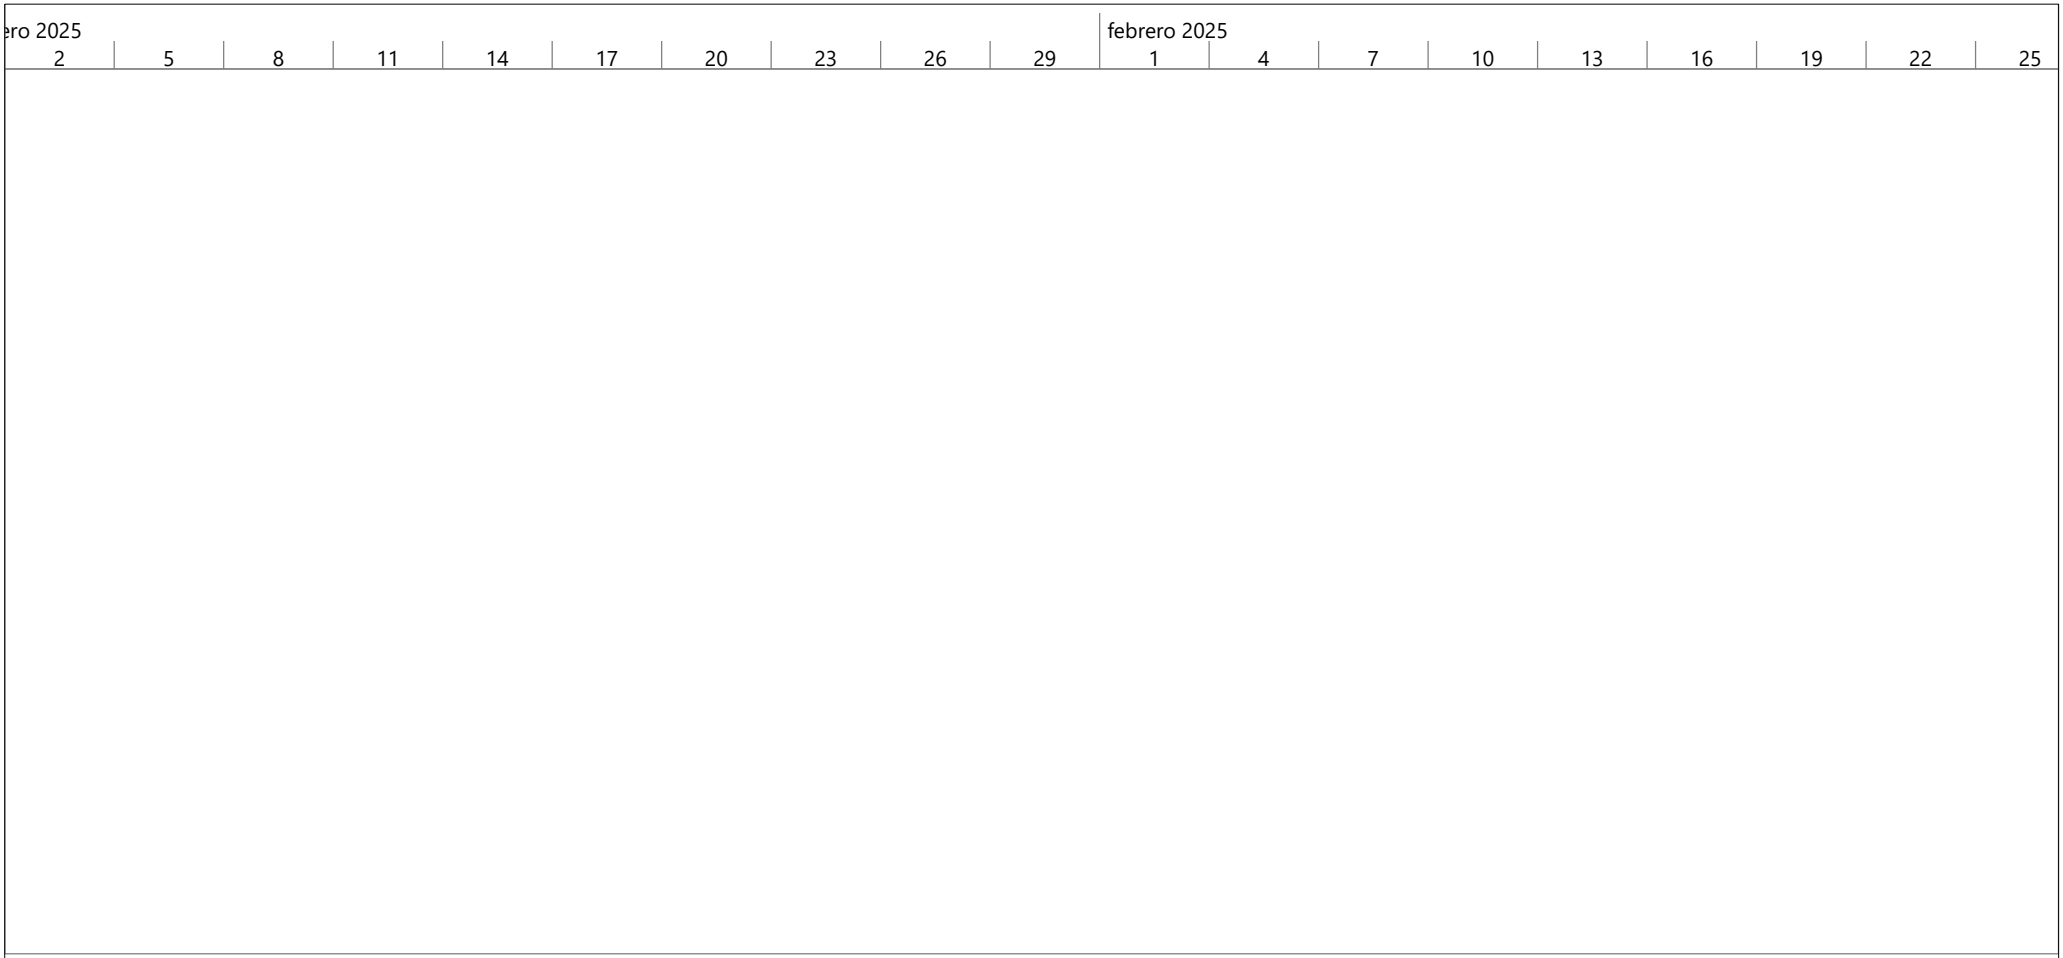

Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

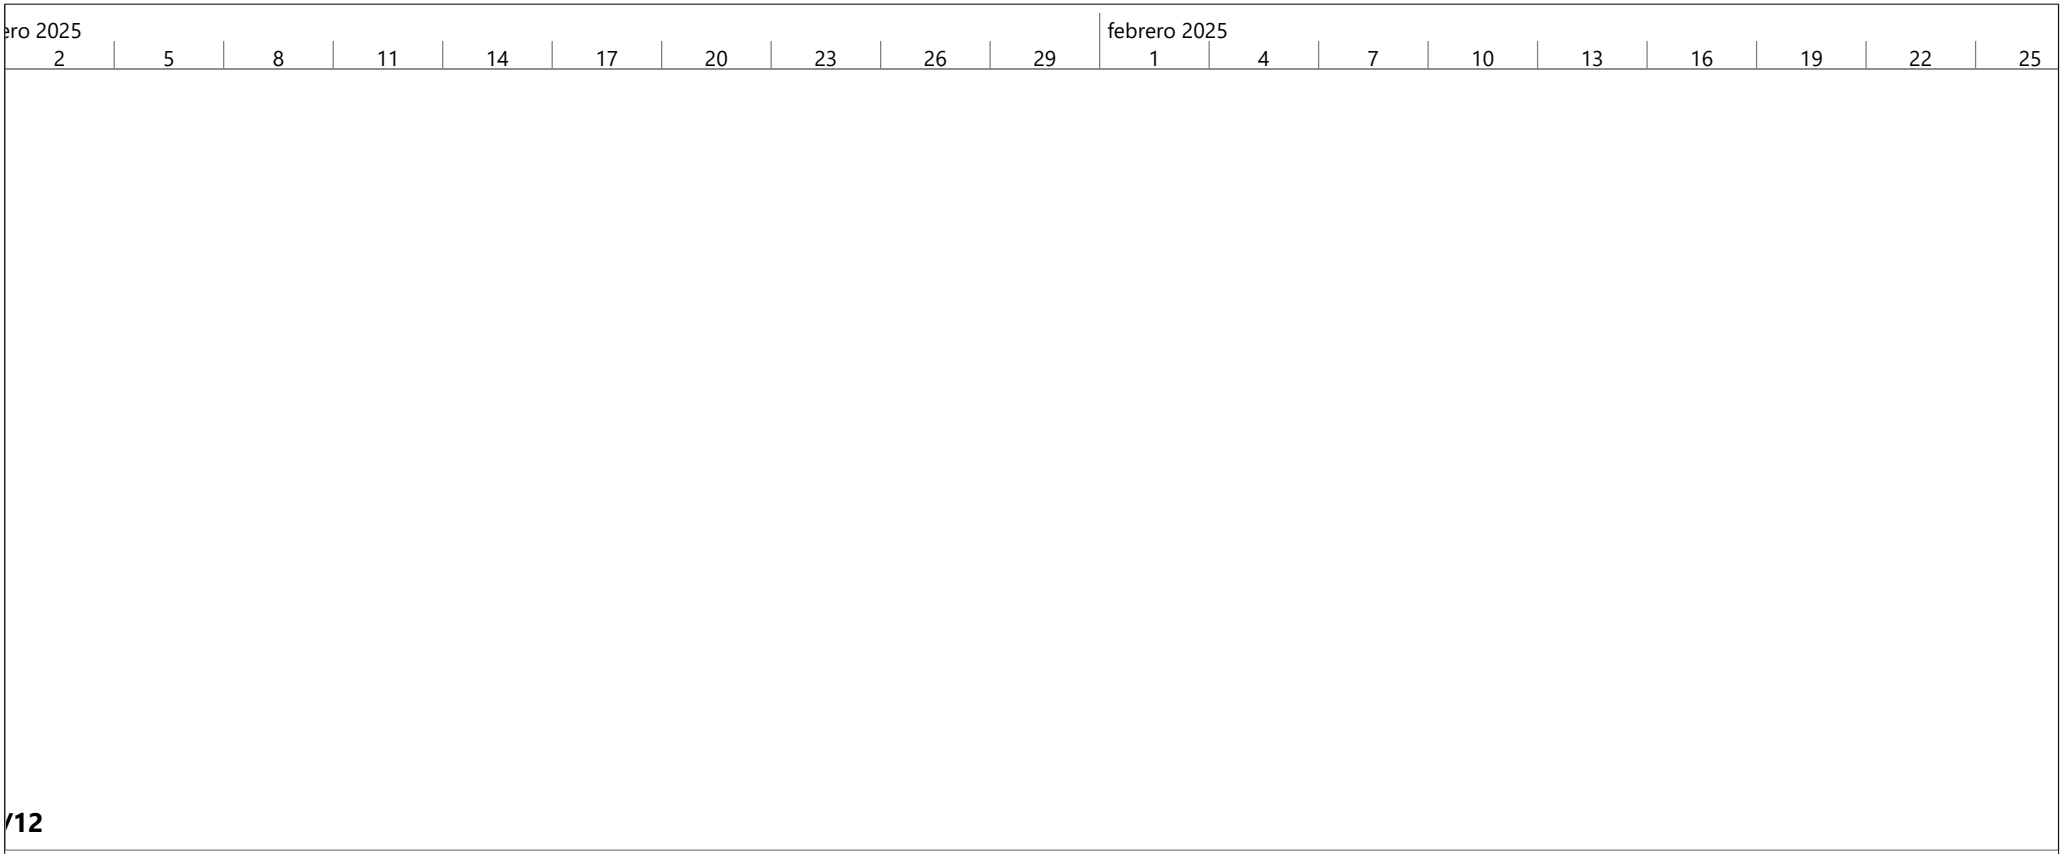

Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: mar 3/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
