
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Plazo ESTIMADO	COMIENZO	FINAL ESTIMADO	Predecesoras	Sucesoras
1		**CRONOGRAMA PRELIMINAR MANTENIEMIENTO GRUPO 4**	**55 días**	**lun 9/12/24**	**vie 21/02/25**		
2		ACTA DE INICIO	0 días	lun 9/12/24	lun 9/12/24		3
3		DIAGNOSTICOS	8 días	lun 9/12/24	mié 18/12/24	2	4
4		APROBACION ALCANCE	5 días	jue 19/12/24	mié 25/12/24	3	5;15
5		CAMPO VERDE	15 días	jue 26/12/24	mié 15/01/25	4	6CC+2 días;11
6		TORITO FELIZ	20 días	lun 30/12/24	vie 24/01/25	5CC+2 días	7CC+2 días
7		OJOS DE PERDIZ	20 días	mié 1/01/25	mar 28/01/25	6CC+2 días	8CC+2 días
8		PORVENIR	25 días	vie 3/01/25	jue 6/02/25	7CC+2 días	9CC+2 días
9		RINCON DE LAS ARDILLAS	30 días	mar 7/01/25	lun 17/02/25	8CC+2 días	10CC+2 días
10		TUNJUELITO	15 días	jue 9/01/25	mié 29/01/25	9CC+2 días	12
11		ESTRELLAS DEL MAÑANA	20 días	jue 16/01/25	mié 12/02/25	5	18
12		YANACONA MUYU KAWSAY	17 días	jue 30/01/25	vie 21/02/25	10	18
13		SIERRA MORENA	20 días	jue 23/01/25	mié 19/02/25	15	18
14		BELLA FLOR	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	16	18
15		ACACIAS	20 días	jue 26/12/24	mié 22/01/25	4	16CC+2 días;13
16		CARLOS GAVIRIA	20 días	lun 30/12/24	vie 24/01/25	15CC+2 días	17CC+2 días;14
17		TEJEDORES DE SUEÑOS	15 días	mié 1/01/25	mar 21/01/25	16CC+2 días	18
18		**FIN DE OBRAS**	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	11;12;13;14;17	

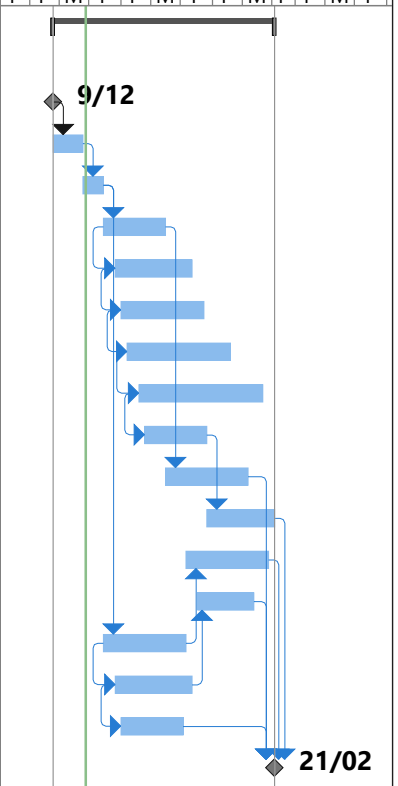

TELMO ALEXANDER CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

MEBYS DE LA OSSA L.
MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Proyecto: CRONOGRAMA GEN
Fecha: vie 20/12/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	
