

Id		Nombre de tarea	Duración
1			
2		**CONCURSO DE MERITOS No. 003 DE 2024**	**114 días?**
3		**1. INICIO DE PROYECTO**	**6 días**
4		Firma del contrato	2 días
5		Reunión inicial para alineación de objetivos	3 días
6		Planeación Logistica y detallada de actividades	2 días
7		**2. RECONOCIMIENTO INICIAL**	**11 días**
8		Visita técnica (registo fotográfico detallado del	6 días
9		Solicitud y recopilación de información existente	7 días
10		Validacion de documentos obtenidos con la Entidad y otros entes competentes	4 días
11		**3. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (ESTUDIO**	**23 días**
12		Realización del estudio de suelos y análisis	7 días
13		Informe de resultados para revisión y aprobación	3 días
14		Ensayos complementarios	7 días
15		Consolidación de datos obtenidos para el análisis	6 días
16		Informe final Estudio de Suelos	2 días
17		**4. PATOLOGÍA ESTRUCTURAL**	**25 días**
18		Inspección directa de la estructura	4 días
19		Imágenes ferromagnéticas	5 días
20		Ensayos no destructivos	5 días
21		Extracción de núcleos y ensayos destructivos	7 días

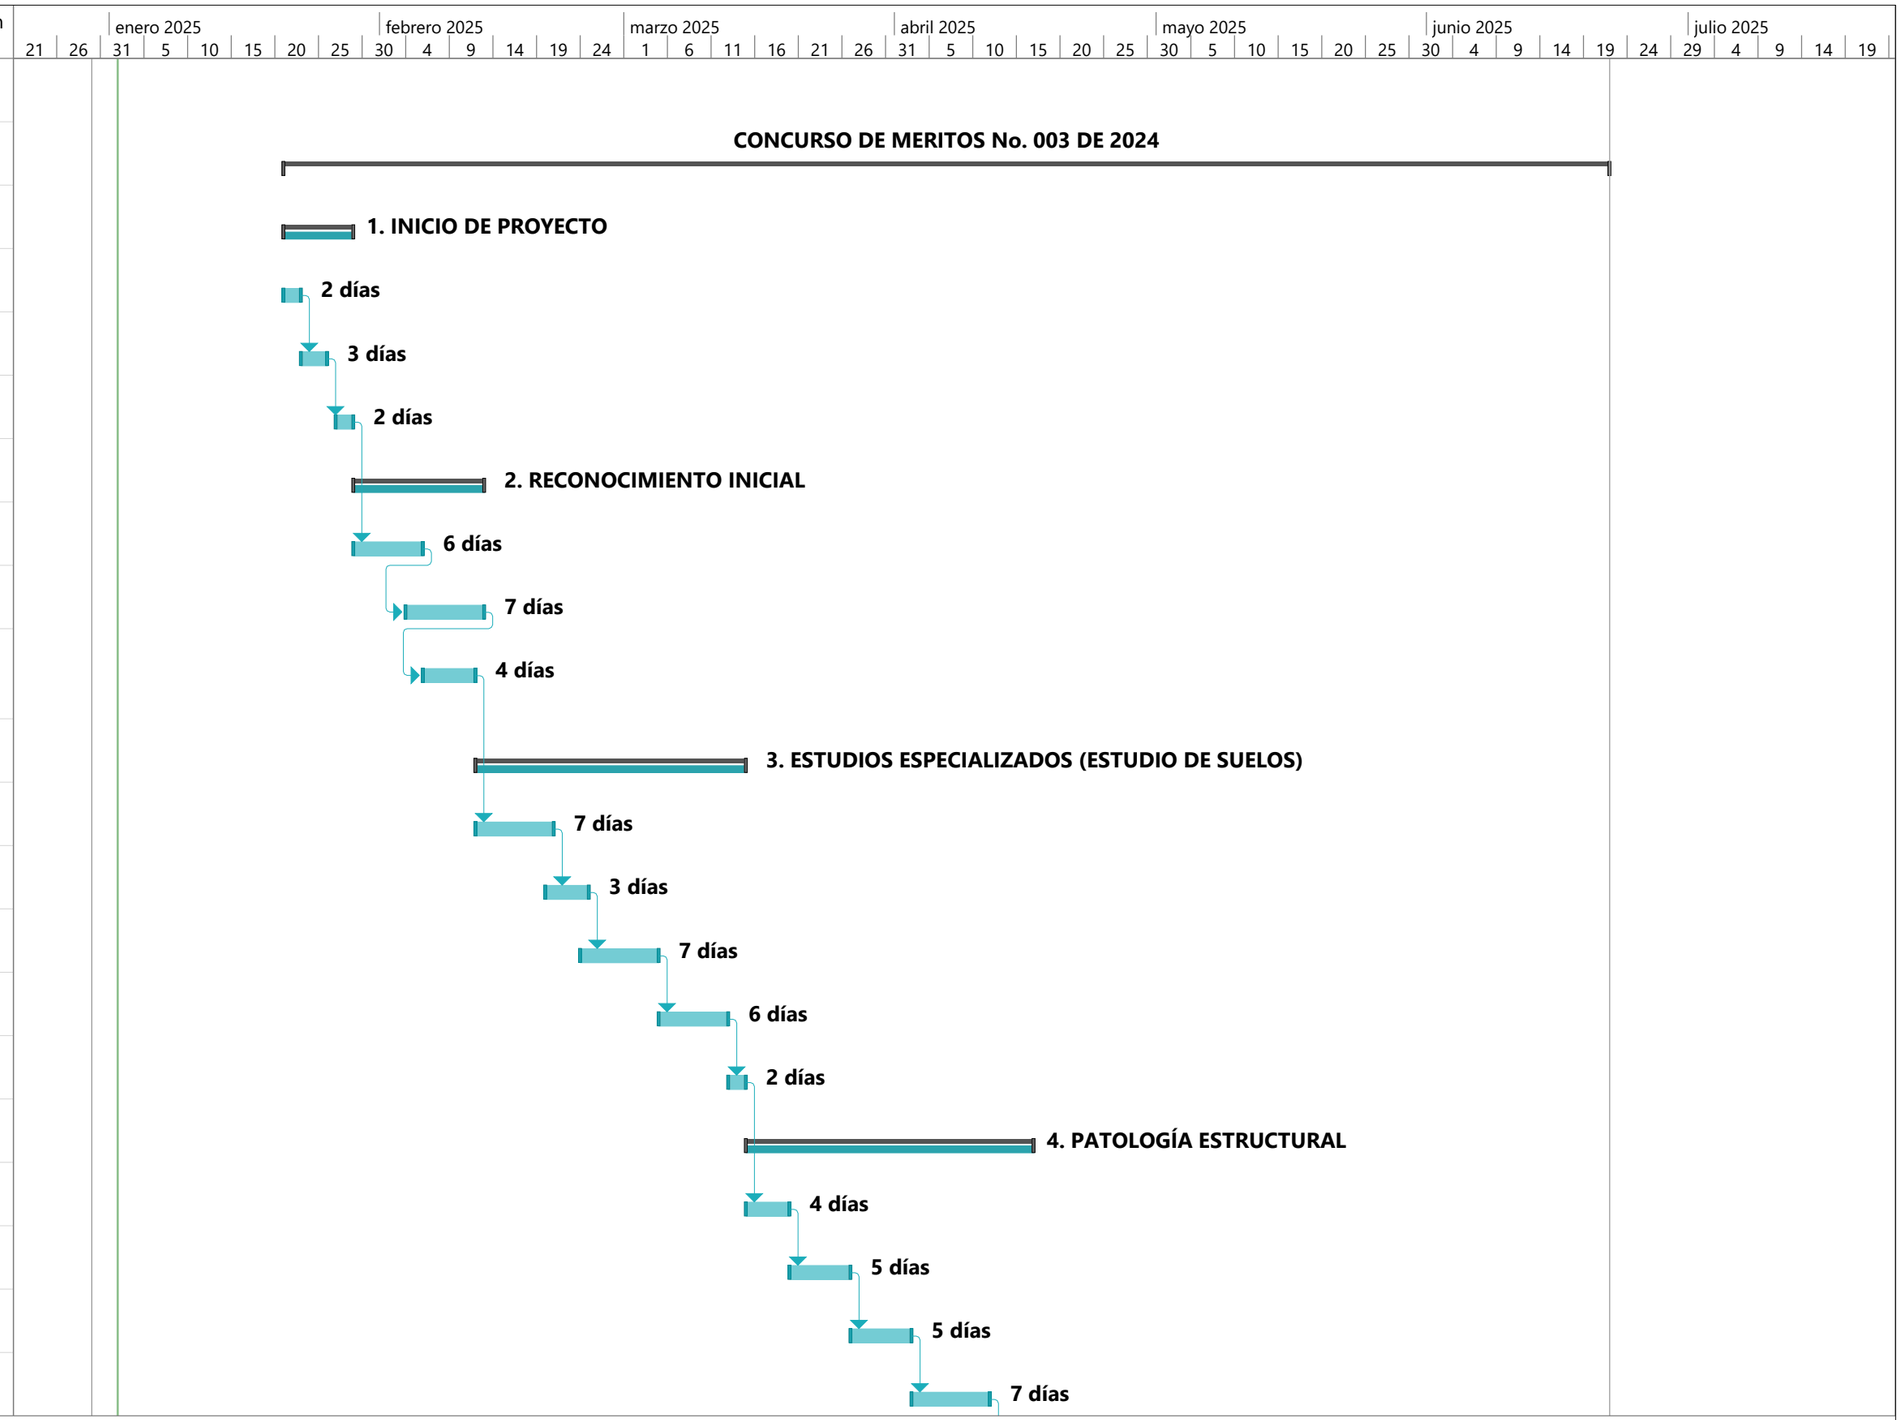

Proyecto: FLUJO DE FONDOS
Fecha: jue 2/01/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		

Id	Nombre de tarea	Duración
22	Levantamiento de lesiones, ataques y	4 días
23	**5.ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA**	**29 días**
24	Análisis de indices de sobreesfuerzo y flexilibidad general	3 días
25	Desarrollo de hipótesis de fallas progresivas	3 días
26	Cálculo del indice de vulnerabilidad conforme a la NSR-10	3 días
27	Redacción de informe de vulnerabilidad	2 días
28	Análisis de carga según las disposiciones de la NSR-10	5 días
29	Recomendaciones y conclusiones	2 días
30	Diseño de Reforzamiento estructural	5 días
31	Elaboración de Planos y Presupuestos	5 días
32	**6. ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES**	**8 días**
33	Presentación del informe de análisis de vulnerabilidad	2 días
34	Entrega de : Planos de levantamiento estructural	2 días
35	Entrega de : Registro fotográfico consolidado	2 días
36	Incorporación de ajustes solicitados por la entidad	2 días
37	**7. REVISIÓN Y CIERRE**	**6 días**
38	Supervisión del informe por parte de interventoría y aprobación final	2 días
39	Ajustes finales y entrega formal del proyecto	2 días
40	Aprobación y Finalización del Contrato	2 días

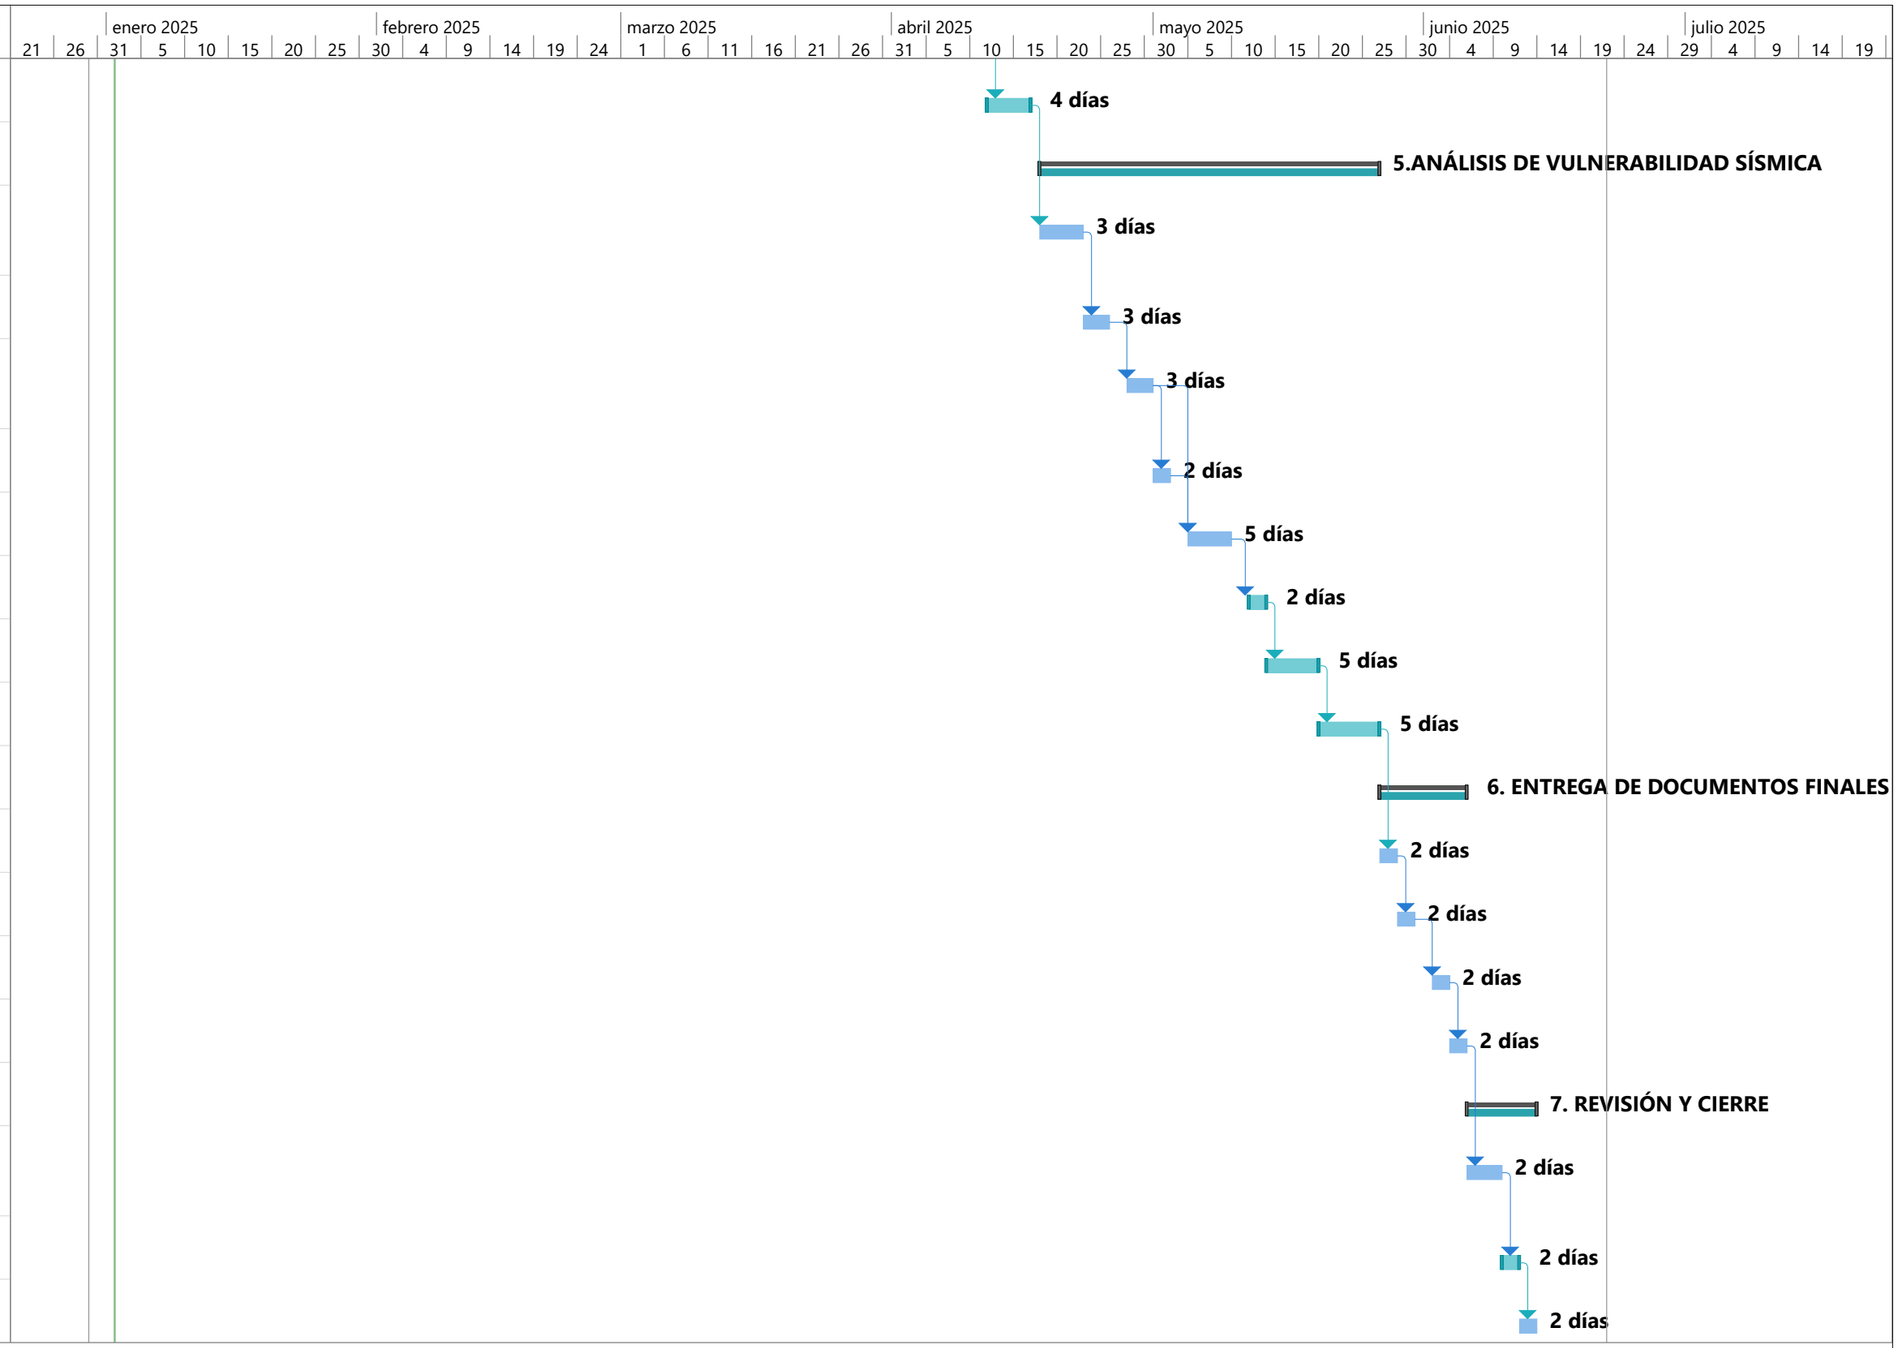

Proyecto: FLUJO DE FONDOS
Fecha: jue 2/01/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	
