
DIAGRAMA DE GANTT
AVENIDA LOS COLIBRIES TRAMO DEL K3+400 AL K6+720

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración
0	**AVENIDA DEL RIO - TRAMO 1**	**$103,784,283,997**	**885 días**
1	Preliminares	$159,631,756	96 días
2	Localizacion	$1,270,193,301	142 días
3	Señalizacion preliminar	$827,053,744	480 días
4	Demoliciones y Desmontes	$634,414,381	145 días
5	Excavacion descapote	$2,911,410,409	226 días
6	Muro en suelo reforzado	$20,045,121,523	283 días
7	Estabilidad de taludes	$44,210,132	131 días
8	**Alcantarillado**	**$4,535,019,757**	**270 días**
9	Excavaciones	$726,428,999	215 días
10	Instalacion tuberias	$3,062,141,502	144 días
11	Llenos	$334,313,425	237 días
12	Obras en concreto	$412,135,831	63 días
13	**Acueducto**	**$64,344,863**	**3 días**
14	Instalacion tuberias y acces	$6,420,399	3 días
15	Valvulas e hidrantes	$57,924,464	3 días
16	**Puente estructura concreto**	**$37,241,926,533**	**596 días**
17	Excavacion profunda	$478,806,990	133 días
18	Acero de refuerzo	$17,208,899,595	358 días
19	Cimentacion profunda	$2,718,863,799	207 días
20	Pilas y estribos	$5,314,639,124	290 días
21	Vigas y riostras	$5,191,054,877	245 días
22	Placa puente	$5,015,306,234	112 días
23	Muros de contención	$327,763,492	175 días
24	Juntas puentes	$839,744,109	190 días
25	Losas de aproximacion	$146,848,314	90 días
26	Aproches puentes	$0	0 días
27	**Instalaciones electricas**	**$2,273,618,116**	**559 días**
28	Desmontes	$91,326,125	40 días
29	Redes electricas - Cables	$603,093,425	61 días
30	Postes para redes de media y alta	$736,190,799	55 días
31	Trasnformadores	$57,511,131	9 días
32	Canalizaciones	$737,197,774	175 días
33	Semaforizacion	$0	0 días
34	Decrechos RETIE/RETILAB	$48,298,862	30 días
35	**Pavimentos**	**$22,053,170,387**	**230 días**
36	Subbase granular	$4,687,860,226	126 días
37	Base granular	$4,368,314,018	105 días
38	Pavimento	$12,996,996,143	59 días
39	**Puente peatonal**	**$4,427,927,140**	**116 días**
40	Infraesturctura	$3,513,599,208	105 días
41	Estructura Metalica	$914,327,932	86 días
42	**Urbanismo**	**$7,296,241,956**	**376 días**
43	Sardineles	$1,765,606,180	112 días
44	Andenes	$2,200,305,707	88 días
45	Señalizacion Final	$351,553,300	71 días
46	Zonas verdes	$211,299,947	116 días
47	Amoblamiento	$1,910,971,566	90 días
48	Iluminacion	$856,505,256	45 días

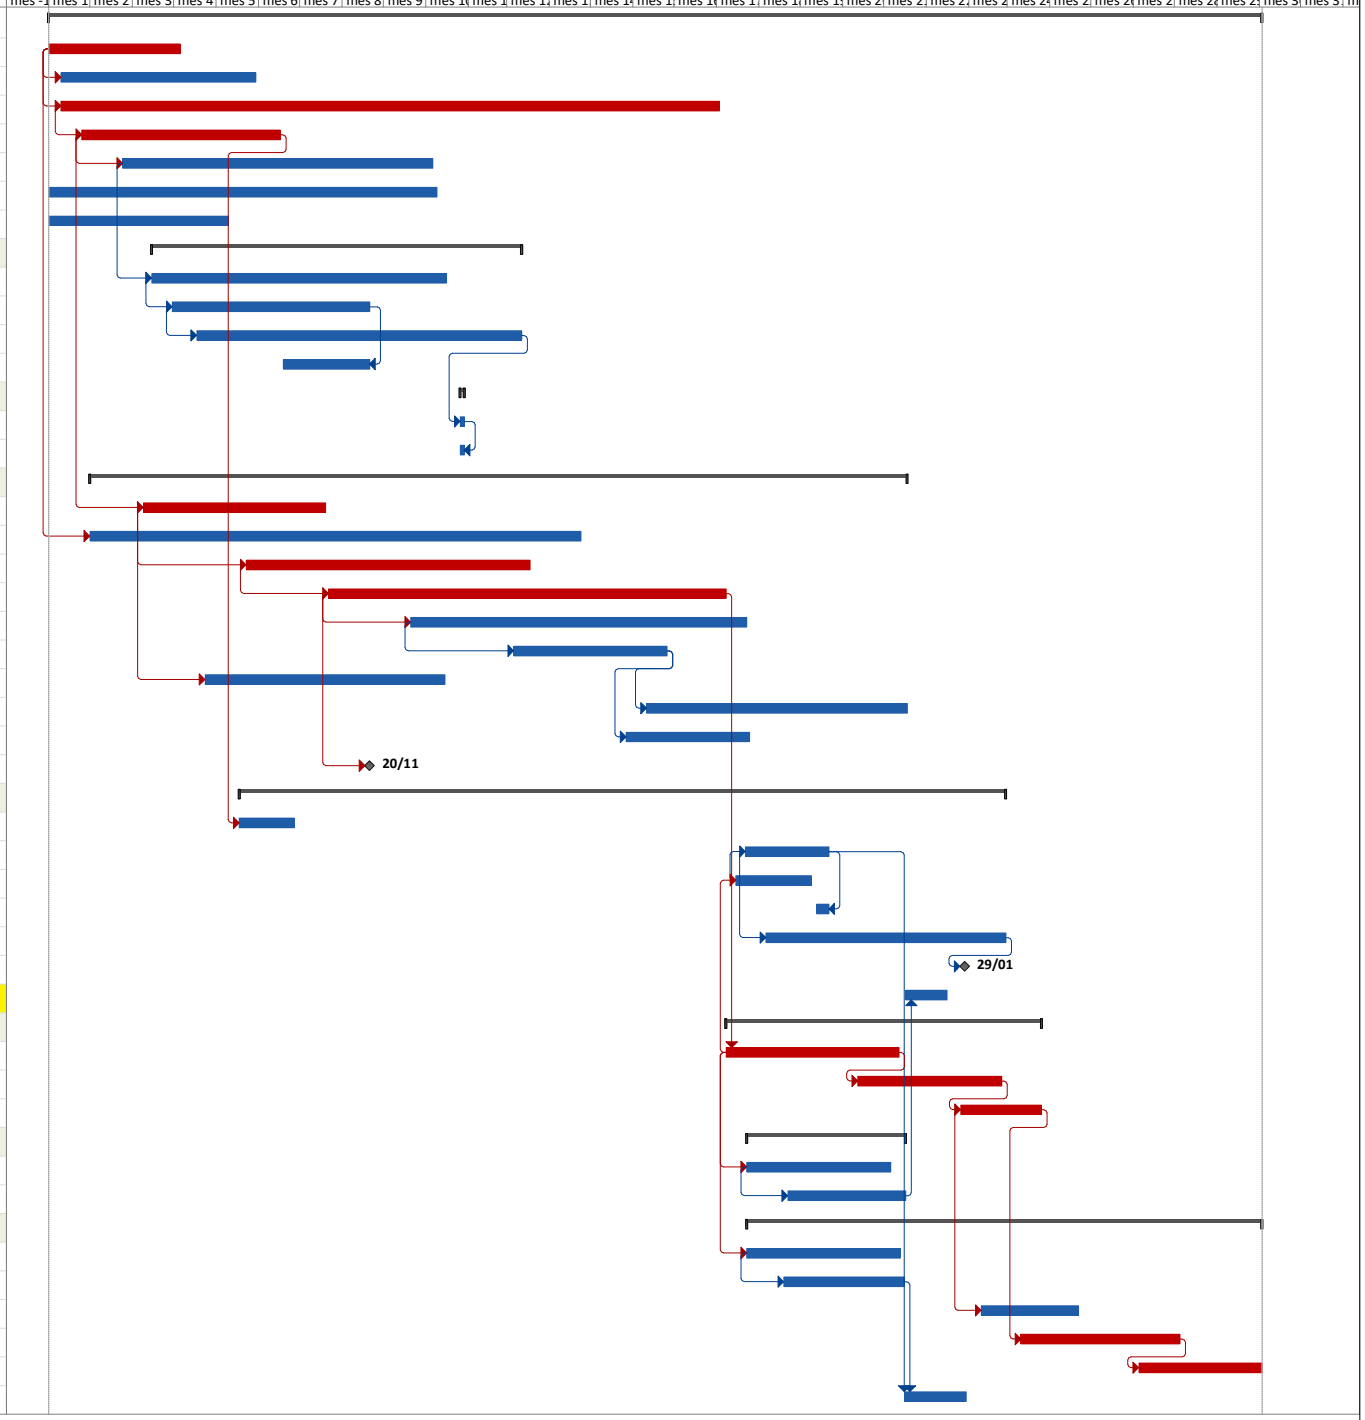

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRA 2024
VERSION 1

Tarea — Hito — Fecha límite — División crítica
División — Resumen — Tareas críticas — Progreso
