
DIAGRAMA DE GANTT

ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO - INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración
0	**AVENIDA INTERSECCION PUENTE MOSQUERA**	**$11,929,472,810**	**360 días**
1	Preliminares	$40,356,202	21 días
2	Localizacion	$94,475,572	147 días
3	Señalizacion preliminar	$146,225,064	360 días
4	Demoliciones y Desmontes	$493,450,615	139 días
5	Excavacion descapote	$750,224,450	73 días
6	Muro en suelo reforzado	$0	0 días
7	Estabilidad de taludes	$0	0 días
8	**Alcantarillado**	**$492,452,529**	**138 días**
9	Excavaciones	$112,672,548	138 días
10	Instalacion tuberias	$266,173,763	74 días
11	Llenos	$65,013,073	88 días
12	Obras en concreto	$48,593,146	18 días
13	**Acueducto**	**$364,267,707**	**44 días**
14	Instalacion tuberias y acces	$349,746,251	44 días
15	Valvulas e hidrantes	$14,521,456	2 días
16	**Puente estructura concreto**	**$5,531,637,958**	**291 días**
17	Excavacion profunda	$257,934,374	95 días
18	Acero de refuerzo	$1,502,143,195	166 días
19	Cimentacion profunda	$376,447,294	99 días
20	Pilas y estribos	$352,164,594	113 días
21	Vigas y riostras	$506,530,540	99 días
22	Placa puente	$226,142,376	96 días
23	Muros de contención	$0	0 días
24	Juntas puentes	$68,623,070	14 días
25	Losas de aproximacion	$8,185,905	5 días
26	Aproches puentes	$2,233,466,610	120 días
27	**Instalaciones electricas**	**$776,016,020**	**221 días**
28	Desmontes	$9,590,577	3 días
29	Redes electricas - Cables	$209,137,695	31 días
30	Postes para redes de media y alta	$194,314,062	12 días
31	Trasnformadores	$13,066,283	4 días
32	Canalizaciones	$334,217,643	63 días
33	Semaforizacion	$1,628,066	12 días
34	Decrechos RETIE/RETILAB	$14,061,694	30 días
35	**Pavimentos**	**$1,902,874,996**	**35 días**
36	Subbase granular	$347,504,013	10 días
37	Base granular	$384,977,328	10 días
38	Pavimento	$1,170,393,656	15 días
39	**Puente peatonal**	**$0**	**30 días**
40	Infraesturctura	$0	0 días
41	Estructura Metalica	$0	0 días
42	**Urbanismo**	**$1,337,491,698**	**92 días**
43	Sardineles	$216,308,761	42 días
44	Andenes	$261,141,569	59 días
45	Señalizacion Final	$230,676,455	50 días
46	Zonas verdes	$246,391,920	74 días
47	Amoblamiento	$66,958,124	16 días
48	Iluminacion	$316,014,869	46 días

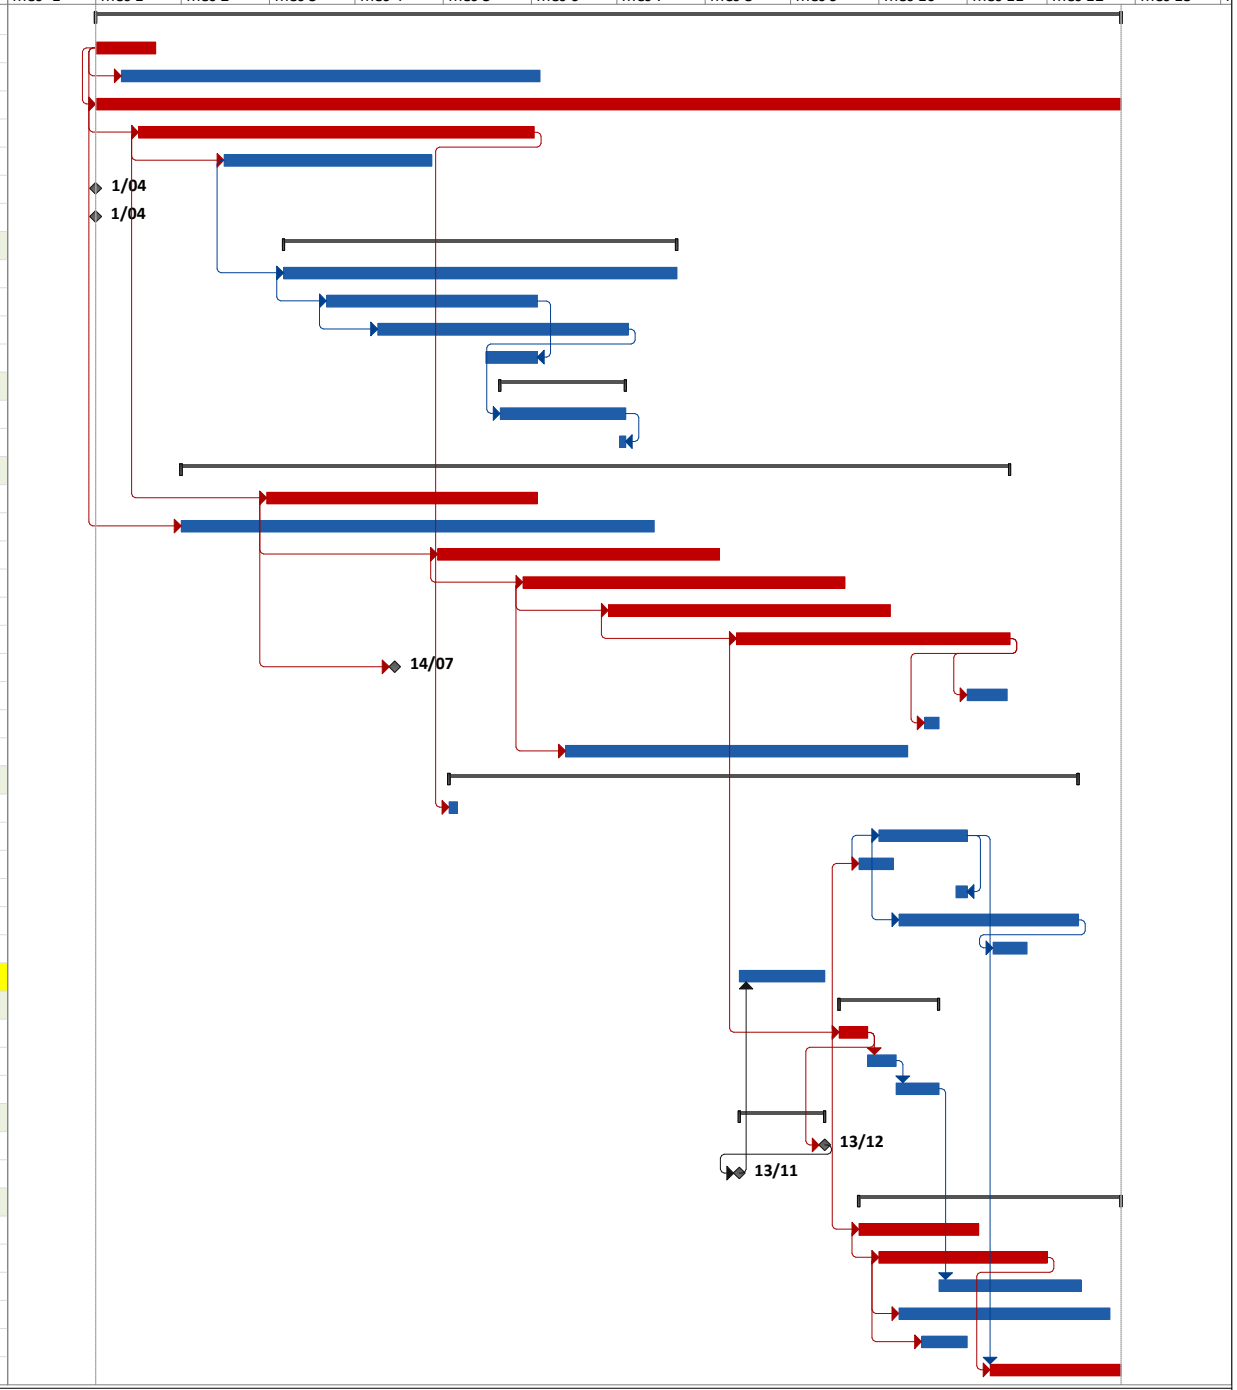

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR
DICIEMBRE 2024
VERSION 1

Tarea | Hito | Fecha límite | División crítica

División | Resumen | Tareas críticas | Progreso
