INFORME TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO Y DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. IDRY-MC-335-2024

Fecha: 17/12/2024

CONTRATO No.:	IDRY-MC-335-2024
FECHA DEL CONTRATO:	28 de noviembre de 2024
CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOPAL - IDRY
CONTRATISTA:	CAROLINA ROJAS ABRIL
NIT:	46.456.278-5
FECHA DE INICIO:	3 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO:	**$33.060.000**.00 TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL PESOS
OBJETO:	SERVICIO DE ADECUACIÓN VALLAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE PÚBLICO PARA EVENTOS, PERTENECIENTES AL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE YOPAL -IDRY
PLAZO:	QUINCE (15) DÍAS
FORMA DE PAGO:	El Instituto pagará al contratista el valor del contrato así: un único pago donde se evidencie el servicio prestado a entera satisfacción una vez entreguen los bienes y servicios requeridos acordes con el proceso contractual, el pago se realizará previa presentación de informe de ejecución por parte del contratista, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, comprobantes de ingreso al inventario si a ello hubiera lugar, suscripción del acta de liquidación, además el contratista deberá entregar factura pertinente o cuenta de cobro según corresponda y certificación y/o planilla del cumplimiento de los requisitos de ley a que haya lugar (seguridad social y parafiscales)


En cumplimiento a las funciones de supervisión que nos competen establecidas en la cláusula decima cuarta de la minuta Contrato de prestación de servicios No. IDRY-MC-335-2024. Se elabora informe técnico de supervisión de cumplimiento del objeto y actividades del contrato cuyo objeto es SERVICIO DE ADECUACIÓN VALLAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE PÚBLICO PARA EVENTOS, PERTENECIENTES AL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE YOPAL -IDRY.

1. FICHA TÉCNICA


A continuación, se relaciona la ficha técnica propuesta a través del estudio previo y sus modificaciones

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VALLAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE PÚBLICO PARA EVENTOS, PERTENECIENTES AL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE YOPAL -IDRY

Las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios del presente proceso de contratación se detallan a continuación:

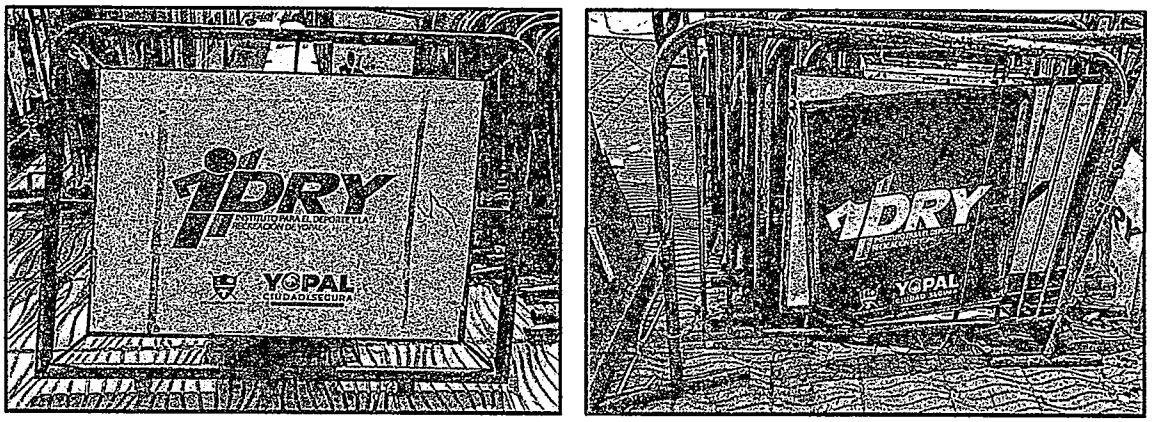

ESTADO INICIAL DE LAS VALLAS

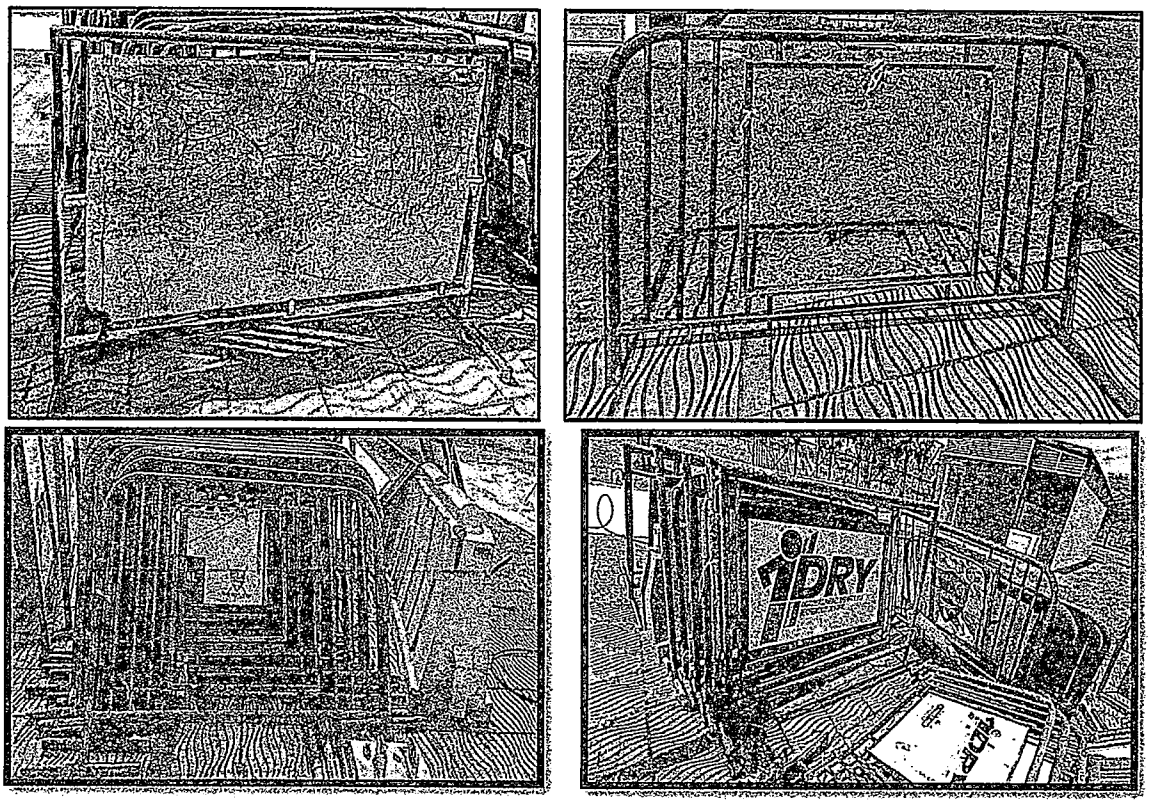

ESTADO INICIAL DE LAS VALLAS

Especificaciones:

Servicio

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	72154028	Servicios de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones	Servicio de instalación y mantenimiento de avisos	Servicio de mantenimiento y reparación de valla de seguridad que incluye: lijado, soldadura, remplazo y/o reparación de tablero en lamina cold rolled, pintura de la valla en su totalidad color amarillo, patas de la estructura, reemplazo e instalación de las patas si están inservibles o no existen, adecuar o instalar ganchos y acoples para anclaje, La pintura de cada valla tendrá las siguientes características: Fondo: Pintura anticorrosiva acabado: Esmalte color amarillo a cincuenta y siete (57) vallas metálicas de contención de público para eventos. El marco exterior; deberá entregarse en tubo en el que está fabricada de 1-1/2 de diámetro, de la parte inferior debe poseer y desprenderse dos soportes fijos (patas), de sus laterales lado derecho (vista de frente) debe llevar dos (2) ganchos en varilla de ½ en forma de U invertida y del lado izquierdo dos (2) acoples en tubo de ½, donde enganchan los ganchos para unir las vallas. Todos estos componentes deben estar ubicados de forma simétrica y uniforme, pintado en su totalidad en Esmalte color amarillo. Soportes fijos (patas), en tubo de 1 y ½ de diámetro, Cada soporte debe estar formado por una parte vertical unida al marco exterior mediante soldadura y una parte horizontal con respecto a la valla con medidas de 2 pulgadas de diámetro y 59 cm de largo. El marco interno: formado con ángulos de 1 y ¼ x 1/8 soldados para formar un cuadrado, del cual se sostiene el tablero central. Debe ir unido al marco exterior mediante soportes soldados, según diseño, ubicados de forma equidistante y simétrica. Tablero se deberá mantener en la lámina cold rolled, unida al marco interno mediante soldadura, tanto en el frente como el reverso de la valla debe llevar el logo del IDRY a full color (el diseño será entregado por el supervisor), con medidas de 50 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho, debe ir ubicado de forma centrada y simétrica, enumerar las vallas con un número en la parte superior derecha, que permita identificar cada una.	Servicio

2. ELEMENTOS ENTREGADOS

A continuación, se relacionada los elementos entregados:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
1	Cincuenta y siete (57) vallas metálicas de contención de público para eventos.	57	57

3. ENTREGA Y VERIFICACIÓN

la supervisión verifica las vallas metálicas para contención de público para eventos, pertenecientes al instituto para el deporte y recreación de Yopal -IDRY, las cuales cumplen las especificaciones técnicas del estudio previo y las recibe.

3. PROCEDIMIENTO REALIZADO.

Verificación en campo de las labores ejecutadas por el contratista.
Se anexa el registro fotográfico

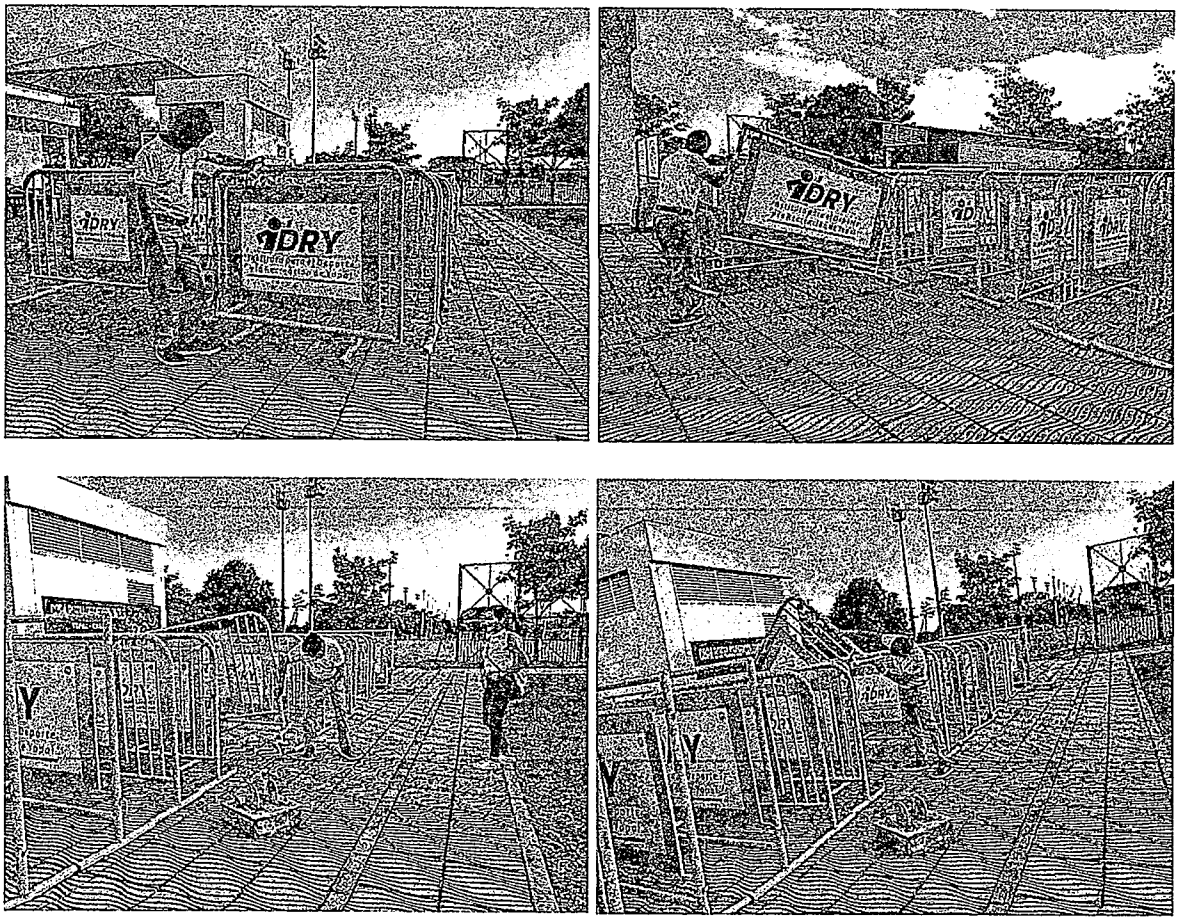

4. ENTRADA DE INVENTARIO

Por ser un contrato de prestación de servicios, no es necesaria la entrada a almacén de inventarios.

Se da cumplimiento por parte del contratista CAROLINA ROJAS ABRIL al objeto y actividades del contrato No. IDRY-MC-335-2024.

Se firma el presente informe a los 17 días del mes de diciembre de 2024.

OSCAR LEONEL ESTUPIÑAN DURAN
Profesional Universitario
Supervisor Contrato No. IDRY-MC-335-2024

INFORME DE ACTIVIDADES No.	1	FECHA INFORME	11/12/2024
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	IDRY-MC-335-2024 del 28 de noviembre de 2024		
VALOR DEL CONTRATO	Treinta y tres millones sesenta mil pesos ($33.060.000)		
CONTRATANTE	Instituto para el deporte y la recreación de Yopal		
CONTRATISTA	Carolina Rojas Abril		
No. DE IDENTIFICACION	46.456.278 de Duitama		
PLAZO DE EJECUCION	Quince (15) días		
SUPERVISOR	Oscar Leonel Estupiñan Duran		
FECHA DE INICIO	03 de diciembre de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de diciembre de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de adecuación vallas metálicas de contención de público para eventos pertenecientes al instituto para el deporte y recreación de Yopal IDRY.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Servicio de mantenimiento y reparación de valla de seguridad que incluye: lijado, soldadura, reemplazo y/o reparación de tablero en lamina cold rolled, pintura de la valla en su totalidad color amarillo, patas de la estructura, reemplazo e instalación de las patas si están inservibles o no existen, adecuar o instalar ganchos y acoples para anclaje. La pintura de cada valla tendrá las siguientes características: Fondo: Pintura anticorrosiva acabado: esmalte color amarillo a cincuenta y siete (57) vallas metálicas de contención de público para eventos. El marco exterior, deberá entregarse en tubo en el que está fabricada de 1-1/2 de diámetro, de la parte inferior debe poseer y desprenderse dos soportes fijos (patas) de sus laterales lado derecho (vista de frente) debe llevar dos (2) ganchos en varilla de 1/2 en forma de U invertida y del lado izquierdo dos (2) acoples en tubo de 1/2 donde enganchan los ganchos para unir las vallas. Todos estos componentes deben estar ubicados de forma simétrica y uniforme, pintado en su totalidad en Esmalte color amarillo. Soportes fijos (patas) en tubo de 1 y 1/2 de diámetro, cada soporte debe estar formado por una parte vertical unida al marco exterior mediante soldadura y una parte horizontal con respecto a la valla con medidas de 2 pulgadas de diámetro y 59 cm de largo.			


Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

El marco interno: formado con ángulos de 1 y 1/4 x 1/8 soldados para formar un cuadrado, del cual se sostiene el tablero central. Debe ir unido al marco exterior mediante soportes soldados, según diseño, ubicados de forma equidistante y simétrica.


Tablero se deberá mantener en la lámina cold rolled, unida al marco interno mediante soldadura, tanto en el frente como el reverso de la valla debe llevar el logo del IDRY a full color (el diseño será entregado por el supervisor) con medidas de 50 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho, debe ir ubicado de forma centrada y simétrica, enumerar las vallas con un numero en la parte superior derecha, que permita identificar cada una.


EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ESTADO INICIAL DE LAS VALLAS

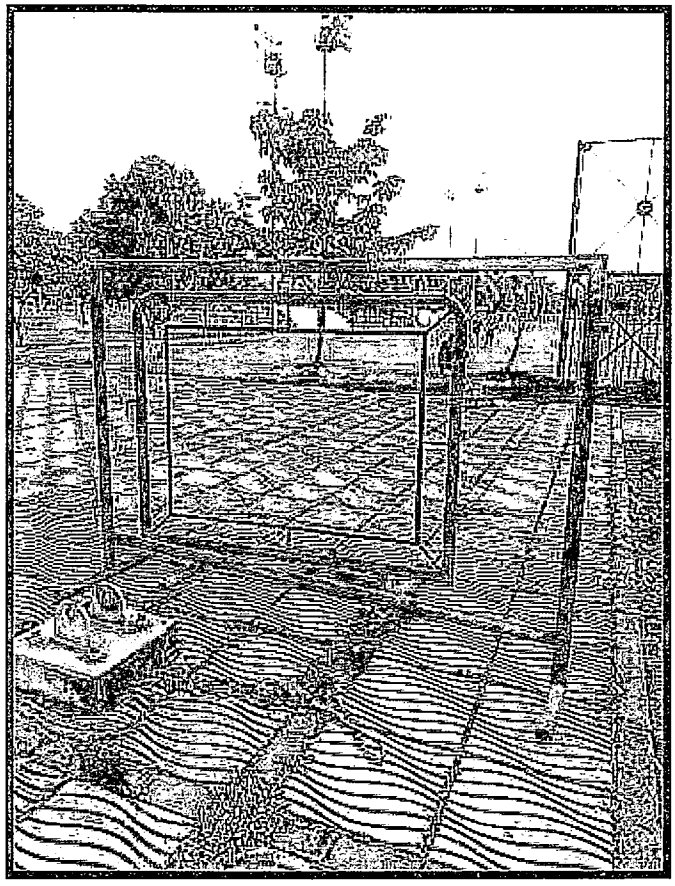



Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

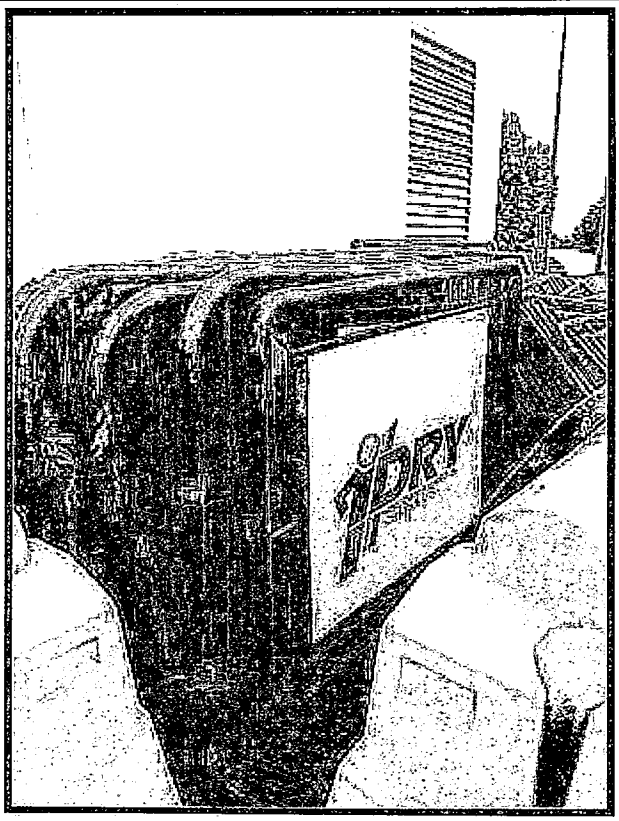

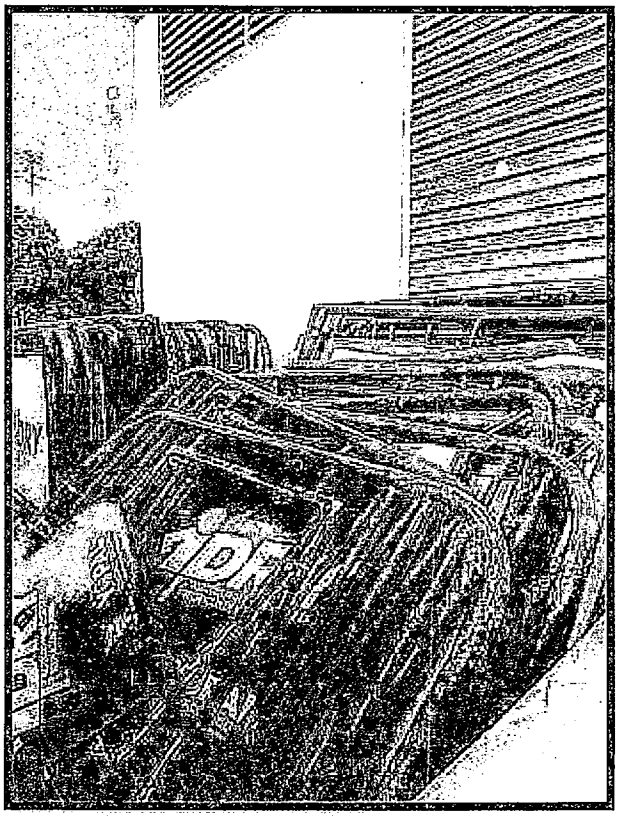

Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

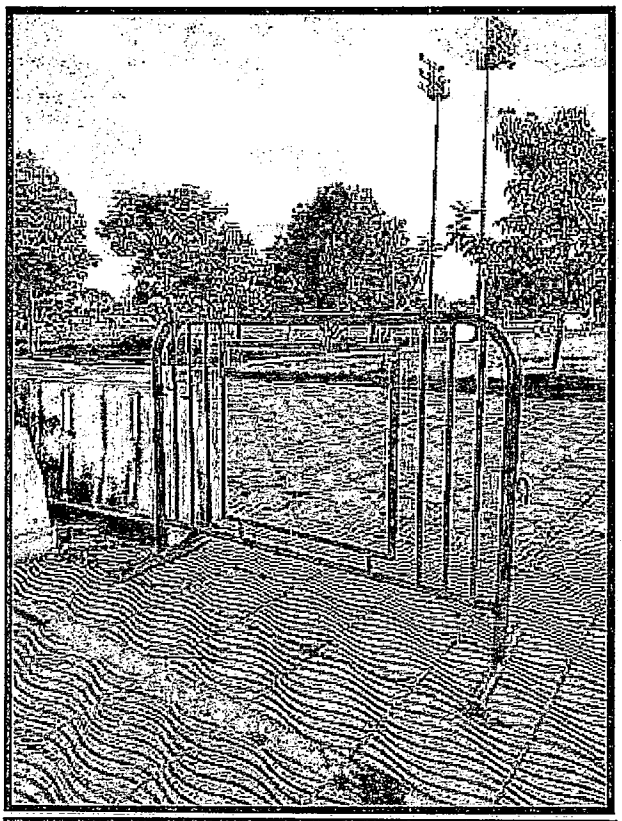


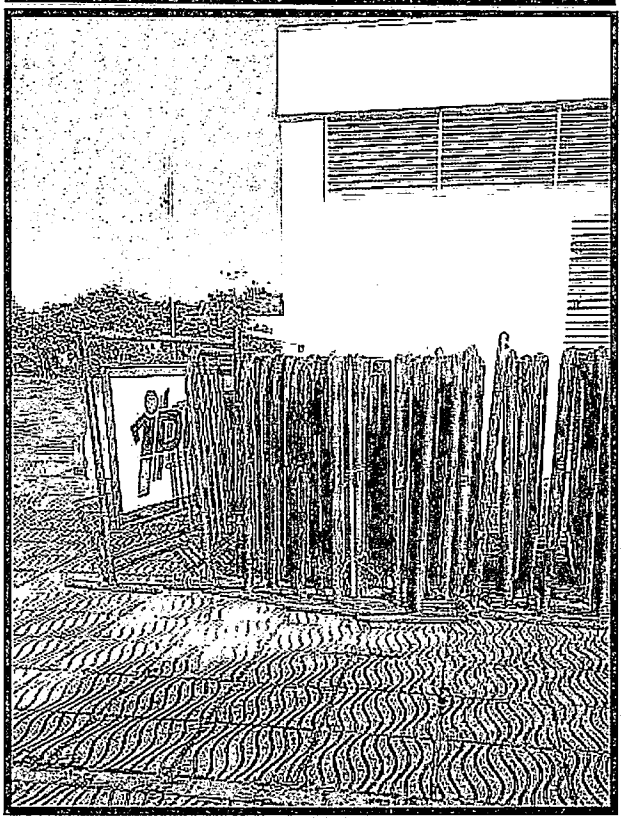

Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793


CAROLINA ROJAS ABRIL

CAMBIO DE TABLERO EN LAMINA COLD ROLLED

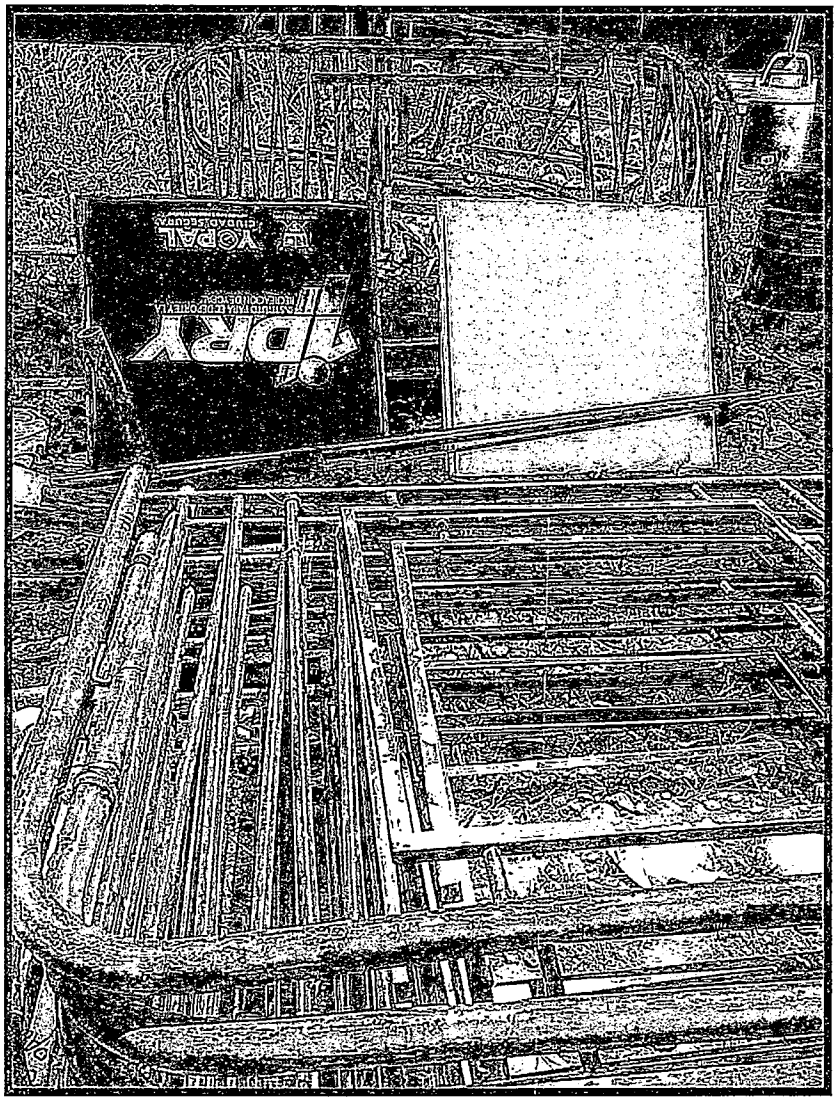

Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793


CAROLINA ROJAS ABRIL

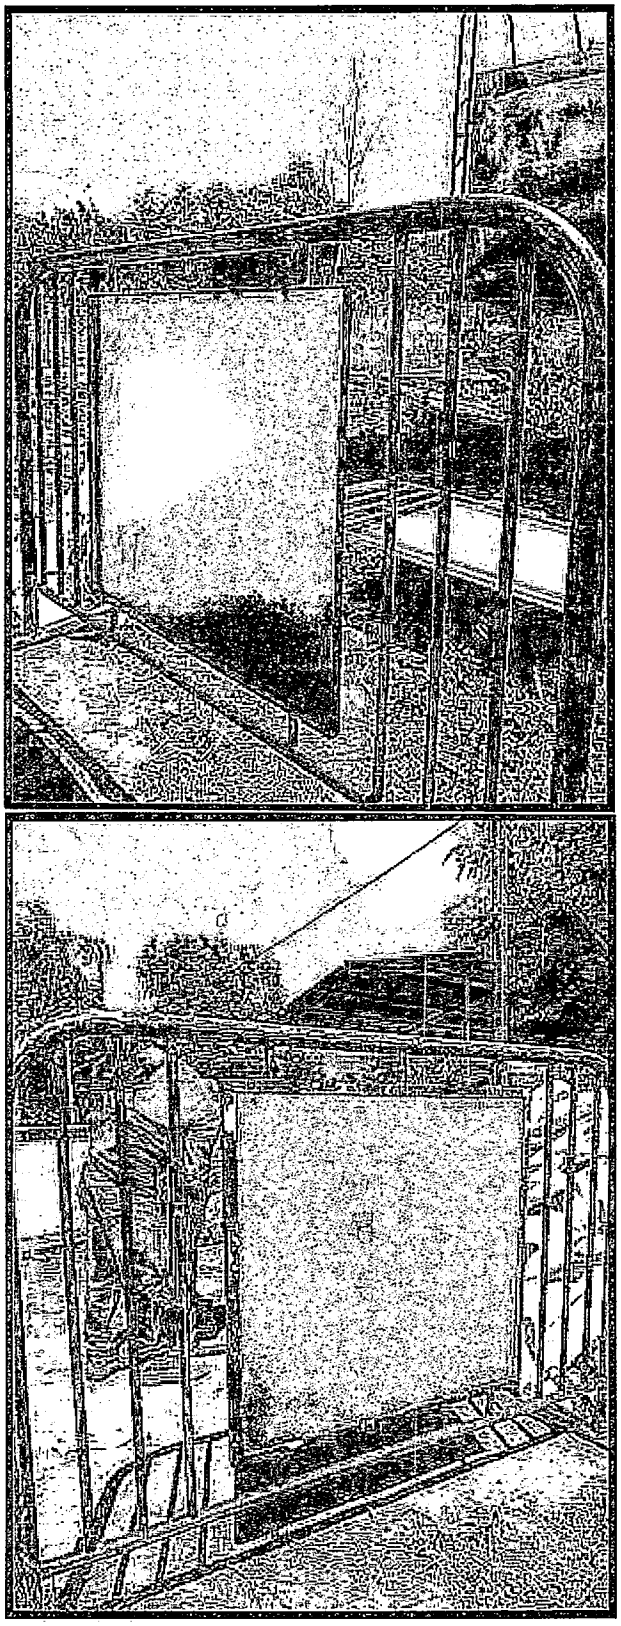


Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

CAROLINA ROJAS ABRIL


LIJADO, SOLDADURA, REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE PATAS, MANTENIMIENTO Y PINTURA

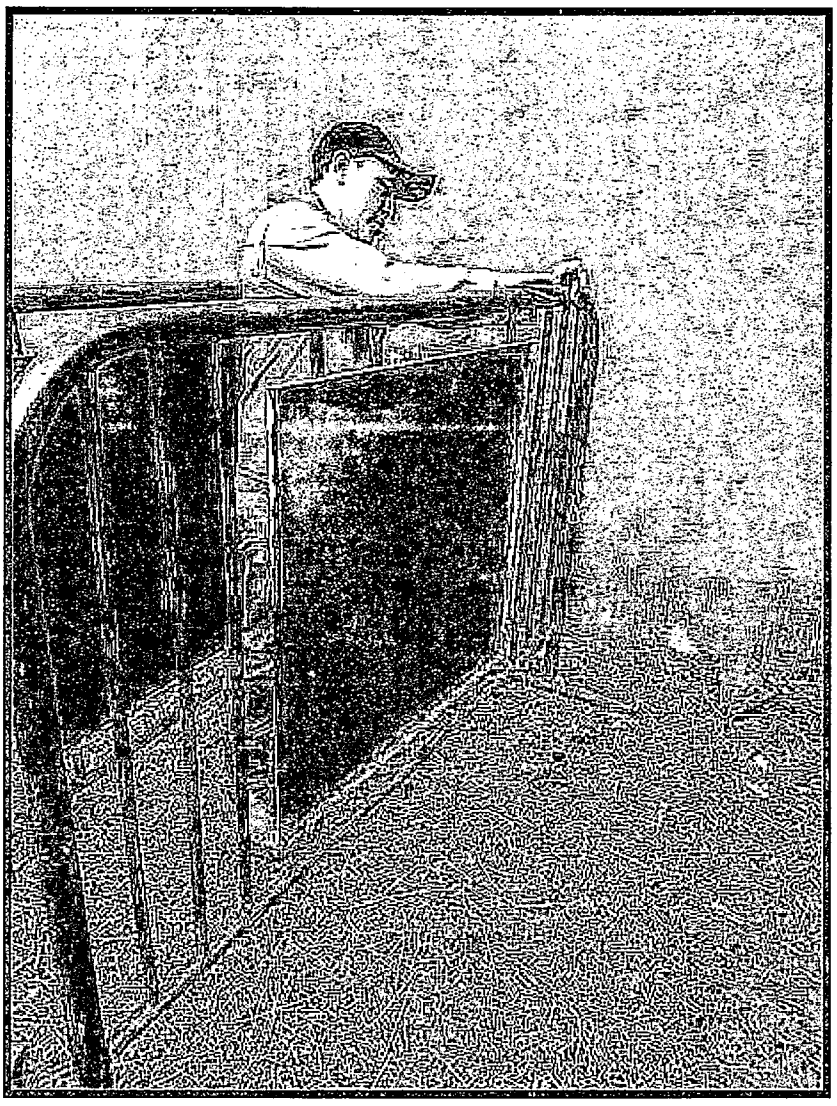


Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

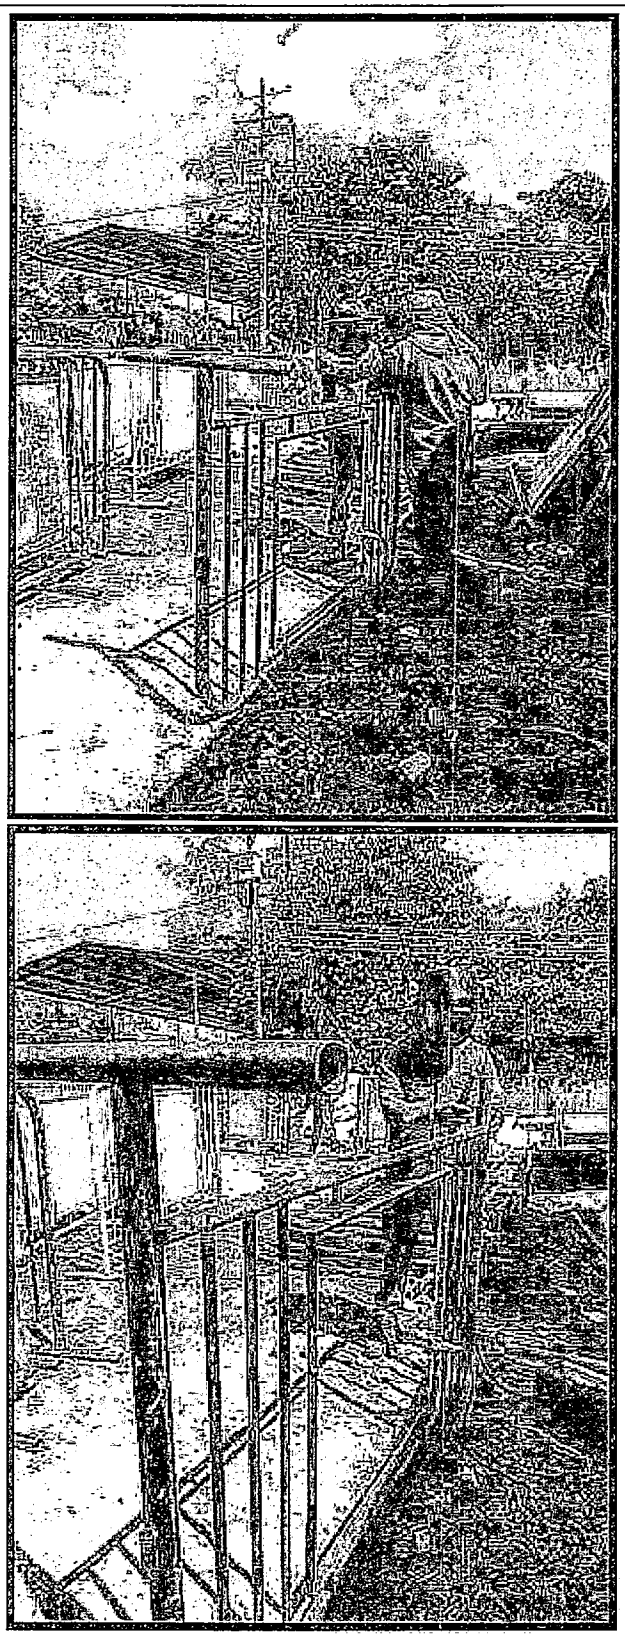


Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

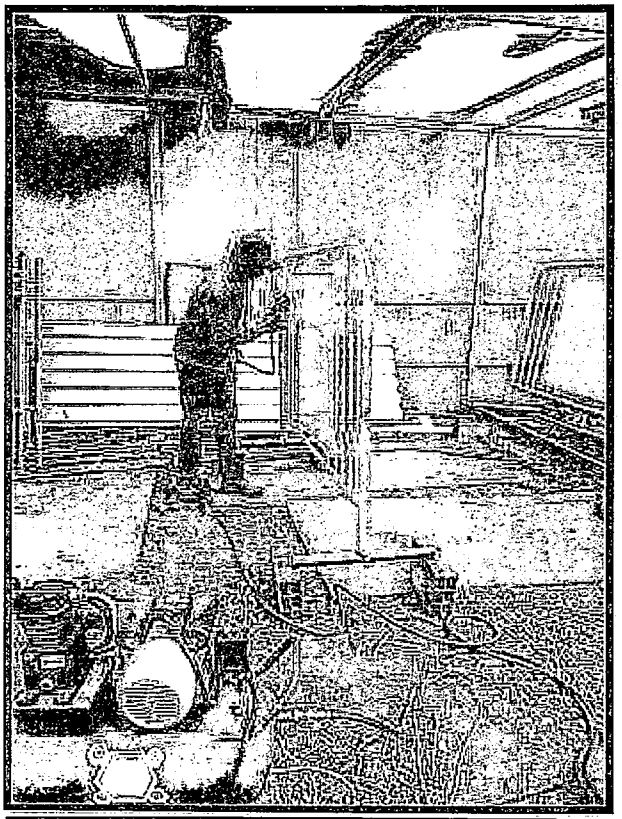

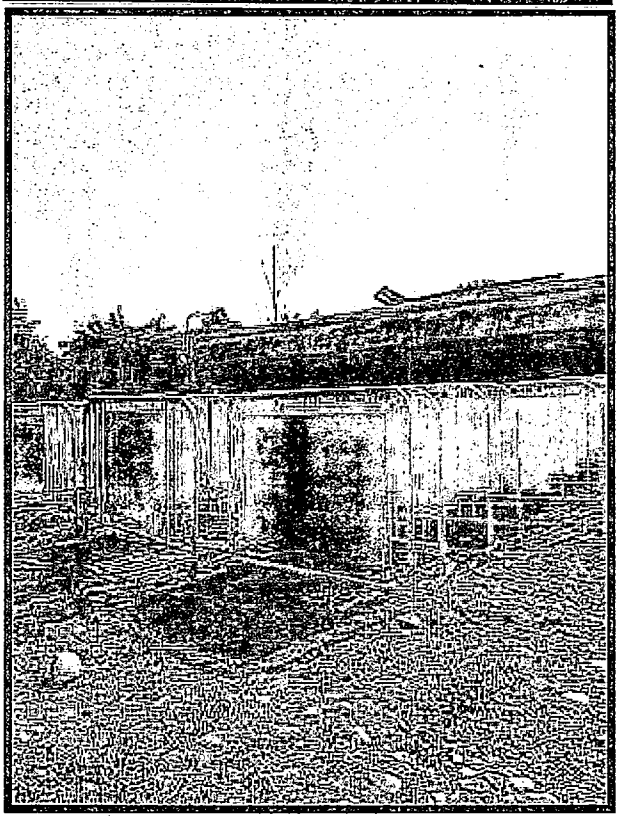



Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

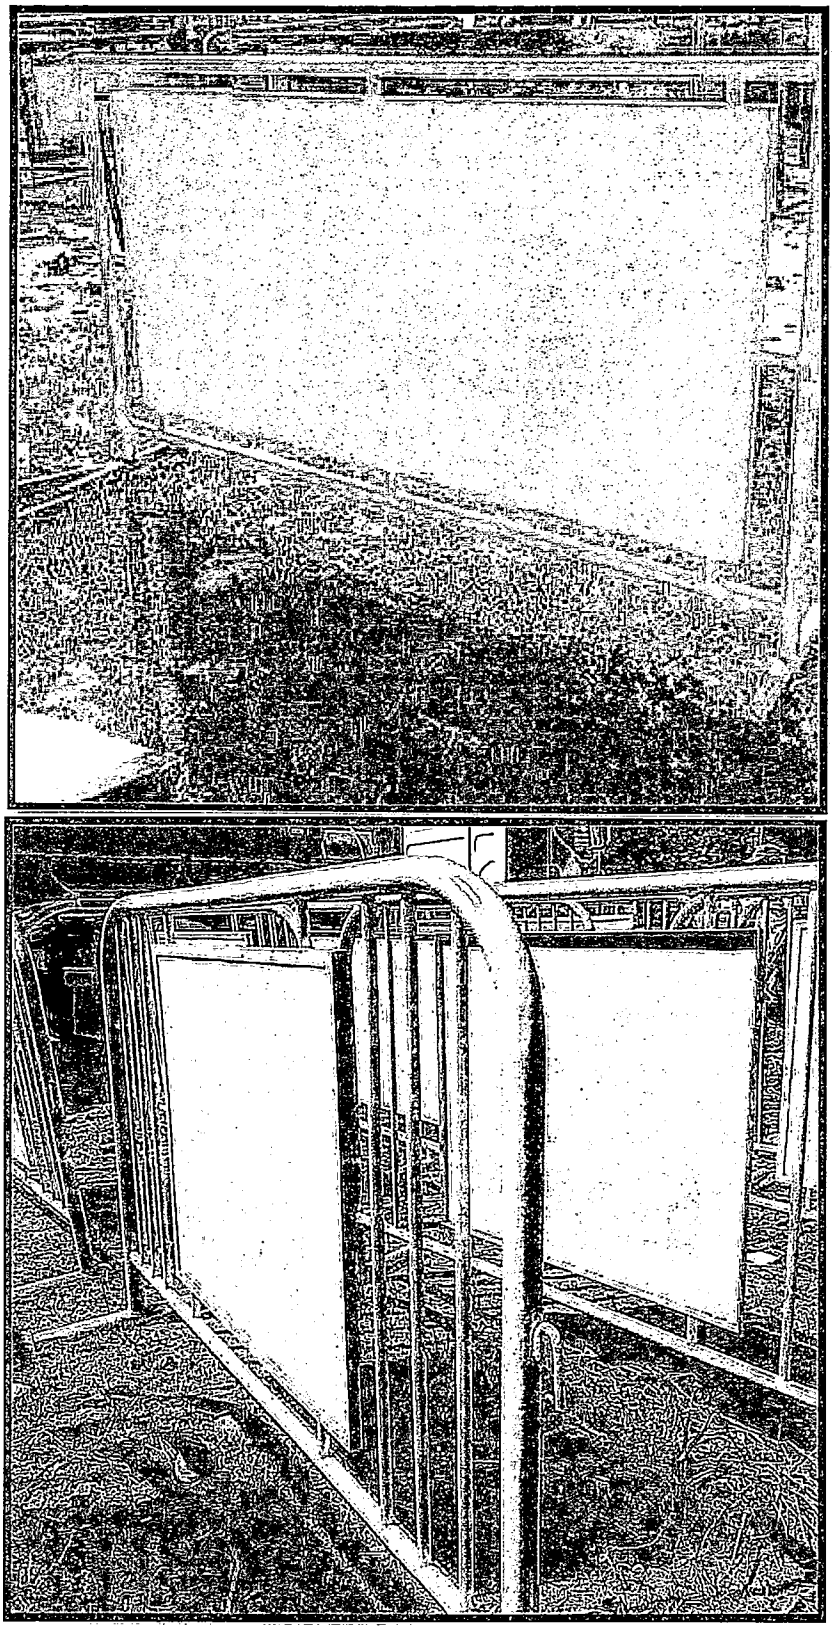

Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793


IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LOGOS

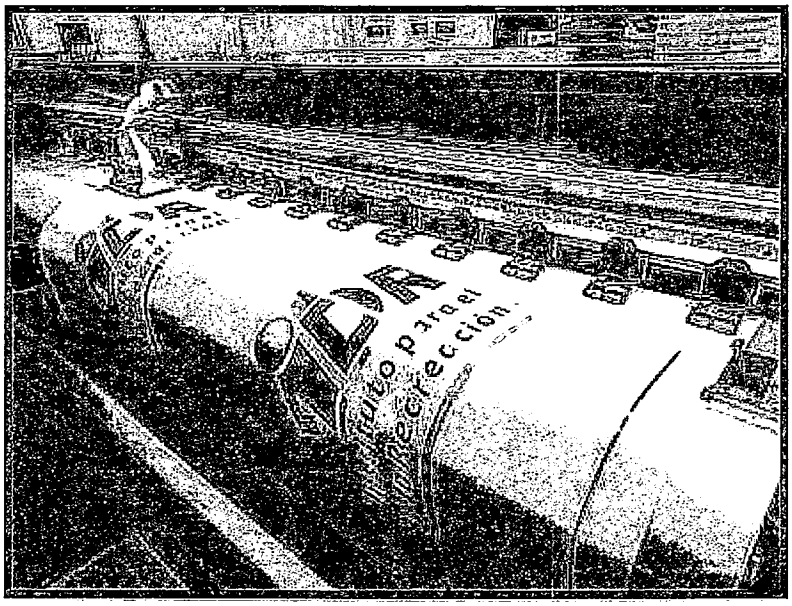

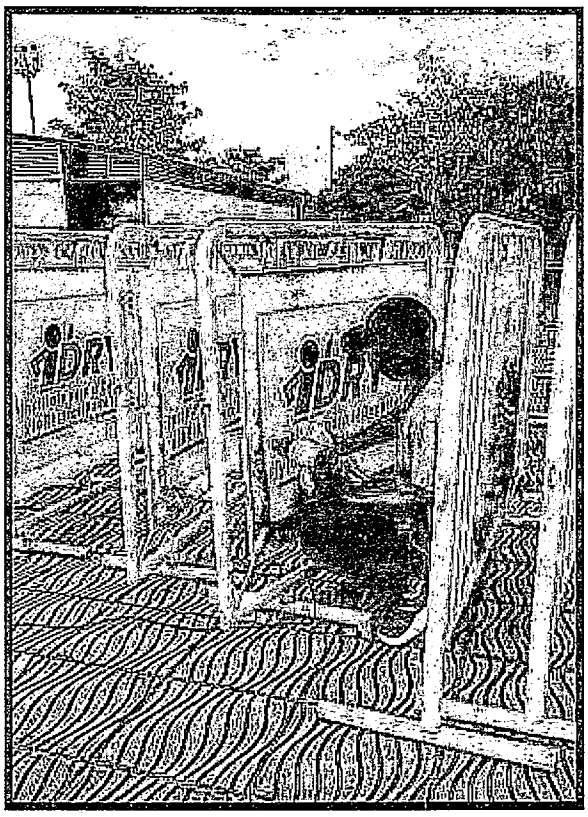


Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

ENTREGA FINAL

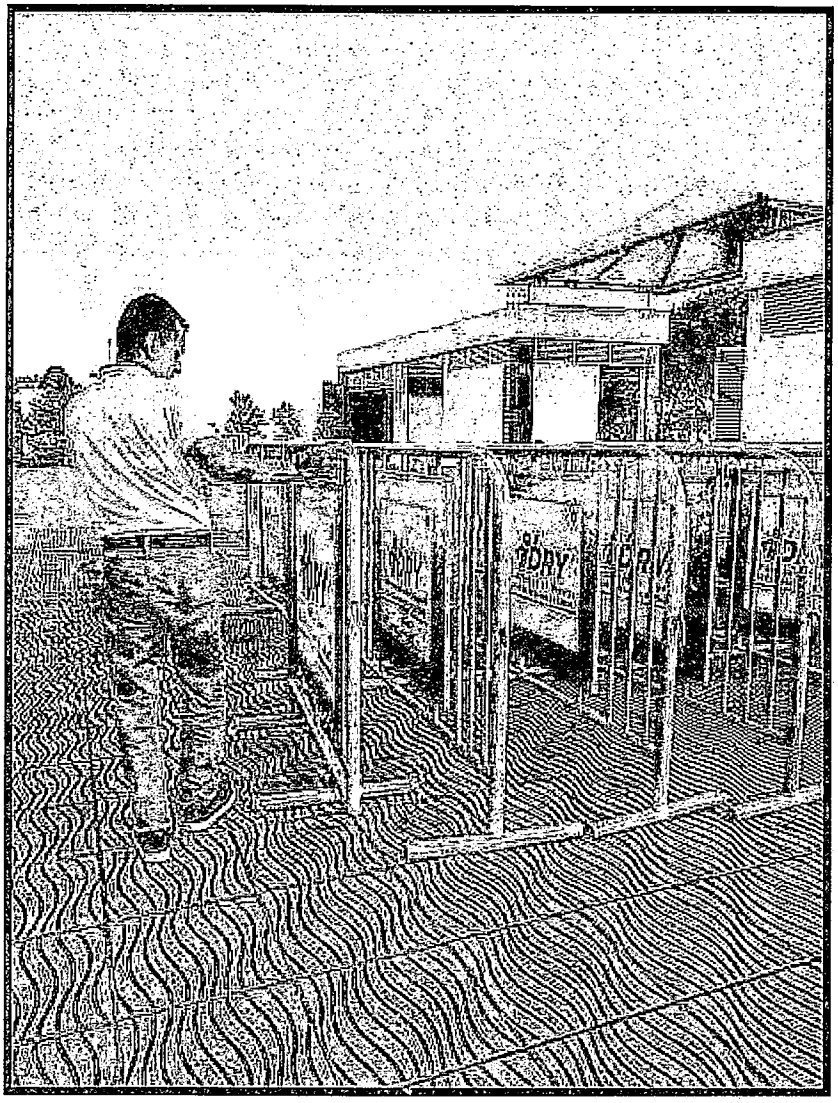



Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

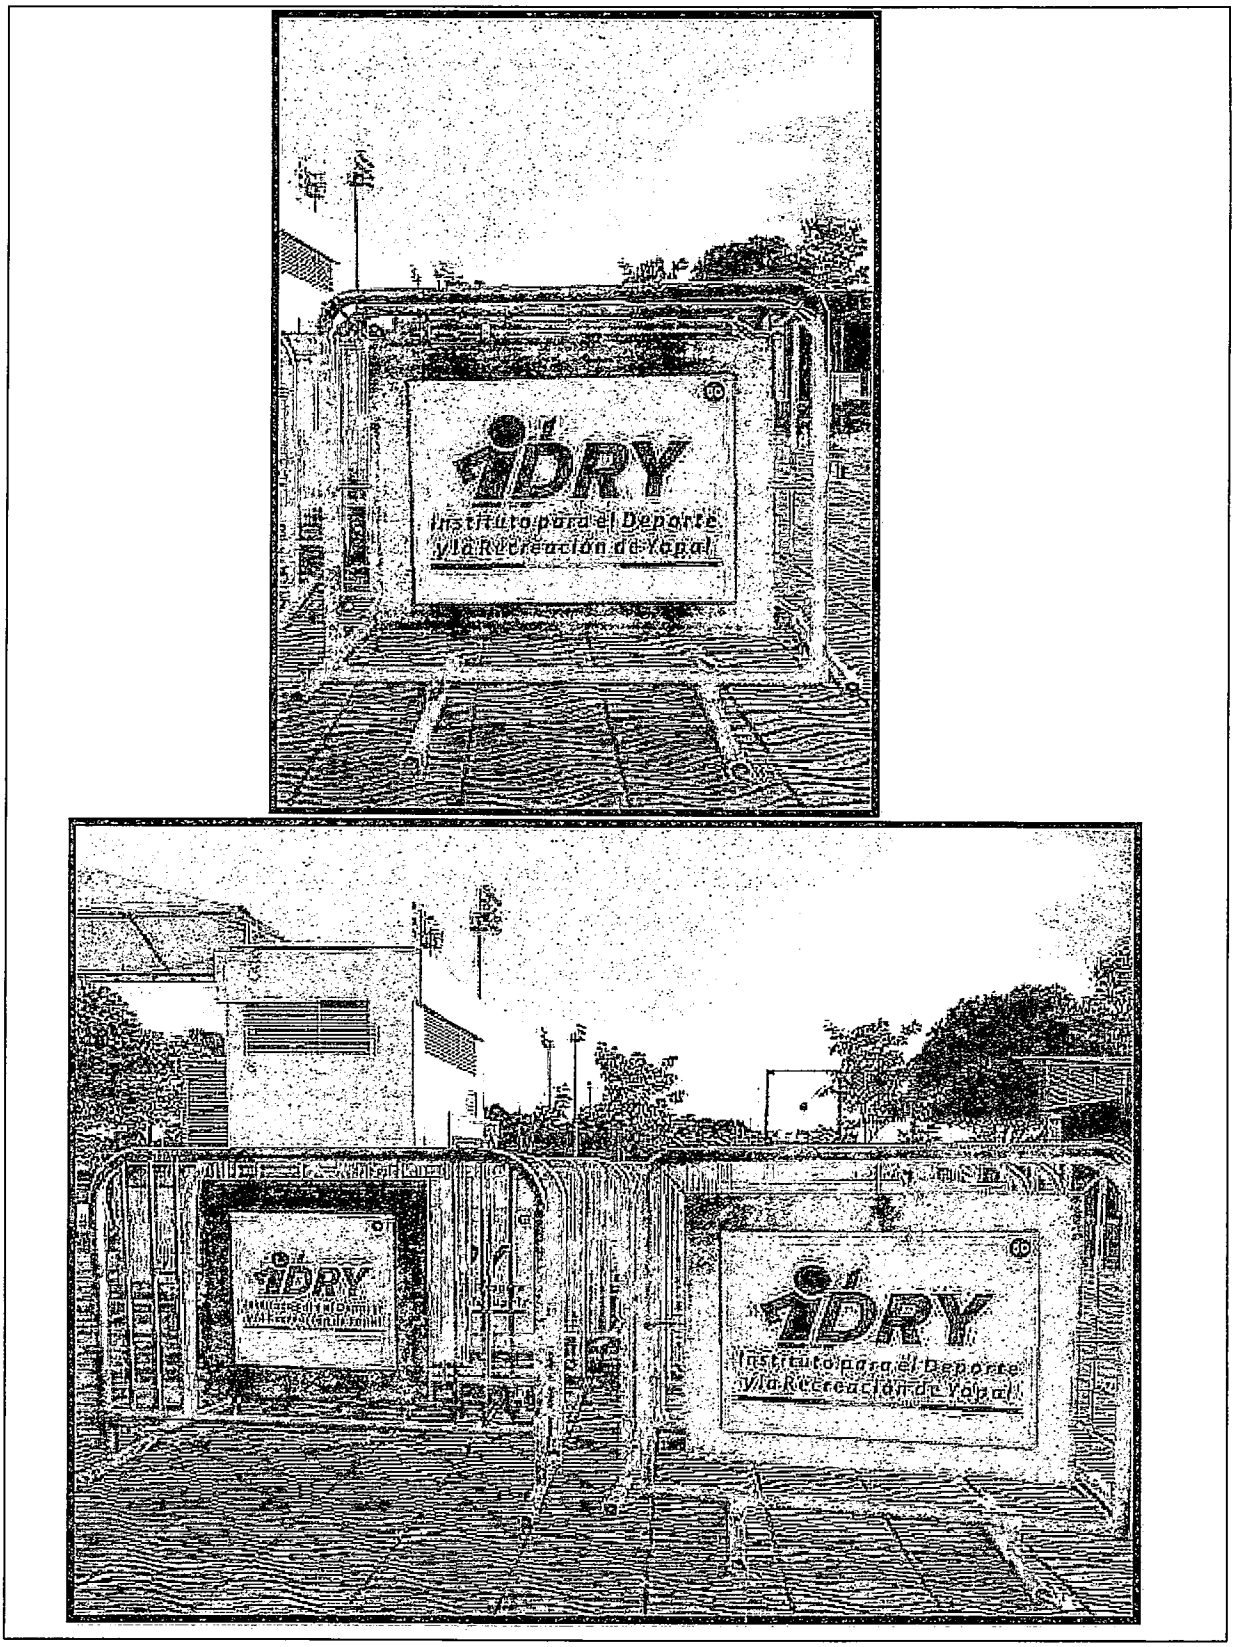

Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

CAROLINA ROJAS ABRIL

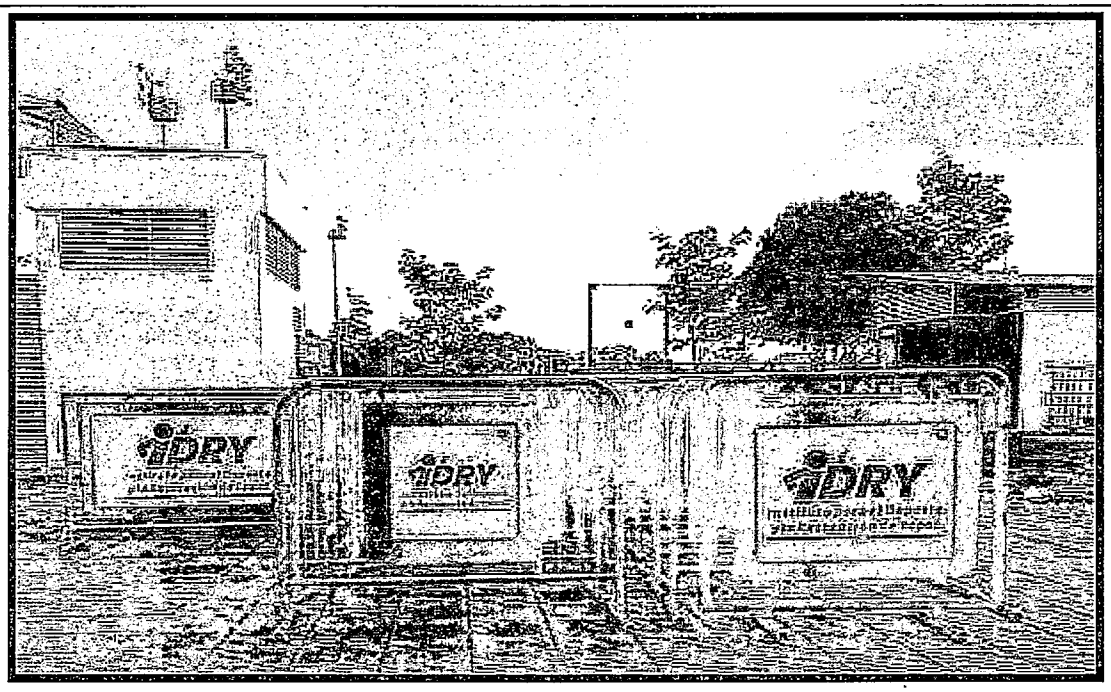

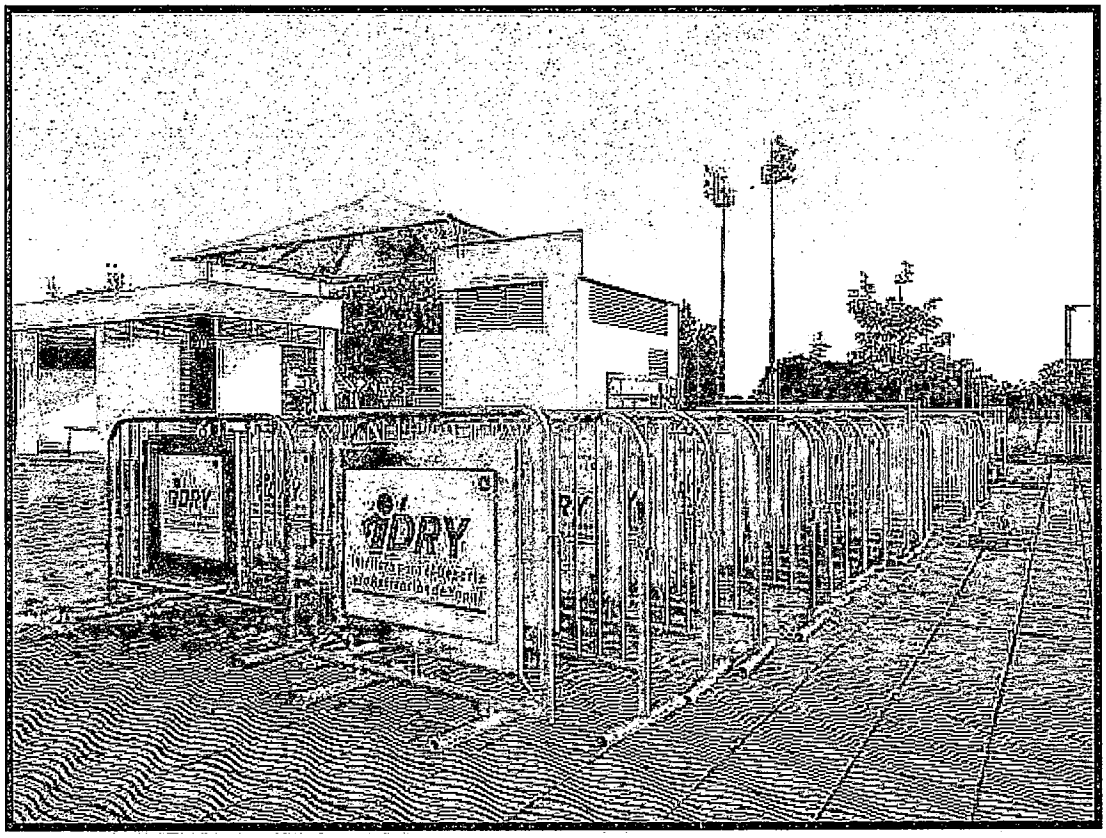

Dirección: Carrera 19 No. 6-44 Yopal-Casanare
E-mail: caritorojasabril@gmail.com
Teléfono: 311 476 6793

Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal

CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS

101.17

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO IDRY-MC-335-2024

C E R T I F I C A:

Que, CAROLINA ROJAS ABRIL, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 46.456.278, cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato de prestación de servicios No. IDRY-MC-335-2024 de fecha 28 de noviembre de 2024, correspondiente a:

SERVICIO DE ADECUACIÓN VALLAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN DE PÚBLICO PARA EVENTOS, PERTENECIENTES AL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE YOPAL -IDRY

Que las actividades fueron realizadas conforme a las obligaciones pactadas en el Contrato de prestación de servicios No. IDRY-MC-335-2024, presentando Factura electrónica de Venta Nro. FV-2 de fecha 17 de diciembre de 2024 y pagos de seguridad social según revisión y aprobación realizada por parte de la supervisión de este contrato.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024, para efectos del respectivo pago.

OSCAR LEONEL ESTUPIÑAN DURAN
Supervisor
