FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

X	**CN:** Contrato	N/A	**RS:** Resolución	N/A	**CM:** Caja Menor
N/A	**CNA:** Contrato Adicional	N/A	**SPC:** Servicios Públicos		

No. FGN-RCS-0089-2024 **VIGENCIA** 2023

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO MD
CÉDULA O NIT	901830566-6
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	leidyramirez276@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	DEL 20/11/2024 AL 07/12/2024
OBJETO:	CONTRATAR LAS ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA SIN REAJUSTE), PARA LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR, A PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Del 30 de Mayo de 2024 al 07 de Diciembre de 2024
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	Se pagará al contratista el valor del contrato, en pagos parciales dependiendo de los avances prestados durante el periodo reportado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega y recibo a satisfacción de las actividades objeto del contrato
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FACTURA MLWE31 DEL16/12/2024
VALOR A PAGAR:	$258.615.604,00

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	560-47-994000178635	Fecha:	15/05/2024		
	No	560-74-994000032567	Fecha:	17/05/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	318724	Fecha:	16/05/2024	Vr. $	$ 258.615.604,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	318724	Fecha:	16/05/2024	Vr. $	$ 258.615.604,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	79.414.034		
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II		
DEPENDENCIA:	COORDINACION GRUPO DE APOYO SECCIONAL PUTUMAYO	**TEL. Ext.:**	3187236074
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	fredy.velasquez@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	16-dic-24

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** 14

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**								
1.1	**Informe No.**			**5**					
1.2	**Período del informe**	**Del**	**20**	**11**	**2024**	**Al**	**07**	**12**	**2024**
1.3	**Contrato #**	FGN-RCS-0089	**Fecha**	**14**	**05**	**2024**	**Tipo de Contrato**	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	
1.4	**Objeto**								
CONTRATAR LAS ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA SIN REAJUSTE), PARA LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR, A PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE.								
1.5	**Nombre del contratista**								
CONSORCIO MD									

1.6	**Cédula o NIT**	**1.7**	**Correo electrónico**
901830566-6		leidyramirez276@gmail.com	
1.8	**Dirección**	**1.9**	**Teléfono**
CR 33 D 23 107 SUR BRR MANZANARES ET 5 NEIVA - HUILA		3125445187	

1.10	**Fecha de Inicio**	30	05	**2024**

1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*		
Acta de Inicio	**X**	Registro Presupuestal	**X**
Aprobación Garantía	**X**	Suscripción del Contrato	**X**

1.12	**Fecha terminación** (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	**X**	Fecha	**30**	**11**	**2024**

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** (*Agregar las filas que se requieran*)
FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
GRUPO SECCIONAL DE APOYO PUTUMAYO		3187236074	
2.4	Correo electrónico	fredy.velasquez@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de	$ **597.850.000,00**				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI		NO	X

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL		**N/A**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
11024	20/03/2024
N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
318724	**16**	**05**	**2024**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/08/2024	$ 597.850.000,00	$0,00	$ 121.601.007,00	$ 476.248.993,00
27/09/2024	$ 597.850.000,00	$121.601.007,00	$ 47.155.901,00	$ 429.093.092,00
18/10/2024	$ 597.850.000,00	$168.756.908,00	$ 62.907.308,00	$ 366.185.784,00
19/11/2024	$ 597.850.000,00	$ 231.664.216,00	$ 99.405.262,00	$ 266.780.522,00
16/12/2024	$ 597.850.000,00	$ 331.069.478,00	$ 258.615.604,00	$ 8.164.918,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
29/11/2024	1	N/A	1	N/A	N/A	Prórroga en plazo de ejecución hasta el 07/12/2024
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	98,63%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	98,63%
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación	Fecha	06	12	2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.	

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Informe de ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes de:
  - Sede de la Fiscalía Principal El Papayo – Ibagué – Tolima (URI – Baños para usuarios, módulos de descanso)
  - Sede de la Fiscalía Guamo - Tolima
  - Sede de la Fiscalía Chaparral - Tolima
  - Sede de la Fiscalía Palacio de Justicia - Neiva – Huila
  - Sede de la Fiscalía Algeciras – Huila
  - Sede de la Fiscalía CTI – Garzón – Huila
  - Sede de la Fiscalía San Agustín – Huila
  - Sede de la Fiscalía Administrativa – Florencia – Caquetá
  - Sede de la Fiscalía URI – Florencia – Caquetá
  - de la Fiscalía Patio Bruselas – Florencia – Caquetá
  - Sede de la Fiscalía Paujil – Caquetá
  - Sede de la Fiscalía Doncello - Caquetá
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Ibagué (Papayo - URI)
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Ibagué (Papayo – Módulos de Descanso URI)
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Ibagué (Papayo – Baños de Usuarios)
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Guamo - Tolima
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Chaparral - Tolima
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Neiva – Huila (Palacio de Justicia)
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Algeciras – Huila
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – CTI – Garzón – Huila
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – San Agustín – Huila
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede Administrativa - Florencia Caquetá
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede URI - Florencia Caquetá
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede Patio Único Bruselas - Florencia Caquetá
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede Paujil - Caquetá
- Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede Doncello - Caquetá
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Ibagué (Papayo - URI)
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Ibagué (Papayo – Módulos de Descanso URI)
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Ibagué (Papayo – Baños de Usuarios)
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Guamo - Tolima
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Chaparral - Tolima
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Neiva – Huila (Palacio de Justicia)
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Algeciras – Huila
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – CTI – Garzón – Huila
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – San Agustín – Huila

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede Administrativa - Florencia Caquetá
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede URI - Florencia Caquetá
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede Patio Único Bruselas - Florencia Caquetá
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede Paujil - Caquetá
- Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.5 – Sede Doncello - Caquetá
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 06/12/2024 – CONSORCIO MD
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 06/12/2024 – MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS.
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 06/12/2024 – DING CONSTRUCCIONES LTDA.
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de Noviembre de 2024 – Consorcio MD
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de Noviembre de 2024 – DING LTDA
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de Noviembre de 2024 – MLW SAS
- Formulario de Registro Único Tributario DIAN No. 14953360777 DING CONSTRUCCIONES LTDA.
- Formulario de Registro Único Tributario DIAN No. 14998006029 MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS.
- Formulario de Registro Único Tributario DIAN No. 141047376800 CONSORCIO MD
- Autorización de consignación en cuenta bancaria de fecha 06/12/2024
- Certificación Bancaria del Banco BBVA, correspondiente a la CUENTA DE AHORROS LI No. 0483244596, de la Empresa MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS
- Factura MLWE31 del 16/12/2024

Informes anexos	**SI**	**X**	**NO**		**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	Informe de ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes de la Fiscalía El Papayo en el municipio de Ibagué (URI – Módulos de descanso, baños para usuarios), Sedes Guamo y Chaparral – Tolima, sede de la Fiscalía Palacio de Justicia – Neiva – Huila, Sede Algeciras, Sede CTI – Garzón y Sede San Agustín – Huila, Sede de la Fiscalía Administrativa – Florencia, Sede URI Florencia, Sede Patio Único Bruselas Florencia, Sedes Paujil y Doncello – Caquetá.					

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El Contratista cumplió con los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a la necesidad de la Institución en las sedes de la Fiscalía El Papayo en el municipio de Ibagué (URI – Módulos de descanso, baños para usuarios), Sedes Guamo y Chaparral – Tolima, sede de la Fiscalía Palacio de Justicia – Neiva – Huila, Sede Algeciras, Sede CTI – Garzón y Sede San Agustín – Huila, Sede de la Fiscalía Administrativa – Florencia, Sede URI Florencia, Sede Patio Único Bruselas Florencia, Sedes Paujil y Doncello – Caquetá, toda vez que dispuso de los recursos necesarios para la realización de los trabajos así:

- Personal necesario para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a las autorizaciones de ingreso a cada una de las sedes intervenidas.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

- Materiales, Herramientas y Equipos en sitio para la realización de actividades en cada sede.
- Medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección personal para la ejecución del contrato.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato, de acuerdo a las siguientes actividades realizadas en cada una de las sedes así:

	FISCALIA SEDE URI BUNKER		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
6,30	PINTURA ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS DOS CARAS	M2	170,00
1,30	DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA ABIERTA	M2	15,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	320,40
INC	PUERTA EN PERSIANA METALICA CALIBRE 20, MARCO EN CALIBRE 18 PINTADO COLOR GRIS	UND	1,00

	FISCALIA SEDE PRINCIPAL – BAÑOS DE USUARIOS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1,56	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED	M2	44,64
1,60	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA O METALICAS DE 0.60 a 1.00 M x H = 2.00 Incluye Marco	UN	2,00
1,33	DESMONTE DE SANITARIO	UN	2,00
1,34	DESMONTE DE LAVAMANOS	UN	2,00
1,17	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	M2	9,10
3,03	ELABORACION DE MURO EN LADRILLO TOLETE	M2	14,28
4,07	PAÑETE CON MORTERO IMPERBEABILIZADO 1:3	M2	28,56
5,06	SUMINISTRO E INSTALAICON DE CERAMICA EN MURO DE 30 X 60	M2	50,00
9,01	MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE INSTLACION	UN	2,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	6,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	2,00
9,29	ACOMETIDA EN PVC DE 1/2"	ML	6,00
11,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 6MM FLOTADO	M2	1,60
9,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2,00
9,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA COLOCAR SOBRE MESON GRANITO	UN	2,00
9,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL	UN	1,00
9,38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO CARACOL NEGRO PARA LAVAMANOS DE EMPOTRAR, INCLUYE SALPICADERO Y FALDON	UND	2,00
9,65	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE BARRA BAÑO DISCAPACITADOS	UN	2,00
9,41	DESMONTE DE GRIFERIA TIPO TANQUE PARA SANITARIO CONVENCIONAL INSTITUCIONAL	UN	2,00
13,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	20,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG, TUBO DE 1/2", TORNILLOS, REGATAS Y RESANES	UN	2,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

6,24	PUERTAS METALICAS EN LAMINA CR CAL 18, ANCHO DE 0,60 A 1,00M X 2,00 A 2,20M, INCLUYE MARCO METALICO Y BASE EN PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE	UN	2,00
10,22	INSTALACION DE LUMNARIA LED DIAMETRO MENOR A 60CM A UNA ALTURA HASTA 6M INCLUYE TORMILLOS, FIJACION Y RESANES, LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD EN SITIO	UN	2,00
13,25	ASEO GENERAL	M2	50,00

	FISCALIA SEDE PRINCIPAL – MODULOS DE DESCANSO URI - TOLIMA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
7,11	MURO EN DRY WALL DOBLE CARA DE .12 (INSONORISADO CON FRESCASA), INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, FILOS, DILATACIONES, INSTALACION DE TAPAS CONTRA VENTANAS	M2	318,94
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	23,46
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN CERAMICA DE CALIDAD SUPERIOR O SIMILAR AL PISO INSTALADO DE 10CMS DE ALTO	ML	21,36
6,27	PUERTAS METALICAS TIPO CELOSIA, ANCHO DE 0,60 A 1,00 M X H = 2,00 A 2,20 M, INCLUYE MARCO METALICO O EN MADERA Y CERRADURA	UND	4
10,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 12W INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	12
10,26	INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS POR AEREAS, INCLUYE DE TACO Y ACCESORIOS EN AREA INTERIORES DE OFICINAS	UN	4
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG, TUBO DE 1/2", TORNILLOS, REGATAS Y RESANES	UN	8
6,30	PINTURA ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS DOS CARAS	M2	8
13,25	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	35
13,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	3

	FISCALIA SEDE GUAMO - TOLIMA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
13,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA PVC TERMO ACUSTICA, INCLUYE FLANCHES (ARQUITECTONICA).	M2	95,00
13,08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA SOPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA	ML	60,00
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	4,25
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	4,25

	FISCALIA SEDE CHAPARRAL- TOLIMA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
7,21	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON PINTURA ELASTICA SOBRE MEMBRANA, INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE FISURAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	18
8,16	SUMINISTRO E INTALACION DE DOMO POLICARBONATO DE 6MM, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION.	M2	18
8,14	DESMONTE DE CUBIERTA POLICARBONATO.	ML	18
6,28	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA, INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS DAÑADOS	UN	17
9,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECRO FUNCIONAMIENTO	UN	1
5,08	INSTALACION Y RESANE DE PISO CON GRANITO PULIDO	ML	3
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA METALICA, CONSTRUIDA EN ANGULOS, INCLUYE TODO EL MATERIAL Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,2
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	2

	FISCALIA SEDE PALACIO DE JUSTICIA – NEIVA - HUILA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
5,10	SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN CERAMICA DE 0,80M	ML	32,62
5,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SOBRE ESTRUCTURA METALICA, ALTURA 4 MT, INCLUYE TORNILLERIA Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	74,37
6,20	MUEBLE BAJO EN MADERA FORMICA	ML	5,33
6,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPAÑOS	ML	5,33
6,25	PUERTAS EN MADERA, ANCHO DE 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, INCLUYE MARCO METÁLICO O EN MADERA Y CERRADURA	UND	4,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	75,92
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	143,11
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED	UND	19,00
10,25	SUMINISTRO DE MARCO PARA PANEL LED DE SOBREPONER	UND	20,00
13,25	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	76,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

14,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UND	4,00

	FISCALIA SEDE ALGECIRAS - HUILA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
1,60	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA O METÁLICAS DE 0.60 A 1.00 M X H = 2.00 INCLUYE MARCO	UN	1
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	66,96
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELÁSTICO A BASE DE POLÍMEROS E IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS /MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN.	M2	13,06
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PERFILERIA EN ALUMINIO PROYECTANTE DE 1 1/2" * 1 1/2", INCLUYE SAMBLASTING Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1,88
13,02	PINTURA EN ESMALTE SOBRE REJAS METÁLICAS DOS CARAS	ML	5,00
13,25	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	27,36

	FISCALIA SEDE CTI – GARZON - HUILA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
	REPARACION BAÑO TERCER PISO		
1,01	DEMOLICION PISO EXISTENTE	M2	9,18
1,33	DESMONTE DE SANITARIO	UN	2,00
1,56	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED	M2	0,84
1,60	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA O METÁLICAS DE 0.60 A 1.00 M X H = 2.00 INCLUYE MARCO	M2	3,00
5,01	ALISTADO Y AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3	M2	9,18
5,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN MURO DE 30 X 60 CM	M2	0,84
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PISO DE 50 X 50 CM	M2	9,18
9,26	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES Y ACOPLES PARA LAVAMANOS, INCLUYE, ACCESORIOS, TUBERIA Y DE SER NECESARIO CAMBIO EN LA TUBERIA HIDROSANITARIA , ADEMÁS, DE TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN.	UND	3,00
9,39	REGISTRO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE TAPA	UND	1,00
9,01	MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE INSTALACION	UND	2,00
9,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CON SOSCO DE 3" A 2" METALICAS	UND	1,00
9,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA TIPO TANQUE PARA SANITARIO CONVENCIONAL INSTITUCIONAL, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2,00
13,25	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	9,18
13,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	2,00
	REPARACION BAÑO SEGUNDO PISO		
1,01	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE.	M2	15,47
1,56	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED	M2	44,98
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	3,00
1,12	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS QUE LO CONSTITUYEN.	M2	15,47
1,33	DESMONTE DE SANITARIO	UN	3,00
1,34	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	2,00
2,05	CONSTRUCCION DE PLACA	M2	1,33
3,02	ELABORACION DE MURO EN BLOQUE N° 4	M2	3,66
4,01	PAÑETE 1:3 , INCLUYE FILOS Y DILATACIONES LINEALES	M2	46,64
5,01	ALISTADO Y AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3	M2	15,47
5,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN MURO DE 30 X 60 CM	M2	46,64
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PISO DE 50 X 50 CM	M2	15,47
5,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN	ML	1,60
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARJIA EN CLR CAL. 18, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	4,00
6,35	ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE MESÓN EN MADERA (INCLUYE DOS CAPAS DE LACA, SELLADA E IMPERMEABILIZACIÓN CAMBIO DE BISAGRAS SI ES NECESARIO)	UND	3,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY-WALL O PVC PLANO	M2	15,47
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	16,54
7,21	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON PINTURA ELASTICA SOBRE MEMBRANA, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN DE FISURAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA PVC DE 1"	ML	6,80
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	6,70

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODOS SANITARIOS 2"	UND	6,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2"	UND	3,00
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE RED HIDRAULICA PVC DE 1"	UND	3,00
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RED HIDRAULICA 1"	UND	3,00
9,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CON SOSCO DE 3" A 2" METALICAS	UND	2,00
9,28	ACOMETIDA EN PVC DE 1"	ML	6,80
9,30	PUNTO DE AGUA FRIA PVCP 1"	UND	3,00
9,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA COLOCAR SOBRE MESON EN GRANITO	UND	3,00
9,53	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	3,00
10,21	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER,	UND	3,00
10,25	SUMINISTRO DE MARCO PARA PANEL LED DE SOBREPONER	UND	3,00
11,12	CAMBIO VIDRIOS 4-5 MM VENTANERIA EXISTENTE - CAMBIO VIDRIOS 6 MM VIDRIO TEMPLADO	M2	1,02
13,01	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	15,47
13,02	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	4,00
13,03	PINTURA DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA.	M2	6,00
13,21	ANGEO CON SU MARCO EN ALUMINIO PARA EVITAR INGRESO DE ABEJAS EN BAÑOS Y COCINA	M2	2,00

	FISCALIA SEDE SAN AGUSTIN - HUILA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
1,33	DESMONTE DE SANITARIO	UN	1,00
1,34	DESMONTE DE LAVAMANOS	M2	1,00
4,06	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR SOBRE MUROS	M2	20,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	292,36
9,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA COLOCAR SOBRE MESON EN GRANITO	UND	1,00
9,53	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00
13,01	PINTURA EN ESMALTE	M2	89,08
13,02	PINTURA EN ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS	ML	50,92
13,25	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	174,03
13,26	RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1,00

	FISCALIA SEDE URI- FLORENCIA - CAQUETA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
INC	BISAGRA HIDRAULICA PUERTA PRINCIPAL	UND	1,00

	FISCALIA SEDE ADMINISTRATIVA - FLORENCIA - CAQUETA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
	SEDE ADMINISTRATIVA CAQUETA		
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	4,00
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	4,00
10,25	SUMINISTRO DE MARCO PARA PANEL LED SOBREPONER	UND	2
	OFICINA HISTORIAS LABORALES		
1,04	DEMOLICION DE CIELO RASO EN ICOPOR	M2	31,10
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	72,04
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	37,52
	FACHADA PRINCIPAL LATERAL		
12,01	LIMPIEZA MECANICA PARA FACHADAS	M2	89,45
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	89,45
	OFICINAS SEGUNDO PISO		
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	534,61
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	7,11
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	155,73
13,12	INSTALCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, INLCUYE REFUERZO DE PLACA SOPORTE DEL TANQUE Y CONEXIONES HIDRAULICAS	UND	1,00
INC	TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO EXTRAFUERTE CON LOGOS DE LA FISCALIA GENERAL	M2	6,62
	ESCALERAS 2 - 3 PISO SECTOR OFICINA BIENES		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	62,88
	ESCALERAS 2 - 3 PISO SECTOR OFICINA BIENES		
13,01	PINTURA EN ESMALTE SOBRE BARANDAS	M2	20,00

	FISCALIA SEDE PATIO BRUSELAS - FLORENCIA - CAQUETA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
INC	SUMINISTRO DE PORTÓN METÁLICO MEDIDA DE 2 DE ALTO POR 5 M DE LARGO EN TUBO DE 2" GALVANIZADO CAL. 18, MARCOS EN ÁNGULO 1"X3/16", MALLA ESLABONADA ESCUADRÍA 2-1/4 X 2-1/4, PIVOTES EN TUBO PETROLERO DE 2", PINTURA ANTICORROSIVA	M2	10,30
2,02	ELABORACION DE COLUMNA EN CONCRETO ARMADO	M3	0,20
1,55	EXCAVACION MANUEL, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	0,78

	FISCALIA SEDE PAUJIL - CAQUETA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1,60	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA O METALICAS DE 0,60 A 1.00 M X H =2,00 INCLUYE MARCO	UND	1,00
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA, INLCUYE MARCO, BISAGRAS, PINTURA CON UNA MANO DE ANTICRROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, ADEMAS DE TODO MATERIAL Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION.	M2	4,56
1,22	DEMOLICION DE VENTANA EXISTENTE	UND	1,00
10,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 12W INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABLIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	4,00
6,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR SENCILLA, ENTAMBORADA SENCILLA, BASTIDOR DE MADERA Y PANELES EN TABLERO CONTRACHAPADO, INCLUYE TODO MATERIAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	2,19
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG, TUBO DE 1/2", TORNILLOS, REGATAS Y RESANES	UND	1,00
13,02	PINTURA EN ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS DOS CARAS	ML	5,00

	FISCALIA SEDE DONCELLO - CAQUETA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1,12	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	38,70
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	1,00
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABLIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	6,4
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	11,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	72,71
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	41,68
10,08	SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMAPARA LED, INCLUYE PERFORACION EN CIELO RASOO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCACHUETADO # 12 AWG HASTA RL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AEREA; ADEMAS DE CAJA METALICA GALVANIZAA HEXAGONAL; SUPLEMENTO ; TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG TUBO EMT DE 1/2", TONILLOS, REGATAS, RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00
10,25	SUMINISTRO DE MARCO PARA PANEL LED SOBREPONER	UND	1,00
13,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA PVC TERMO ACUSTICA, INCLUYE FLANCHES	ML	10,00
13,08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA SOPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA	ML	10,00

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Malo		Regular		Bueno	X	N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con los aspectos técnicos referentes a disponer del Personal necesario para la ejecución de los trabajos, Materiales, Herramientas y Equipos en sitio para la realización de actividades en cada sede, Medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección personal para la ejecución del contrato, tanto para su personal en obra como en los sitios en intervención. Así mismo cumplió con los plazos del contrato, realizó los trabajos solicitados en cada sede, coordinó los diversos aspectos de ejecución con el supervisor del contrato y con los supervisores de apoyo, en cada Seccional. Así mismo cumplió con la afiliación y pago de seguridad social de su personal de manera oportuna, aportando las planillas de seguridad social y las afiliaciones de su personal de acuerdo a lo requerido por parte de la Entidad. En general cumplió con las obligaciones contractuales definidas en la contratación.

OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Aspectos relevantes:

1. El presente informe corresponde al Acta de Entrega Parcial No.5
2. Durante la ejecución del contrato se han realizado comunicaciones de manera personal por parte del Contratista y telefónica que ha permitido coordinar el trabajo. Así mismo se ha realizado la coordinación de los trabajos en ejecución con cada uno de los Supervisores de Apoyo de las Seccionales Tolima, Huila y Caquetá.
3. Se han realizado visitas de verificación de actividades por parte de los Supervisores de Apoyo para la revisión de ejecución en cuanto a la calidad de los trabajos, cantidades de obra, recomendaciones y cumplimiento del contratista en cuanto a las especificaciones técnicas de actividades en ejecución.
4. Se enviaron comunicaciones varias mediante correo electrónico, para la coordinación de los trabajos y de solicitudes de autorización de ingreso del personal del contratista a cada una de la sedes.
5. Para el presente informe se realizaron reuniones virtuales para establecer el avance de actividades y se solicitó al Contratista adoptar acciones para agilizar los trabajos en los diferentes frentes de trabajo, en particular en las Seccionales Tolima y Huila, para lo cual el contratista adoptó mecanismos tendientes a agilizar los trabajos y mejorar en la respuesta a los requerimientos.

Así mismo se deja constancia de los siguientes aspectos observados en la ejecución de actividades inherentes al contrato en las sedes descritas:

SEDE EL PAPAYO – IBAGUE - TOLIMA:

En relación con los trabajos realizados, durante el mes de noviembre de 2024 especialmente, se solicitó por parte de la supervisora de apoyo Seccional Tolima la calidad y agilidad en los trabajos en la Sede Principal, Chaparral y Guamo.

Aspectos relevantes:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

- El Contratista cumplió dentro del plazo establecido en el contrato, con la finalización de los trabajos en los diferentes frentes de trabajo y sedes de la Seccional Tolima, lo cual fue corroborado por parte de la Supervisora de Apoyo de esta Seccional.

SEDE PALACIO DE JUSTICIA – NEIVA - HUILA:

En relación con los trabajos realizados, durante los meses de noviembre y parte de diciembre de 2024, se solicitó por parte de la supervisora de apoyo Seccional Huila, la calidad en las labores ejecutadas en esta sede, lo cual se cumplió por parte del Contratista.

SEDES ALGECIRAS – CTI GARZON Y SAN AGUSTIN - HUILA:
En relación con los trabajos realizados, durante los meses de noviembre y parte de diciembre de 2024, se ajustaron las cantidades de actividades a intervenir y se coordinaron con la supervisora de apoyo para cumplir con los plazos establecidos.

SEDE ADMINISTRATIVA - CAQUETA:

El supervisor de apoyo designado de la Seccional Caquetá, realizó el seguimiento detallado de actividades en la sede Administrativa, habiéndose finalizado los trabajos a entera satisfacción. Es de advertir que las intervenciones se ejecutaron en el plazo establecido por la Entidad.

SEDES URI y PATIO UNICO BRUSELAS - CAQUETA:

En estas sedes se suministraron e instalaron elementos de funcionalidad para las mismas, que estaban pendientes de realizar, para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las mismas, los trabajos fueron verificados y coordinados por el supervisor de apoyo designado para la Seccional.

SEDES PUAJIL Y DONCELLO:

En relación con los trabajos realizados, durante los meses de noviembre y parte de diciembre de 2024, se ajustaron las cantidades de actividades a intervenir y se coordinaron con el supervisor de apoyo para cumplir con los plazos establecidos.


ASPECTOS GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO En términos generales dentro de la ejecución del contrato se ha observado lo siguiente:

- Durante la ejecución del contrato, el contratista puso a disposición del personal suficiente y necesario en cada una de las sedes, con los elementos de protección y seguridad en el trabajo, respecto al uso de los implementos de seguridad industrial, tales como cascos, guantes, tapabocas.
- Se solicitó la utilización de señalización preventiva que permitiera observar la ejecución de estos trabajos por parte de usuarios y servidores de la Fiscalía y de otras entidades con quienes se comparten las instalaciones.
- En general la labor realizada ha sido supervisada de manera detallada y continua, habiéndose levantado el registro fotográfico de las obras por cada uno de los supervisores de apoyo de las Seccionales, como constancia de su ejecución, con el apoyo del personal del área de administración de sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.
- El Contratista realizó las comunicaciones necesarias para solicitar las autorizaciones de ingreso del personal a cargo en cada una de las sedes, acatando las órdenes y recomendaciones del personal de seguridad de la Fiscalía.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

- El Contratista en cumplimiento al numeral 7.2.2. Factor Técnico del Pliego de Condiciones Definitivo y de acuerdo a la certificación adjunta a su propuesta, aplicó 1.000 m2 de resane y pintura adicional, sin ningún costo para la Entidad, en la sede Principal de la Fiscalía en la ciudad de Ibagué – Tolima, específicamente en el área del auditorio del segundo piso de dicha sede y muros adyacentes, de acuerdo al requerimiento efectuado por parte de la Supervisora de Apoyo de la Seccional Tolima, habiendo sido certificado por la servidora.

De otro lado se deja constancia que los trabajos entregados por parte del Contratista, quedan sujetos a la garantía de funcionamiento y estabilidad de obra, respecto de las cuales deberá hacerse seguimiento por parte de los supervisores de apoyo, para que se reporte oportunamente cualquier eventualidad o irregularidad en los trabajos y que no correspondan al deterioro normal de las intervenciones realizadas.

FIRMA RESPONSABLES					
 Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre		**Cedula**			
FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL		**79.414.034**			
Ciudad	MOCOA	**fecha**	16	12	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**Fredy Alirio Velásquez Abril**		16/12/2024
Revisó	**Hernán Torres Ávila**		16/12/2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901016695-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 33 D 23 107 SUR, Neiva, Huila, Colombia
Tel. 3125445187
Email. Leidyramirez276@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764070072446 válida desde 2024-05-02 hasta 2025-05-02 rango desde MLWE24 hasta MLWE100.

Cliente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE
NIT : 800187590
Dirección: CRA 10 Sur 4680, Ibagué, Tolima, Colombia, CP 730001
Teléfono: 608270802
Email: fredy.velasquez@fiscalia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : MLWE31
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:38:25-05:00
FECHA FIRMADO: 16/12/2024 15:38:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$203.714.535,00				0,00	$203.714.535,00
2	02	ADMINISTRACIÓN	WSD	1,00	$40.742.909,00				0,00	$40.742.909,00
3	03	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	$2.037.145,00				0,00	$2.037.145,00
4	03	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$10.185.727,00	IVA	19%	$1,935,288.00	0,00	$10.185.727,00

Notas:
#$29-01-01-L02;FGN-RCS-0089-2024;fredy.velasquez@fiscalia.gov.co#$

SON: (doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos quince mil seiscientos cuatro pesos)
CUFE: e6029dc847b07924ee302288046674c163ca419fec3d76ce1251e19ec67fa356d80dae927e7087c92679e0a795b17d1a

Subtotal:	$256.680.316,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.935.288,00
Total:	$258.615.604,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$10.185.727,00	19,00%	$1.935.288,00

Recibí x plataforma Siif
16/12/2024 04:30 p.m.

Firma Digital: uJhqezNcsal5z+klamTCqJkV1LEgQwBIBo73XvRJkg4OnjHE8eA6BFKrDJr2fqK/ gwk6vbLbv57srMij+G1A6Q+UvdgdGid/XuwKWUX8zup/tXeIMT 44750s8vLMOUJu HbChJfDc2i7cuCY16wnTFXvzZJsBOTqLmuPt9cGli1Jc2GNhgZhMTbIXMvUQ+BIU sBnDi4M9vMg2MVY5f6Yda+ph29SNugXQT4Z 7FvqzvY4SkJMWP+1M0KETiMMTu+/q 92SbFgF+MyoTpjkV6ocevQkuU/BZK+5nNhf2a7tVR59aq4daq6v1T2jGg6pWW6Xf XLBELxf1VYFZXeoAlEDl fw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Tolima certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$23.521.207,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Principal – El Papayo – Tolima – Adecuación Baños Usuarios Dirección: Dirección: Transversal 1ª sur No.47-02 Zona Industrial El Papayo
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	Sede Principal: ● Adecuación baños de usuarios sede principal Ibagué.

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiendo a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede Principal – Baños de Usuarios – Ibagué - Tolima, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Tolima
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**Nº DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nº DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 23.521.207,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE BAÑOS BUNKER

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE BAÑOS BUNKER										
1,56	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED	M2	1,00	$ 4.377	$ 4.377,00	44,64	$ 195.389,28			44,64	$ 195.389,28
1,60	DeESMONTE DE PUERTAS EN MADERA O METALICAS DE 0.60 a 1.00 M x H = 2.00 Incluye Marco	UN	1,00	$ 124.878	$ 124.878,00	2,00	$ 249.756,00			2,00	$ 249.756,00
1,33	DESMONTE DE SANITARIO	UN	1,00	$ 106.539	$ 106.539,00	2,00	$ 213.078,00			2,00	$ 213.078,00
1,34	DESMONTE DE LAVAMANOS	UN	1,00	$ 33.116	$ 33.116,00	2,00	$ 66.232,00			2,00	$ 66.232,00
1,17	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	M2	1,00	$ 13.915	$ 13.915,00	9,10	$ 126.626,50			9,10	$ 126.626,50
3,03	ELABORACION DE MURO EN LADRILLO TOLETE	M2	1,00	$ 63.792	$ 63.792,00	14,28	$ 910.949,76			14,28	$ 910.949,76
4,07	PAÑETE CON MORTERO IMPERBEABILIZADO 1:3	M2	1,00	$ 35.385	$ 35.385,00	28,56	$ 1.010.595,60			28,56	$ 1.010.595,60
5,06	SUMINISTRO E INSTALAICON DE CERAMICA EN MURO DE 30 X 60	M2	1,00	$ 78.780	$ 78.780,00	50,00	$ 3.939.000,00			50,00	$ 3.939.000,00
9,01	MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE INSTLACION	UN	1,00	$ 290.485	$ 290.485,00	2,00	$ 580.970,00			2,00	$ 580.970,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	1,00	$ 47.163	$ 47.163,00	6,00	$ 282.978,00			6,00	$ 282.978,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	1,00	$ 84.844	$ 84.844,00	2,00	$ 169.688,00			2,00	$ 169.688,00
9,29	ACOMETIDA EN PVC DE 1/2"	ML	1,00	$ 166.558	$ 166.558,00	6,00	$ 999.348,00			6,00	$ 999.348,00
11,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 6MM FLOTADO	M2	1,00	$ 288.020	$ 288.020,00	1,60	$ 460.832,00			1,60	$ 460.832,00
9,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 983.167	$ 983.167,00	2,00	$ 1.966.334,00			2,00	$ 1.966.334,00
9,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA COLOCAR SOBRE MESON GRANITO	UN	1,00	$ 333.147	$ 333.147,00	2,00	$ 666.294,00			2,00	$ 666.294,00
9,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL	UN	1,00	$ 583.435	$ 583.435,00	1,00	$ 583.435,00			1,00	$ 583.435,00
9,38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO CARACOL NEGRO PARA LAVAMANOS DE EMPOTRAR, INCLUYE SALPICADERO Y FALDON	UND	1,00	$ 556.465	$ 556.465,00	2,00	$ 1.112.930,00			2,00	$ 1.112.930,00
9,65	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE BARRA BAÑO DISCAPACITADOS	UN	1,00	$ 752.765,00	$ 752.765,00	2,00	$ 1.505.530,00			2,00	$ 1.505.530,00
9,41	DESMONTE DE GRIFERIA TIPO TANQUE PARA SANITARIO CONVENCIONAL INSTITUCIONAL	UN	1,00	$ 28.353	$ 28.353,00	2,00	$ 56.706,00			2,00	$ 56.706,00
13,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	1,00	$ 69.887	$ 69.887,00	20,00	$ 1.397.740,00			20,00	$ 1.397.740,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG, TUBO DE 1/2", TORNILLOS, REGATAS Y RESANES	UN	1,00	$ 105.480	$ 105.480,00	2,00	$ 210.960,00			2,00	$ 210.960,00
6,24	PUERTAS METALICAS EN LAMINA CR CAL 18, ANCHO DE 0,60 A 1,00M X 2,00 A 2,20M, INCLUYE MARCO METALICO Y BASE EN PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE	UN	1,00	$ 714.302	$ 714.302,00	2,00	$ 1.428.604,00			2,00	$ 1.428.604,00
10,22	INSTALACION DE LUMNARIA LED DIAMETRO MENOR A 60CM A UNA ALTURA HASTA 6M INCLUYE TORMILLOS, FIJACION Y RESANES, LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD EN SITIO	UN	1,00	$ 93.277	$ 93.277,00	2,00	$ 186.554,00			2,00	$ 186.554,00
13,25	ASEO GENERAL	M2	1,00	$ 4.148	$ 4.148,00	50,00	$ 207.400,00			50,00	$ 207.400,00
Sub total							$ 18.527.930,14				$ 18.527.930,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS									**0**		**$ 18.527.930,00**
A.I.U		26%			$ -				0		$ 4.817.262,00
ADMINISTRACION		20%			$ -				0		$ 3.705.586,00
IMPREVISTO		1%			$ -				0		$ 185.279,00
UTILIDAD		5%			$ -				0		$ 926.397,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -				0		$ 176.015,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**0**		**$ 23.521.207,00**
VALOR A PAGAR											**$ 23.521.207,00**

TOTAL A PAGAR SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Tolima
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL TOLIMA

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICACIÓN:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Tolima certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$17.107.932,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Principal – El Papayo – Tolima – URI Dirección: Dirección: Transversal 1ª sur No.47-02 Zona Industrial El Papayo
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	Sede Principal: ● Mantenimientos varios URI sede principal Ibagué.

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede Principal – URI – Ibagué - Tolima, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Tolima
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 17.107.932,00	0	
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE URI BUNKER

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE URI BUNKER										
6,30	PINTURA ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS DOS CARAS	M2	170,00	$ 31.319	$ 5.324.230,00	170,00	$ 5.324.230,00	$ -	$ -	170,00	$ 5.324.230,00
1,30	DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA ABIERTA	M2	15,00	$ 29.493	$ 442.395,00	15,00	$ 442.395,00	$ -	$ -	15,00	$ 442.395,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	320,40	$ 18.132	$ 5.809.492,80	320,40	$ 5.809.492,80	$ -	$ -	320,40	$ 5.809.492,80
Sub total							$ 11.576.117,80				$ 11.576.117,80
INC	PUERTA EN PERSIANA METALICA CALIBRE 20, MARCO EN CALIBRE 18 PINTADO COLOR GRIS	UND	1,00	$ 1.900.000	$ 1.900.000,00	1,00	$ 1.900.000,00	$ -	$ -	1,00	$ 1.900.000,00
Sub total							$ 1.900.000,00				$ 1.900.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS									**0**		**$ 13.476.118,00**
A.I.U		26%			$ -				0		$ 3.503.791,00
ADMINISTRACION		20%			$ -				0		$ 2.695.224,00
IMPREVISTO		1%			$ -				0		$ 134.761,00
UTILIDAD		5%			$ -				0		$ 673.806,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -				0		$ 128.023,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**0**		**$ 17.107.932,00**
VALOR A PAGAR											**$ 17.107.932,00**

TOTAL A PAGAR SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Tolima
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL TOLIMA

CERTIFICACIÓN:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Tolima certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$48.715.792,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Principal – El Papayo – Tolima – módulos de Descanso URI Dirección: Dirección: Transversal 1ª sur No.47-02 Zona Industrial El Papayo
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	Sede Principal: ● Adecuación módulos sede principal Ibagué.

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No. 5 – Sede Principal – Módulos de Descanso - URI – Ibagué - Tolima, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Tolima
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	O4 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	1	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 48.715.792,00	8,15%	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

SE PRINCIPAL - EL PAPAYO IBAGUE - TOLIMA

						OBRA EJECUTADA					
CONDICIONES ORIGINALES						**PRESENTE ACTA**		**ACTAS ANTERIORES**		**ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	DRYWALL EN MODULOS DE DESCANSO URI										
7,11	MURO EN DRY WALL DOBLE CARA DE .12 (INSONORISADO CON FRESCASA), INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, FILOS, DILATACIONES, INSTALACION DE TAPAS CONTRA VENTANAS	M2	318,94	$ 89.345	$ 28.495.694	318,94	$ 28.495.694	0,00	$ -	318,94	$ 28.495.694,30
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	23,46	$ 18.132	$ 425.377	23,46	$ 425.377	0,00	$ -	23,46	$ 425.376,72
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN CERAMICA DE CALIDAD SUPERIOR O SIMILAR AL PISO INSTALADO DE 10CMS DE ALTO	ML	21,36	$ 31.523	$ 673.331	21,36	$ 673.331	0,00	$ -	21,36	$ 673.331,28
6,27	PUERTAS METALICAS TIPO CELOSIA, ANCHO DE 0,60 A 1,00 M X H = 2,00 A 2,20 M, INCLUYE MARCO METALICO O EN MADERA Y CERRADURA	UND	4	$ 604.409	$ 2.417.636	4	$ 2.417.636	0,00	$ -	4	$ 2.417.636,00
10,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 12W INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	12	$ 168.363	$ 2.020.356	12	$ 2.020.356	0,00	$ -	12	$ 2.020.356,00
10,26	INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS POR AEREAS, INCLUYE DE TACO Y ACCESORIOS EN AREA INTERIORES DE OFICINAS	UN	4	$ 723.093	$ 2.892.372	4	$ 2.892.372	0,00	$ -	4	$ 2.892.372,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG, TUBO DE 1/2", TORNILLOS, REGATAS Y RESANES	UN	8	$ 105.480	$ 843.840	8	$ 843.840	0,00	$ -	8	$ 843.840,00
6,30	PINTURA ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS DOS CARAS	M2	8	$ 31.319	$ 250.552	8	$ 250.552	0,00	$ -	8	$ 250.552,00
13,25	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	35	$ 4.148	$ 145.180	35	$ 145.180	0,00	$ -	35	$ 145.180,00
13,26	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	3	$ 69.887	$ 209.661	3	$ 209.661	0,00	$ -	3	$ 209.661,00
Sub total DRYWALL EN MODULOS					**$ 38.373.999,30**		**$ 38.373.999,30**		**$ -**		**$ 38.373.999,30**
TOTAL COSTOS DIRECTOS									**$ -**		**$ 38.373.999,00**
A.I.U		26%							$ -		$ 9.977.240,00
ADMINISTRACION		20%							$ -		$ 7.674.800,00
IMPREVISTO		1%							$ -		$ 383.740,00
UTILIDAD		5%							$ -		$ 1.918.700,00
IVA Sobre Utilidad		19%							$ -		$ 364.553,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**$ -**		**$ 48.715.792,00**
VALOR A PAGAR									**0,00**		**$ 48.715.792,00**

TOTAL A PAGAR SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional
SUPERVISOR

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Tolima
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL TOLIMA

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICACIÓN:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Tolima certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$19.649.250,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Guamo – Tolima Dirección: CL 11 15 168 - KM 1 Via San Luis
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	Sede Guamo: ● Mantenimientos varios de la sede.

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No. 5 – Sede Guamo – Tolima, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Tolima
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 19.649.250,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE GUAMO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE GUAMO										
13,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA PVC TERMO ACUSTICA, INCLUYE FLANCHES (ARQUITECTONICA).	M2	95,00	$ 65.588	$ 6.230.860,00	95,00	$ 6.230.860,00			95,00	$ 6.230.860,00
13,08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA SOPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA	ML	60,00	$ 148.365	$ 8.901.900,00	60,00	$ 8.901.900,00			60,00	$ 8.901.900,00
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	4,25	$ 12.537	$ 53.282,00	4,25	$ 53.282,25			4,25	$ 53.282,25
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	4,25	$ 68.683	$ 291.903,00	4,25	$ 291.902,75			4,25	$ 291.902,75
Sub total							$ 15.477.945,00				$ 15.477.945,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS									**0**		**$ 15.477.945,00**
A.I.U		26%			$ -				0		$ 4.024.266,00
ADMINISTRACION		20%			$ -				0		$ 3.095.589,00
IMPREVISTO		1%			$ -				0		$ 154.779,00
UTILIDAD		5%			$ -				0		$ 773.897,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -				0		$ 147.040,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**0**		**$ 19.649.250,00**
VALOR A PAGAR											**$ 19.649.250,00**

TOTAL A PAGAR SON: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Tolima
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL TOLIMA

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICACIÓN:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Tolima certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$6.552.620,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Chaparral – Tolima Dirección: KR 7 7 03 ESQ - Chaparral
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	Sede Principal: ● Mantenimientos varios en la sede.

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No. 5 – Sede Chaparral – Tolima, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Tolima
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 6.552.620,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMIREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE CHAPARRAL

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE CHAPARRAL										
7,21	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON PINTURA ELASTICA SOBRE MEMBRANA, INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE FISURAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	1	$ 30.989	$ 30.989,00	18	$ 557.802			18,00	$ 557.802,00
8,16	SUMINISTRO E INTALACION DE DOMO POLICARBONATO DE 6MM, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION.	M2	1	$ 126.377	$ 126.377,00	18	$ 2.274.786			18,00	$ 2.274.786,00
8,14	DESMONTE DE CUBIERTA POLICARBONATO.	ML	1	$ 11.572	$ 11.572,00	18	$ 208.296			18,00	$ 208.296,00
6,28	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA, INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS DAÑADOS	UN	1	$ 23.078	$ 23.078,00	17	$ 392.326			17,00	$ 392.326,00
9,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECRO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 983.167	$ 983.167,00	1	$ 983.167			1,00	$ 983.167,00
5,08	INSTALACION Y RESANE DE PISO CON GRANITO PULIDO	ML	1	$ 76.626	$ 76.626,00	3	$ 229.878			3,00	$ 229.878,00
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA METALICA, CONSTRUIDA EN ANGULOS, INCLUYE TODO EL MATERIAL Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1	$ 399.213	$ 399.213,00	1,2	$ 479.056			1,20	$ 479.055,60
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	1	$ 18.132	$ 18.132,00	2	$ 36.264			2,00	$ 36.264,00
Sub total							$ 5.161.574,60				$ 5.161.574,60
TOTAL COSTOS DIRECTOS									**0**		**$ 5.161.575,00**
A.I.U		26%			$ -				0		$ 1.342.010,00
ADMINISTRACION		20%			$ -				0		$ 1.032.315,00
IMPREVISTO		1%			$ -				0		$ 51.616,00
UTILIDAD		5%			$ -				0		$ 258.079,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -				0		$ 49.035,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**0**		**$ 6.552.620,00**
VALOR A PAGAR											**$ 6.552.620,00**

TOTAL A PAGAR SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Tolima
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL TOLIMA

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Huila certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$45.719.860,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
R EPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Palacio de Justicia Neiva – Huila Dirección: Cra. 4 #6 - 99, Neiva, Huila
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimiento y adecuaciones varias áreas destinadas a Fiscalías

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede Palacio de Justicia Neiva – Huila, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Huila
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 45.719.860,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE PALACIO DE JUSTICIA NEIVA - HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	FISCALIA SEDE PALACIO DE JUSTICIA NEIVA										
5,10	Suministro e instalacion e instalacion de guardaescobas en ceramica de 0,80m	ML	1,00	$ 36.283,00	$ 36.283,00	32,62	$ 1.183.551,46			32,62	$ 1.183.551,46
5,23	Suministro e Instalacion de Lamina Sobre estructura Metalica, altura 4 mt, incluye tornilleria y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamineto.	M2	1,00	$ 198.722,00	$ 198.722,00	74,37	$ 14.778.955,14			74,37	$ 14.778.955,14
6,20	mueble bajo en madera formica	ML	1,00	$ 529.067,00	$ 529.067,00	5,33	$ 2.819.927,00			5,33	$ 2.819.927,00
6,33	suministro e instalacion de entrepaños	ML	1,00	$ 59.562,00	$ 59.562,00	5,33	$ 317.465,00			5,33	$ 317.465,00
6,25	Puertas en Madera, Ancho De 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metálico o en Madera y Cerradura	UND	1,00	$ 824.125,00	$ 824.125,00	4,00	$ 3.296.500,00			4,00	$ 3.296.500,00
7,07	Suministro e instalacion de cielo raso en dry - wall o pvc plano	M2	1,00	$ 68.683,00	$ 68.683,00	75,92	$ 5.214.413,00			75,92	$ 5.214.413,00
7,14	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	1,00	$ 18.132,00	$ 18.132,00	143,11	$ 2.594.871,00			143,11	$ 2.594.871,00
10,08	Suministro e instalacion de lampara LED	UND	1,00	$ 195.183,00	$ 195.183,00	19,00	$ 3.708.477,00			19,00	$ 3.708.477,00
10,25	Suministro de marco para panel led de sobreponer	UND	1,00	$ 68.353,00	$ 68.353,00	20,00	$ 1.367.060,00			20,00	$ 1.367.060,00
13,25	Aseo general del inmueble	M2	1,00	$ 4.148,00	$ 4.148,00	76,00	$ 315.248,00			76,00	$ 315.248,00
14,26	Retiro de escombro	UND	1,00	$ 104.400,00	$ 104.400,00	4,00	$ 417.600,00			4,00	$ 417.600,00
Sub total Preliminares											$ 36.014.067,60
TOTAL COSTOS DIRECTOS									**0**		**$ 36.014.068,00**
A.I.U		26%			$ -				0		$ 9.363.658,00
ADMINISTRACION		20%			$ -				0		$ 7.202.814,00
IMPREVISTO		1%			$ -				0		$ 360.141,00
UTILIDAD		5%			$ -				0		$ 1.800.703,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -				0		$ 342.134,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**0**		**$ 45.719.860,00**
VALOR A PAGAR											**$ 45.719.860,00**

TOTAL A PAGAR SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.LCONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Huila
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL HUILA

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Huila certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$5.028.567,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
R EPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede ALGECIRAS – Huila Dirección: KR 5 CL 6 ESQ Algeciras
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimiento y adecuaciones varias áreas destinadas a Fiscalías

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede Algeciras – Huila, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Huila
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**Nº DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nº DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 5.028.567,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE ALGECIRAS

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										
1,60	Desmonte de Puertas en Madera o Metálicas de 0.60 a 1.00 M x H = 2.00 Incluye Marco	UN	1,00	$ 124.878,00	$ 124.878,00	1	$ 124.878,00			1,00	$ 124.878,00
Sub total Pisos							**124.878**				**$ 124.878,00**
7	**IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS**										
7,14	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	1,00	$ 18.132,00	$ 18.132,00	66,96	$ 1.214.118,72			66,96	$ 1.214.119,00
7,15	Suministro y aplicación de impermeabilizante en muro interior mediante revestimiento elástico a base de polímeros e imprimación a base de resinas acrílicas incluye limpieza de muro y todos los elementos /materiales necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación.	M2	1,00	$ 10.264,00	$ 10.264,00	13,06	$ 134.047,84			13,06	$ 134.048,00
Sub total Pisos							**1.348.167**				**$ 1.348.167,00**
11	**PUERTA DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO**										
11,03	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$ 1.201.924,00	$ 1.201.924,00	1,88	$ 2.259.617,12			1,88	$ 2.259.617,00
Sub total Pisos							**2.259.617**				**$ 2.259.617,00**
13	**PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL**									**0,00**	**$ 0,00**
13,02	Pintura en esmalte sobre rejas metálicas dos caras	ML	1,00	$ 22.982,00	$ 22.982,00	5,00	$ 114.910,00			5,00	$ 114.910,00
13,25	Aseo general del inmueble	M2	1,00	$ 4.148,00	$ 4.148,00	27,36	$ 113.489,28			27,36	$ 113.489,28
Sub total Pisos							**228.399**				**$ 228.399,28**
TOTAL COSTOS DIRECTOS											**$ 3.961.061,00**
A.I.U		26%			$ -				0		$ 1.029.876,00
ADMINISTRACION		20%			$ -				0		$ 792.212,00
IMPREVISTO		1%			$ -				0		$ 39.611,00
UTILIDAD		5%			$ -				0		$ 198.053,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -				0		$ 37.630,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**0**		**$ 5.028.567,00**
VALOR A PAGAR											**$ 5.028.567,00**

TOTAL A PAGAR SON: CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.LCONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL HUILA

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Huila certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$27.237.673,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede GARZON – Huila Dirección: CL 8 A 9 47 ED Registraduría
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimiento y adecuaciones varias áreas destinadas a Fiscalías

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede Garzón – Huila (Edificio Registraduría), la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Huila
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 27.237.673,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE REGISTRADURIA GARZON

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	REPARACION BAÑO TERCER PISO										
1	**PRELIMINARES**										
1,01	Demolicion piso existente	M2	1,00	$ 9.968,00	$ 9.968,00	9,18	$ 91.506,00			9,18	$ 91.506,24
1,33	Desmonte de Sanitario	UN	1,00	$ 106.539,00	$ 106.539,00	2,00	$ 213.078,00			2,00	$ 213.078,00
1,56	Demolicion de enchape de pared	M2	1,00	$ 4.337,00	$ 4.337,00	0,84	$ 3.643,00			0,84	$ 3.643,08
1,60	Desmonte de Puertas en Madera o Metálicas de 0.60 a 1.00 M x H = 2.00 Incluye Marco	M2	1,00	$ 124.878,00	$ 124.878,00	3,00	$ 374.634,00			3,00	$ 374.634,00
Sub total Preliminares							**$ 682.861,00**				**$ 682.861,00**
5	**PISOS**						$ -				
5,01	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	M2	1,00	$ 30.972,00	$ 30.972,00	9,18	$ 284.323,00			9,18	$ 284.323,00
5,06	Suministro e instalacion de Ceramica en muro de 30 x 60 cm	M2	1,00	$ 78.780,00	$ 78.780,00	0,84	$ 66.175,20			0,84	$ 66.175,00
5,07	Suministro e instalacion de Ceramica piso de 50 X 50 cm	M2	1,00	$ 70.489,00	$ 70.489,00	9,18	$ 647.089,02			9,18	$ 647.089,00
Sub total Preliminares							**$ 997.587,00**				**$ 997.587,00**
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
9,26	Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación.	UND	1,00	$ 164.509,00	$ 164.509,00	3,00	$ 493.527,00			3,00	$ 493.527,00
9,39	Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa	UND	1,00	$ 63.224,00	$ 63.224,00	1,00	$ 63.224,00			1,00	$ 63.224,00
9,01	Montaje de aparatos sanitarios incluye instalacion	UND	1,00	$ 290.485,00	$ 290.485,00	2,00	$ 580.970,00			2,00	$ 580.970,00
9,24	Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas	UND	1,00	$ 26.069,00	$ 26.069,00	1,00	$ 26.069,00			1,00	$ 26.069,00
9,44	Suministro e instalación de griferia tipo tanque para sanitario convencional institucional, incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 82.639,00	$ 82.639,00	2,00	$ 165.278,00			2,00	$ 165.278,00
Sub total Preliminares							**$ 1.329.068,00**				**$ 1.329.068,00**
13	**PINTURAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL**										
13,25	Aseo general del inmueble	M2	1,00	$ 4.148,00	$ 4.148,00	9,18	$ 38.078,64			9,18	$ 38.079,00
13,26	Retiro de escombro	UN	1,00	$ 69.887,00	$ 69.887,00	2,00	$ 139.774,00			2,00	$ 139.774,00
Sub total Preliminares							**$ 177.852,64**				**$ 177.853,00**
SUBTOTAL REPARACION BAÑO TERCER PISO							**$ 3.187.368,64**				**$ 3.187.369,00**
	REPARACION BAÑO SEGUNDO PISO										
1	**PRELIMINARES**										
1,01	Demolición de piso existente.	M2	1,00	$ 9.968,00	$ 9.968,00	15,47	$ 154.204,96			15,47	$ 154.204,96
1,56	Demolicion de enchape de pared	M2	1,00	$ 4.337,00	$ 4.337,00	44,98	$ 195.078,26			44,98	$ 195.078,26
1,03	Desmonte de luminarias	UND	1,00	$ 9.209,00	$ 9.209,00	3,00	$ 27.627,00			3,00	$ 27.627,00
1,12	Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen.	M2	1,00	$ 12.537,00	$ 12.537,00	15,47	$ 193.947,39			15,47	$ 193.947,39
1,33	Desmonte de Sanitario	UN	1,00	$ 106.539,00	$ 106.539,00	3,00	$ 319.617,00			3,00	$ 319.617,00
1,34	Desmonte de lavamanos	UND	1,00	$ 33.116,00	$ 33.116,00	2,00	$ 66.232,00			2,00	$ 66.232,00
Sub total Preliminares							**$ 956.707,00**				**$ 956.707,00**
2	**CONCRETO**										
2,05	Construccion de placa	M2	1,00	$ 934.087,00	$ 934.087,00	1,33	$ 1.242.335,71			1,33	$ 1.242.336,00
Sub total concreto							**$ 1.242.336,00**				**$ 1.242.336,00**
3	**MAMPOSTERIA Y ACCESORIOS**										
3,02	Elaboracion de muro en bloque N° 4	M2	1,00	$ 40.776,00	$ 40.776,00	3,66	$ 149.240,16			3,66	$ 149.240,00
Sub total mamposteria							**$ 149.240,00**				**$ 149.240,00**
4	**PAÑETE Y ESTUCO**										
4,01	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	M2	1,00	$ 31.015,00	$ 31.015,00	46,64	$ 1.446.539,60			46,64	$ 1.446.540,00
Sub total pañete							**$ 1.446.540,00**				**$ 1.446.540,00**
5	**PISOS**										
5,01	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	M2	1,00	$ 30.972,00	$ 30.972,00	15,47	$ 479.136,84			15,47	$ 479.137,00
5,06	Suministro e instalacion de Ceramica en muro de 30 x 60 cm	M2	1,00	$ 78.780,00	$ 78.780,00	46,64	$ 3.674.299,20			46,64	$ 3.674.299,20
5,07	Suministro e instalacion de Ceramica piso de 50 X 50 cm	M2	1,00	$ 70.489,00	$ 70.489,00	15,47	$ 1.090.464,83			15,47	$ 1.090.464,83
5,32	Suministro e instalacion de win	ML	1,00	$ 9.341,00	$ 9.341,00	1,60	$ 14.945,60			1,60	$ 14.945,60
Sub total pisos							**$ 5.258.846,00**				**$ 5.258.847,00**
6	**CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA**										
6,14	Suministro e instalación de alfarjia en CLR CAL. 18, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ML	1,00	$ 56.581,00	$ 56.581,00	4,00	$ 226.324,00			4,00	$ 226.324,00
6,35	Adecuación y reinstalación de mesón en madera (incluye dos capas de laca, sellada e impermeabilización cambio de bisagras si es necesario)	UND	1,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	3,00	$ 313.194,00			3,00	$ 313.194,00
Sub total carpinteria metálica							**$ 539.518,00**				**$ 539.518,00**
7	**IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y ACABADOS**										
7,07	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano	M2	1,00	$ 68.683,00	$ 68.683,00	15,47	$ 1.062.526,01			15,47	$ 1.062.526,01

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 27.237.673,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE REGISTRADURIA GARZON

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
7,14	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	1,00	$ 18.132,00	$ 18.132,00	16,54	$ 299.903,28			16,54	$ 299.903,28
7,21	Impermeabilización de cubierta con pintura elastica sobre membrana, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento	ML	1,00	$ 30.989,00	$ 30.989,00	4,00	$ 123.956,00			4,00	$ 123.956,00
Sub total impermeabilizacion, pintura y acabados							**$ 1.486.385,00**				**$ 1.486.385,00**
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
9,06	Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1"	ML	1,00	$ 37.196,00	$ 37.196,00	6,80	$ 252.932,80			6,80	$ 252.932,80
9,03	Suministro e instalación Tuberia sanitaria PVC 2"	ML	1,00	$ 47.163,00	$ 47.163,00	6,70	$ 315.992,10			6,70	$ 315.992,10
9,16	Suministro e instalación Semicodos sanitarios 2"	UND	1,00	$ 8.951,00	$ 8.951,00	6,00	$ 53.706,00			6,00	$ 53.706,00
9,17	Suministro e instalación Tee sanitaria 2"	UND	1,00	$ 12.489,00	$ 12.489,00	3,00	$ 37.467,00			3,00	$ 37.467,00
9,18	Suministro e instalación Tee red hidraulica pvc de 1"	UND	1,00	$ 8.666,00	$ 8.666,00	3,00	$ 25.998,00			3,00	$ 25.998,00
9,20	Suministro e instalación Codo red hidraulica 1"	UND	1,00	$ 8.145,00	$ 8.145,00	3,00	$ 24.435,00			3,00	$ 24.435,00
9,24	Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas	UND	1,00	$ 26.069,00	$ 26.069,00	2,00	$ 52.138,00			2,00	$ 52.138,00
9,28	Acometida en pvc de 1"	ML	1,00	$ 179.762,00	$ 179.762,00	6,80	$ 1.222.381,60			6,80	$ 1.222.381,60
9,30	Punto de agua fria PVCP 1"	UND	1,00	$ 79.573,00	$ 79.573,00	3,00	$ 238.719,00			3,00	$ 238.719,00
9,36	Suministro e instalacion de lavamanos para colocar sobre meson en granito	UND	1,00	$ 333.147,00	$ 333.147,00	3,00	$ 999.441,00			3,00	$ 999.441,00
9,53	Suministro e instalacion de sanitario tipo Institucional, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 723.093,00	$ 723.093,00	3,00	$ 2.169.279,00			3,00	$ 2.169.279,00
Sub total instalaciones hidráulicas y sanitarias							**$ 5.392.490,00**				**$ 5.392.490,00**
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD**										
10,21	Instalación de luminaria LED 60x60 de sobreponer,	UND	1,00	$ 59.064,00	$ 59.064,00	3,00	$ 177.192,00			3,00	$ 177.192,00
10,25	Suministro de marco para panel led de sobreponer	UND	1,00	$ 68.353,00	$ 68.353,00	3,00	$ 205.059,00			3,00	$ 205.059,00
Sub total instalaciones electricas y conectividad							**$ 382.251,00**				**$ 382.251,00**
11	**PUERTAS Y DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO**										
11,12	cambio vidrios 4-5 mm ventaneria existente - cambio vidrios 6 mm vidrio templado	M2	1,00	$ 387.718,00	$ 387.718,00	1,02	$ 395.472,36			1,02	$ 395.472,36
Sub total instalaciones electricas							**$ 395.472,00**				**$ 395.472,00**
13	**PINTURAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL**										
13,01	Aseo general del inmueble	M2	1,00	$ 4.148,00	$ 4.148,00	15,47	$ 64.169,56			15,47	$ 64.170,00
13,02	Retiro de escombro	UN	1,00	$ 69.887,00	$ 69.887,00	4,00	$ 279.548,00			4,00	$ 279.548,00
13,03	Pintura de esmalte sobre lamina llena.	M2	1,00	$ 26.344,00	$ 26.344,00	6,00	$ 158.064,00			6,00	$ 158.064,00
13,21	Angeo con su marco en aluminio para evitar ingreso de abejas en baños y cocina	M2	1,00	$ 258.248,00	$ 258.248,00	2,00	$ 516.496,00			2,00	$ 516.496,00
Sub total pinturas y mantenimiento en general							**$ 1.018.278,00**				**$ 1.018.278,00**
SUBTOTAL REPARACION SEGUNDO PISO							**$ 18.268.063,00**		**$ -**		**$ 18.268.064,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS											**$ 21.455.433,00**
A.I.U		26%			$ -						$ 5.578.413,00
ADMINISTRACION		20%			$ -						$ 4.291.087,00
IMPREVISTO		1%			$ -						$ 214.554,00
UTILIDAD		5%			$ -						$ 1.072.772,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -						$ 203.827,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**						**$ 27.237.673,00**
VALOR A PAGAR											**$ 27.237.673,00**

TOTAL A PAGAR SON: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.LCONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL HUILA

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Huila certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$13.640.953,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede San Agustín – Huila Dirección: KR 12 CL 3 ESQ – SAN AGUSTIN
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimiento y adecuaciones varias áreas destinadas a Fiscalías

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede San Agustín – Huila, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Huila
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 13.640.953,00	0	
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE SAN AGUSTIN

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										
1,33	Desmonte de Sanitario	UN	1,00	$ 106.539,00	$ 106.539,00	1,00	$ 106.539,00			1,00	$ 106.539,00
1,34	Desmonte de lavamanos	M2	1,00	$ 33.116,00	$ 33.116,00	1,00	$ 33.116,00			1,00	$ 33.116,00
Sub total Preliminares							**139.655**				**$ 139.655,00**
4	**PAÑETE Y ESTUCO**										
4,06	estuco acrilico exterior sobre muros	M2	1,00	$ 13.736,00	$ 13.736,00	20,00	$ 274.720,00			20,00	$ 274.720,00
Sub total pañete y estuco							**274.720**				**$ 274.720,00**
7	**IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS**										
7,14	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	1,00	$ 18.132,00	$ 18.132,00	292,36	$ 5.301.071,52			292,36	$ 5.301.072,00
Sub total impermeabilización pintura y acabados							**5.301.072**				**$ 5.301.072,00**
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
9,36	Suministro e instalacion de lavamanos para colocar sobre meson en granito	UND	1,00	$ 333.147,00	$ 333.147,00	1,00	$ 333.147,00			1,00	$ 333.147,00
9,53	Suministro e instalacion de sanitario tipo Institucional, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 723.093,00	$ 723.093,00	1,00	$ 723.093,00			1,00	$ 723.093,00
Sub total instalaciones hidráulicas y sanitarias							**1.056.240**				**$ 1.056.240,00**
13	**PINTURA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL**										
13,01	Pintura en esmalte	M2	1,00	$ 22.580,00	$ 22.580,00	89,08	$ 2.011.426,40			89,08	$ 2.011.426,00
13,02	pintura en esmalte sobre rejas metalicas	ML	1,00	$ 22.982,00	$ 22.982,00	50,92	$ 1.170.243,44			50,92	$ 1.170.243,00
13,25	Aseo general del inmueble	M2	1,00	$ 4.148,00	$ 4.148,00	174,03	$ 721.895,11			174,03	$ 721.895,00
13,26	retiro de escombros	UND	1,00	$ 69.887,00	$ 69.887,00	1,00	$ 69.887,00			1,00	$ 69.887,00
Sub total pintura y mantenimiento general											**$ 3.973.451,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS									**0**		**$ 10.745.138,00**
A.I.U		26%			$ -				0		$ 2.793.736,00
ADMINISTRACION		20%			$ -				0		$ 2.149.028,00
IMPREVISTO		1%			$ -				0		$ 107.451,00
UTILIDAD		5%			$ -				0		$ 537.257,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -				0		$ 102.079,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**0**		**$ 13.640.953,00**
VALOR A PAGAR											**$ 13.640.953,00**

TOTAL A PAGAR SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.LCONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL HUILA

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá, certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$30.511.695,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Administrativa - Florencia - Caquetá Dirección: AV CV #5-14, Florencia - Caquetá
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimientos varios sede Adtva – Florencia

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede Administrativa - Florencia - Caquetá, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de Diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 30.511.695,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE ADMINISTRATIVA FLORENCIA - CAQUETA

							OBRA EJECUTADA					
		CONDICIONES ORIGINALES					PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**		**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE ADMINISTRATIVA CAQUETA											
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	4,00	$ 9.209	$ 36.836,00		4,00	$ 36.836,00			4,00	$ 36.836,00
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	4,00	$ 59.064	$ 236.256,00		4,00	$ 236.256,00			4,00	$ 236.256,00
10,25	SUMINISTRO DE MARCO PARA PANEL LED SOBREPONER	UND	2	$ 68.353	$ 136.706,00		2,00	$ 136.706,00			2,00	$ 136.706,00
	SUBTOTAL							**$ 409.798,00**				**$ 409.798,00**
	OFICINA HISTORIAS LABORALES											
1,04	DEMOLICION DE CIELO RASO EN ICOPOR	M2	31,10	$ 7.858	$ 244.383,80		31,10	$ 244.389,00			31,10	$ 244.389,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	72,04	$ 18.132	$ 1.306.229,28		72,04	$ 1.306.229,00			72,04	$ 1.306.229,00
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	37,52	$ 68.683	$ 2.577.302,10		37,52	$ 2.577.302,00			37,52	$ 2.577.302,00
	SUBTOTAL							**$ 4.127.920,00**				**$ 4.127.920,00**
	FACHADA PRINCIPAL LATERAL											
12,01	LIMPIEZA MECANICA PARA FACHADAS	M2	89,45	$ 9.921	$ 887.433,45		89,45	$ 887.433,00			89,45	$ 887.433,00
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	89,45	$ 20.330	$ 1.818.518,50		89,45	$ 1.818.519,00			89,45	$ 1.818.519,00
	SUBTOTAL							**$ 2.705.952,00**				**$ 2.705.952,00**
	OFICINAS SEGUNDO PISO											
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	534,61	$ 18.132	$ 9.693.550,33		534,61	$ 9.693.550,00			534,61	$ 9.693.550,00
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	7,11	$ 10.264	$ 72.925,72		7,11	$ 72.926,00			7,11	$ 72.926,00
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	155,73	$ 18.132	$ 2.823.643,78		155,73	$ 2.823.644,00			155,73	$ 2.823.644,00
13,12	INSTALCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, INLCUYE REFUERZO DE PLACA SOPORTE DEL TANQUE Y CONEXIONES HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 409.377	$ 409.377,00		1,00	$ 409.377,00			1,00	$ 409.377,00
INC	TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO EXTRAFUERTE CON LOGOS DE LA FISCALIA GENERAL	M2	6,62	$ 332.259	$ 2.199.553,92		6,62	$ 2.199.554,00			6,62	$ 2.199.554,00
	SUBTOTAL							**$ 15.199.051,00**				**$ 15.199.051,00**
	ESCALERAS 2 - 3 PISO SECTOR OFICINA BIENES											
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	62,88	$ 18.132	$ 1.140.098,00		62,88	$ 1.140.098,00			62,88	$ 1.140.098,00
	SUBTOTAL							**$ 1.140.098,00**				**$ 1.140.098,00**
	ESCALERAS 2 - 3 PISO SECTOR OFICINA BIENES											
13,01	PINTURA EN ESMALTE SOBRE BARANDAS	M2	20,00	$ 22.580	$ 451.600,00		20,00	$ 451.600,00			20,00	$ 451.600,00
	SUBTOTAL							$ 451.600,00				$ 451.600,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS										**0**		**$ 24.034.419,00**
A.I.U		26%			$ -					0		$ 6.248.949,00
ADMINISTRACION		20%			$ -					0		$ 4.806.884,00
IMPREVISTO		1%			$ -					0		$ 240.344,00
UTILIDAD		5%			$ -					0		$ 1.201.721,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -					0		$ 228.327,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**					**0**		**$ 30.511.695,00**
VALOR A PAGAR												**$ 30.511.695,00**

TOTAL A PAGAR SON: TREINTA MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Caquetá
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá, certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$1.500.549,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede UR - Florencia - Caquetá Dirección: CL 18 11 46/56 - Florencia - Caquetá
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Suministro e Instalación de gato hidráulico puerta de acceso

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede UR - Florencia - Caquetá, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de Diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**Nº DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nº DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 1.500.549,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE URI FLORENCIA - CAQUETA

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE URI FLORENCIA										
INC	BISAGRA HIDRAULICA PUERTA PRINCIPAL	UND	1,00	$ 1.182.000	$ 1.182.000,00	1,00	$ 1.182.000,00			1,00	$ 1.182.000,00
Sub total							$ 1.182.000,00				$ 1.182.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ 1.182.000,00**		**0**		**$ 1.182.000,00**
A.I.U		26%			$ -		$ 307.320,00		0		$ 307.320,00
ADMINISTRACION		20%			$ -		$ 236.400,00		0		$ 236.400,00
IMPREVISTO		1%			$ -		$ 11.820,00		0		$ 11.820,00
UTILIDAD		5%			$ -		$ 59.100,00		0		$ 59.100,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -		$ 11.229,00		0		$ 11.229,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**		**$ 1.500.549,00**		**0**		**$ 1.500.549,00**
VALOR A PAGAR							**$ 1.500.549,00**				**$ 1.500.549,00**

TOTAL A PAGAR SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Caquetá
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá, certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$6.794.820,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Patio Bruselas - Florencia - Caquetá Dirección: VI al Sena Vereda Venecia Florencia - Caquetá
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Adecuación portón de ingreso sede Patio Bruselas

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede Patio Bruselas - Florencia - Caquetá, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de Diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 6.794.820,00	0	
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE PATIO BRUSELAS - FLORENCIA - CAQUETA

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE PATIO BRUSELAS										
INC	SUMINISTRO DE PORTÓN METÁLICO MEDIDA DE 2 DE ALTO POR 5 M DE LARGO EN TUBO DE 2" GALVANIZADO CAL. 18, MARCOS EN ÁNGULO 1"X3/16", MALLA ESLABONADA ESCUADRÍA 2-1/4 X 2-1/4, PIVOTES EN TUBO PETROLERO DE 2", PINTURA ANTICORROSIVA	M2	10,30	$ 488.330	$ 5.029.799,00	10,30	$ 5.029.799,00			10,30	$ 5.029.799,00
2,02	ELABORACION DE COLUMNA EN CONCRETO ARMADO	M3	0,20	$ 1.344.110	$ 263.446,00	0,20	$ 263.446,00			0,20	$ 263.446,00
1,55	EXCAVACION MANUEL, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	0,78	$ 75.400	$ 59.114,00	0,78	$ 59.114,00			0,78	$ 59.114,00
Sub total											$ 5.352.359,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS									**0**		**$ 5.352.359,00**
A.I.U		26%			$ -				0		$ 1.391.613,00
ADMINISTRACION		20%			$ -				0		$ 1.070.472,00
IMPREVISTO		1%			$ -				0		$ 53.524,00
UTILIDAD		5%			$ -				0		$ 267.618,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -				0		$ 50.847,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**0**		**$ 6.794.820,00**
VALOR A PAGAR											**$ 6.794.820,00**

TOTAL A PAGAR SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Caquetá
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá, certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$5.528.709,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede PAUJIL - Caquetá Dirección: CL 5 A 4 28 Alcaldía Municipal Paujil - Caquetá
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimientos varios al inmueble

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede PAUJIL - Caquetá, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de Diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 5.528.709,00	0	
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE PAUJIL CAQUETA

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE PAUJIL										
1,60	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA O METALICAS DE 0,60 A 1.00 M X H =2,00 INCLUYE MARCO	UND	1	$ 124.878	$ 124.878,00	1,00	$ 124.878,00			1,00	$ 124.878,00
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA, INLCUYE MARCO, BISAGRAS, PINTURA CON UNA MANO DE ANTICRROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, ADEMAS DE TODO MATERIAL Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION.	M2	1	$ 569.807	$ 569.807,00	4,56	$ 2.597.180,31			4,56	$ 2.597.180,31
1,22	DEMOLICION DE VENTANA EXISTENTE	UND	1	$ 27.362	$ 27.362,00	1,00	$ 27.362,00			1,00	$ 27.362,00
10,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 12W INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1	$ 168.363	$ 168.363,00	2,00	$ 336.726,00			2,00	$ 336.726,00
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABLIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1	$ 30.989	$ 30.989,00	4,00	$ 123.956,00			4,00	$ 123.956,00
6,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR SENCILLA, ENTAMBORADA SENCILLA, BASTIDOR DE MADERA Y PANELES EN TABLERO CONTRACHAPADO, INCLUYE TODO MATERIAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1	$ 422.742	$ 422.742,00	2,19	$ 924.536,75			2,19	$ 924.536,75
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG, TUBO DE 1/2", TORNILLOS, REGATAS Y RESANES	UND	1	$ 105.480	$ 105.480,00	1,00	$ 105.480,00			1,00	$ 105.480,00
13,02	PINTURA EN ESMALTE SOBRE REJAS METALICAS DOS CARAS	ML	1	$ 22.982	$ 22.982,00	5,00	$ 114.910,00			5,00	$ 114.910,00
Sub total											$ 4.355.029,06
TOTAL COSTOS DIRECTOS									**0**		**$ 4.355.029,00**
A.I.U		26%			$ -				0		$ 1.132.308,00
ADMINISTRACION		20%			$ -				0		$ 871.006,00
IMPREVISTO		1%			$ -				0		$ 43.550,00
UTILIDAD		5%			$ -				0		$ 217.751,00
IVA Sobre Utilidad		19%			$ -				0		$ 41.373,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**				**0**		**$ 5.528.709,00**
VALOR A PAGAR											**$ 5.528.709,00**

TOTAL A PAGAR SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Caquetá
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá

CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá, certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.5, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	**$7.105.977,00**
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede DONCELLO - Caquetá Dirección: CL 3 3 11/15/19 Doncello - Caquetá
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	• Mantenimientos varios al inmueble

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiéndose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.5 – Sede DONCELLO - Caquetá, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de Diciembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA INICIAL**	04 DE JUNIO DE 2024	**N° DE ACTA**	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	**PLAZO INICIAL**	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 597.850.000,00	**FECHA FINAL**	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	**FECHA DEL PRESENTE ACTA**	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**AVANCE**	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 7.105.977,00	0	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ				
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL				

FISCALIA SEDE DONCELLO - CAQUETA

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/R UNIT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**V/R TOTAL**
	SEDE DONCELLO										
1,12	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	38,70	$ 12.537	$ 485.182,00	38,70	$ 485.182,00			38,70	$ 485.182,00
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	1,00	$ 9.209	$ 9.209,00	1,00	$ 9.209,00			1,00	$ 9.209,00
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABLIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	6,4	$ 30.989	$ 198.330,00	6,4	$ 198.330,00			6,4	$ 198.330,00
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	11,00	$ 68.683	$ 755.513,00	11,00	$ 755.513,00			11,00	$ 755.513,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	72,71	$ 18.132	$ 1.318.377,72	72,71	$ 1.318.378,00			72,71	$ 1.318.378,00
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	41,68	$ 10.264	$ 427.782,99	41,68	$ 427.783,00			41,68	$ 427.783,00
10,08	SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMAPARA LED, INCLUYE PERFORACION EN CIELO RASOO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCACHUETADO # 12 AWG HASTA RL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AEREA; ADEMAS DE CAJA METALICA GALVANIZAA HEXAGONAL; SUPLEMENTO ; TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG TUBO EMT DE 1/2", TONILLOS, REGATAS, RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 195.183	$ 195.183,00	1,00	$ 195.183,00			1,00	$ 195.183,00
10,25	SUMINISTRO DE MARCO PARA PANEL LED SOBREPONER	UND	1,00	$ 68.353	$ 68.353,00	1,00	$ 68.353,00			1,00	$ 68.353,00
13,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA PVC TERMO ACUSTICA, INCLUYE FLANCHES	ML	10,00	$ 65.588	$ 655.880,00	10,00	$ 655.880,00			10,00	$ 655.880,00
13,08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA SOPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA	ML	10,00	$ 148.365	$ 1.483.650,00	10,00	$ 1.483.650,00			10,00	$ 1.483.650,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS											**$ 5.597.461,00**
A.I.U		26%			$ -						$ 1.455.340,00
ADMINISTRACION		20%			$ -						$ 1.119.492,00
IMPREVISTO		1%			$ -						$ 55.975,00
UTILIDAD		5%			$ -						$ 279.873,00
IVA Sobre Utlidad		19%			$ -						$ 53.176,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 597.850.000**						**$ 7.105.977,00**
VALOR A PAGAR											**$ 7.105.977,00**

TOTAL A PAGAR SON: SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD
CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Caquetá
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

Neiva, 06 de Diciembre de 2024

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No FGN-RCS-0089-2024 “Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

Asunto: Autorización consignación cuenta bancaria

Por medio de la presente me permito AUTORIZAR el pago del ACTA PARCIAL No 5 del contrato de obra CONTRATO DE OBRA No FGN-RCS-0089-2024 cuyo objeto es “Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable. Se realice a la cuenta de ahorros N° 0483244596 del banco BBVA COLOMBIA, a nombre de MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S integrante del CONSORCIO MD.

Agradezco la atención prestada

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

DIEGO FERNANDO BUSTOS SANTANA
DING CONSTRUCCIONES LTDA
NIT 900.464.414-1

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD

Carrera 33D N° 23 - 107 Sur
Manzanares V etapa – celular 312 544 51 87
-mlwdisenosyconstruccionessas@gmail.com
Neiva – Huila

BBVA Net Cash


BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **MLW DISE OS Y CONSTRCCIONES SAS**, identificado(a) con NIT número **901.016.695-7** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0483244596** aperturada el **17 de abril del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **31 de Noviembre del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0483244596**
Cuenta de 16 dígitos:**0483000200244596**
Cuenta de 20 dígitos:**00130483000200244596**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.394.218, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO MD** identificada con NIT 901.830.566-6 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JENIFFER ANDREA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.400.204, y con Tarjeta Profesional No. 166279-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **CONSORCIO MD**, identificada con NIT 901.830.566-6 , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Neiva, 06 de diciembre de 2024

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.400.204 la Plata – Huila
Contador Público TP 166279-T

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.394.218 la Plata
R.L CONSORCIO MD

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.081.400.204**

RAMIREZ LOSADA

APELLIDOS

JENIFFER ANDREA

NOMBRES

Andrea Ramirez L.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUL-1988**

LA PLATA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-AGO-2006 LA PLATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1904900-00804236-F-1081400204-20160322 **0049**033246A 1 44908761

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

166279-T



JENIFFER ANDREA
RAMIREZ LOSADA
C.C. 1081400204
RESOLUCION INSCRIPCION 092 **FECHA 12/04/2012**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178255

JENIFFER ANDREA RAMIREZ L.

FIRMA DEL TITULAR

93452

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas. 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 E 4 C 4 0 C 0 1 9 7 1 6 F 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081400204 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 166279-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.016.695 – 7

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA, identificada con cedula de ciudadanía No 1.081.394.218, en mi condición de Representante Legal de **MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con NIT 901.016.695-7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JENIFFER ANDREA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.400.204, y con Tarjeta Profesional No. 166279-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** , identificada con NIT 901.016.695-7 , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Neiva, 06 de diciembre de 2024

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.400.204 la Plata – Huila
Contador Público TP 166279-T

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.394.218 la Plata
R.L MLW S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.081.400.204**

RAMIREZ LOSADA

APELLIDOS

JENIFFER ANDREA

NOMBRES

Andrea Ramirez L.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUL-1988**

LA PLATA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-AGO-2006 LA PLATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1904900-00804236-F-1081400204-20160322 **0049**033246A 1 44908761

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

166279-T



JENIFFER ANDREA
RAMIREZ LOSADA
C.C. 1081400204
RESOLUCION INSCRIPCION 092 **FECHA 12/04/2012**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178255

JENIFFER ANDREA RAMIREZ L.

FIRMA DEL TITULAR

93452

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas. 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 E 4 C 4 0 C 0 1 9 7 1 6 F 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081400204 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 166279-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DING Construcciones Ltda.
Ingenieria civil, Obra, Consultoria, Arquitectura


CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito CLAUDIA MIREYA MONTAÑA identificado con cédula de ciudadanía 36.345.135 y tarjeta profesional No112129 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de DING CONSTRUCCIONES LTDA identificada con NIT 900.464.414, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Neiva, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 06 días del mes de Diciembre de 2024, en Neiva

Se firma según el caso por:



CLAUDIA MIREYA MONTAÑA S
Cedula de ciudadanía N° 36.345.135
Contador Público
TP-112129-T
Contador



Firma Representante Legal _____
DIEGO FERNANDO BUSTOS SANTANA
C.C. No.12.280329 La Plata

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

112129-T



CLAUDIA MIREYA
MONTAÑA SANCENO
C.C. 36345135
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 2005/07/21
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 121902

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 32131

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 0 A 4 7 9 0 E B A 9 F B 8 8 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA MIREYA MONTAÑA SANCENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36345135 de CAMPOALEGRE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 112129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31848337
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO MD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	9018305666	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 33D 23 107	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	MLWDISENOSYCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125445187
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1081394218	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	LOSADA
PRIMER NOMBRE	LEIDY	SEGUNDO NOMBRE	LORENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
18		$8.276.672		31848337

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1110536254	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	ALVIS GOMEZ BRAIAN HERMINSUL	$1.300.000
CC-93375661	01	No	No	No	73	1	1131201	Fijo	BARRERO DEVIA WILLIAM	$1.300.000
CC-1007931555	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	BERNAL AGUILAR JUAN PABLO	$1.300.000
CC-14220302	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	CLAVIJO MODESTO HECTOR RAUL	$1.300.000
CC-14138523	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	COFLES GARZON WILSON	$1.300.000
CC-1007687752	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	CORONADO NARVAEZ BRIAN STIVEN	$1.300.000
CC-1118022015	01	No	No	No	18	256	1711001	Fijo	GUTIERREZ DELGADILLO YIMY	$1.300.000
CC-1117487366	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	JIMENEZ SUAREZ JERSON DANIEL	$1.300.000
CC-1006514397	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	JIMENEZ SUAREZ JHON ALEJANDRO	$1.300.000
CC-1006484377	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	MENDEZ PERDOMO BRAYAN	$1.300.000
CC-96332349	01	No	No	No	18	256	1711001	Fijo	PERDOMO GASCA LUIS ARCENIO	$1.300.000
CC-1006011069	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	REINA OSPINA JOSE ALEJANDRO	$1.300.000
CC-1117534607	01	No	No	No	18	1	5411201	Fijo	RIVERA TRUJILLO WILSON ANDRES	$1.300.000
CC-7685188	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	ROA GUTIERREZ LEONEL	$1.300.000
CC-83233371	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	TRUJILLO LOSADA ALVARO	$1.300.000
CC-1026558697	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	VARGAS PAREDES DANIEL	$1.300.000
CC-1118020480	01	No	No	No	18	256	1711001	Fijo	WALTERO MUÑOZ FRANKLIN	$1.300.000
CC-12132069	01	No	No	No	41	524	1711001	Fijo	YAÑEZ SOLANO JUAN CARLOS	$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1110536254																													0		
CC - 93375661																													0		
CC - 1007931555			X	2024-11-08																									0		
CC - 14220302			X	2024-11-03																									0		
CC - 14138523			X	2024-11-03																									0		
CC - 1007687752	X	2024-11-06																											0		
CC - 1118022015			X	2024-11-04																									0		
CC - 1117487366	X	2024-11-06																											0		
CC - 1006514397	X	2024-11-06	X	2024-11-07																									0		
CC - 1006484377	X	2024-11-27																											0		
CC - 96332349			X	2024-11-02																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1006011069			X	2024-11-04																									0		
CC - 1117534607			X	2024-11-02																									0		
CC - 7685188			X	2024-11-02																									0		
CC - 83233371			X	2024-11-02																									0		
CC - 1026558697																													0		
CC - 1118020480			X	2024-11-03																									0		
CC - 12132069			X	2024-11-12																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1110536254	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 93375661	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1007931555	PORVENIR	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0
CC - 14220302	COLPENSIONES	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 14138523	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1007687752	PROTECCION	25	$1.083.334	0.1600000	$173.400	$0	$0	$173.400	$0	$0	$0
CC - 1118022015	PORVENIR	4	$173.334	0.1600000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 1117487366	PORVENIR	25	$1.083.334	0.1600000	$173.400	$0	$0	$173.400	$0	$0	$0
CC - 1006514397	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1006484377	PORVENIR	4	$173.334	0.1600000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 96332349	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1006011069	PORVENIR	4	$173.334	0.1600000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 1117534607	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 7685188	PROTECCION	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 83233371	PROTECCION	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1026558697	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1118020480	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 12132069	PROTECCION	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1110536254	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 93375661	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 1007931555	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$346.667	0.1250000	$43.400	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	2	0.0696000	$24.200
CC - 14220302	EPS-S EMSSANAR	3	$130.000	0.1250000	$16.300	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.100
CC - 14138523	SALUD TOTAL	3	$130.000	0.1250000	$16.300	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.100
CC - 1007687752	SALUD TOTAL	25	$1.083.334	0.1250000	$135.500	$0	0	$0	0	$0	25	$1.083.334	2	0.0696000	$75.500
CC - 1118022015	ESSC ASMET SALUD	4	$173.334	0.1250000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	4	$173.334	1	0.0696000	$12.100
CC - 1117487366	ESSC ASMET SALUD	25	$1.083.334	0.1250000	$135.500	$0	0	$0	0	$0	25	$1.083.334	1	0.0696000	$75.500
CC - 1006514397	ESSC ASMET SALUD	2	$86.667	0.1250000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100
CC - 1006484377	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$173.334	0.1250000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	4	$173.334	1	0.0696000	$12.100
CC - 96332349	SANITAS	2	$86.667	0.1250000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100
CC - 1006011069	SALUD TOTAL	4	$173.334	0.1250000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	4	$173.334	2	0.0696000	$12.100
CC - 1117534607	SANITAS	2	$86.667	0.1250000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100
CC - 7685188	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.1250000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	3	0.0696000	$6.100
CC - 83233371	SANITAS	2	$86.667	0.1250000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	3	0.0696000	$6.100
CC - 1026558697	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1118020480	ESSC ASMET SALUD	3	$130.000	0.1250000	$16.300	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0696000	$9.100
CC - 12132069	SANITAS	12	$520.000	0.1250000	$65.000	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	3	0.0696000	$36.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1110536254	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93375661	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1007931555	COMFENALCO-TOLIMA	8	$346.667	0.0400000	$13.900	0.0200000	$7.000	0.0300000	$10.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14220302	COMFENALCO-TOLIMA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0200000	$2.600	0.0300000	$3.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14138523	COMFENALCO-TOLIMA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0200000	$2.600	0.0300000	$3.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007687752	COMFENALCO-TOLIMA	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	0.0200000	$21.700	0.0300000	$32.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118022015	COMFACA	4	$173.334	0.0400000	$7.000	0.0200000	$3.500	0.0300000	$5.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117487366	COMFACA	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	0.0200000	$21.700	0.0300000	$32.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006514397	COMFACA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0200000	$1.800	0.0300000	$2.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006484377	COMFACA	4	$173.334	0.0400000	$7.000	0.0200000	$3.500	0.0300000	$5.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-96332349	COMFACA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0200000	$1.800	0.0300000	$2.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006011069	COMFENALCO-TOLIMA	4	$173.334	0.0400000	$7.000	0.0200000	$3.500	0.0300000	$5.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117534607	COMFACA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0200000	$1.800	0.0300000	$2.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7685188	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0200000	$1.800	0.0300000	$2.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83233371	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0200000	$1.800	0.0300000	$2.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026558697	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118020480	COMFACA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0200000	$2.600	0.0300000	$3.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12132069	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0200000	$10.400	0.0300000	$15.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	11	$603.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$603.600
PROTECCION	5	$492.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$492.400
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
COLPENSIONES	1	$20.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$20.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$76.000	$0	0	$0	0	$0	$76.000	0	$0	$0	$76.000	$0	0	$0	$0	$76.000	$0	$0	$76.000
EPS-S EMSSANAR	1	$16.300	$0	0	$0	0	$0	$16.300	0	$0	$0	$16.300	$0	0	$0	$0	$16.300	$0	$0	$16.300
ESSC ASMET SALUD	4	$184.400	$0	0	$0	0	$0	$184.400	0	$0	$0	$184.400	$0	0	$0	$0	$184.400	$0	$0	$184.400
SALUD TOTAL	5	$498.500	$0	0	$0	0	$0	$498.500	0	$0	$0	$498.500	$0	0	$0	$0	$498.500	$0	$0	$498.500
SANITAS	5	$260.200	$0	0	$0	0	$0	$260.200	0	$0	$0	$260.200	$0	0	$0	$0	$260.200	$0	$0	$260.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	18	$577.000	0	$0	$0	$577.000	0	$0	$577.000	0	$0	$0	$577.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO-TOLIMA	7	$178.700	0	$0	$178.700
COMFACA	7	$73.100	0	$0	$73.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$79.800	0	$0	$79.800
SENA	18	$166.100	0	$0	$166.100
ICBF	18	$249.400	0	$0	$249.400
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.035.400

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	4	$1.324.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$577.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	$331.600
SENA	1	$166.100
ICBF	1	$249.400
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.684.300

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31758552
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MLW DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901016695	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 33D N 23 107 SUR	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	MLWDISENOSYCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125445187
FAX	3124451	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1081394218	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	LOSADA
PRIMER NOMBRE	LEIDY	SEGUNDO NOMBRE	LORENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$1.863.335		31758552

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075214722	01	No	No	No	41	1	3711001	Fijo	CACHAYA CHACUE FABIO ALEXANDER	$1.300.000
CC-1075220886	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CERQUERA ZAMORA WILLIAM ANTONIO	$1.300.000
CC-1081394218	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	RAMIREZ LOSADA LEIDY LORENA	$1.300.000
CC-31323401	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	ROMAN ARBOLEDA DENNY PATRICIA	$1.300.000
CC-7722736	01	No	No	No	41	1	3711001	Fijo	VARGAS MENDEZ EDILVER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075214722	X	2024-11-12	X	2024-11-15																									0		
CC - 1075220886	X	2024-11-12	X	2024-11-15																									0		
CC - 1081394218																													0		
CC - 31323401	X	2024-11-18	X	2024-11-19																									0		
CC - 7722736			X	2024-11-03																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075214722	PROTECCION	4	$173.334	0.1600000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 1075220886	COLFONDOS	4	$173.334	0.1600000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 1081394218	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 31323401	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 7722736	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075214722	SANITAS	4	$173.334	0.0400000	$7.000	$0	0	$0	0	$0	4	$173.334	1	0.0696000	$12.100
CC - 1075220886	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$173.334	0.0400000	$7.000	$0	0	$0	0	$0	4	$173.334	1	0.0696000	$12.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081394218	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5423901	0.0696000	$90.500
CC - 31323401	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	5423901	0.0696000	$6.100
CC - 7722736	SANITAS	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0696000	$9.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075214722	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$173.334	0.0400000	$7.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075220886	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$173.334	0.0400000	$7.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081394218	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-31323401	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7722736	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$27.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$27.800
COLFONDOS	1	$27.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$27.800
PORVENIR	3	$242.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$242.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$62.500	$0	0	$0	0	$0	$62.500	0	$0	$0	$62.500	$0	0	$0	$0	$62.500	$0	$0	$62.500
SANITAS	2	$12.200	$0	0	$0	0	$0	$12.200	0	$0	$0	$12.200	$0	0	$0	$0	$12.200	$0	$0	$12.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	$129.900	0	$0	$0	$129.900	0	$0	$129.900	0	$0	$0	$129.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$74.700	0	$0	$74.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$74.700
PENSIONES	3	$298.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$129.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$74.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$577.600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900464414	1	DING CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DING	CARRERA 9 No 10 -07 LOCAL 19	NEIVA-HUILA	8776461	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1131585233	9478972821	E	2024/12/04	2024/12/16	BANCOLOMBIA	12	$6,226,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DING (17 Afiliados)						$14,516,670	$2,323,000			$15,816,670	$633,000			$15,816,670	$633,000			$15,816,670	$1,101,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)						$14,516,670	$2,323,000			$15,816,670	$633,000			$15,816,670	$633,000			$15,816,670	$1,101,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (17 Afiliados)						$14,516,670	$2,323,000			$15,816,670	$633,000			$15,816,670	$633,000			$15,816,670	$1,101,500		$0	$0
1	CC	1003812036	ANGEL CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	83166587	BUENDIA ROLANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	11307521	CARRASCO FERNANDO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1004492840	CLAROS JOHAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
5	CC	1081729749	CUELLAR VICTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	8729572	DIAZ ROBINSON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1088272666	GARCIA JOSE	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
8	CC	1081397937	IRIRA GORDDY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1084901401	MAZABEL ELIECER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	1084898797	MAZABEL KRISTHIAN	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC24	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
11	CC	7703130	MOSQUERA GILDARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	1084869302	RIVEROS GIANCARLO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	1075274123	SANTIAGO CARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	1000940164	TORRES JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CE	6375027	TRICONIS MARCC	230301	1	$43,334	$7,000	MIN001	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
16	CC	1084896361	VALENIA SANTIAGO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
17	CC	1004492730	VELEZ JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GERENCIA DING (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$334,100		$0	$0
Centro de Trabajo: GERENCIA DING (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$334,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$334,100		$0	$0
18	CC	12280329	BUSTOS DIEGO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
19	CC	55130070	CASTRO MARLEN	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(19)**					$19,316,670	$3,091,000			$20,616,670	$825,000			$20,616,670	$825,000			$20,616,670	$1,435,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900464414	1	DING CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DING	CARRERA 9 No 10 -07 LOCAL 19	NEIVA-HUILA	8776461	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1131585233	9478972821	E	2024/12/04	2024/12/16	BANCOLOMBIA	12	$6,226,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,091,000	$25,000	$0	$3,116,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$2,400	$0	$290,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$624,000	$5,000	$0	$629,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,491,000	$12,000	$0	$1,503,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$688,000	$5,600	$0	$693,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,435,600	$11,500	$0	$1,447,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$1,435,600	$11,500	$0	$1,447,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$825,000	$6,600	$0	$831,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	$825,000	$6,600	$0	$831,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$825,000	$7,000	$0	$832,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$104,000	$900	$0	$104,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$53,800	$500	$0	$54,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$1,800	$100	$0	$1,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$156,000	$1,300	$0	$157,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$53,800	$500	$0	$54,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$455,600	$3,700	$0	$459,300
TOTAL				19	$6,176,600	$50,100	$0	$6,226,700

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141047376800

(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 0 5 6 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO MD

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 D 23 107 SUR BRR MANZANARES ET 5

42. Correo electrónico mlwdisenosyconstruccionessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 4 4 5 1 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 4 0 4 1 0	4 3 3 0	2 0 2 4 0 4 1 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	1 6	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 19 / 10 : 51: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047376800

(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 0 5 6 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 4 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 4 1 0	
81. Hasta	2 0 4 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047376800

(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 0 5 6 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 1 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 1 3 9 4 2 1 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RAMIREZ	LOSADA	LEIDY	LORENA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 1 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 2 8 0 3 2 9		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
BUSTOS	SANTANA	DIEGO	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047376800

(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 0 5 6 6	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 1 6 6 9 5	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
478,280,000	8 0	2 0 2 4 0 4 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 6 4 4 1 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DING CONSTRUCCIONES LTDA.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
119,570,000	2 0	2 0 2 4 0 4 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14998006029

(415)7707212489984(8020) 000001499800602 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 6 9 5	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Nátaga 4 8 3

41. Dirección principal
CR 33 D 23 107 SUR

42. Correo electrónico mlwsas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 4 4 5 1 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 1 0 0 7	4 2 2 0	2 0 1 6 1 0 0 7		7 1 1 2	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 18 / 22 : 13: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ LOSADA LEIDY LORENA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14998006029

(415)7707212489984(8020) **000001499800602 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 6 9 5	7	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 6 1 0 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 0 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 8 8 0 4 4	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 1 0 0 4	
81. Hasta	2 0 2 6 1 0 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 3 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14998006029

(415)7707212489984(8020) **000001499800602 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 1 6 6 9 5	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 0 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 1 3 9 4 2 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	LOSADA	LEIDY	LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 3 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 5 2 2 0 8 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CERQUERA	ZAMORA	WILLIAM	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14953360777

(415)7707212489984(8020) 000001495336077 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 4 4 1 4	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DING CONSTRUCCIONES LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Nátaga 4 8 3

41. Dirección principal
CL 1 SUR 4 67

42. Correo electrónico dfbustos@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 0 9 6 8 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 1 0 8 0 5	4 2 1 0	2 0 1 1 0 8 0 5	4 2 2 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 03 / 13 : 56: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUSTOS SANTANA DIEGO FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHangonzal	ANGY NEILYN GONZALEZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-L02	FISCALIA TOLIMA - IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-16-11:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11024 de fecha 2024-03-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	318724	**Fecha Registro:**	2024-05-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	597.850.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	597.850.000,00	**Saldo x Obligar:**	597.850.000,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	901016695	**Razón Social:**	MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901830566	**Razón Social:**	CONSORCIO MD		

CUENTA BANCARIA

Número:	0483000200244596	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	2235304	**Nombre:**	WILLER MARIO LEYTON BERNAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR (E)

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	FGN-RCS-0089-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		19.350.000,00	0,00		
					Total:	19.350.000,00	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		578.500.000,00	0,00		
					Total:	578.500.000,00	0,00	578.500.000,00	578.500.000,00

Objeto:	A-02-02-01-003-007-01-A-02-02-02-005-004-01-2 CONTRATO FGN-RCS-0089-2024 CONTRATAR LAS ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA SIN REAJUSTE), PARA LOS BIEN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L02	FISCALIA IBAGUE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	597.850.000,00	597.850.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

INFORME DE OBRA ACTA PARCIAL No 5

CONTRATO DE OBRA No **CO1.SLCNTR.12793118** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO MD**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $597.850.000,00**
OBJETO: Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.	**PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el 07 de diciembre de 2024

GARANTIAS CONTRACTUALES:

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
N° POLIZA	560-47-994000178635		
FECHA DE EXPEDICION	8/05/2024		
CUMPLIMIENTO			
	VIGENCIA		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
cumplimiento de contrato	8/05/2024	5/06/2025	179355000
pago de salarios	8/05/2024	5/12/2027	29892500
estabilidad de la obra	5 años apartir acta recibo final		179355000
calidad del servicio	8/05/2024	05/06/025	179355000

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
N° POLIZA	560-74-994000032567		
FECHA DE EXPEDICION	8/05/2024		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
	VIGENCIA		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
Contratistas y subcontratistas	8/05/2024	30/11/2024	260000000
RCE patronal	8/05/2024	30/11/2024	260000000
vehiculos propios y no propios	8/05/2024	30/11/2024	260000000

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
N° POLIZA	560-47-994000178635		
FECHA DE EXPEDICION:	27/11/2024		
CUMPLIMIENTO			
	VIGENCIA		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento	8/05/2024	12/05/2025	$ 179.355.000
pagos de salarios	8/05/2024	13/12/2027	$ 29.892.500
estabilidad de la obra	5 años a partir del recibo final		$ 179.355.000
calidad del servicio	8/05/2024	12/06/2025	$ 179.355.000

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
N° POLIZA	560-47-994000032567		
FECHA DE EXPEDICION:	27/11/2024		
RESPONSABILIDAD CIVIL			
	VIGENCIA		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
predios laborales y operacionales	30/11/2024	7/12/2024	$ 260.000.000
contratistas y subcontrat	30/11/2024	7/12/2024	$ 260.000.000
RCE patronal	30/11/2024	7/12/2024	$ 260.000.000
vehiculos propios y no pr	5 años a partir del recibo final		$ 260.000.000

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

FECHA DE ACTA DE INICIO:	**04 de junio de 204**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**30 de noviembre de 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL	**07 De diciembre de 2024**

ACTIVIDADES REALIZADAS


SEDES HUILA


- **SEDE FISCALIA PALACIO DE JUSTICIA NEIVA**

Se llevo a cabo la adecuación de la oficina 803 del palacio de justica

REGISTRO FOTOGRAFICO

- ✓ Instalacion de guardaescoba

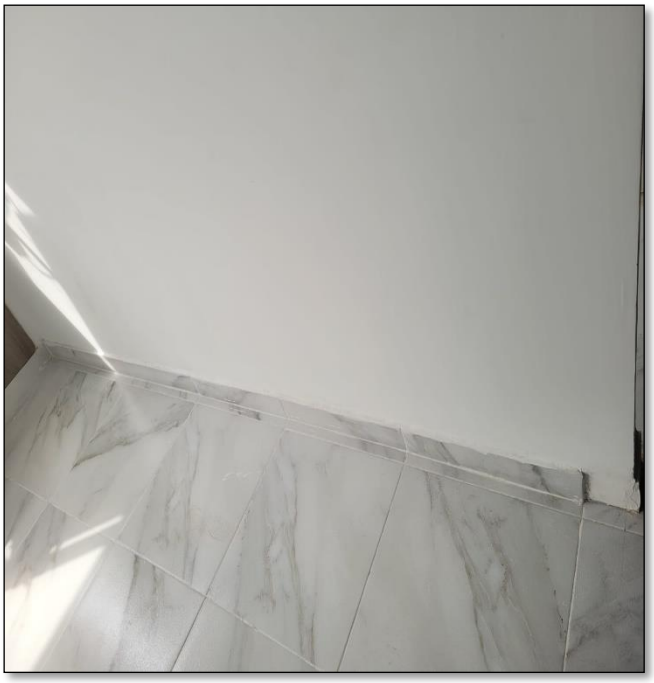

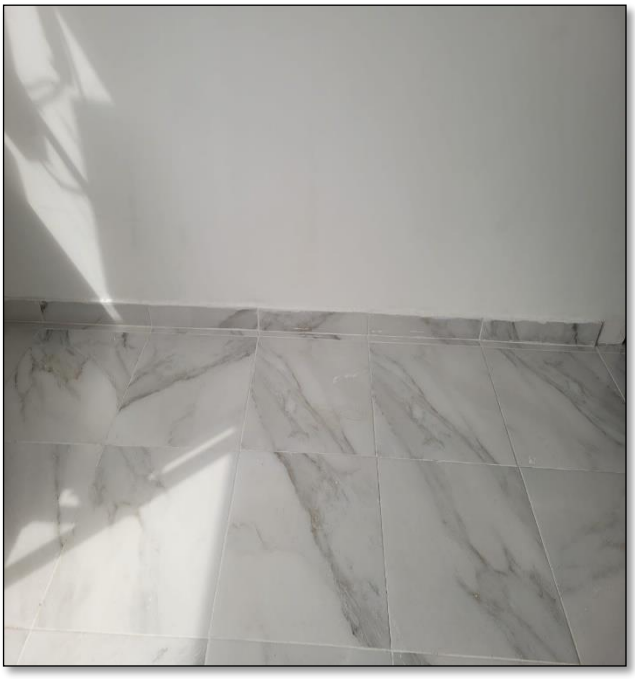

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

- ✓ Construccion de muros divisorios









CONSORCIO MD


R.L Leidy Lorena Ramirez

- ✓ Instalacion de mueble y entrepaños







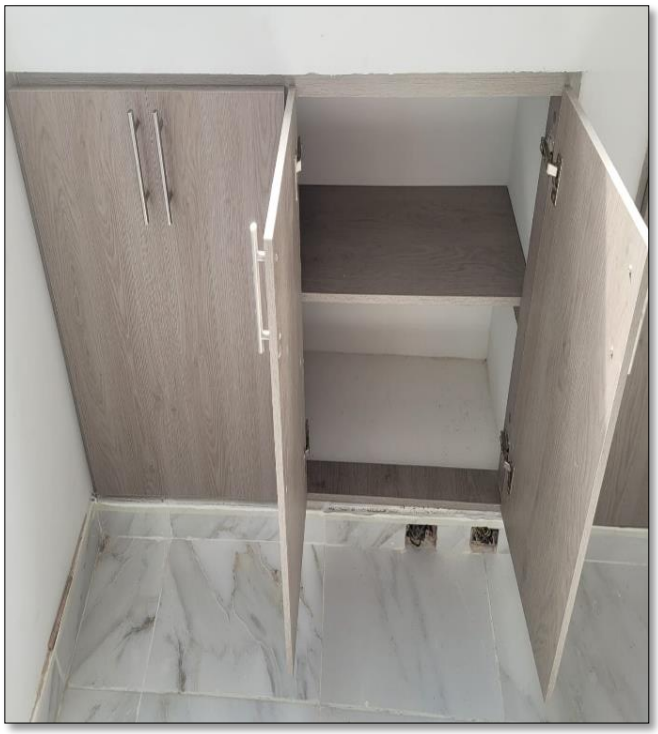

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

- ✓ Suministro e instaalcion de puertas







CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

- ✓ Suministro e instalacion de cielo raso en pvc






- ✓ Pintura sobre muros





CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



- ✓ Suministro e instalacion de lamparas led de 60*60 con sus respectivos marcos











CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

- ✓ Aseo general del inmueble y retiro de escombros

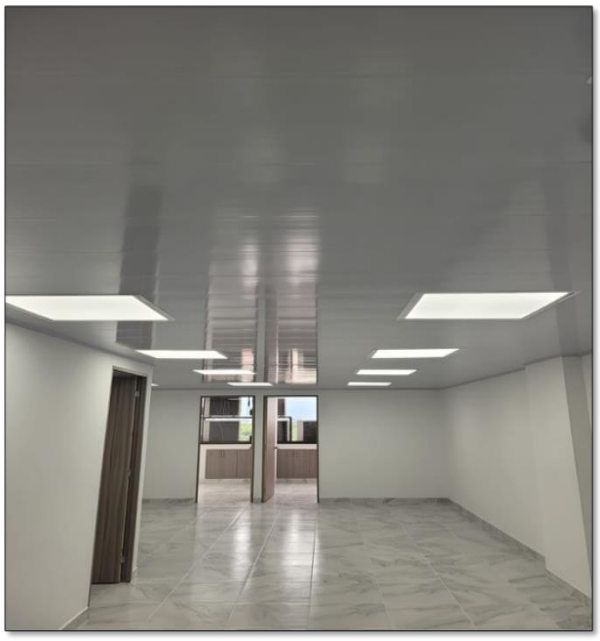



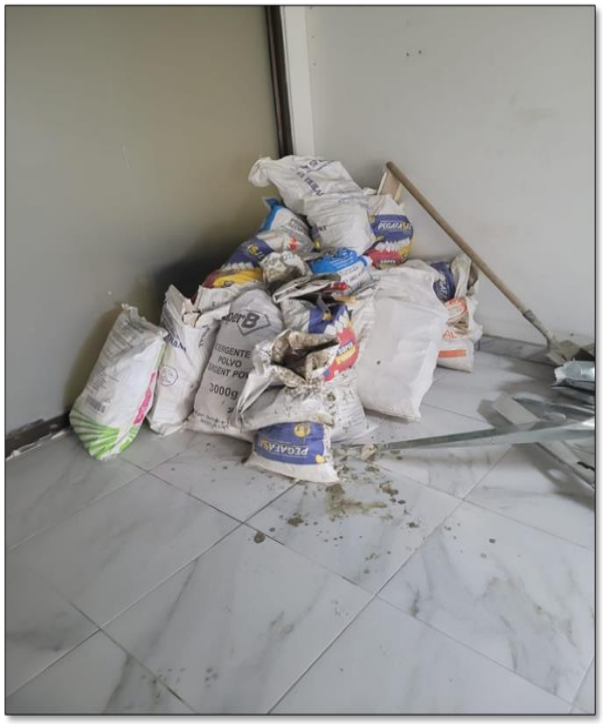



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

- **SEDE FISCALIA SAN AGUSTIN**

Se realizo el cambio de sanitario y lavamos de la sede y pintura general interior y fachada









CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez









CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez













CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez














CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



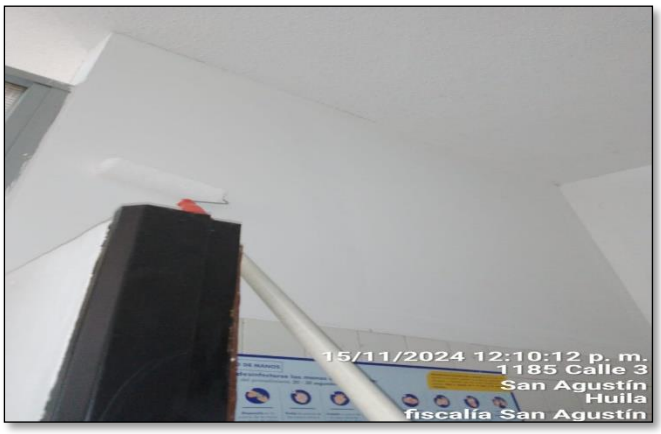









CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez













CONSORCIO MD


R.L Leidy Lorena Ramirez





SEDE ALGECIRAS

en la sede de algeciras se realizo cambio de puerta de vidrio, pintura general interior y pintura de ventana fachada.

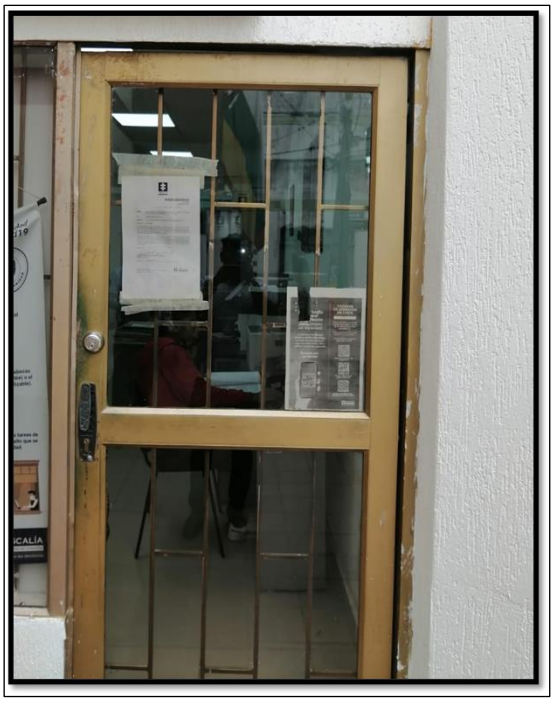



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez









CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

SEDE FISCALIA GARZON

De acuerdo a los requerimientos de esta sede, se llevo a cabo la reparacion de gotera originada en el segundo piso del edificio de la procuraduria y que afectaba directamente los baños del segundo piso correspondiente a baños oficina CTI, de acuerdo al informe tecnico presentado el 21 de octube de 2024. Adjutno registro fotografico.

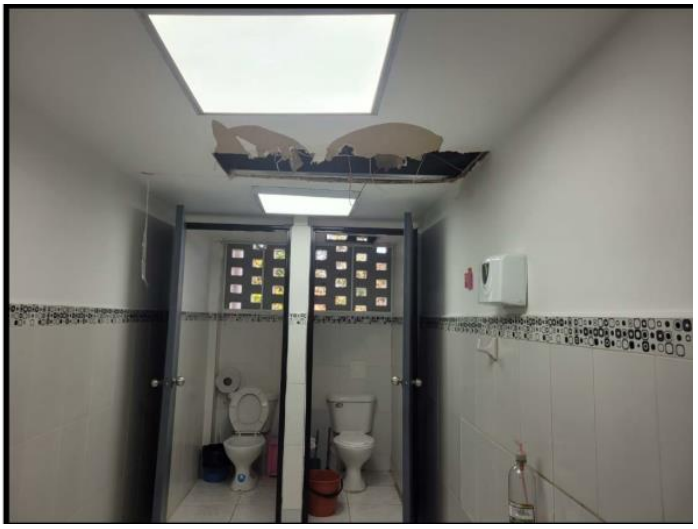



En esta sede se llevo a cabo la reparacion de la gotera y las adecuaciones de los baños del segundo piso y para ello se llevaron a cabo las siguientes actividades

REPARACION HUMEDAD BAÑOS PROCURADURIA

Se realizo el cambio de tuberia hidraulica y sanitaria de los puntos exisntes como lo es del de los sanitarios y los lavamanos, para realizar las respectuvas reparaciones a las fugas de agua que generaban en humedad en la placa del segundo piso afectando a los baños del CTI.

Luego de la reparacion de esta humedad, se realizaron las adecuaciones y mejoras a los mismo, para dejarlos en optimas condiciones y funcionales.

Para las adecuaciones se llevo a cabo el alistado de piso, desmonte y reinstalacion de puertas, instalacion de piso ceramica, instalacion de enchape de pared, desmonte e instalacion de sanitarios existente, cambio de griferia de los mismos, retiro de escombros y aseo de los baños.

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

REGISTRO FOTOGRAFICO

- ✓ Demolicion de piso existente





- ✓ Desmonte de sanitarios





- ✓ Demolicion enchape de pared: esta actividad se realizo ebajo de los lavamanos existentes, para realizar el cambio de tuberia existente a pvc.

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez












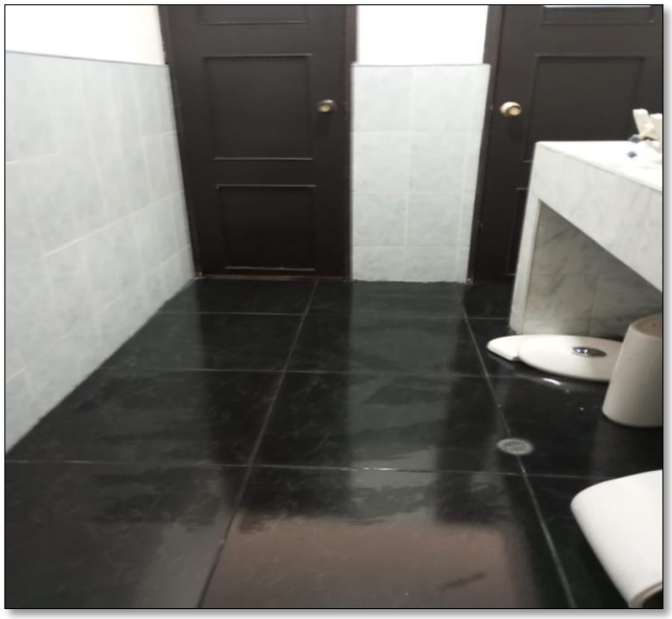

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

SEDES BAÑOS CTI – SEGUNDO PISO

Demolicion de pisos, enchape de pared,




Desmonte de sanitarios. Lavamanos




Alistado de piso




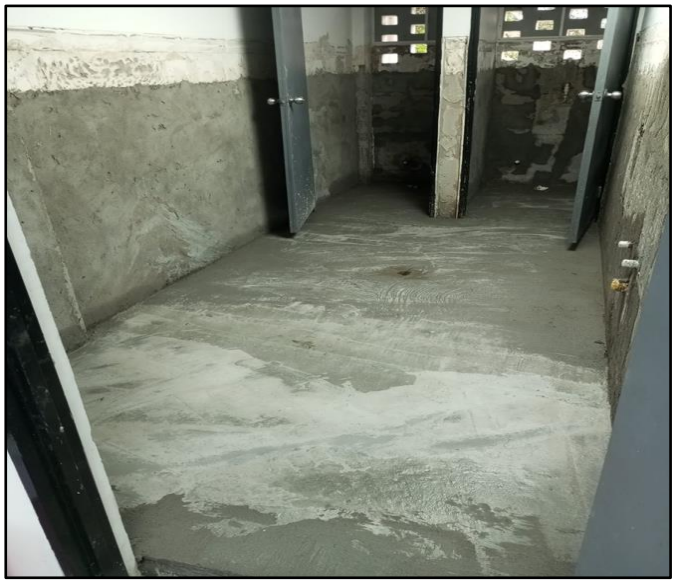

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

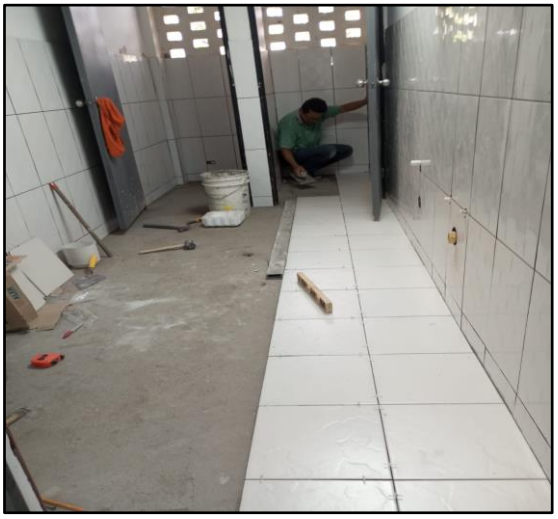

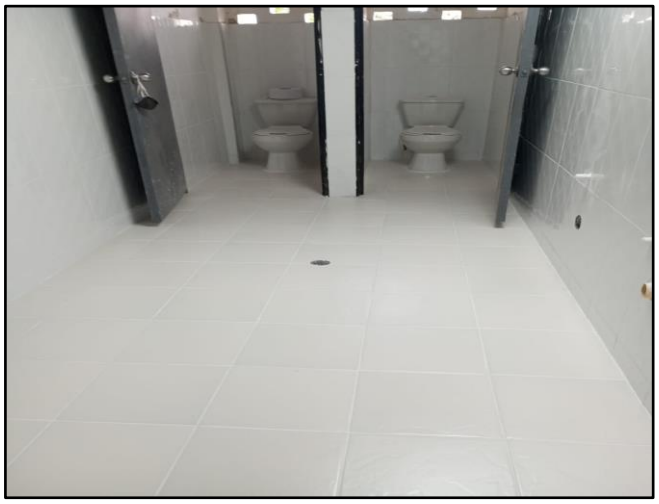

Instalacion de ceramica piso y sanitarios





Construccion de placa y instalacionde lavamanos





CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Retiro de escombros



malla angeo



Pintura de puertas



alfajica cubierta

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

SEDES TOLIMA

SEDE BUNKER FISCALIA

MODULOS: Se llevo a cabo la construccion de modulos de descanso en el bunker de la fiscalia, con sus respectivas instalciones electricas, puertas y listos para uso.










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez








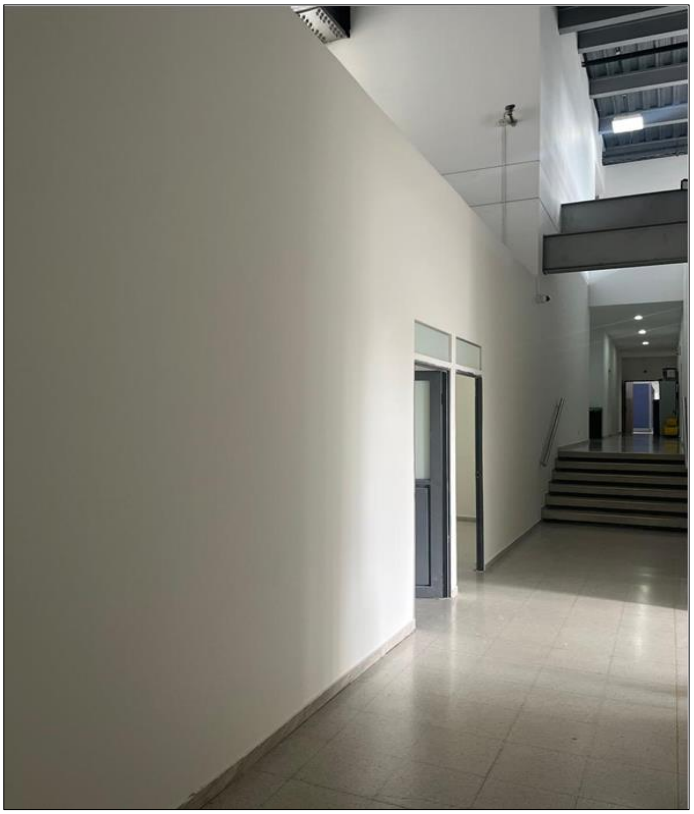


CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



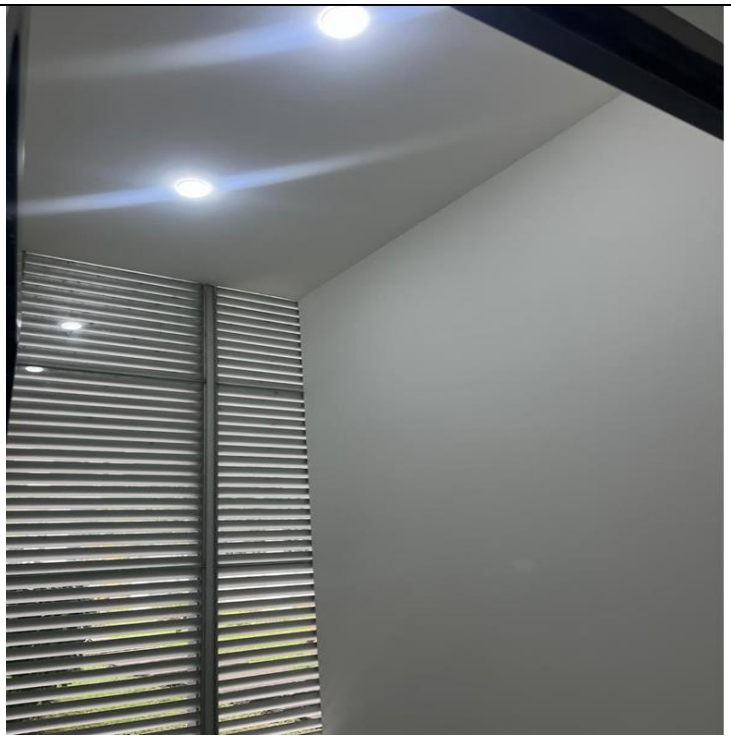


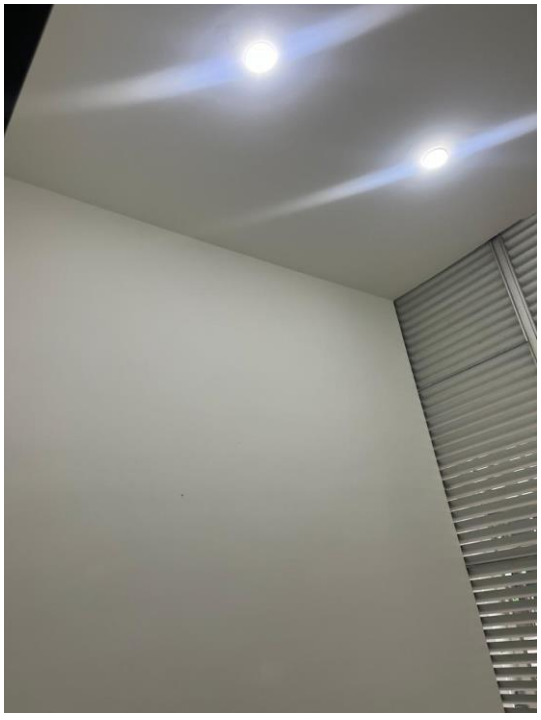




CONSORCIO MD


R.L Leidy Lorena Ramirez

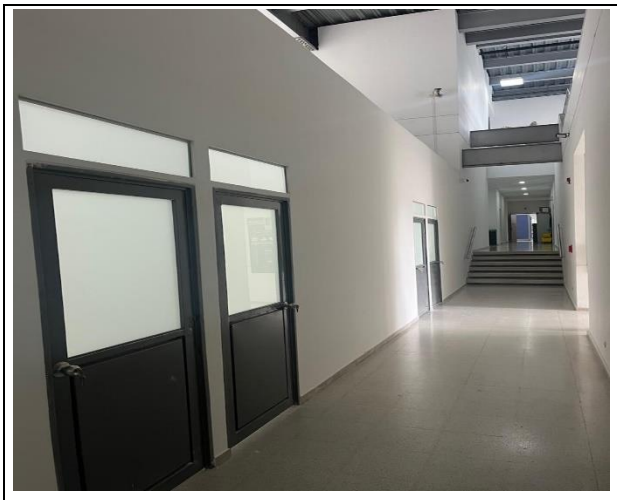



BAÑOS BUNKER IBAGUE: en esta area se llevo a cabo la adecuacion de los baños de usuarios, los cuales consisito en la pliacion de los mismos, cambio de sanitarios y lavamanos y adecuacion de barras para discapacitados.

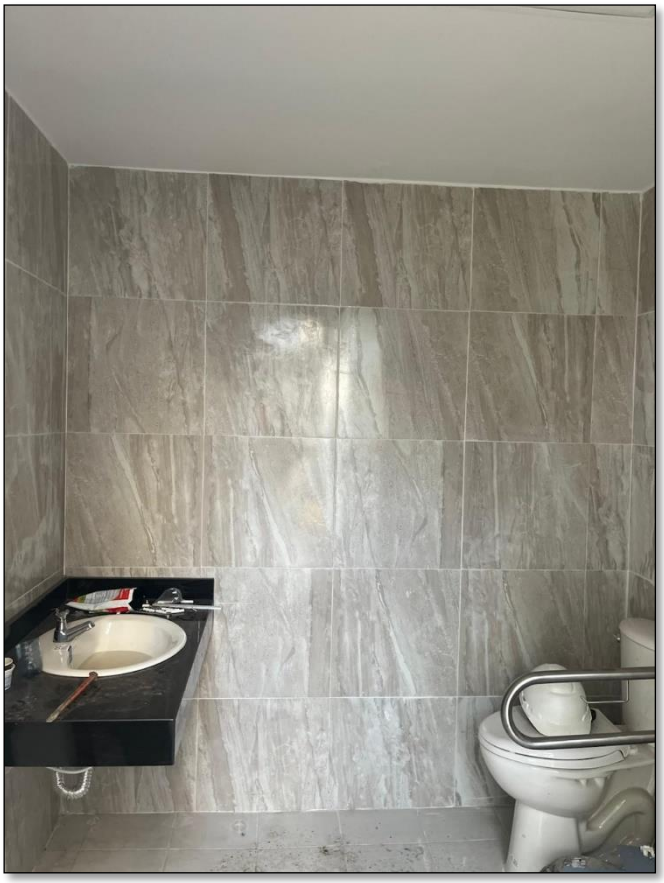


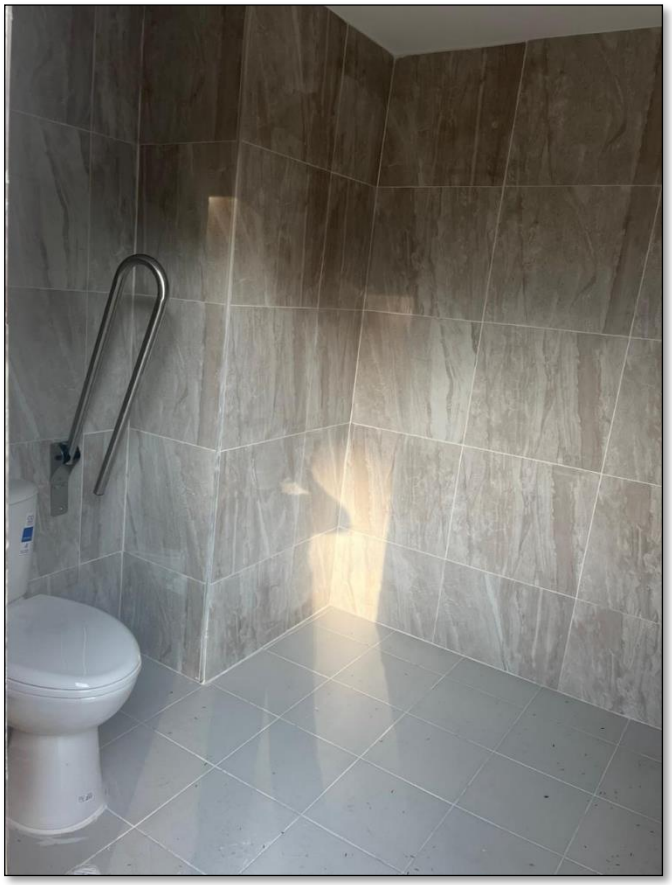

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



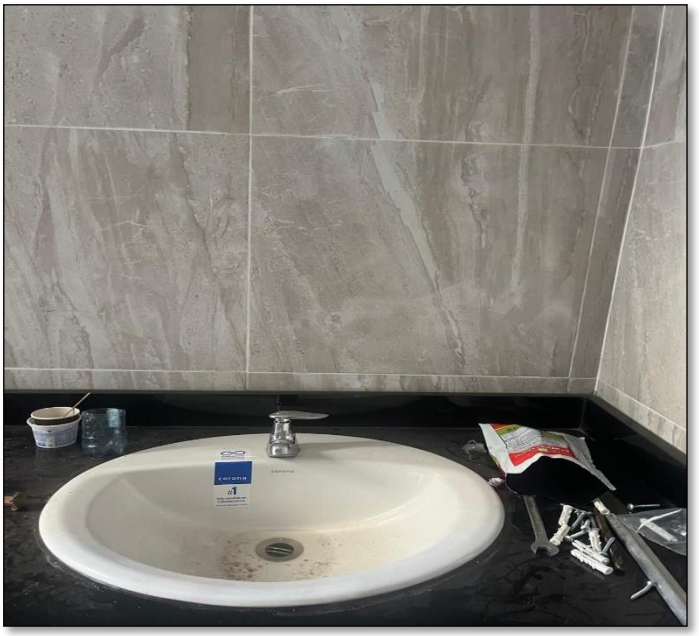





SEDE URI BUNKER IBAGUE: se continuo con la pintura del primer y segundo piso incluido escales y modulos

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez





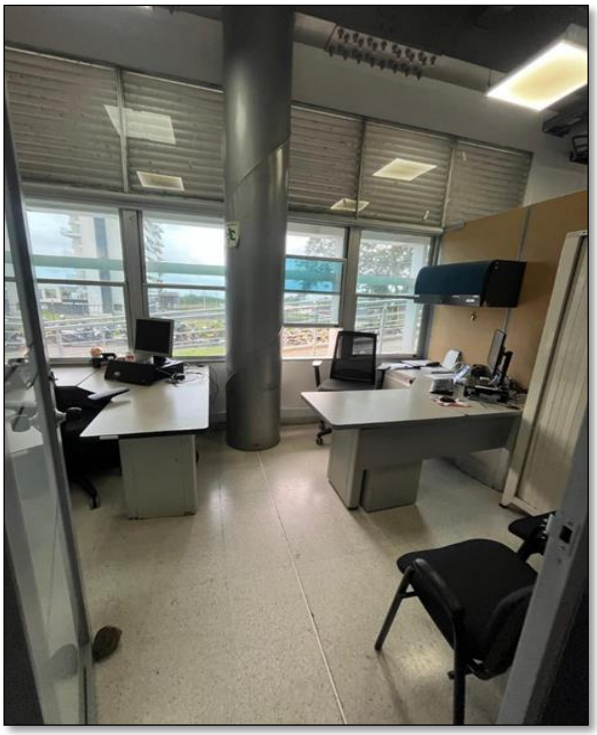




CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



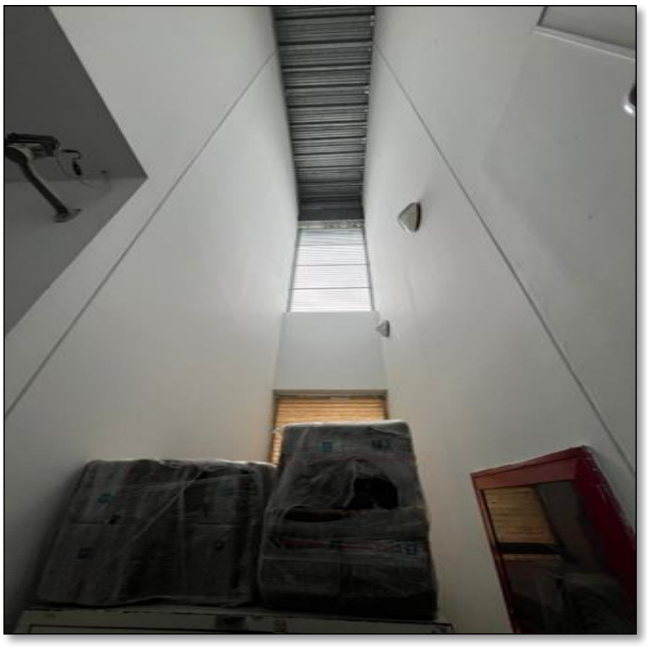



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

SEDE CHAPARRAL: se llevo realizo la impermeabilizacion de cubierta, cambio de teja en policarbonato que se enconraba en mal estado, cambio de sanitario.










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



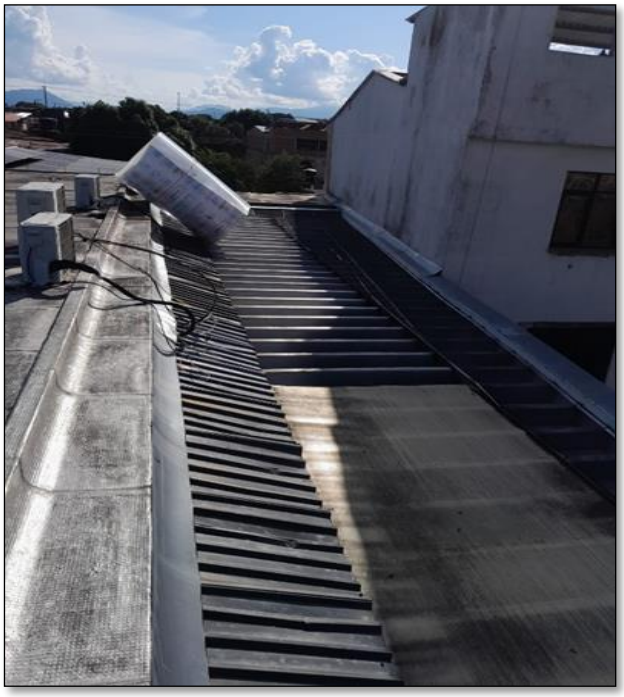





CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez







CONSORCIO MD


R.L Leidy Lorena Ramirez

SEDE GUAMO:







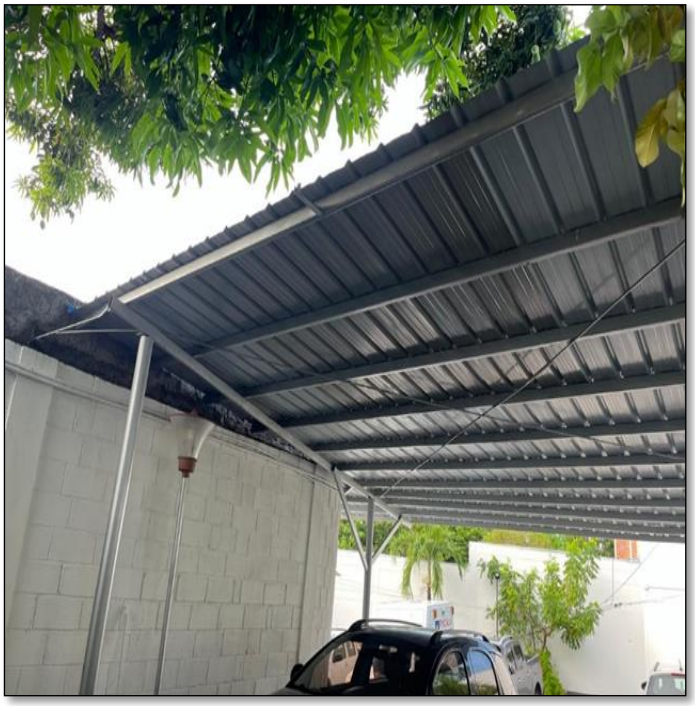

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez









CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez









SEDES CAQUETA

URI FLORENCIA: se realizo el suministro e instalacion de gato hidruilico



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

SEDE ADMINISTRATIVA CAQUETA: en esta sede se realizo las adecuaciones de las oficinas, las cuales incluyo pintura, impermeabilizacion de fachada, cambio de cielo raso, cambio de lamparas, puntura de pasamanos en escaleras.











CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



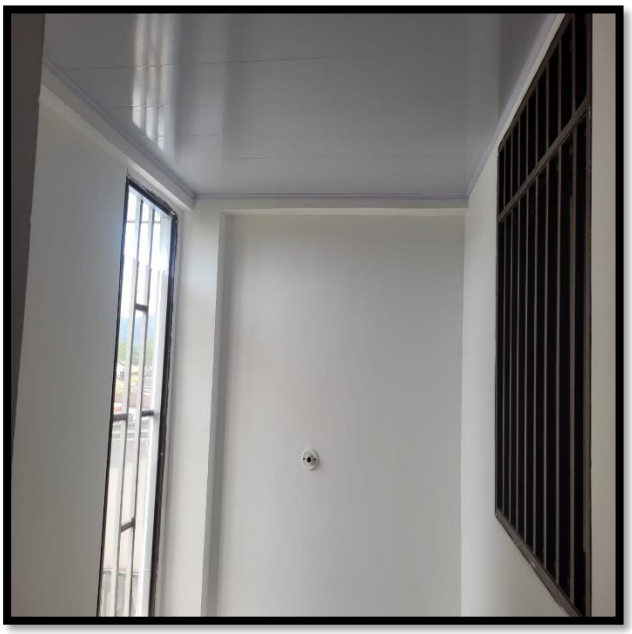

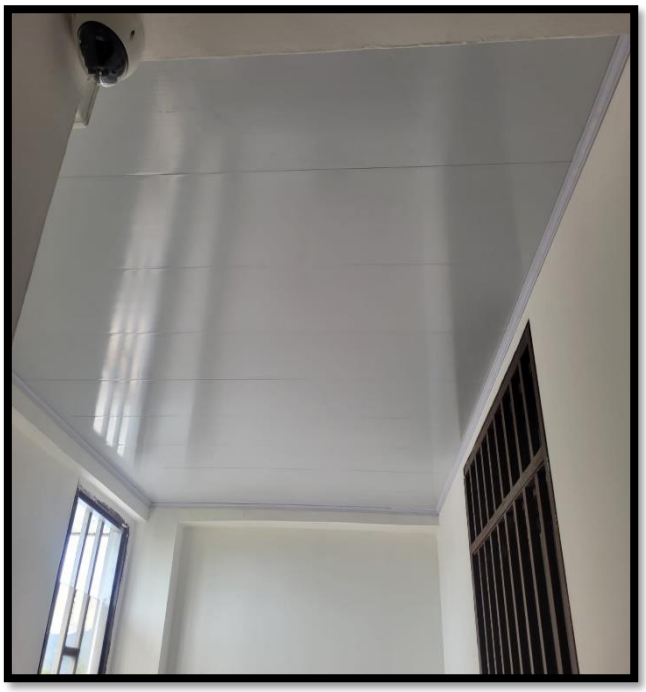



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez













CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

SEDE DONCELLO: se realizo la adecuacion de la oficina del fiscal con cambio de cielo raso, pintura general, se realizo la instalacion de cubierta e impermeabilizacion la misama la cual genera humedad y goteras en el interior.










CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



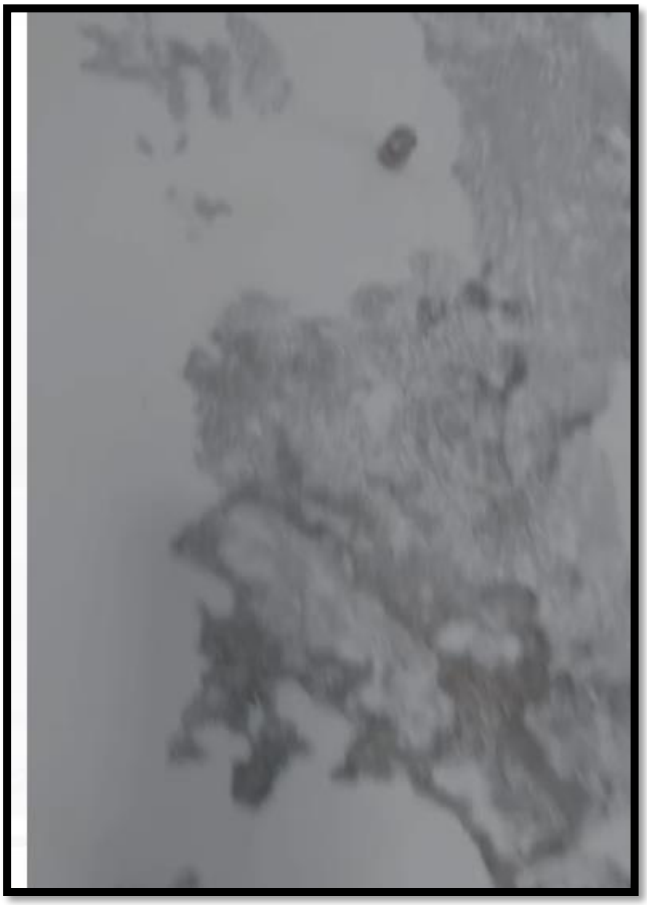






CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

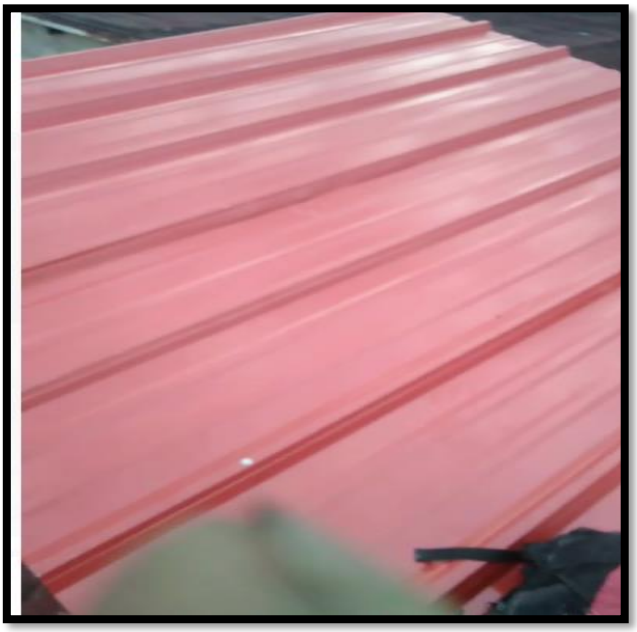



SEDE PATIO BRUSELAS: se realizo la instalacion de porton


SEDE EL PAUJIL: se realizaron adecuaciones generales a las sede.





CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

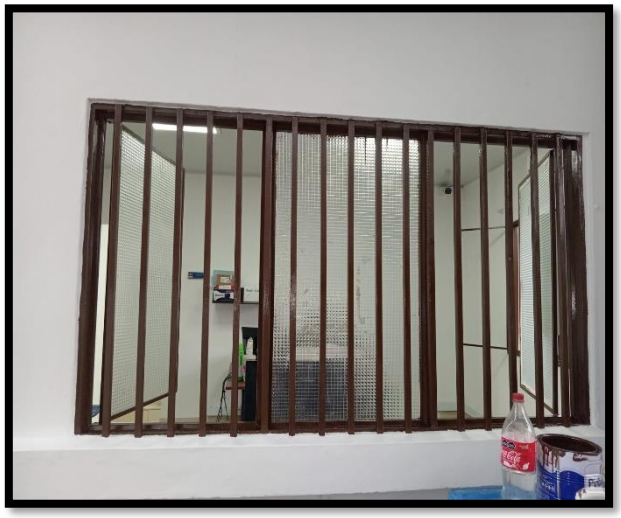





LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

EMPRESA:	**CONSORCIO MD**		
CONTRATO N°:	**FGN-RCS-0089-2024**		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.		
CENTRO DE TRABAJO			
ELABORÓ:	**EDILVER FRANK VARGAS**	**CARGO:**	**INSPECTOR-SST**
PERIODICIDAD (SEMANAL/MENSUAL):	**MENSUAL**	**FECHA (Día-Mes-Año):**	**24 DE OCTUBRE DEL 2024**

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN MARCO DEL CONTATO Y/O AVANCE DEL PROYECTO

Describir en forma general las actividades Operativas ejecutadas durante el periodo del presente informe:

Mejoras y mantenimientos de cielorrasos (Desmonte e instalacion)cambio de luminarias por otras adecuadas a los sitios de trabajo,resanes y pintura en las instalaciones adscritas al presente contrato,Demolicion de placa oficina de SIGIN ,palacio de justicia Neiva.

DE

2. EJECUCIÓN DEL PLAN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Capacitaciones,realizacion de ATS,Permisos de trabajo,inspecciones

Actividades planeadas en el periodo según cronograma SST

#	Descripción de la actividad	Fecha ejecución [Día-Mes-Año]	Registros anexos	Asociada a:	Observaciones
1	induccion del personal al sistema de gestion de la empresa personal de Neiva -Huila -elaboracion de ATS	14/10/2024	Acta registro de asistencia	Medicina Preventiva y del Trabajo	Se realizo capacitacion
2	Capacitacion cuidado de manos	18/10/2024	Acta registro de asistencia	Medicina Preventiva y del Trabajo	
3	Inspeccion orden y aseo ,retiro de escombros de demolicion	22/10/2024	registro fotografico	Higiene Industrial	
4					
5					
10					

Actividades pendientes de periodos anteriores según cronograma SST

#	Descripción de la actividad	Fecha ejecución [Día-Mes-Año]	Registros anexos	Asociada a:	Observaciones

3. ASPECTOS DE CONTROL OPERATIVO

Relación del personal del proyecto en el periodo

En los anexos del informe se debe incluir una matriz detallada con el listado del personal del contrato, donde se refleje el nombre, cargo, fecha de ingreso y/o retiro. Para el personal que ingreso al contrato se deben anexar los registros de: certificados de aptitud médica, inducciones, entrega de EPP, certificados de vacunación, afiliaciones y/o pagos al SSSI y certificados de competencias laborales según aplique. Para personal antiguo adjuntar el registro de pago al SSSI y la actualización de los certificados de competencia segun aplique.

Resumen de Trabajadores asociados al contrato en el periodo

Empresa		# Trabajadores que ingresaron	# Trabajadores retirados	# Total trabajadores activos
Empresa:	CONSORCIO MD	3	0	3

Actividades de capacitación, divulgación y formación

Todas las actividades deben tener un registro de ejecución reportado en los anexos del informe.

Tema	Fecha ejecución [Día-Mes-Año]	Tipo	# de trabajadores cubiertos
			4
Divulgacion del sistema de gestion	14/10/2024	Capacitación	4
manejo y usos de epps	14/10/2024	Charla	4
cuidado de manos	18/10/2024	Capacitación	4
			4
			4

Reportes de actos y/o condiciones inseguras

Todas las acciones correctivas deben tener un registro de ejecución reportado en los anexos del informe.

Fecha [Día-Mes-Año]	Descripción	Lugar	Acción Correctiva	Fecha de cumplimiento [Día-Mes-Año]	Responsable

Reporte de vehículos, volquetas y maquinaria usados durante el mes

Vehículos		
Tipos de vehículos	Cantidad de vehículos usados en el periodo	Observaciones
Automóvil	0	0
Camioneta	0	0
Vehículo de transporte colectivo	0	0
Vehículo de transporte de carga	0	0
Otro: Cual?	0	0

Mantenimientos de vehículos, maquinaria y equipos

#	Placa / Tipo de Maquinaria/equipo	Fecha [Día-Mes-Año]	Preventivo / Correctivo	Descripción
1				
2				
3				
4				
5				

Uso y manejo de sustancias químicas

tipos de sustancias, cantidades usadas, tipo de almacenamiento y controles operativos, además anexar el registro de las hojas de seguridad o MSDS, la matriz de compatibilidad y el procedimiento de trasvase.

Tipo de sustancia	Actividad en la que es usada	Observaciones

Actividades de demarcación y señalización

Se debe anexar el registro fotográfico por cada actividad de señalización reportada

Señalización de frentes de obra o sitios de trabajo


#	Tipo de señal	Temática de la señal	Frente de obra / Sitio de trabajo	Señales instaladas en el periodo	Acumulado
1	Peligro	INFORMAR O ADVERTIR DE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO Y PEIGRO	INTERIOR DE LA OBRA	1	2
2					

Señalización de vías de acceso

#	Tipo de señal	Temática de la señal	Vía de acceso a:	Señales instaladas en el periodo	Acumulado
	Peligro	informar sobre la actividad que se esta realizando	Dentro de las instalaciones	1	1
		Señalizacion de areas para distanciamiento	Dentro de las instalaciones	1	1

4. CONCLUSIONES Y ASPECTOS ADICIONALES



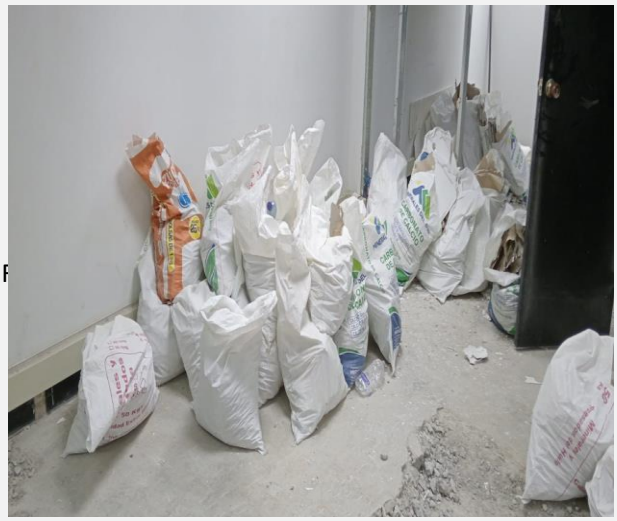

Descripción:	Recoleccion de escombros de demolicion
Lugar:	
Fecha:	
Observaciones:	Ninguna






Descripción:	Almacenamiento y organización
Lugar:	
Fecha:	CADA QUE SEA NECESARIO
Observaciones:	Ninguna





Descripción:	Organización orden y aseo ,areas despejadas
Lugar:	
Fecha:	Cda que se requiera
Observaciones:	Ninguna

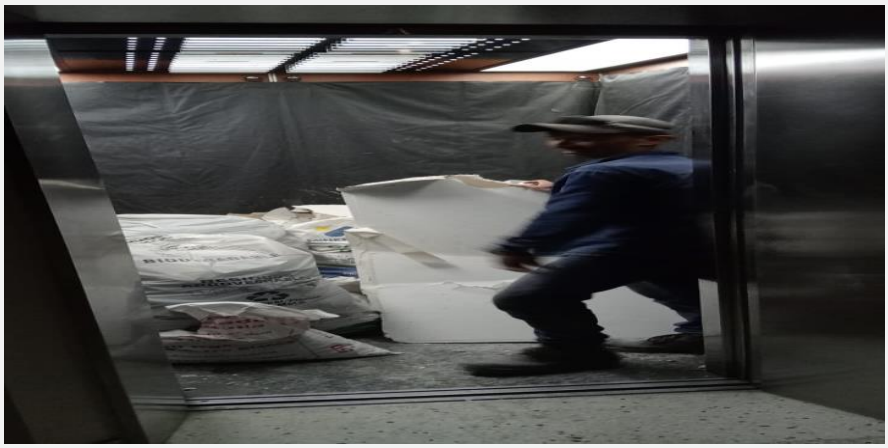

Descripción:	ascensor para evacuacion de escombros con su respectiva carpa de proteccion
Lugar:	Todas las sedes
Fecha:	
Observaciones:	Ninguna

Indicadores Accidentalidad

2<

Constante "K" anual:	100
Meses cargados 2024	0
T: Periodo de tiempo para el calculo	Anual / Mensual

2023

Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total de horas hombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. De Dias laborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promedio Trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
No. de accidentes de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. de días perdidos por accidente de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. de días perdidos por enfermedad general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. de accidentes de trabajo mortales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. de enfermedades laborales calificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de nuevas enfermedades laborales calificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


2024

Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total de horas hombre										128			
No. De Dias laborados										8			
Promedio Trabajadores										0			
No. de accidentes de trabajo										0			
No. de días perdidos por accidente de trabajo										0			
No. de días perdidos por enfermedad general										0			
No. de accidentes de trabajo mortales										0			
No. de enfermedades laborales calificadas										0			
# de nuevas enfermedades laborales calificadas										0			


Descripción	Periodo	2024											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Índice de frecuencia de accidente de trabajo. "IF"	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Índice de Severidad de accidentes de trabajo " IS "	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Mortalidad de accidentes laborales	ANUAL	#¡DIV/0!											
Prevalencia de la enfermedad laboral	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Incidencia de la enfermedad laboral	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Ausentismo	MENSUAL	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Indicadores Accidentalidad	

2<

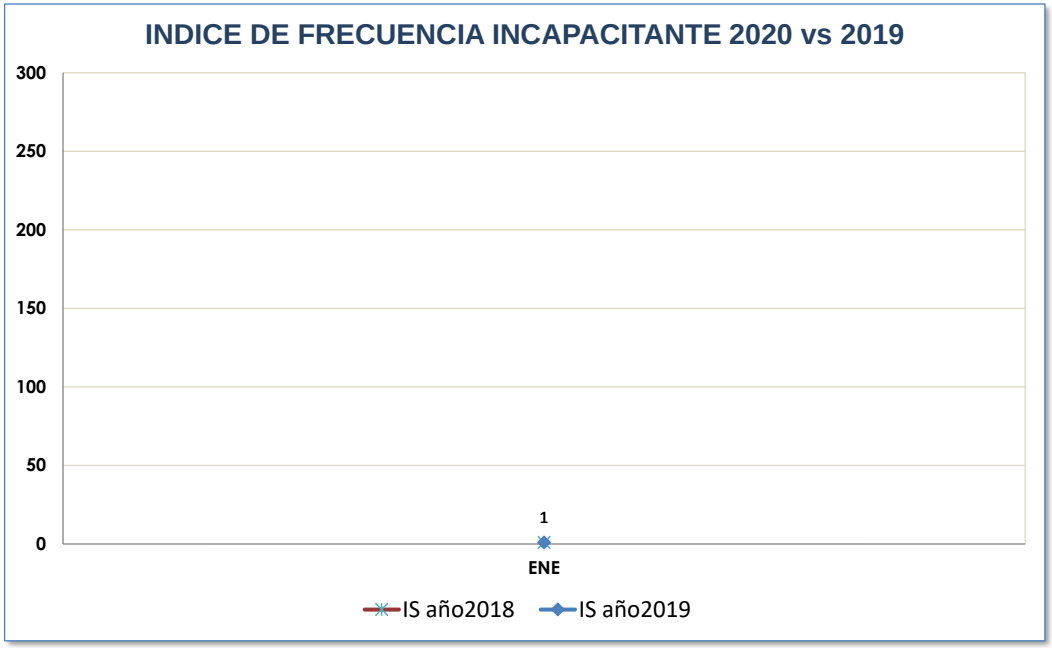

	Responsable:EDILVER FRANK VARGAS

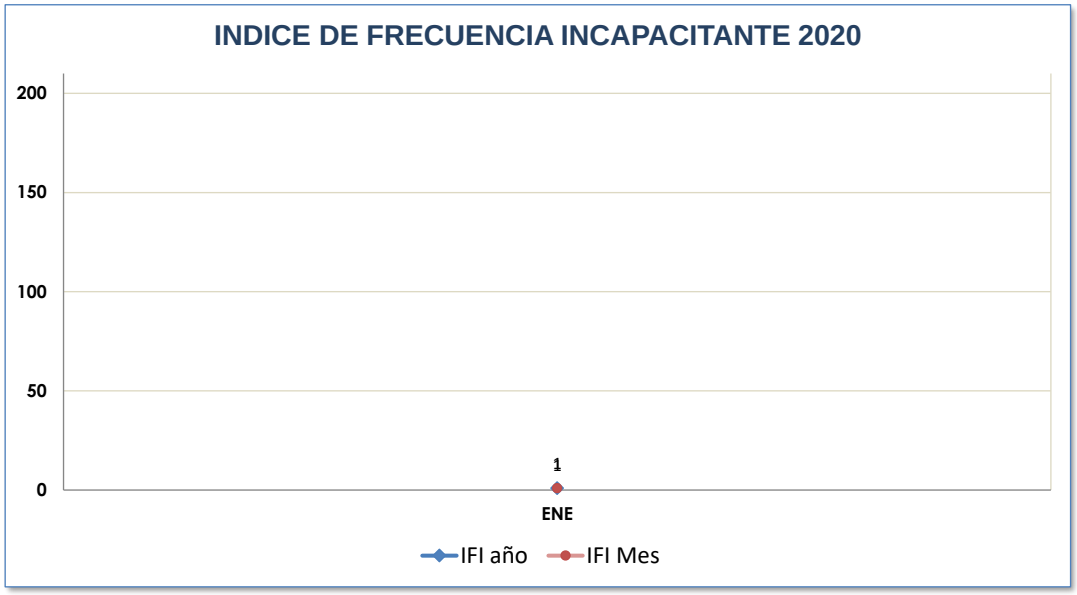

	ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE SG-SST	VERSIÓN: 01 SST- FR- 01 FECHA CREACIÓN: 20/02/2020

FECHA:	21 - 10 - 2024	CAPACITADOR:	Edilma Frank Vargas M
DIRIGIDO A:	Trabajadore de la obra	HORA INICIO:	07:00
LUGAR:	Palacio de Justicia.	HORA FINAL:	08:10

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO LA CAPACITACIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE:

- Induccion SG-SST
- Cuidad. de Manos

Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLO DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES.

ASISTENTES

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Vargas P	1076558697	oficial	Daniel V.P.
2	Leonel Roa Suarez	76887[illegible]	oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE: CC 7727736

Scanned with ACE Scanner

	FORMATO ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO SG-SST	VERSIÓN: 1 CODIGO: SST-FR-04 FECHA DE CREACIÓN : 04/01/2020

Empresa:	MLW Construcciones	Ciudad:	Neiva - Huila
Área/Proceso:	Oficina. Obra	Ubicación donde se realiza el trabajo:	Palacio de Justicia
Fecha de realización del Trabajo:	21-10-24	Fecha de Terminación del Trabajo:	
Hora de Inicio (a.m./p.m.)	07:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.)	

Descripción de la tarea a realizar:
Demolición de piso e instalación de ceramica. Resanes y Pintura.

CERTIFICACIONES

TRABAJO EN ALTURA: SI ___ NO: X N/A:___	ESPACIO CONFINADO: SI ___ NO: X N/A:___	CALIENTE: SI ___ NO: X N/A:___
ENERGIA PELIGROSAS: SI ___ NO: X N/A:___	OTRO, CUAL? Caidas a mismo Nivel	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Otras:
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas	✓	

ANÁLISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A nivel de piso
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Botas, Gafas, Ropa de trabajo.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 (Dos)
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	5S
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☑ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

TRABAJADORES QUE ELABORAN EL ANALISIS SEGURO DE TRABAJO Declaro haber participado activamente en la identificación de los peligros, los riesgos y en la definición de las medidas de control del trabajo que se va a realizar, para garantizar que el personal ejecutor en todo momento pueda realizar la actividad en condiciones seguras.

Nombre y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Daniel Vargas Paredes	1026558697	oficial	Daniel V. P.
Jhon Rocha Gutierrez	7685168	Oficial	

EJECUTORES DE LA ACTIVIDAD
Declaro haber participado y recibido la socialización en la identificación de los peligros, los riesgos y en la definición de las medidas de control que se implementarán del trabajo que se va a realizar, para garantizar la actividad en condiciones seguras.

Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Cédula	Cargo	Firma

Scanned with ACE Scanner
