Expediente: **258-2024**
Radicado: **DC-01255-2024**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental:
Fecha: **19/09/2024** Hora: **15:21:27** Folios: **14**

Señores
GESTIÓN DOCUMENTAL

Cordial Saludo:

En mi calidad de Supervisor del contrato: 258-2024, y en cumplimiento a mis funciones descritas en el Manual de Supervisión *(M-GJ-02), y* exactamente la función de "*Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con todos los soportes necesarios*", hago entrega a la oficina de Gestión Documental para su debido proceso los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	FORMATO		FOLIOS	ANEXOS		
	Digital	Físico		CD	USB	DD
Correspondencia enviada al contratista (Oficio de salida).						
Correspondencia interna.						
Correspondencia recibida del contratista (Oficios de entrada).						
Cuenta de cobro, parafiscales, RUT, acta de avance.		X	7			
Informe de interventoría.						
Informe de supervisión (**no para pagos**).		X	6			
Informe y/o certificación supervisor para pagos.		X	1			
Solicitud de modificatorio.						

Cordialmente,

Supervisor Contrato: _____

NOTAS:

- *El documento debidamente radicado se carga a su CONNECTOR para lo de su competencia.*
- *Los documentos de la carpeta pueden ser consultados en CONNECTOR.*
- *Los anexos se guardan en el servidor de* **Cornare**, *DVTK_Contratos para su consulta.*

Vigente desde
28-sep-23

F-GD-24 V.01

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO 258-2024

CERTIFICA QUE:

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING, con NIT: 12.236.250-2, presentó Cuenta de cobro por valor de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L ($33.651.445), por concepto del cumplimiento del contrato No. 258-2024, cuyo objeto lo constituye: *"REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ÁREA SOCIAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE CORNARE"*

Anexos:

- **Cuenta de Cobro No. 01 (2 folios)**
- **Copia del RUT (1 folio)**
- **Certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (1 folio)**
- **Certificado bancario (1 folio)**
- **Acta de entrega y recibo de obra (2 folios)**
- **Informe de supervisión (6 folios)**
- **Informe de actividades del contratista (Anexos digitales)**

ERINIA BEDOYA MURILLO
Supervisora

COPIA CONTROLADA

CUENTA DE COBRO No. 01

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE - CORNARE
NIT No. 890.985.138 - 3

DEBE A:
DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
NIT No. 12.236.250 - 2

LA SUMA DE: ($ 33.651.445)
SON: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: PAGO FINAL POR CONCEPTO DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO **No. S-MC-258-2024** CUYO OBJETO ES: **"REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ÁREA SOCIAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE CORNARE"**, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE RELACIÓN:

Item.	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unit	Valor Total
1	Mano de obra pintura en muros y techos caverna	m2	1099	$ 8.500	$ 9.341.500
2	Suministro y mano de obra pintura blanca en muros y techos de cocina y restaurante para aplicación de impermeabilizante (de 2 a 3 manos de pintura)	m2	265	$ 8.200	$ 2.173.000
3	Retiro de puerta y cierre vano en mampostería, revoque (incluye suministros) y pintura	global	1	$ 280.000	$ 280.000
4	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de combos sanitarios blancos tipo institucional, consumo de agua 4,8 litros con tanques compactos y modernos, con sistema accionamiento de botón push ergónomico con su respectiva válvula de entrada y sistema hidrostático, más lavamanos con pedestal, grifería y accesorios	un	2	$ 550.000	$ 1.100.000
5	Limpieza y mantenimiento de 3 fuentes de agua, limpieza de obra, recogida de escombros y votada de materiales provenientes de la misma.	global	1	$ 650.000	$ 650.000

COPIA CONTROLADA

6	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de orinal referencia tipo institucional, diseño moderno de formas orgánicas de tráfico mediano, consumo de agua 1,9 lpf (0,5 gpf), sifón integrado en porcelana, presión optima de funcionamiento mínima 25 PSI y máxima 80 PSI.	un	1	$ 490.000	$ 490.000
7	Retiro de aparatos sanitarios	un	5	$ 20.000	$ 100.000
8	instalación de puerta no incluye suministro	un	1	$ 50.000	$ 50.000
9	Apertura de vanos para puerta incluye filetes y botada de escombros	un	1	$ 280.000	$ 280.000
10	suministro e instalacion de vidrios (1 de 1.41*1.11) (2 de 1.21x66,5) (2 de 1.22x81)	global	5	$ 1.820.000	$ 1.820.000
11	Retiro de puerta y cierre vano en baños hombres en ladrillo, revoque y pintura	un	1	$ 340.000	$ 340.000
12	Suministro y siembra de plántulas para embellecimiento y paisajismo de entornos.	m2	12	$ 140.000	$ 1.680.000
13	Mano de obra resanes, incluye cemento, revoque y estuco para su correcta instalación en muros y salidas de ventanas.	m2	9	$ 8.000	$ 72.000
14	Mano de obra para pintura en tapas en concreto para luminarias 0,52x0,80	un	18	$ 25.000	$ 450.000
15	Suministro y Mano de obra para replanteo de red hidraulica y sanitaria de orinal y lavamanos	global	1	$ 265.100	$ 265.100
16	Demolicion de fuentes en piedra y muros en concreto	un	2	$ 162.880	$ 325.760
17	Suministro y mano de obra para construccion de marcos sobre ventana	global	1	$ 503.600	$ 503.600
18	Suministro y mano de obra para pintura sobre puerta	un	11	$ 168.500	$ 1.853.500
19	Suministro y mano de obra para pintura sobre lagrimales	ml	130	$ 6.860	$ 891.800
20	Suministro e instalacion de toma corriente tipo levinton 110 V, no incluye cableado	un	7	$ 17.480	$ 122.360
21	Suministro e instalacion de toma corriente a 220 V, en cajilla dexon, incluye cableado	un	1	$ 127.200	$ 127.200
22	suministro e instalacion de caja de paso dexon y interruptor, no incluye cableado y tuberia	un	7	$ 33.280	$ 232.960
23	Suministro e instalacion de caja de circuitos y breakers, no incluye cableado y tuberia	global	1	$ 709.200	$ 709.200
24	Suminstro e instalacion de rejilla sanitaria antiolor	un	8	$ 161.700	$ 1.293.600
25	Suministro e instalacion de embudo para control de filtracion de agua	un	3	$ 344.080	$ 1.032.240
				SUBTOTAL	$ 26.183.820
				SUMA DE SUBTOTAL	$ 26.183.820
				Administracion 19%	$ 4.974.926
				Utilidad 8%	$ 2.094.706
				IVA 19% sobre utilidad 8%	19% $ 397.994
				TOTAL	$ 33.651.445

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del ET, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Se expide en Pitalito Huila, a los 16 días del mes de Septiembre de 2024.

Atentamente.

Didier F Figueroa Sterling
12236250 pto

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
C.C. No. 12.236.250 Pitalito

NOTA: favor consignar el valor de la presente cuenta de cobro, en la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia No. 453-363620-44 a nombre de DIDIER FIGUEROA STERLING.

COPIA CONTROLADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14874112514

(415)7707212489984(8020) 000001487411251 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 2 3 6 2 5 0	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 3 6 2 5 0	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Pitalito 5 5 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FIGUEROA	STERLING	DIDIER	FRANQUIL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Pitalito 5 5 1

41. Dirección principal: CL 10 SUR 3 20

42. Correo electrónico: figueroa71@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 5 9 8 4 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 5 0 1 0 1	4 3 2 1	2 0 1 5 0 1 0 1	2 5 9 9	4 7 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 31 / 09 : 09: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FIGUEROA STERLING DIDIER FRANQUIL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Pitalito Huila, 16 de Septiembre de 2024.

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGROS Y NARE "CORNARE"
El Santuario

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.236.250 de Pitalito, actuando en nombre y representación propio bajo la gravedad de juramento, me permito CERTIFICAR que he cumplido con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, y me encuentro al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar.

Nombre: **DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING**
Nit o C.C.:12236250
No De Dirección: Calle 10 a sur 3 – 20
Teléfono: 320-2598412
Correo electrónico: figueroa71qoutlook.com
Ciudad: Pitalito

Atentamente,

Didier F. Figueroa Sterling
12236250 pto.

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
C.C. No. 12236250 de Pitalito

COPIA CONTROLADA

Certificado
Bancario

Martes, 20 de agosto de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING identificado(a) con CC 12236250, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45336362044	2015/01/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

COPIA CONTROLADA

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE

OBRA

CONTRATO:	**258-2024**
CONTRATISTA:	DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ÁREA SOCIAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE CORNARE
FECHA DE INICIO:	12 de agosto de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de septiembre de 2024
PLAZO INICIAL:	20 días
PLAZO FINAL:	35 días
OBJETO ACTA:	Entrega y recibo de la obra

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.910.618
ADICIÓN No. 1	$8.406.702
ADICIÓN No. 2	$3.013.701
VALOR	**$ 34.331.021**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 33.651.445**

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
	INICIALES		
1	MANO DE OBRA PINTURA EN MUROS Y TECHOS CAVERNA	M2	1019
2	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PINTURA BLANCA EN MUROS Y TECHOS DE COCINA Y RESTAURANTE PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE (DE 2 A 3 MANOS DE PINTURA)	M2	265
3	RETIRO DE PUERTA Y CIERRE VANO EN MAMPOSTERÍA, REVOQUE (INCLUYE SUMINISTROS) Y PINTURA	Global	1
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMBOS SANITARIOS BLANCOS TIPO INSTITUCIONAL, CONSUMO DE AGUA 4,8 LITROS CON TANQUES COMPACTOS Y MODERNOS, CON SISTEMA	un	2

	ACCIONAMIENTO DE BOTÓN PUSH ERGÓNOMICO CON SU RESPECTIVA VÁLVULA DE ENTRADA Y SISTEMA HIDROSTÁTICO, MÁS LAVAMANOS CON PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS		
5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 3 FUENTES DE AGUA, LIMPIEZA DE OBRA, RECOGIDA DE ESCOMBROS Y VOTADA DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA MISMA.	global	1
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ORINAL REFERENCIA TIPO INSTITUCIONAL, DISEÑO MODERNO DE FORMAS ORGÁNICAS DE TRÁFICO MEDIANO, CONSUMO DE AGUA 1,9 LPF (0,5 GPF), SIFÓN INTEGRADO EN PORCELANA, PRESIÓN OPTIMA DE FUNCIONAMIENTO MÍNIMA 25 PSI Y MÁXIMA 80 PSI.	un	1
7	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	un	5
8	INSTALACIÓN DE PUERTA NO INCLUYE SUMINISTRO	un	1
9	APERTURA DE VANOS PARA PUERTA INCLUYE FILETES Y BOTADA DE ESCOMBROS	un	1
10	RETIRO DE PUERTA Y CIERRE VANO EN BAÑOS HOMBRES EN LADRILLO, REVOQUE Y PINTURA	un	1
11	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLÁNTULAS PARA EMBELLECIMIENTO Y PAISAJISMO DE ENTORNOS.	M2	12
12	MANO DE OBRA RESANES, INCLUYE CEMENTO, REVOQUE Y ESTUCO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN MUROS Y SALIDAS DE VENTANAS.	M2	9
13	MANO DE OBRA PARA PINTURA EN TAPAS EN CONCRETO PARA LUMINARIAS 0,52X0,80	un	18
	ADICIÓN No. 1		
1	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA REPLANTEO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA DE ORINAL Y LAVA MANOS	Global	1
2	DEMOLICIÓN DE FUENTES EN PIEDRA Y MUROS EN CONCRETO	un	2
3	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MARCO SOBRE VENTANA	Global	1
4	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA PINTURA SOBRE PUERTA	un	8
5	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA PINTURA PARA LAGRIMALES	ML	130

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO LEVINTON 110 V, EN CAJILLA EXISTENTE, NO INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	7
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DEXON Y INTERRUPTOR, NO INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	7
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS Y BREAKER, NO INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	Global	1
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SANITARIA ANTIOLOR	un	8
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS (2 DE 1,21 X 66,5) (2 DE 1,22 X 81) - (CAMBIO)	Global	4
	ADICIÓN No. 2		
1	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA PINTURA SOBRE VENTANA Y REJA	un	3
2	PINTURA EN MUROS Y TECHOS CAVERNA	M2	80
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE A 220 V, EN CAJILA DEXON, INCLUYE CABLEADO	un	1
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMBUDO PARA CAPTACIÓN DE FILTRACION DE AGUA	un	3

Los suscritos, **ERINIA BEDOYA MURILLO,** supervisora por **CORNARE, FREDY ARLEY FRANCO OSORIO,** Contratista de apoyo a la supervisión y **DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING,** quien actúa como **CONTRATISTA DE OBRA**, hemos acordado suscribir la presente entrega y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato No. 258-2024; de acuerdo con las siguientes: **CONSIDERACIONES**: **PRIMERA.- ENTREGA**: Mediante la presenta Acta el **CONTRATISTA DE OBRA**, en calidad de ejecutor hace entrega física a **CORNARE** de la obra y los productos que la conforman correspondientes al desarrollo del objeto contractual y las actividades anteriormente descritas; así mismo, **CORNARE** recibe dichas ejecuciones, de conformidad con las especificaciones técnicas pactadas. **SEGUNDA. - VALOR:** El valor del contrato corresponde a lo establecido en las consideraciones iniciales de la presente acta en la cual se estipulan los valores ejecutados. **TERCERA. - DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de esta acta todos los demás documentos que reposan en el archivo de CORNARE y en la plataforma SECOP II, referente a la ejecución del mencionado contrato. **CUARTA. -RESPONSABILIDAD**: El recibo de los productos del contrato no releva a las partes de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en las normas legales vigentes, así como de las establecidas en el Contrato No. 258-2024 y sus modificaciones. **QUINTA. EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA:** El **CONTRATISTA DE OBRA,** se obliga a expedir la póliza de calidad y estabilidad de la obra por un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato y

vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra.

SEXTA. -MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Sin embargo, cada una de las partes libera su responsabilidad respecto a aquellos documentos que no haya firmado.

Para constancia, se suscribe por las partes, el día 16 de septiembre de 2024

ERINIA BEDOYA MURILLO
Coord. Logística y Mantenimiento
Supervisora

FREDY ARLEY FRANCO OSORIO
Contratista
Apoyo a la supervisión

Didier F. Figueroa Sterling
1223620 pto

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
Contratista

COPIA CONTROLADA

CONTRATO No. S-MC-258-2024

FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME: 17 DE SEPTIEMBRE 2024

SUPERVISORA: ERINIA BEDOYA MURILLO

APOYO. SUPERVISIÓN: FREDY ARLEY FRANCO OSORIO

CONTRATISTA: DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ÁREA SOCIAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE CORNARE

VALOR INICIAL: VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($ 22.910.618)

VALOR CON ADICIONES: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTIÚN PESOS M/L ($ 34.331.021)

VALOR FINAL: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 33.651.445)
FECHA DE INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LOCALIZACIÓN: SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DEL EL SANTUARIO ANTIOQUIA

PLAZO INICIAL: 20 DÍAS

SUSPENSIONES: N/A

PLAZO FINAL: 35 DÍAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA:
DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING

DIRECCION:
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA CL 10 SUR 3 20

TELEFONO:
3 2 0 2 5 9 8 4 1 2

E-MAIL: figueroa71@outlook.com

REPRESENTANTE LEGAL: DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING

INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN TÉCNICA

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
comare

1. La obra, fue ejecutada de acuerdo a lo inicialmente planteado en el contrato **No. S-MC-258-2024** y sus modificaciones.

2. Verificado el contrato de obra **No. S-MC-258-2024**, y la propuesta económica del contratista final que ejecutó la obra, la supervisión constató la realización de las siguientes actividades:

DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA PINTURA EN MUROS Y TECHOS CAVERNA	M2	1099	$ 8.500	$ 9.341.500
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PINTURA BLANCA EN MUROS Y TECHOS DE COCINA Y RESTAURANTE PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE (DE 2 A 3 MANOS DE PINTURA)	M2	265	$ 8.200	$ 2.173.000
RETIRO DE PUERTA Y CIERRE VANO EN MAMPOSTERÍA, REVOQUE (INCLUYE SUMINISTROS) Y PINTURA	Global	1	$ 280.000	$ 280.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMBOS SANITARIOS BLANCOS TIPO INSTITUCIONAL, CONSUMO DE AGUA 4,8 LITROS CON TANQUES COMPACTOS Y MODERNOS, CON SISTEMA ACCIONAMIENTO DE BOTÓN PUSH ERGÓNOMICO CON SU RESPECTIVA VÁLVULA DE ENTRADA Y SISTEMA HIDROSTÁTICO, MÁS LAVAMANOS CON PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS	un	2	$ 550.000	$ 1.100.000
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 3 FUENTES DE AGUA, LIMPIEZA DE OBRA, RECOGIDA DE ESCOMBROS Y VOTADA DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA MISMA.	global	1	$ 650.000	$ 650.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ORINAL REFERENCIA TIPO INSTITUCIONAL, DISEÑO MODERNO DE FORMAS ORGÁNICAS DE TRÁFICO MEDIANO, CONSUMO DE AGUA 1,9 LPF (0,5 GPF), SIFÓN INTEGRADO EN PORCELANA, PRESIÓN OPTIMA DE FUNCIONAMIENTO MÍNIMA 25 PSI Y MÁXIMA 80 PSI.	un	1	$ 490.000	$ 490.000
RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	un	5	$ 20.000	$ 100.000
INSTALACIÓN DE PUERTA NO INCLUYE SUMINISTRO	un	1	$ 50.000	$ 50.000
APERTURA DE VANOS PARA PUERTA INCLUYE FILETES Y BOTADA DE ESCOMBROS	un	1	$ 280.000	$ 280.000
RETIRO DE PUERTA Y CIERRE VANO EN BAÑOS HOMBRES EN LADRILLO, REVOQUE Y PINTURA	un	1	$ 340.000	$ 340.000
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTULAS PARA EMBELLECIMIENTO Y PAISAJISMO DE ENTORNOS.	M2	12	$ 140.000	$ 1.680.000
MANO DE OBRA RESANES, INCLUYE CEMENTO, REVOQUE Y ESTUCO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN MUROS Y SALIDAS DE VENTANAS.	M2	9	$ 8.000	$ 72.000
MANO DE OBRA PARA PINTURA EN TAPAS EN CONCRETO PARA LUMINARIAS 0,52X0,80	un	18	$ 25.000	$ 450.000
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA REPLANTEO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA DE ORINAL Y LAVA MANOS	Global	1	$ 265.100	$ 265.100
DEMOLICIÓN DE FUENTES EN PIEDRA Y MUROS EN CONCRETO	un	2	$ 162.880	$ 325.760
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MARCO SOBRE VENTANA	Global	1	$ 503.600	$ 503.600
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA PINTURA SOBRE PUERTA	un	11	$ 168.500	$ 1.853.500
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA PINTURA PARA LAGRIMALES	ML	130	$ 6.860	$ 891.800
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO LEVINTON 110 V, EN CAJILLA EXISTENTE, NO INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	7	$ 17.480	$ 122.360
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DEXON Y INTERRUPTOR, NO INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	7	$ 33.280	$ 232.960
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS Y BREAKER, NO INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	Global	1	$ 709.200	$ 709.200
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SANITARIA ANTIOLOR	un	8	$ 161.700	$ 1.293.600
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS (1 DE 1.41 * 1.11) (2 DE 1,21 X 66,5) (2 DE 1,22 X 81)	Global	5	$ 1.820.000	$ 1.820.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE A 220 V, EN CAJILA DEXON, INCLUYE CABLEADO	un	1	$ 127.200	$ 127.200
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMBUDO PARA CAPTACIÓN DE FILTRACION DE AGUA	un	3	$ 344.080	$ 1.032.240
SUBTOTAL				$ 26.183.820
ADMINISTRACIÓN				$ 4.974.926
UTILIDAD				$ 2.094.706
IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ 397.994
TOTAL				$ 33.651.445

3. La obra presentó variaciones de conformidad con los modificatorios 1 y 2 debidamente publicados en SECOP II.
4. Respecto a la actividad de suministro e instalación de vidrios se debe realizar la siguiente precisión:

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

En la etapa de presentación de ofertas, quien resultó adjudicatario del proceso de selección allegó un documento con los APU propuestos para la ejecución del contrato, en el cual estableció el siguiente valor:

Didier Figueroa Sterling.
C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL. figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202596412 3023109655

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

N° ITEM	10		
DESCRIPCION		UND. MEDIDA	CANTIDAD
Instalación y suministro de vidrios claros de 1.41 * 1.11 y .70 *.40		UNIDAD	2

I. EQUIPO					
ID	DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
EQ	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	EQUIPO	$ 40.000	2	$ 80.000
EQ	HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 55.000	1	$ 55.000
				SUB-TOTAL	$ 135.000

II. MATERIALES EN OBRA					
ID	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL
INS	VIDRIO CLARO 1.41x1.11	VIDRIO	1	$ 210.000	$ 210.000
INS	VIDRIO CLARO 70x40	VIDRIO	1	$ 175.000	$ 175.000
INS	SILICONA	TUVO	2	$ 40.000	$ 80.000
	DESPERDICIO	%			
				SUB-TOTAL	$ 465.000

III. TRANSPORTE					
ID	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/M3-KM	VR. PARCIAL
				SUB-TOTAL	$

IV. MANO DE OBRA					
ID	DESCRIPCION	UNIDAD	JORNAL/PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
AYU	AYUDANTE DE OBRA (2)	JORNAL	$ 50.000	3	$ 150.000
				SUB-TOTAL	$ 150.000

TOTAL COSTO UNITARIO OFERTADO	$ 750.000

Administracion	19%	$ 142.500
Utilidad	8%	$ 60.000
IVA 19% sobre utilidad 8%	19%	$ 11.400
VALOR UNITARIO OFERTADO - A + U + IVA SOBRE UTILIDAD		$ 963.900

Como se puede evidenciar, en la cantidad estableció 2 unidades, sin percatarse que dentro de ese mismo APU se encontraban los 2 vidrios inicialmente requeridos, por lo cual el contratista asumió que debía instalar 4 unidades.
Posteriormente en la modificación No. 1 al contrato, se adicionaron 4 unidades de vidrios, sin que hasta ese momento se hubiese identificado la imprecisión ocurrida en dicha actividad.

Es por ello, que se aclara que finalmente solo se requirió la instalación de 5 vidrios, no de 6 como podría interpretarse a partir de los APU. Para dar mayor claridad se presenta el APU final de esta actividad con 5 vidrios:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
N°ITEM:		
DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO (1 DE 1.41*1.11) (2 DE 1,21X66,5) (2 DE 1,22X81)	Global	5

I. EQUIPO					
ID	DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
EQ	ANDAMIO MULTI DIRECCIONAL	EQUIPO	$ 40.000	4	$ 160.000
					$ -
EQ	HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 55.000	4	$ 220.000
				SUB-TOTAL	$ 380.000

II. MATERIALES EN OBRA					
ID	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL
INS	VIDRIO CLARO 1.41X1.11	UNIDAD	1	$ 210.000	$ 210.000
INS	VIDRIO CLARO DE 1,21X66,5	UNIDAD	2	$ 195.000	$ 390.000
INS	VIDRIO CLARO DE 1,22X81	UNIDAD	2	$ 195.000	$ 390.000
SUM	SILICONA	TUVO	5	$ 40.000	$ 200.000
				SUB-TOTAL	$ 1.190.000

III. TRANSPORTE					
ID	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/M3-KM	VR. PARCIAL
					$ -
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA					
ID	DESCRIPCION	UNIDAD	JORNAL/PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
AYU	AYUDANTE DE OBRA	JORNAL	$ 50.000	5	$ 250.000
				SUB-TOTAL	$ 250.000

TOTAL COSTO UNITARIO OFERTADO		$ 1.820.000
Administracion	19%	$ 345.800
Utilidad	8%	$ 145.600
IVA 19% sobre utilidad 8%	19%	$ 27.664
VALOR UNITARIO OFERTADO + A + U + IVA SOBRE UTILIDAD		$ 2.339.064

En consecuencia, se descontará del valor final del contrato la suma de $679.576, reiterando que si bien se genera esta disminución, también es cierto que se ejecutaron todas las actividades requeridas, bajo las especificaciones y cantidades correspondientes.

5. Durante la ejecución del contrato se desarrollaron todas las actividades pactadas, bajo las condiciones requeridas por la Entidad.

6. A continuación, se cita cada uno de los productos y/o cumplimiento de requisitos que debía acreditar el contratista:

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

CRITERIO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Realizar la disposición de los residuos de construcción en un lugar dispuesto para ello	Certificación expedida por el contratista, en el cual indique el sitio de disposición y la cantidad de residuos

Ecopuntolimpio s.a.s
NIT 901722457-9
CR 81 B 53 A 119 I N 208, Medellín, Antioquia,
Tel: +57 3155722901
ecopuntolimpiosas@gmail.com ;

Medellín, septiembre 09- 2024

CERTIFICA

Por medio del presente documento deja constancia que **ECOPUNTO LIMPIO SAS NIT: 901722457-9**

Recibió del señor: **FIGUEROA STERLING DIDIER FRANQUIL identificado con C.C. No. 12.236.250**

Un total de 0.7 mtrs3 de escombro limpio rcd

Los materiales son transportados desde El Santuario.



La disposición final de los materiales adquiridos por parte de su empresa se les da un manejo en coordinación con mincivil y conasfaltos ya ellos hacen el proceso de economía circular

Atentamente,

alba Piedrahita Yepes

Representante Legal – WhatsApp 315 572 2901
Direccion: carrera 81b #53a-119 (interior 208)

ECOPUNTO-LIMPIO S.A.S.

COPIA CONTROLADA

Acreditar el pago de seguridad social y parafiscales	Certificación expedida por el contratista, requisito para el pago del contrato

DIDIER F FIGUEROA STERLING

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Pitalito Huila, 16 de Septiembre de 2024.

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGROS Y NARE "CORNARE"
El Santuario

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.236.250 de Pitalito, actuando en nombre y representación propio bajo la gravedad de juramento, me permito CERTIFICAR que he cumplido con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, y me encuentro al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar.

Nombre: DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
Nit o C.C.:12236250
No De Dirección: Calle 10 a sur 3 – 20
Teléfono: 320-2598412
Correo electrónico: figueroa71qoutlook.com
Ciudad: Pitalito

Atentamente.

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
C.C. No. 12236250 de Pitalito

figueroa71@outlook.com Calle 10 a sur # 3-20 3202598412 3185278621

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de combos sanitarios y orinales ahorradores	Se verificará con la solicitud de la ficha técnica y se establecerá como requisito habilitante.
Requisitos verificados durante el desarrollo del proceso de selección de mínima cuantía, de igual manera se constató la instalación de los elementos que habían sido propuestos.	
Elaborar las bitácoras de obra y presentarlas a la supervisión del contrato	El contratista presenta informe de ejecución de las actividades, el cual se encuentra adjunto a los documentos del contrato.
Acta de entrega y recibo de obra, la cual reposa en los documentos del contrato.	

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA N/A

1. Se verificó el cumplimiento del desarrollo de las actividades dentro del plazo contractuales y el avance de las mismas.
2. Durante el plazo de ejecución, se recibió por parte del contratista un informe final de ejecución en el cual acredita el cumplimiento a satisfacción de las actividades.
3. El plazo de ejecución del contrato fue objeto de modificación, mediante prórroga de 15 días, con el fin de ejecutar actividades adicionales:

Plazo inicial	Plazo (según modificatorio No 1)	Plazo final	¿Hubo suspensiones?	Plazo final
20 Días	15 Días	35 Días	N/A	35 Días

SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

1. Durante la ejecución del contrato **No S-MC-258-2024**, CORNARE realizará un único pago al contratista, previa presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, certificado de disposición de los residuos de la obra expedida por el contratista donde indique el lugar de disposición y la cantidad, certificación del Supervisor de haber recibido a satisfacción el objeto del contrato, copia del RUT y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social y parafiscal.

   La Corporación efectuará el respectivo pago pago dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de los requisitos mencionados anteriormente.

No. de Cuenta	Fecha	Valor a pagar
Cuenta de Cobro No. 01	16/09/2024	$33.651.445

2. El valor del contrato fue objeto de modificación y adición en recursos durante su ejecución tal como se detalla a continuación:

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.910.618
ADICIÓN No. 1	$8.406.702
ADICIÓN No. 2	$3.013.701
VALOR	**$ 34.331.021**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 33.651.445**

SUPERVISIÓN JURÍDICA

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

1. El contrato **No S-MC-258-2024**, estuvo cubierto por las siguientes garantías:

No de póliza (citar No de anexo)	Amparo	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor de la garantía
560 47 994000181356 Anexo 0	Cumplimiento del contrato	12/08/2024	10/01/2025	2,291,061.80
560 47 994000181356 Anexo 0	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	12/08/2024	10/09/2027	1,145,530.90
560 74 994000033096 Anexo 0	Responsabilidad civil extracontractual	12/08/2024	15/09/2024	260,000,000.00
560 47 994000181356 Anexo 1	Cumplimiento del contrato	12/08/2024	25/01/2025	3,131,732.00
560 47 994000181356 Anexo 1	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	12/08/2024	25/09/2027	1,565,866.00
560 74 994000033096 Anexo 1	Responsabilidad civil extracontractual	12/08/2024	30/09/2024	260,000,000.00
560 47 994000181356 Anexo 3	Estabilidad y calidad de la obra	16/09/2024	15/09/2025	3,433,102.10

2. Los riegos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos FGJ-159, no se materializaron durante la ejecución del contrato. Ahora en cuanto a los riegos plasmados allí, se presenta seguimiento a los mismos:

Riesgo	A quien se le asigno el riesgo	Que seguimiento o monitoreo se estableció	Periodo establecido para hacer seguimiento	Evidencia del seguimiento	Seguimiento
Cambios regulatorios o tributarios que pueden afectar la obra	Cornare	Revisión de los cambios sustanciales de normas que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar	Con el informe final de la supervisión	A través del seguimiento y vigilancia por parte de la supervisión	Informe de supervisión – No se identificaron cambios normativos sustanciales

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Riesgo	A quien se le asigno el riesgo	Que seguimiento o monitoreo se estableció	Periodo establecido para hacer seguimiento	Evidencia del seguimiento	Seguimiento
Que el ejecutor de la obra no de cumplimiento en el plazo estimado.	Contratista - Cornare	Supervisión periódica	Supervisión a cargo	Seguimiento permanente de la programación de la obra.	Mediante la modificación del plazo se garantizó la ejecución de la obra inicial y obras adicionales dentro del término pactado entre las partes
Monto y oportunidad de la obra y las eventuales variaciones por cantidades de obra, plazo y precios	Cornare, siempre y cuando no obedezca a causas imputables al contratista	Seguimiento periódico por parte de la supervisión	Periódicamente con la revisión de la información.	A través del seguimiento y vigilancia por parte de la supervisión	La obra se desarrolló en el plazo pactado y las variaciones de cantidades y precios fueron fijadas en las modificaciones del contrato y en los informes del contratista y el presente informe de supervisión.
Aspectos geológicos. Interferencia y presencia de redes de servicios públicos domiciliarios	Compartida	Realizar el reconocimiento en campo del área de influencia del proyecto.	Informe final de supervisión que dará cuenta de la ocurrencia o no de estas situaciones	A través del seguimiento y vigilancia por parte del supervisor	Debido a la estructura que se intervino se debe indicar que la presencia de humedad es alta, lo cual dio lugar a la realización de actividades adicionales con el fin de atacar de manera directa las causas y aminorar las consecuencias de las mismas.
Costos de operación y mantenimiento mayores a los proyectados o falta de disponibilidad de la obra para efectos de mantenimiento.	Contratista	Verificar que el contratista cuente con el equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato, de acuerdo a la programación de obra	En el ejercicio de la supervisión y las bitácoras	A través del seguimiento y vigilancia por parte de la supervisión	Durante toda la ejecución el contrato, el contratista contó con los equipos, herramientas y personal requeridos

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Riesgo	A quien se le asigno el riesgo	Que seguimiento o monitoreo se estableció	Periodo establecido para hacer seguimiento	Evidencia del seguimiento	Seguimiento
					para el desarrollo de las actividades.
Eventos que están fuera de control de las partes y cuya ocurrencia conlleva a la suspensión de las obligaciones del contrato	Compartida	Implementar estrategias de gestión oportuna con las entidades para la toma de decisiones en el menor tiempo posible	Periódicamente durante el ejercicio de la supervisión	A través del seguimiento y vigilancia por parte de la supervisión	No se presentaron durante la ejecución del contrato.
Financiación del contratista y variación de condiciones financieras durante el plazo de ejecución de la obra	Contratista	La entidad realizará un único pago, lo cual contribuye a garantizar que el oferente cuente con músculo financiero necesario para la ejecución de las actividades	Periódicamente durante el ejercicio de la supervisión	A través del seguimiento y vigilancia por parte de la supervisión	No se evidenció desfinanciación del contratista. Se procederá a efectuar un único pago por el valor total ejecutado.
Mala calidad de los insumos utilizados en la obra	Contratista	Verificar la idoneidad y calidad de los materiales una vez el contratista los disponga en el sitio	Periódicamente durante el ejercicio de la supervisión	A través del seguimiento y vigilancia por parte de la supervisión	Los insumos utilizados para la ejecución de las obras presentaron buena calidad.

SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

Se cuenta con certificación en la cual consta el sitio de disposición de los residuos de construcción de la obra, donde de identifica el sitio y la cantidad de residuos, tal como se anexó en el numeral 6 del acápite de supervisión técnica.

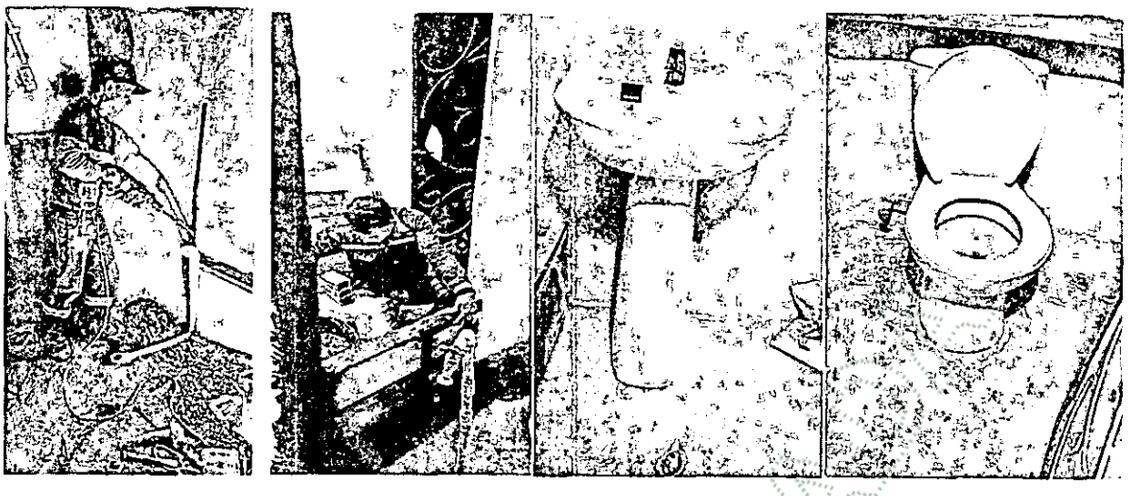
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

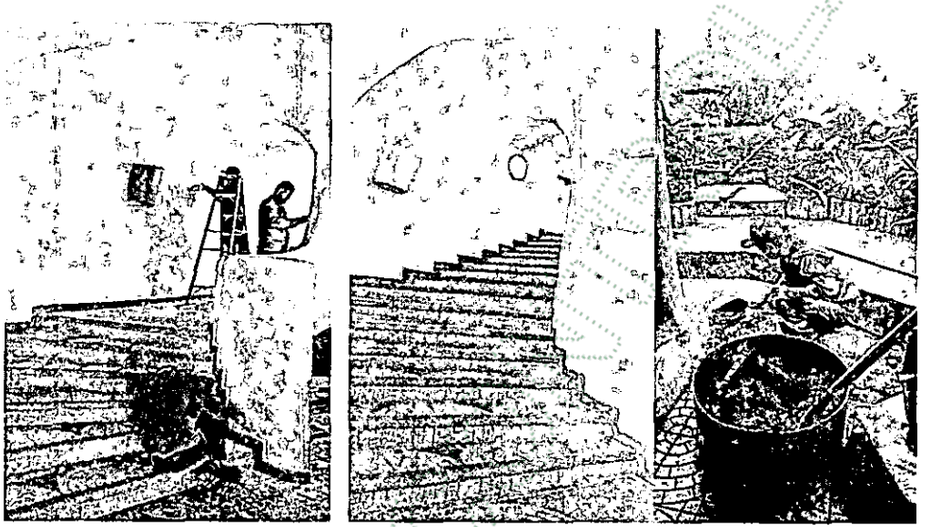
En el expediente del contrato **No S-MC-258-2024**, reposan todos los documentos que dan cuenta de la ejecución total y ha entera satisfacción del objeto convenido y/o contratado.

Todos los documentos relacionados, así como los atinentes con la ejecución del contrato se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP II.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS:







Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare







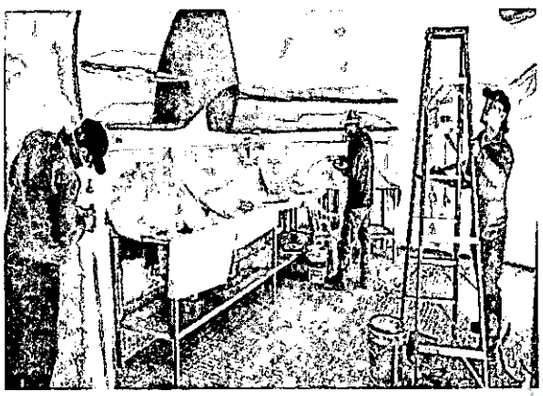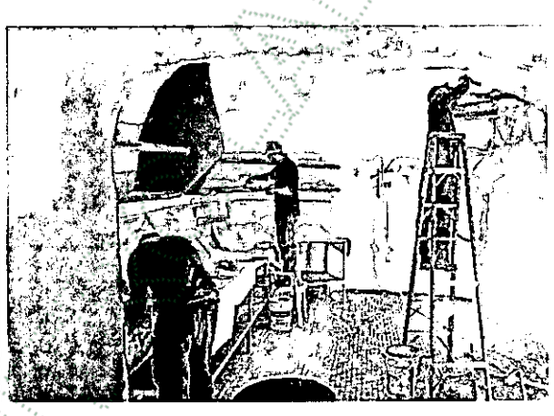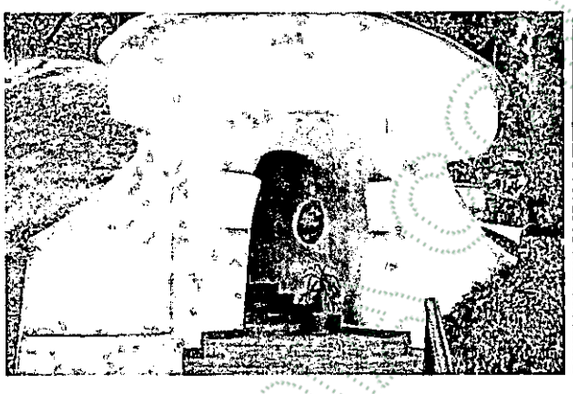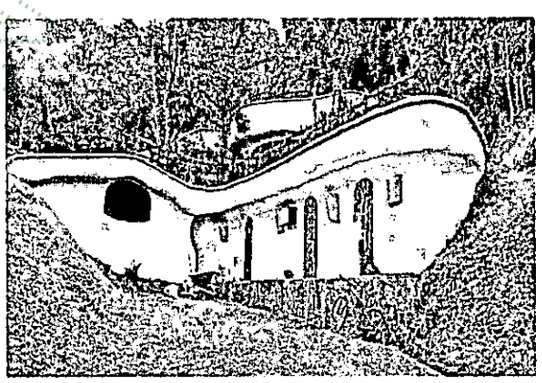Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

ERINIA BEDOYA MURILLO
Supervisora

FREDY ARLEY FRANCO OSORIO
Apoyo a la supervisión Contrato No. 156-2024

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

CORPORACION AUTONOMA DE LA CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

CON:

N. RADICADO

EXPEDIENTE

CONTRATO

Expediente: **258-2024**
Radicado: **DC-01255-2024**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental:
Fecha: **19/09/2024** Hora: **15:21:27** Folios: **14**

TIPO ANEXO	MEDIO (CD-DOCTO)	UNIDAD (FOLIOS-UNIDAD)	OBSERVACIONES/ CONTENIDO
CD`S			
USB			
DAA- DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS			
EIA -ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL			
FOTOS			
INFORME INTERVENTORIA			
INFORME FINAL DE CONTRATACION			
LIBRO- EMPASTADO			
LICITACIONES			
MANUALES			
MAPAS			
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			
PLANOS			
VIDEO			
OTRO **DIGITAL**		X	DVTK 2024 Contratos
OTRO			

FUNCIONARIO QUE RECIBE GESTION DOCUMENTAL

DEPENDENCIA Y/O REGIONAL SANTUARIO

DIGITALIZADO
