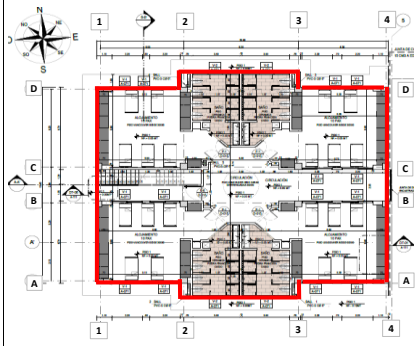
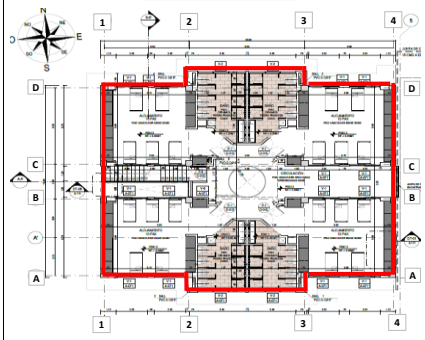
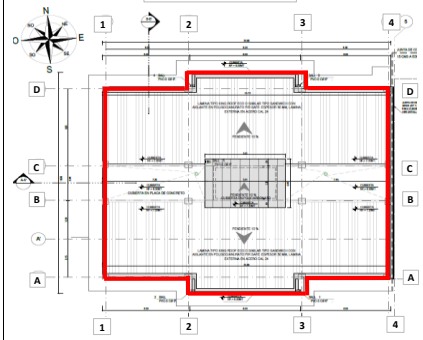
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº 1,1	UND: m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES ÁREA	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
ÁREA EDIFICIO EJES 1-4 NIVEL 0.00						
	EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4					
	N + 0.00	353,85		353,85	1	353,85
	N + 3.15	353,82		353,82	1	353,82
	N + 6.30	353,82		353,82	1	353,82
	DESCUENTO AREA EDIFICIO 2	80,37		80,37	-1	-80,37
ÁREA EDIFICIO EJES 1-4 NIVEL +3,15						
						
ÁREA EDIFICIO EJES 1-4 NIVEL +6,30						
						
					TOTAL ACTA No 10	981,12
					TOTAL PRESENTE ACTA	981,12

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma


VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Valanizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023		
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"		
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS		
ÍTEM Nº	1,2	UND:	m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN.		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES ÁREA	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
	**EDIFICIO 2 ENTE EJES 5-11**					
 	LOCALIACIÓN ENTE EJES 5-11	81,080		81,080	1	81,08
						
					TOTAL ACTA No 10	**81,08**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**81,08**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma


VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO A. MEDRO CATTENS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ITEM Nº 1,3	UND: m²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4**						
	UBICACIÓN DEL EDIFICIO						
	DESCAPOTE PARA EJES 1,4-A,D		0,0005		0,0005	-1	-0,0005
							
							
							
						TOTAL ACTA No 10	-0,0005
						TOTAL PRESENTE ACTA	-0,0005

Elaboró::

Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:

Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:

Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº 1,5	UND: m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

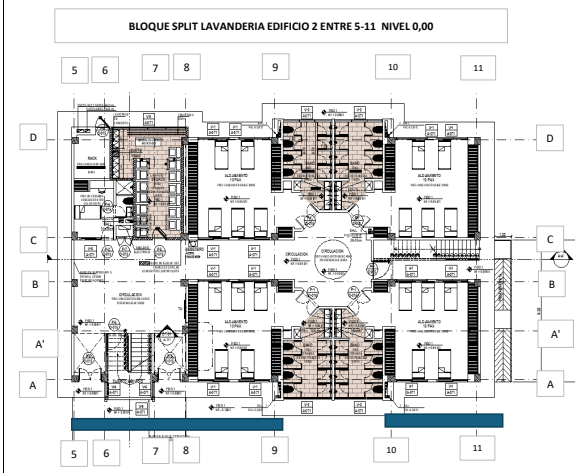



UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 2 ENTRE 5-11						
ENTRE A 5-9	0,9	14,13	0,08	1,01736	1	1,02
ENTRE A 10-11	0,9	8,2	0,08	0,5904	1	0,59
				TOTAL ACTA No 10		**1,61**
				TOTAL		**1,61**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma


VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098
			Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº: 2,1	UND: m3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

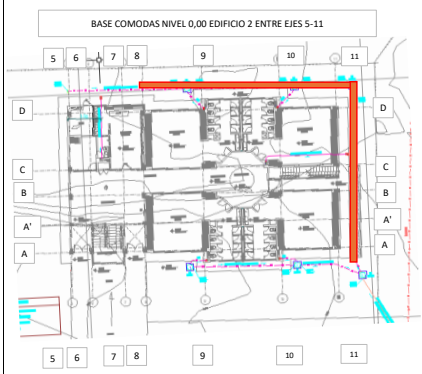PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	% RECONOCER	TOTAL
		Ancho (m)	Longitud (m)	Altura (m)			
							
	INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS						
	COMPLEMENTO-PARALELO A EJE 11	0,45	0,67	0,78	0,23	1	0,23
							
						TOTAL ACTA 10	**0,23**
						TOTAL PRESENTE ACTA	**0,23**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoria
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoria
Firma y Posfirma
EDUARDO ALFREDO CATHEMS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	Versión	4
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS


ÍTEM Nº	3.5	UND:	m3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

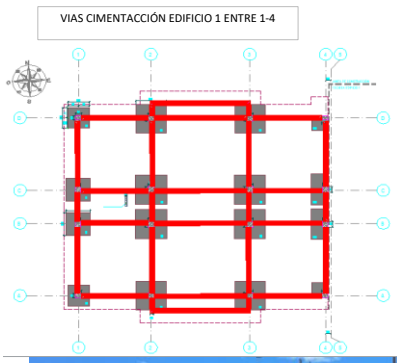







UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
VIGA A1-A2	0,5	0,3	5,5	0,03	1	0,03
VIGA B1-B2	0,5	0,3	5,6	0,03	1	0,03
VIGA C1-C2	0,5	0,3	5,6	0,03	1	0,03
VIGA D1-D2	0,5	0,3	5,5	0,03	1	0,03
VIGA VDB A2-A3	0,5	0,3	7,7	0,02	1	0,02
VIGA A2-A3	0,5	0,3	7,7	0,02	1	0,02
VIGA B2-B3	0,5	0,3	7,7	0,02	1	0,02
VIGA C2-C3	0,5	0,3	7,7	0,02	1	0,02
VIGA D2-D3	0,5	0,3	7,7	0,02	1	0,02
VIGA VDB D2-D3	0,5	0,3	7,7	0,02	1	0,02
VIGA A3-A4	0,5	0,3	5,7	0,03	1	0,03
VIGA B3-B4	0,5	0,3	5,8	0,03	1	0,03
VIGA C3-C4	0,5	0,3	5,8	0,02	1	0,02
VIGA D3-D4	0,5	0,3	5,7	0,02	1	0,02
VIGA A1-B1	0,5	0,3	5,85	0,02	1	0,02
VIGA B1-C1	0,5	0,3	2,55	0,02	1	0,02
VIGA C1-D1	0,5	0,3	5,85	0,02	1	0,02
				0,02		
VIGA VDB-A2	0,5	0,5	1,28	0,02	1	0,02
VIGA A2-B2	0,5	0,3	5,75	0,02	1	0,02
VIGA B2-C2	0,5	0,3	2,55	0,02	1	0,02
VIGA C2-D2	0,5	0,3	5,75	0,02	1	0,02
VIGA D2-VDB	0,5	0,5	1,27	0,02	1	0,02
				0,02		
VIGA VDB-A3	0,5	0,5	1,28	0,02	1	0,02
VIGA A3-B3	0,5	0,3	5,75	0,02	1	0,02
VIGA B3-C3	0,5	0,3	2,55	0,02	1	0,02
VIGA C3-D3	0,5	0,3	5,75	0,02	1	0,02
VIGA D3-VDB	0,5	0,5	1,27	0,02	1	0,02
				0,02		
VIGA A4-B4	0,5	0,3	5,85	0,02	1	0,02
VIGA B4-C4	0,5	0,3	2,55	0,02	1	0,02
VIGA C4-D4	0,5	0,3	5,85	0,02	1	0,02
VIGAS 9-10 A-D	1,27	0,2	0,5	0,02	1	0,02
CORRESPONDE A LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE ALTURA REAL EJECUTADA EN VIGAS DE CIMENTACIÓN						
				TOTAL ACTA No 10		**0,68**
TOTAL PRESENTE ACTA						**0,68**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoria
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO


Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoria
Firma y Posfirma
EDUARDO ALBERTO CATTENS


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONT	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJET	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL
CONT	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTER ... SOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ITEM Nº	4.2.1 — UND: — kg
DESCRIPCIÓN ITEM	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

EDIFICIO 1 ENTRE 1-4 NIVEL 0,00 SECTOR DE BAÑOS

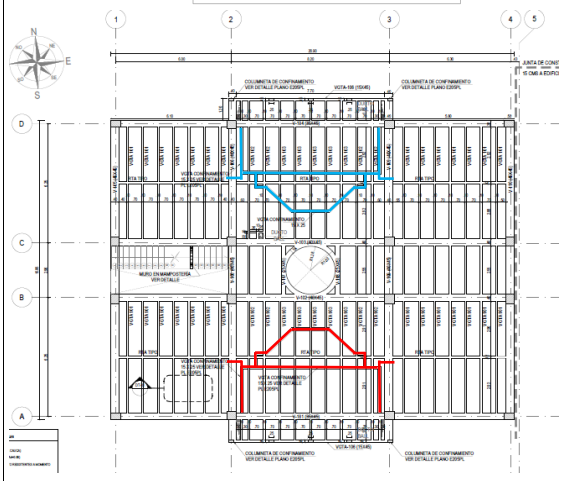

VIAS DE CONFINAMIENTO EDIFICIO 1 ENTRE 1-4 NIVEL 6,30 SECTOR DE CUBIERTA

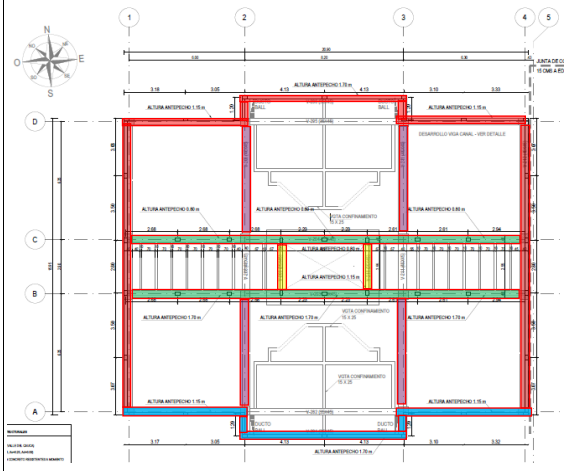

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Diametro	PESO ML	Nº DE ELEMENTOS	PESO TOTAL
	EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
	PRIMER PISO NIVEL 0,00						
	VIGA DE CONFINAMIENTO BAÑO ENTRE A2-A3-B2-B3						
	VIGA DE CONFINAMIENTO BAÑO ENTRE A2-A3		23,03	#3	0,56	4	51,59
	ESTRIOS VIGA CONFI BAÑO ENTRE A2-A3		0,62	#2	0,25	115	17,83
	VIGA DE CONFINAMIENTO BAÑO ENTRE C2-C3-D2-D3						
	VIGA DE CONFINAMIENTO BAÑO ENTRE D2-D3		23,03	#3	0,56	4	51,59
	ESTRIOS VIGA CONFI BAÑO ENTRE D2-D3		0,62	#2	0,25	115	17,83
	EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
	CUBIERTA NIVEL 6,30						
	EJE A1-A4		23,06	#3	0,56	4	51,65
			0,62	#2	0,25	115	17,83
	EJE D1-D4		23,06	#3	0,56	4	51,65
			0,62	#2	0,25	115	17,83
	EJE B1-B4		20,6	#3	0,56	4	46,14
			0,62	#2	0,25	103	15,97
	EJE C1-C4		20,6	#3	0,56	4	46,14
			0,62	#2	0,25	103	15,97
	EJE B2-C2		2,85	#3	0,56	4	6,38
			0,62	#2	0,25	14	2,17
	EJE B3-C3		2,85	#3	0,56	4	6,38
			0,62	#2	0,25	14	2,17
	EJE A1-D1		15,65	#3	0,56	4	35,06
			0,62	#2	0,25	78	12,09
	EJE A4-D4		15,65	#3	0,56	4	35,06
			0,62	#2	0,25	78	12,09
	CUCHILLA ENTRE A2-B2		6,3	#3	0,56	4	14,11
			0,62	#2	0,25	32	4,96
	CUCHILLA ENTRE A3-B3		6,3	#3	0,56	4	14,11
			0,62	#2	0,25	32	4,96
	CUCHILLA ENTRE C2-D2		6,3	#3	0,56	4	14,11
			0,62	#2	0,25	32	4,96
	CUCHILLA ENTRE C3-D3		6,3	#3	0,56	4	14,11
			0,62	#2	0,25	32	4,96
	GANCHOS		20	#3	0,56	1	11,2
	COLUMNETAS EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
	EN CUBIERTA NIVEL 6,30						
	ENTRE A1-A4		1,85	#3	0,56	16	16,58
			0,62	#2	0,25	19	2,95
			2,4	#3	0,56	20	26,88
			0,62	#2	0,25	24	3,72
	ENTRE B1-B4		1	#3	0,56	16	8,96
			0,62	#2	0,25	10	1,55
			1,45	#3	0,56	12	9,74
			0,62	#2	0,25	15	2,33
	ENTRE C1-C4		1	#3	0,56	16	8,96
			0,62	#2	0,25	10	1,55
			1,2	#3	0,56	12	8,06
			0,62	#2	0,25	12	1,86
	ENTRE D1-D4		1,85	#3	0,56	16	16,58
			0,62	#2	0,25	19	2,95
			2,4	#3	0,56	20	26,88
			0,62	#2	0,25	24	3,72
	ENTRE A1-D1		1,85	#3	0,56	48	49,73
			0,62	#2	0,25	19	2,95
	ENTRE A4-D4		1,85	#3	0,56	48	49,73
			0,62	#2	0,25	19	2,95
	TRASLAPOS VIGAS CONFINAMIENTO		2,16	#3	0,56	4	4,84
	EDIFICIO 1 ENTRE EJES 14						
	VIGAS CONFINAMIENTO BAÑOS SEGUNDO PISO						
	VIGAS CONINAMIENTO 12X25 EJES C-D		31,71	#3	0,56	4	71,03
	ESTRIBOS		0,62	#2	0,25	160	24,8
	COLUMNETAS SEGUND PISO		3,4	#3	0,56	8	15,23
			0,62	#2	0,25	54	8,37
			1,75	#3	0,56	12	11,76
			0,62	#2	0,25	33	5,12








EDIFICIO 1 ENTRE 1-4 NIVEL 3,15 SECTOR DE BAÑOS



COLUMNETAS EDIFICIO 1 ENTRE 1-4 NIVEL 6,30 SECTOR DE CUBIERTA

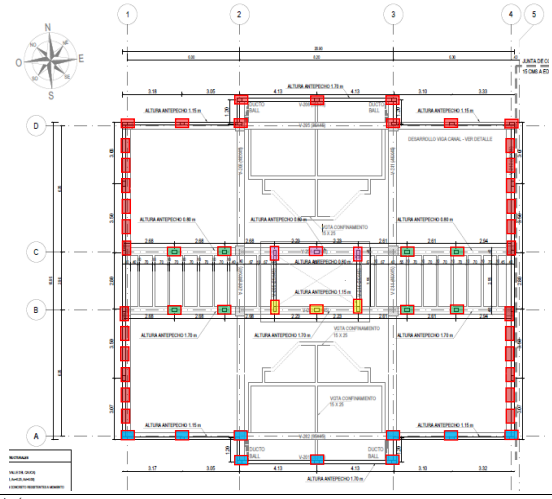







TOTAL ACTA No 10	990,68
TOTAL PRESENTE ACTA	990,68

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas


SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDWARDO ALFREDO CASTAÑAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	5,6 — UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	BASE CONCRETO SIMPLE DE 2000 PSI E=10CM MUEBLES
CORTE Nº:	10 — FECHA: 29/11/2024

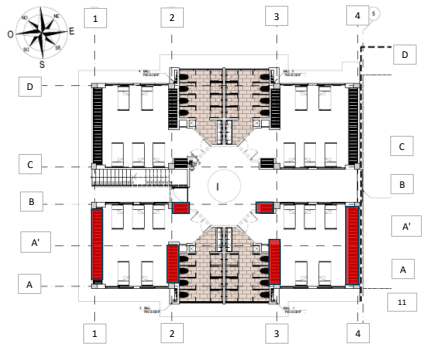PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
BASE CCOMODAS NIVEL 0,00 EDIFICIO 1 ENTRE 1-4							
	**EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4**						
	PRIMER PISO						
	ALOJAMIENTO A1-A2-B1-B2						
	COODA X 6	0,7	6		4,2	1	4,2
	DESCUENTO ESQUINA	0,25	0,15		0,04	-1	-0,04
	COMODA X3	0,7	3		2,1	1	2,1
	COMODA X 1	0,7	1		0,7	1	0,7
	ALOJAMIENTO A3-A4-B3-B4						
	COODA X 6	0,7	6		4,2	1	4,2
	DESCUENTO ESQUINA	0,25	0,15		0,04	-1	-0,04
	COMODA X3	0,7	3		2,1	1	2,1
	COMODA X 1	0,7	1		0,7	1	0,7
							
							
	 						
							
						TOTAL ACTA No 10	13,92
						TOTAL PRESENTE ACTA	13,92

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoria
Firma y Posfirma
José Alejandro Cellazos Rojas


SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Tairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoria
Firma y Posfirma
EDUARDO A. MEDRO CATTENIS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023


CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº: 6.1.9	UND: UN
DESCRIPCIÓN ÍTEM: TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 4"	
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	Ancho	Longitud	Diametro	UNIDAD	Nº DE ELEMENTOS	PESO TOTAL
 	**DESCOLGADO ZONA DE LAVANDERÍA**						
	PENDIENTE POR AJUSTE -FINAL COLECTOR SANITARIO				1	-1	-1
						TOTAL ACTA No 10	**-1,00**
						TOTAL PRESENTE ACTA	**-1,00**

Elaboró:: Miguel Rios Ing. Miguel Felipe Rios Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma José Alejandro Collazos Rojas SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO
Revisó: Arq. Jairo Villamizar Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma EDUARDO ALBERTO CASTAÑAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº 6.4.1	UND: M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.
CORTE Nº: 10	FECHA 29/11/2024

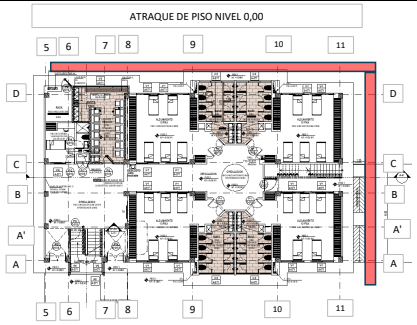
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**ENTRE CAJA AFUERA DE LAVANDERÍA Y EJE D11**						
	INRAESTRUCTURA AGUAS RESIDUALES	0,45	27,16	0,45	5,50	1	5,50
	INRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS	0,45	21,7	0,45	4,39	1	4,39
	DESCUENTO TUBO	3,141592654	48,86	0,0762	0,018241469	-1	**-0,89**
	FRENTE EJE D11 HASTA FRENTE EJE A11						
	INRAESTRUCTURA AGUAS RESIDUALES	0,45	27,16	0,45	5,50	1	5,50
	INRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS	0,45	21,7	0,45	4,39	1	4,39
	DESCUENTO TUBO	3,141592654	48,86	0,0762	0,018241469	-1	**-0,89**
	pendiente en modificatorio 4						-7,01
							
							
							
							
					TOTAL ACTA No 10		**11,00**
					TOTAL PRESENTE ACTA		**11,00**

Elaboró::	VoBo:
Ing. Miguel Felipe Rios Residente de Obra Firma y Posfirma	Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó:
Arq. Jairo Villamizar Director de Obra Firma y Posfirma	Director de Interventoría Firma y Posfirma


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	7.7.6 — UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO COBRE 1 X #12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1 X #12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1 X #12CU-AWG-DESN TIERRA ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Diametro	CANTIDAD PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	PESO TOTAL
TOMAS GFCI BAÑOS PRIMER PISO EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11	**EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11**						
	PRIMER PISO NIVEL 0,00						
	BAÑO 1 EJE A9					2	2
	BAÑO 1 EJE A10					2	2
	BAÑO 1 EJE D9					2	2
	BAÑO 1 EJE D10					2	2
	PRIMER PISO NIVEL 0,00						
	BAÑO 1 EJE A9					2	2
	BAÑO 1 EJE A10					2	2
						TOTAL ACTA 10	12
						TOTAL PRESENTE ACTA	**12,00**

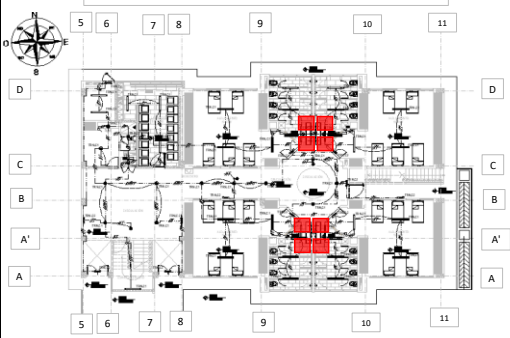

TOMAS GFCI BAÑOS SEGUNDO PISO EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11

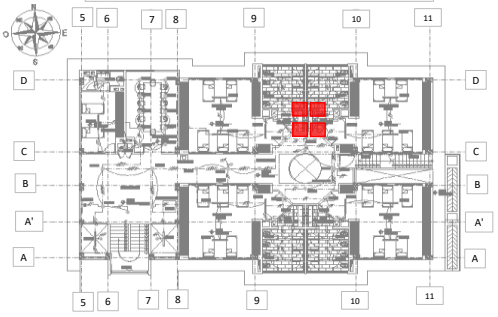














Elaboró::	VoBo:
Ing. Miguel Felipe Rios Residente de Obra Firma y Posfirma	Residente de Interventoría Firma y Posfirma José Alejandro Collazos Rojas SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO
Revisó: Arq. Jairo Villamizar Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma EDUARDO ALBERTO CASTAÑEDA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	7.7.10 — UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA LED HERMETICA T8, 2X18W, 3200LM, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

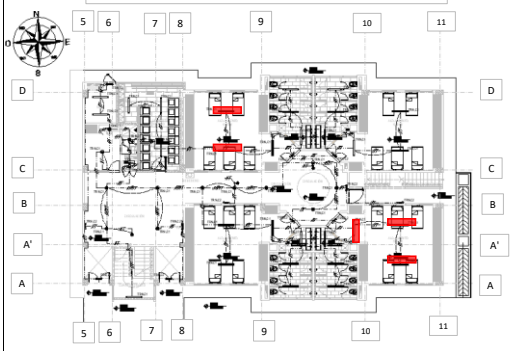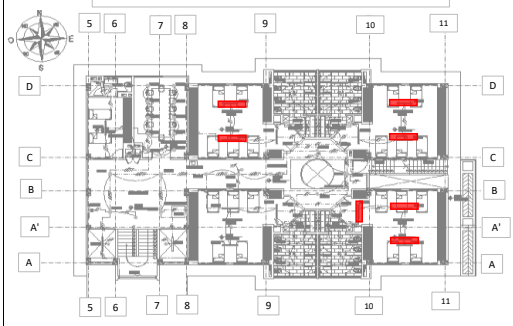PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Diametro	CANTIDAD PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	PESO TOTAL
LAMPARAS HERMETICAS PRIMER PISO EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11							
	**EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11**						
	PRIMER PISO NIVEL 0,00						
	ALOJAMIENTO ENTRE A10-A11-B10-B11					3	3
	ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9					2	2
	SEGUNDO PISO NIVEL 3,15						
	ALOJAMIENTO ENTRE A10-A11-B10-B11					2	2
	ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9					2	2
	ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11					3	3
LAMPARAS HERMETICAS SEGUNDO PISO EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11							
							
							
 							
							
						TOTAL ACTA 10	12
						TOTAL PRESENTE ACTA	**12,00**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas — SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO


Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO ALBERTO CATTEGNIS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	7.10.1.1 — UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PANEL CENTRAL DE INCENDIOS INTEGRABLE CON PLATAFORMA INTEGRACION, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LOS EQUIPOS DE BOSCH, HONEYWELL Y SIMPLEX, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES longitud	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
	EN CUARTO DE RACK JUNTO A EJE D5				1,00	1	1,00
						TOTAL ACTA 10	1,00
						TOTAL PRESENTE ACTA	1,00

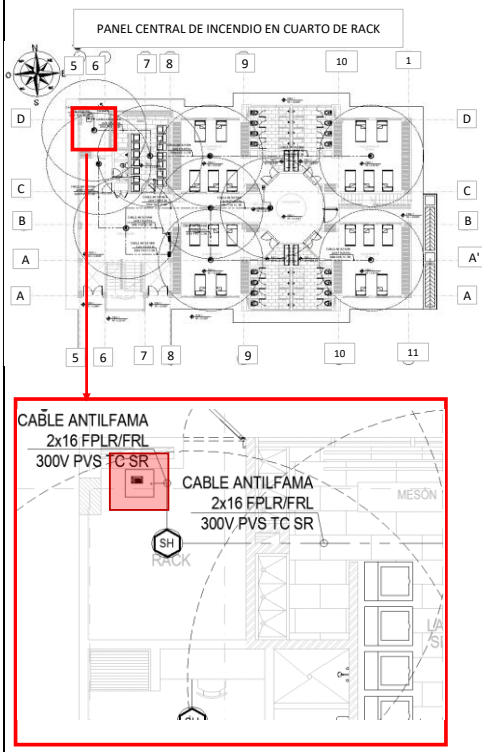







Elaboró::	VoBo:
Ing. Miguel Felipe Rios Residente de Obra Firma y Posfirma	Residente de Interventoría Firma y Posfirma José Alejandro Collazos Rojas
Revisó:	Autorizó:
Arq. Jairo Villamizar Director de Obra Firma y Posfirma	Director de Interventoría Firma y Posfirma EDUARDO ALBERTO CASTAÑEDA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	7.10.1.2 — UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TECLADO REMOTO PANEL INCENDIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LOS EQUIPOS DE BOSCH, HONEYWELL Y SIMPLEX, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES longitud	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
PANEL CENTRAL DE INCENDIO EN CUARTO DE RACK							
	EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
	EN CUARTO DE RACK JUNTO A EJE D5				1,00	1	1,00
CABLE ANTILFAMA 2x16 FPLR/FRL 300V PVS TC SR							
						TOTAL ACTA 10	1,00
						TOTAL PRESENTE ACTA	1,00

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO


Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	7.10.1.6 — UND: ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CABLE ANTIFLAMA 2X16 FPLR/FRL OS 300 V PVS TC SR, PARA SISTEMAS CONTRAINCENDIOS, INCLUYE TODOS LOS ACCERORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES longitud	ANCHO	ALTO	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
	PRIMER NIVEL						
	TRAMO 1	27,64				1	27,64
	BAJA A TABLERO	2				1	2,00
	TRAMO 2	63,6				1	63,60
	BAJA A TABLERO PRINCIPAL	2				1	2,00
	TRAMO 3	17,53				1	17,53
	BAJA A TABLERO PRINCIPAL	3				1	3,00
	TRAMO 4	17,58				1	17,58
	TECLADO	6				1	6,00
	BAJA A TABLERO PRINCIPAL	2				1	2,00
	BAJA SENSORES	4				1	4,00
	SEGUNDO NIVEL						
	TRAMO 1	29,4				1	29,40
	BAJA A TABLERO	6				1	6,00
	TRAMO 2	59,97				1	59,97
					TOTAL ACTA 10		**240,72**
					TOTAL PRESENTE ACTA		**240,72**

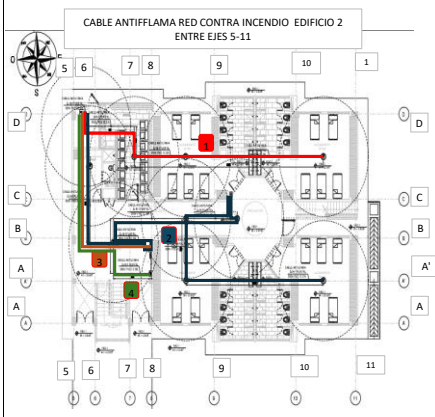

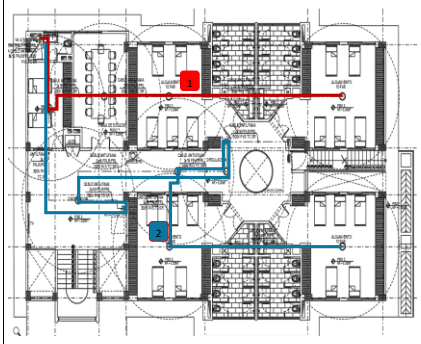











Elaboró:: Ing. Miguel Felipe Rios Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría Firma y Posfirma José Alejandro Collazos Rojas SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO
Revisó: Arq. Jairo Villamizar Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría Firma y Posfirma EDUARDO A. RICO CAICEDO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS

ÍTEM Nº	10,1	UND:	m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA










UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
UNIDAD SANITARIA EJE A9		1,05	2,6	2,73	1	2,73
		0,15	2,25	0,34	1	0,34
		1,05	2,6	2,73	1	2,73
		1,9	2,6	4,94	1	4,94
		0,87	2,6	2,26	1	2,26
		0,67	2,6	1,74	1	1,74
		1,12	0,35	0,39	2	0,78
		0,09	2,6	0,23	1	0,23
		0,5	2,6	1,3	1	1,3
		0,6	2,6	1,56	1	1,56
		0,55	2,6	1,43	1	1,43
		0,15	2,25	0,34	1	0,34
		1,3	2,6	3,38	1	3,38
		3,76	2,6	9,78	1	9,78
		3,43	1,6	5,49	1	5,49
		3,76	2,6	9,78	1	9,78
CARTERAS DE FACHADAS EDIICIO 2						
EN FACHADA ENTRE A8-A9		4,2	0,15	0,63	4	2,52
EN FACHADA ENTRE A9-A10		5,4	0,15	0,81	4	3,24
EN FACHADA ENTRE A10-A11		4,2	0,15	0,63	4	2,52
EN FACHADA ENTRE D8-D9		4,2	0,15	0,63	4	2,52
EN FACHADA ENTRE D9-D10		5,4	0,15	0,81	4	3,24
EN FACHADA ENTRE D10-D11		4,2	0,15	0,63	4	2,52
EN FACHADA ENTRE D5-D8		4,25	0,15	0,64	2	1,28
		7,2	0,15	1,08	1	1,08
		5,4	0,15	0,81	1	0,81
EN ACHADA B11-C11		5,6	0,15	0,84	1	0,84
FACHADA S						
FACHADA ENTRE A5-A8		10,48	8	83,84	1	83,84
DESCUENTOS PUERTAS (P5)		1,6	2,7	4,32	-2	-8,64
VENTANA V4		1	0,6	0,6	-2	-1,2
VENTANA V6		1,6	2,2	3,52	-2	-7,04
VENTANA V7		3	2,2	6,6	-1	-6,6
EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
PRIMER PISO						
UNIDAD SANITARIA EJE A3		1,05	2,6	2,73	1	2,73
		0,15	2,25	0,34	1	0,34
		1,05	2,6	2,73	1	2,73
		1,9	2,6	4,94	1	4,94
		0,87	2,6	2,26	1	2,26
		0,67	2,6	1,74	1	1,74
		0,18	2,6	0,47	1	0,47
		0,5	2,6	1,3	1	1,3
		0,5	2,6	1,3	1	1,3
		0,55	2,6	1,43	1	1,43
		0,15	2,25	0,34	1	0,34
		1,3	2,6	3,38	1	3,38
		3,76	2,6	9,78	1	9,78
		3,43	1,6	5,49	1	5,49
		3,76	2,6	9,78	1	9,78
UNIDAD SANITARIA EJE A2		1,05	2,6	2,73	1	2,73
		0,15	2,25	0,34	1	0,34
		1,05	2,6	2,73	1	2,73
		1,9	2,6	4,94	1	4,94
		0,87	2,6	2,26	1	2,26
		0,67	2,6	1,74	1	1,74
		0,18	2,6	0,47	1	0,47
		0,5	2,6	1,3	1	1,3
		0,5	2,6	1,3	1	1,3
		0,55	2,6	1,43	1	1,43
		0,15	2,25	0,34	1	0,34
		1,3	2,6	3,38	1	3,38
		3,76	2,6	9,78	1	9,78
		3,43	1,6	5,49	1	5,49
		3,76	2,6	9,78	1	9,78

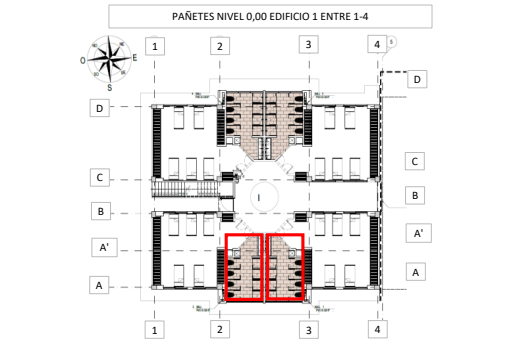PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	 						
						TOTAL ACTA No 10	225,76
						TOTAL PRESENTE ACTA	225,76

Elaboró::

Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoria
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:

Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:


Director de Interventoria
Firma y Posfirma
EDUARDO ALBERTO CASTAÑEDA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023


CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	10,2 — UND: m2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PAÑETES NIVEL 0,00 EDIFICIO 1 ENTRE 1-4

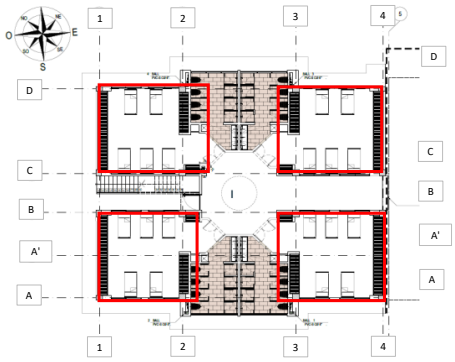

PAÑETES NIVEL 3,15 EDIFICIO 1 ENTRE 1-4

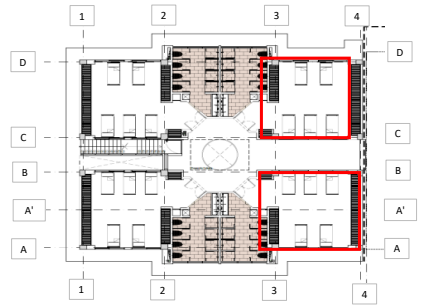











UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
PRIMER PISO						
A3-A4-B3-B4		34,48	2,6	89,65	1	89,65
DESCUENTO VENTANAS		2,2	1	2,2	-4	-8,8
DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,25	3,38	-1	-3,38
DESCUENTO ACCESO BAÑO		1,11	2,6	2,89	-1	-2,89
CARTERA PUERTA P1		6	0,15	0,9	1	0,9
CARTERA ACCESO BAÑOS		4,9	0,15	0,74	1	0,74
C3-C4-D3-D4		34,48	2,6	89,65	1	89,65
DESCUENTO VENTANAS		2,2	1	2,2	-4	-8,8
DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,25	3,38	-1	-3,38
DESCUENTO ACCESO BAÑO		1,11	2,6	2,89	-1	-2,89
CARTERA PUERTA P1		6	0,15	0,9	1	0,9
CARTERA ACCESO BAÑOS		4,9	0,15	0,74	1	0,74
A1-A2-B1-B2		34,08	2,6	88,608	1	88,61
DESCUENTO VENTANAS		2,2	1	2,2	-4	-8,8
DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38
DESCUENTO ACCESO BAÑO		1,11	2,6	2,89	-1	-2,89
CARTERA PUERTA P1		6	0,15	0,9	1	0,9
CARTERA ACCESO BAÑOS		4,9	0,15	0,735	1	0,74
C1-C2-D1-D2		33,92	2,6	88,19	1	88,19
DESCUENTO VENTANAS		2,2	1	2,2	-2	-4,4
DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,25	3,38	-1	-3,38
DESCUENTO ACCESO BAÑO		1,11	2,6	2,89	-1	-2,89
CARTERA PUERTA P1		6	0,15	0,9	1	0,9
CARTERA ACCESO BAÑOS		4,9	0,15	0,74	1	0,74
SEUNDO PISO						
A3-A4-B3-B4		34,48	2,6	89,65	1	89,65
DESCUENTO VENTANAS		2,2	1	2,2	-4	-8,8
DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,25	3,38	-1	-3,38
DESCUENTO ACCESO BAÑO		1,11	2,6	2,89	-1	-2,89
CARTERA PUERTA P1		6	0,15	0,9	1	0,9
CARTERA ACCESO BAÑOS		4,9	0,15	0,74	1	0,74
C3-C4-D3-D4		34,48	2,6	89,65	1	89,65
DESCUENTO VENTANAS		2,2	1	2,2	-4	-8,8
DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,25	3,38	-1	-3,38
DESCUENTO ACCESO BAÑO		1,11	2,6	2,89	-1	-2,89
CARTERA PUERTA P1		6	0,15	0,9	1	0,9
CARTERA ACCESO BAÑOS		4,9	0,15	0,74	1	0,74
				TOTAL ACTA No 10		**459,22**
				TOTAL		**459,22**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO ALFREDO CASTAÑEDA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	11,1 — UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIELO RASO PVC 9 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Area	DIMENSIONES Diametro	medida parcial	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-8					
	PRIMER PISO					
	1. ALOJAMIENTO ENTRE A8-A9-B8-B9	46,63		46,63	1	46,63
	2. ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9	46,63		46,63	1	46,63
	3. ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11	46,51		46,51	1	46,51
	4. ALOJAMIENTO ENTRE A10-A11-B10-B11	46,55		46,55	1	46,55
	SEGUNDO PISO					
	1. ALOJAMIENTO ENTRE A8-A9-B8-B9	46,63		46,63	1	46,63
	2. ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9	46,63		46,63	1	46,63
	3. ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11	46,51		46,51	1	46,51
	4. ALOJAMIENTO ENTRE A10-A11-B10-B11	46,55		46,55	1	46,55
					TOTAL ACTA 10	**372,64**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**372,64**

























Elaboró:
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO A. NIÑO CATAÑO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº: 12,1	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


ALISTADO DE PISO NIVEL 0,00

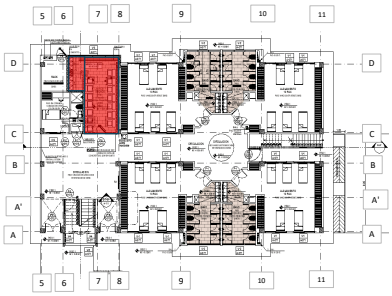

ALISTADO DE PISO NIVEL 3,15





SOBREPISO NIVEL 0,00 EDIFICIO 1 ENTRE 1-4

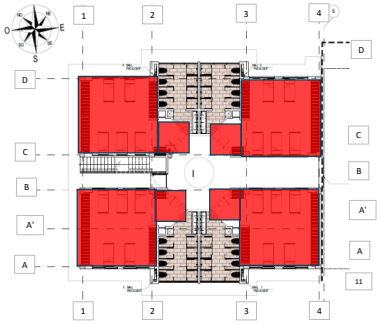



UBICACIÓN	DIMENSIONES Área	DIMENSIONES Diametro	medida parcial	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11					
PRIMER PISO NIVEL 0,00					
ÁREA DE LAVANDERÍA ENTRE C-D-5-8	27,98		27,98	1	27,98
SEGUNDO PISO NIVEL 0,00					
ÁREA DE BAÑO VIP ENTRE C-D-5-8	4,77		4,77	1	4,77
EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11					
PRIMER PISO NIVEL 0,00					
ALOJAMIENTO NTRE EJE A1-A2-B1-B2	46,75			1	46,75
ALOJAMIENTO NTRE EJE A3-A4-B3-B4	48,02			1	48,02
ALOJAMIENTO C3-C4-D3-D4	48,02			1	48,02
ALOJAMIENTO C1-C2-D1-D2	46,68			1	46,68
EDIFICIO 2 ENTRE 5-11					
PRIMER PISO					
ESCALERAS ETRE 6.7					
HUELLAS	0,45		0,45	16	7,2
	5,5125		5,5125	1	5,51
CONTRAHUELLAS	0,2625		0,2625	18	4,73









TOTAL ACTA 10	239,66
TOTAL PRESENTE ACTA	239,66

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO


Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO ALFREDO CASTAÑEDA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº: 12,4	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERAMICA VANCOUVER DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR BEIGE CORONA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACIÓN TIPO TRABADO EN ALOJAMIENTOS.
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		AREA	ALTURA			
ALOJAMIENTOS NIVEL 0,00 EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
	EDIFICIO 2 ENTRE 5-11					
	PRIMER PISO					
	ALOJAMIENTO ENTRE A8-A9-B8-B9	39,63		39,63	1	39,63
	ALOJAMIENTO ENTRE A10-A11-B10-B11	39,63		39,63	1	39,63
	ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9	39,63		39,63	1	39,63
	ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11	39,56		39,56	1	39,56
	EDIFICIO 2 ENTRE 5-11					
	SEGUNDO PISO					
	ALOJAMIENTO ENTRE A10-A11-B10-B11	39,63		39,63	1	39,63
	ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9	39,63		39,63	1	39,63
	ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11	39,56		39,56	1	39,56
ALOJAMIENTOS NIVEL3,15 EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
				TOTAL ACTA 10		277,27
				TOTAL PRESENTE ACTA		277,27

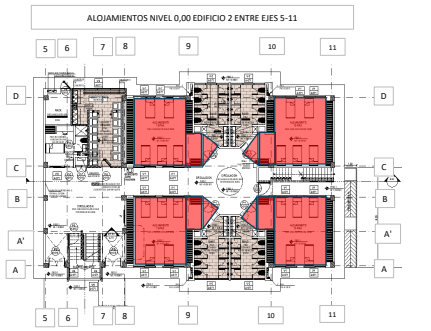

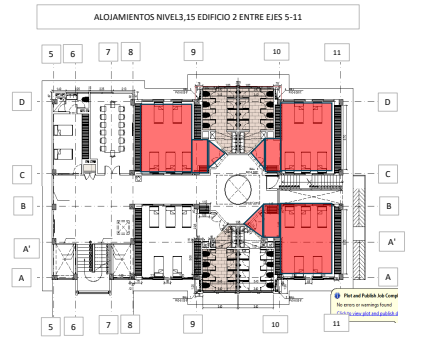

















Elaboró::
Residente de Obra
Firma y Posfirma


Revisó:
Arq. Jaime Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO A. MEJIA CATAÑO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº 12,5	UND: ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERAMICA VANCOUVER DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR BEIGE O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACIÓN TIPO TRABADO EN ALOJAMIENTOS.
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

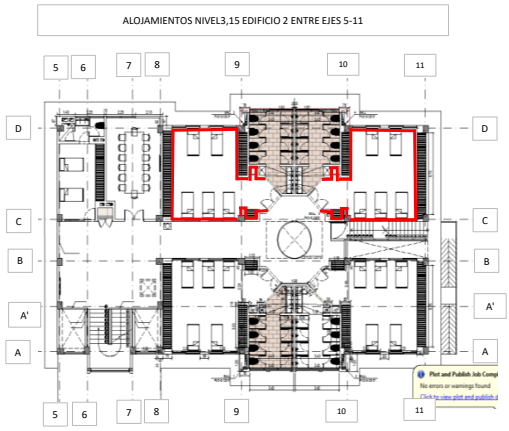
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ALTURA	MEDIDA PARCIL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	**EDIFICIO 2 ENTRE 5-11**					
	SEGUNDO PISO					
	ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9	27,3		27,3	1	27,3
	ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11	27,3		27,3	1	27,3
 						
						
						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS

ÍTEM Nº	12,6	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

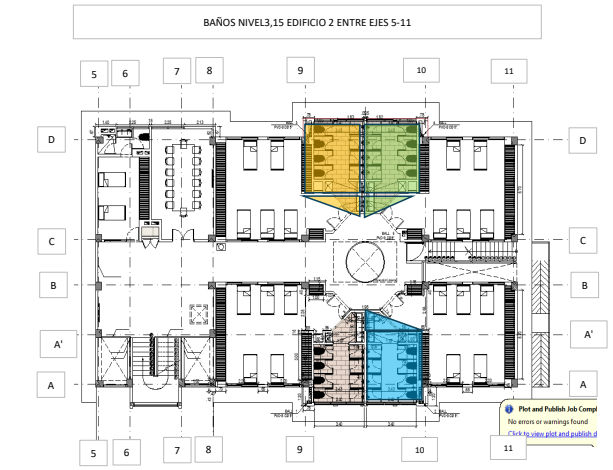







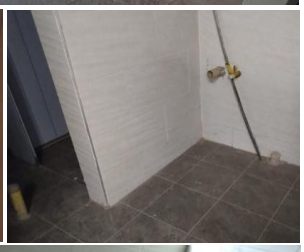



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA	Nº DE	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 2 ENTRE 5-11						
SEGUNDO PISO						
BAÑO ENTRE A9-A10-B9-B10	16,66			16,66	1	16,66
BAÑO ENTRE D9-D10-C9-C10	16,66			16,66	1	16,66
BAÑO ENTRE D9-D10-C9-C10	16,66			16,66	1	16,66
				TOTAL ACTA 10		49,98
				TOTAL PRESENTE ACTA		**49,98**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO


Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO A. RICAURTE CAICEDO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	12,7 — UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

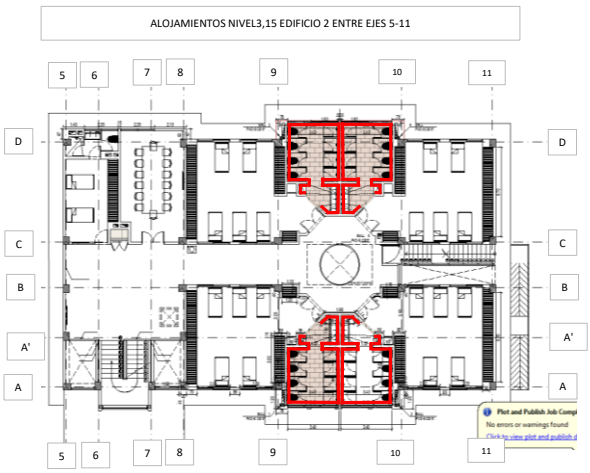










UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	ALTURA	MEDIDA PARCIL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 2 ENTRE 5-11						
SEGUNDO PISO						
BAÑO ENTRE A10-B10		6,9	2,25	15,53	1	15,53
		9,41	2,25	21,17	1	21,17
		3,4	1,2	4,08	1	4,08
		4,8	0,17	0,82	1	0,82
		11,51	0,12	1,38	1	1,38
BAÑO ENTRE A9-B9		6,9	2,25	15,53	1	15,53
		9,41	2,25	21,17	1	21,17
		3,4	1,2	4,08	1	4,08
		4,8	0,17	0,82	1	0,82
		11,51	0,12	1,38	1	1,38
BAÑO ENTRE A10-B10		6,9	2,25	15,53	1	15,53
		9,41	2,25	21,17	1	21,17
		3,4	1,2	4,08	1	4,08
		4,8	0,17	0,82	1	0,82
		11,51	0,12	1,38	1	1,38
BAÑO ENTRE A10-B10		6,9	2,25	15,53	1	15,53
		9,41	2,25	21,17	1	21,17
		3,4	1,2	4,08	1	4,08
		4,8	0,17	0,82	1	0,82
		11,51	0,12	1,38	1	1,38
PRIMER PISO						
BAÑO ENTRE A9-B9		4,8	0,17	0,82	1	0,82
		11,51	0,12	1,38	1	1,38
BAÑO ENTRE A10-B10		4,8	0,17	0,82	1	0,82
		11,51	0,12	1,38	1	1,38
BAÑO ENTRE A9-B9		4,8	0,17	0,82	1	0,82
		11,51	0,12	1,38	1	1,38
BAÑO ENTRE A10-B10		4,8	0,17	0,82	1	0,82
		11,51	0,12	1,38	1	1,38
					TOTAL ACTA 10	**180,72**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**180,72**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma


Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	13,1 — UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

ESTUCO Y PINTURA INTERIOR NIVEL 00
EDIFICIO 2 ENTRE 5-11

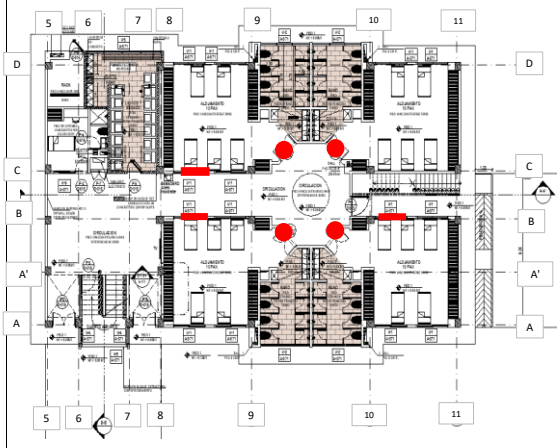

ESTUCO Y PINTURA NIVEL 3,15 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11

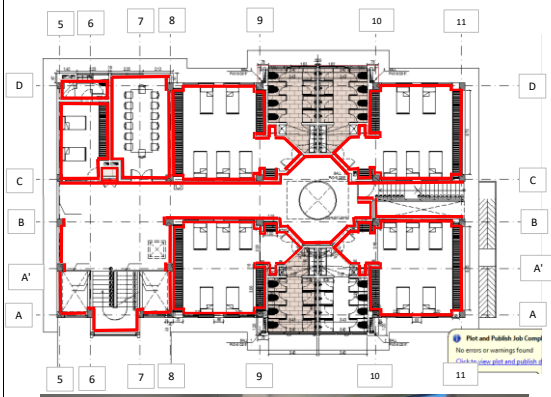





PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	ALTURA	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO 2 ENTRE 5-11						
	PRIMER PISO						
	ALOJAMIENTO ENTRE A8-A9-B8-B9						
	CARTERAS VENTANAS B8-B9		6,4	0,15	0,96	1	0,96
	ALOJAMIENTO ENTRE A10-A11-B10-B11						
	CARTERAS VENTANAS B10-B11		6,4	0,15	0,96	1	0,96
	ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9						
	CARTERAS VENTANAS C8-C9		6,4	0,15	0,96	1	0,96
	ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11						
	MUROS HALL ALOJAMIENTO		1,67	2,5	4,18	1	4,18
	PUERTA P1 4 LOJAMIENTOS		1,5	0,2	0,3	4	1,2
	EDIFICIO 2 ENTRE 5-11						
	SEGUNDO PISO						
	ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9						
	MURO ENTRE D8-D9		5,65	2,5	14,13	1	14,13
	DESCCUENTO VENTANA D8-D9		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	AREA COMODA X 6		7,4	2,4	17,76	1	17,76
	MURO ENTRE C8-C9		6,55	2,5	16,38	1	16,38
	CARTRAS VENTANAS C8-C9		6,4	0,15	0,96	2	1,92
	DESCUENTO VENTANAS C8-C9		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	AREA COMODA X 3		4,4	2,4	10,56	1	10,56
	MUROS HALL ALOJAMIENTO		7,74	2,5	19,35	1	19,35
	CARTERA PUERTA P1		5,9	0,15	0,89	1	0,89
	CARTERA ACCESO A BAÑOS		5,91	0,15	0,89	1	0,89
	DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
	DESCUENTO VANO ACCESO BAÑO		1,11	2,4	2,66	-1	-2,66
	AREA COMODA X 1		2,4	2,4	5,76	1	5,76
	ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11						
	MURO ENTRE D10-11		5,8	2,5	14,5	1	14,5
	DESCUENTO VENTANAS D10-D11		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	AREA COMODA X 6		7,4	2,4	17,76	1	17,76
	MURO ENTRE C10-C11		6,35	2,5	15,88	1	15,88
	DESCUENTO VENTANAS D10-D11		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	CARTERA VENTANAS MURO C10-C11		6,4	0,15	0,96	2	1,92
	AREA COMODA X 3		4,4	2,4	10,56	1	10,56
	MUROS HALL ALOJAMIENTO		7,74	2,5	19,35	1	19,35
	CARTERA PUERTA P1		5,9	0,15	0,89	1	0,89
	CARTERA ACCESO A BAÑOS		5,91	0,15	0,89	1	0,89
	DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
	DESCUENTO VANO ACCESO BAÑO		1,11	2,4	2,66	-1	-2,66
	AREA COMODA X 1		2,4	2,4	5,76	1	5,76
	PASILLO						
	PASILLO EJE B		8	2,5	20	1	20
	DESCUENTO VENTANA PASILLO EJE B		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	PASILLO EJE C		8	2,5	20	1	20
	DESCUENTO VENTANA PASILLO EJE C		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	CIRCULACIONES						
	HALL PRINCIPAL ALOJAMIENTOS ENTE B-C-9-10		19,97	2,5	49,93	1	49,93
	DESCUENTO PUERTAS ALOJAMIENTOS P1		1,5	2,2	3,3	-4	-13,2
	DESCUENTO PUERTA PASILLO EMERENCIA P6		1,2	2,2	2,64	-1	-2,64
	DESCUENTO VENTANA SALIDA EMERGENCIA		1,2	1,8	2,16	-1	-2,16
	CARA EXTERIOR VENTANA Y PUERTA EMERENCIA		3,7	2,5	9,25	1	9,25
	DESCUENTO PUERTA PASILLO EMERENCIA P6		1,2	2,2	2,64	-1	-2,64
	DESCUENTO VENTANA SALIDA EMERGENCIA		1,2	1,8	2,16	-1	-2,16
	MURO ENTRE B10-B11		6	3,1	18,6	1	18,6
	DESCUENTO VENTANAS		2,2	1	2,2	-4	-8,8
	MURO ENTRE C10-C11		6	3,1	18,6	1	18,6
	HALL ESCALERAS						
	MURO EJE C5-C8		7,69	2,5	19,23	1	19,23
	DESCCUENTO PUERTA SALA REUNIONES		1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
	DESCUENTO PUERTA ASEO		1,2	2,2	2,64	-1	-2,64
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO VIP		0,9	2,2	1,98	-1	-1,98
	DESCUENTO VENTANA ALOJAMIENTO VIP		1,5	1	1,5	-1	-1,5
	MURO EJES A5-B5		8,05	2,5	20,13	1	20,13
	MURO EJE A5-A8		10,98	3,15	34,59	1	34,59
	DESCENTO VENTANA V7 EN ESCCALERA		3	2,2	6,6	-1	-6,6
	DESCUENTO VNTANA V6 EN ESCALEERAS		1,6	2,2	3,52	-1	-3,52
	MURO EJES A8-B8		7,65	2,5	19,13	1	19,13
	SALA DE REUNIONES						
	MURO ENTRE C8-D8		7,92	2,5	19,8	1	19,8
	MURO ENTRE D6-D8		4,23	2,5	10,58	1	10,58
	MURO ENTRE C6-D6		7,75	2,5	19,38	1	19,38
	MURO ENTRE C6-C8		3,2	2,5	8	1	8
	DESUENTO VENTANA V5		2,25	1	2,25	-1	-2,25
	DESCUENTO PERTA P1 SALA		1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
	ALOJAMIENTO VIP						
	MUROS		17,74	2,5	44,35	1	44,35
	DESCUENTO PUERTA P2 ALJAMIENTO VIP		0,9	2,2	1,98	-1	-1,98
	DESCUENTO PERTA P4 BAÑO		0,8	2,2	1,76	-1	-1,76
	DESCUENTO VENTANA ALOJAMMIENTO VIP		1,5	1	1,5	-1	-1,5

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	ALTURA			
	DESCUENTO PISO COMODAS		5,4	0,1	0,54	-1	-0,54
	CUARTO DE ASEO						
	MUROS		4	2,5	10	1	10
	DESCUENTO PUERTA P7		1,2	2,2	2,64	-1	-2,64
	EDIFICIO 1 ENTRE 1-4						
	ALOJAMIENTO ENTRE A3-A4-B3-B4						
	MURO ENTRE A3-A4		5,85	2,55	14,92	1	14,92
	DESCCUENTO VENTANA D8-D9		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	AREA COMODA X 6		7,4	2,4	17,76	1	17,76
	MURO ENTRE B3-B4		6,6	2,55	16,83	1	16,83
	CARTRAS VENTANAS C8-C9		6,4	0,15	0,96	2	1,92
	DESCUENTO VENTANAS C8-C9		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	AREA COMODA X 3		4,4	2,45	10,78	1	10,78
	MUROS HALL ALOJAMIENTO		7,7	2,55	19,64	1	19,64
	CARTERA PUERTA P1		5,9	0,15	0,89	1	0,89
	CARTERA ACCESO A BAÑOS		5,91	0,15	0,89	1	0,89
	DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
	DESCUENTO VANO ACCESO BAÑO		1,11	2,45	2,72	-1	-2,72
	AREA COMODA X 1						
	ALOJAMIENTO ENTRE C3-C4-D3-D4						
	MURO ENTRE D3-D4		5,85	2,55	14,92	1	14,92
	DESCCUENTO VENTANA D8-D9		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	AREA COMODA X 6		7,4	2,4	17,76	1	17,76
	MURO ENTRE C8-C9		6,6	2,55	16,83	1	16,83
	CARTRAS VENTANAS C8-C9		6,4	0,15	0,96	2	1,92
	DESCUENTO VENTANAS C8-C9		2,2	1	2,2	-2	-4,4
	AREA COMODA X 3						
	MUROS HALL ALOJAMIENTO		7,7	2,55	19,64	1	19,64
	CARTERA PUERTA P1						
	CARTERA ACCESO A BAÑOS						
	DESCUENTO PUERTA P1		1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
	DESCUENTO VANO ACCESO BAÑO		1,11	2,45	2,72	-1	-2,72
	AREA COMODA X 1						
						TOTAL ACTA 10	546,61
						TOTAL PRESENTE ACTA	546,61














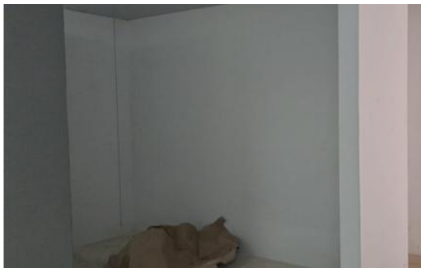

Elaboró::

Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó:

Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:

Director de Interventoría
Firma y Posfirma


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº: 13,2	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

ESTUCO Y PINTURA KORAZA NIVEL 00 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11

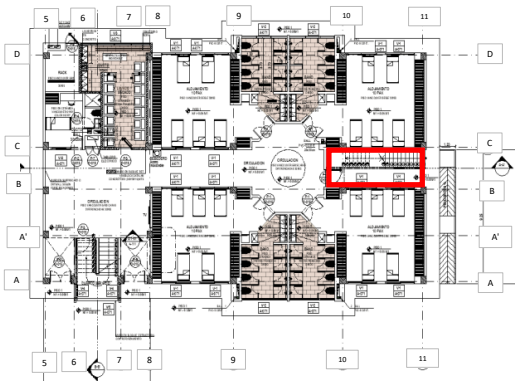

ESYUCO KORAZA NIVEL3,15 EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11

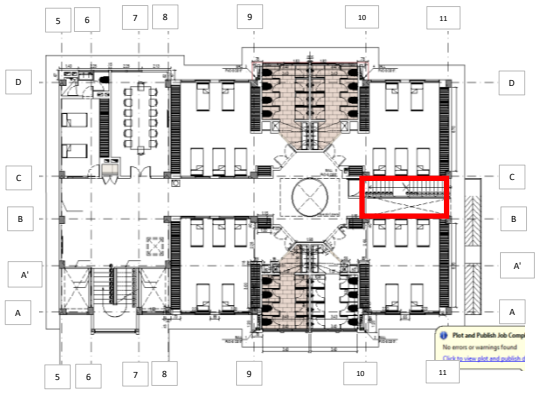







UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES ALTURA	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
EDIFICIO 2 ENTRE EJES						
PISO 1						
MURO PASILLO EMERGENCIA PRIMER PISO		12	3,15	37,8	1	37,8
DESCUENTO VENTANAS EJE B10-B11		2,2	1	2,2	-2	-4,4
DESCUENTO PUERTA DE EMERGENCIA ENTRE B10-C10		1,2	2,2	2,64	-1	-2,64
DESCUENTO VENTANAS EJE C10-C11		2,2	1	2,2	-2	-4,4
MURO DE PUERTA EMERENCIA B10-C10		5,54	2,7	14,96	1	14,96
DESCUUENTO ÁREA DE ESCALERA		1,51	1	1,51	-1	-1,51
PISO 2						
MURO PASILLO EMERGENCIA SEGUNDO PISO		17,55	2,5	43,88	1	43,88
DESCUENTO VENTANAS EJE B10-B11		2,2	1	2,2	-2	-4,4
DESCUENTO PUERTA DE EMERGENCIA ENTRE B10-C10		1,2	2,2	2,64	-1	-2,64
DESCUENTO VENTANAS EJE C10-C11		2,2	1	2,2	-2	-4,4
VENTANA JUNTO ACCESO EMERGENCIA		1,2	1,8	2,16	-1	-2,16
				TOTAL ACTA 10		70,09
				TOTAL PRESENTE ACTA		70,09

Elaboró:
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:
Arq. Claire Villarreal
Director de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS


ÍTEM Nº	16,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SILVER SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y/O SEGÚN DISEÑO, VIDRIO EN FACHADA DE COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN Y TRASPARENTE DE 5 MM EN INTERIORES, (INCLUYE MARCO Y ANGEO GRIS FIBRA DE VIDRIO COLMALLAS)		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	ALTURA			

VENTANAS PRIMER PISO NIVEL 0,00 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11

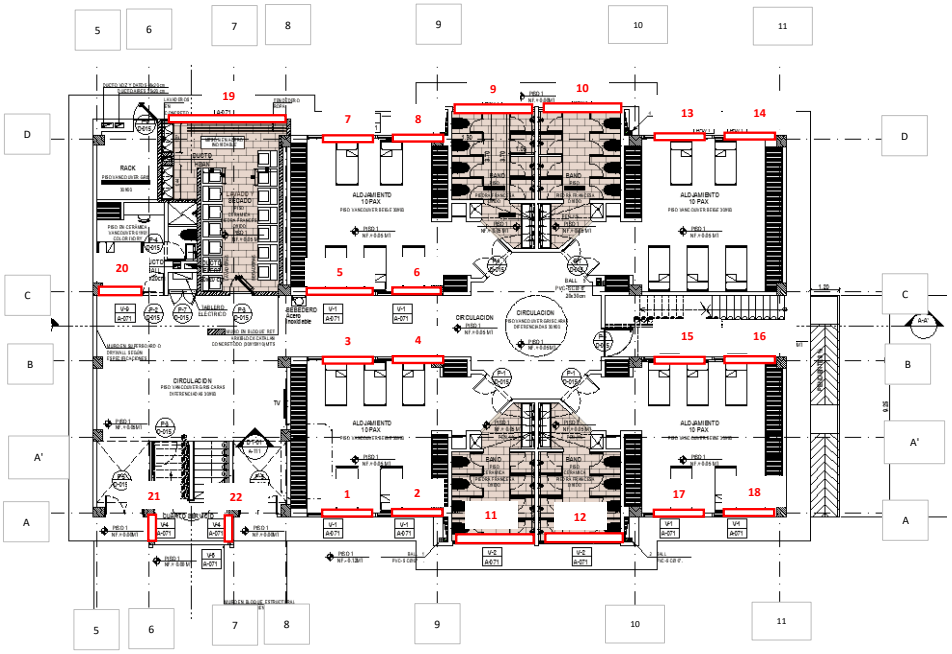

VENTANAS NIVEL3,15 EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11

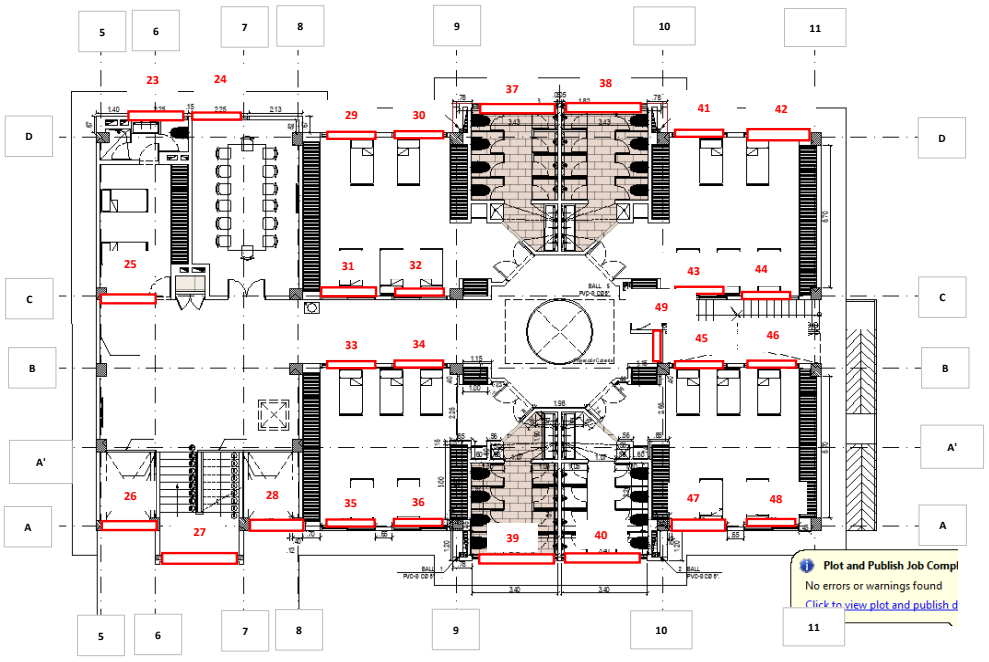

Plot and Publish Job Compl
No errors or warnings found
Click to view plot and publish d

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	ALTURA			
	EDIFICIO 2 ENTRE 5-11						
	PRIMER PISO NIVEL 0.00						
	ALOJAMIENTO ENTRE A8-A9-B8-B9						
	VENTANA 1		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 2		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 3		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 4		2,2	1	2,2	1	2,2
	ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9						
	VENTANA 5		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 6		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 7		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 8		2,2	1	2,2	1	2,2
	ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11						
	VENTANA 13		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 14		2,2	1	2,2	1	2,2
	ALOJAMIENTO ENTRE A10-A11-B10-B11						
	VENTANA 15		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 16		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 17		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 18		2,2	1	2,2	1	2,2
	BAÑO ENTRE A9-A10						
	VENTANA 11		3,4	1	3,4	1	3,4
	VENTANA 12		3,4	1	3,4	1	3,4
	BAÑO ENTRE D9-D10						
	VENTANA 11		3,4	1	3,4	1	3,4
	VENTANA 12		3,4	1	3,4	1	3,4
	ALOJAMIENTO VIP ENTRE C5-C8						
	VENTANA 20		1,5	1	1,5	1	1,5
	PUNTO FIJO ENTRE A5-A8						
	VENTANA 21		1	0,6	0,6	1	0,6
	VENTANA 22		1	0,6	0,6	1	0,6
	EDIFICIO 2 ENTRE 5-11						
	SEGUNDO PISO NIVEL 3,15						
	ALOJAMIENTO ENTRE C8-C9-D8-D9						
	VENTANA 29		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 30		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 31		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 32		2,2	1	2,2	1	2,2
	ALOJAMIENTO ENTRE A8-A9-B8-B9						
	VENTANA 33		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 34		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 35		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 36		2,2	1	2,2	1	2,2
	ALOJAMIENTO ENTRE C10-C11-D10-D11						
	VENTANA 41		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 42		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 43			1	2,2	1	2,2
	VENTANA 44		2,2	1	2,2	1	2,2
	ALOJAMIENTO ENTRE A10-A11-B10-B11				2,2		
	VENTANA 45		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 46		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 47		2,2	1	2,2	1	2,2
	VENTANA 48		2,2	1	2,2	1	2,2
	BAÑO ENTRE D9-D10						
	VENTANA 37		3,4	1	3,4	1	3,4
	VENTANA 38		3,4	1	3,4	1	3,4
						TOTAL ACTA 10	**89,10**
						TOTAL PRESENTE ACTA	**89,10**













Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO


Revisó:
Arq. Jairo Alamilar
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº: 18,1	UND: Kg
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
CORTE Nº: 10	FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

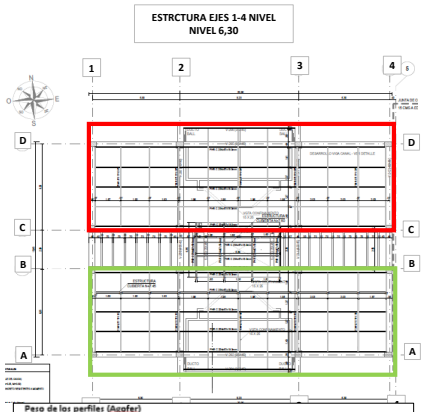


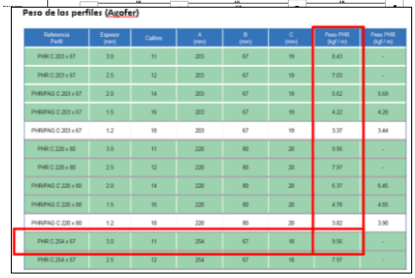





UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Diametro	peso	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
NIVEL +6,30						
ENTRE EJES A-B						
1. CORREAS DE CUBIERTA - PHR C 254x67x18-3mm						
EJE 1 - 2 ENTRE A - B		6,17		9,56	5	294,93
EJE 2 - 3 ENTRE A - B		7,95		9,56	6	456,01
EJE 3 - 4 ENTRE A - B		6,06		9,56	5	289,67
PLATINAS DE ANCLAJE LATERAL						
EJE 1 ENTRE A - B	0,3	0,25	99,59	7,47	5	37,35
EJE 2 ENTRE A - B	0,3	0,25	99,59	7,47	11	82,17
EJE 3 ENTRE A - B	0,3	0,25	99,59	7,47	11	82,17
EJE 4 ENTRE C - D	0,3	0,25	99,59	7,47	5	37,35
ANCLAJES AL CONCRETO						
EJE 1 ENTRE A - B		0,1	#3	0,56	20	
EJE 2 ENTRE A - B		0,11	#3	0,56	44	
EJE 3 ENTRE A - B		0,11	#3	0,56	44	
EJE 4 ENTRE A - B		0,1	#3	0,56	20	
TEMPLETES						
EJE 1 - 2 ENTRE A - B		5,79	#3	0,56	2	
EJE 2 - 3 ENTRE A - B		7,13	#3	0,56	3	
EJE 3 - 4 ENTRE A - B		5,79	#3	0,56	2	
					TOTAL EJE A-B	**1279,65**
NIVEL +6,30						
ENTRE EJES C-D						
1. CORREAS DE CUBIERTA - PHR C 254x67x18-3mm						
EJE 1 - 2 ENTRE C - D		6,17		9,56	5	294,93
EJE 2 - 3 ENTRE C - D		7,95		9,56	6	456,01
EJE 3 - 4 ENTRE C - D		6,06		9,56	5	289,67
PLATINAS DE ANCLAJE LATERAL						
EJE 1 ENTRE C - D	0,3	0,25	99,59	7,47	5	
EJE 2 ENTRE C - D	0,3	0,25	99,59	7,47	11	
EJE 3 ENTRE C - D	0,3	0,25	99,59	7,47	11	
EJE 4 ENTRE C - D	0,3	0,25	99,59	7,47	5	
ANCLAJES AL CONCRETO						
EJE 1 ENTRE C - D		0,1	#3	0,56	20	
EJE 2 ENTRE C - D		0,11	#3	0,56	44	
EJE 3 ENTRE C - D		0,11	#3	0,56	44	
EJE 4 ENTRE C - D		0,1	#3	0,56	20	
TEMPLETES						
EJE 1 - 2 ENTRE C - D		5,79	#3	0,56	2	
EJE 2 - 3 ENTRE C - D		7,13	#3	0,56	3	
EJE 3 - 4 ENTRE C - D		5,79	#3	0,56	2	
					TOTAL EJE C-D	**1040,61**
					TOTAL ACTA 10	**2320,25**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**2320,25**



Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Scarpa

SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO ALFREDO CASTAÑEDA


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	19,2 — UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

GRIFERIA DUCHA NIVEL 0.00 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11

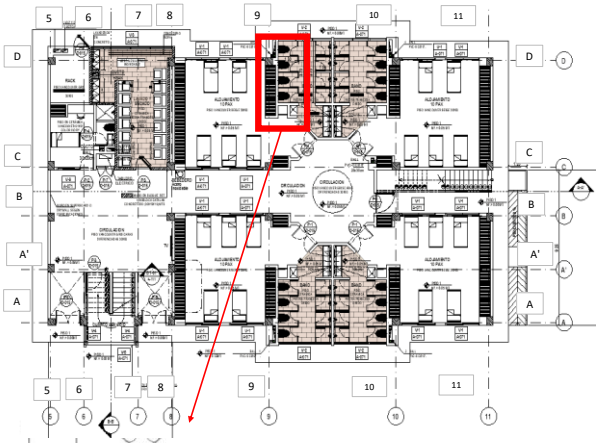


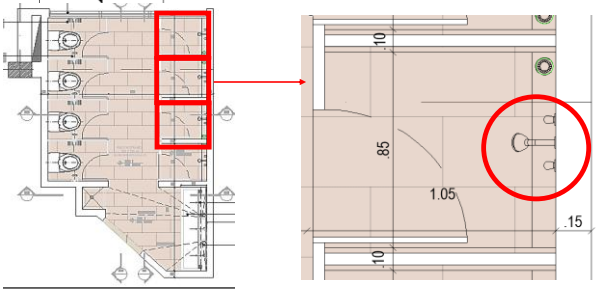



UBICACIÓN	DIMENSIONES lonitund	ancho	Diametro	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
PRIMER PISO						
DUCHA BAÑO 1 ENTRE A10					3	3,00
					TOTAL ACTA 10	3,00
					TOTAL	3,00







Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS

ÍTEM Nº	NP 01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MURO EN BLOQUE Nº5 PV, liso; e=12 cm, largo= 29 cm, alto 21 cm, INCLUYE, MORTERO RELLENO DE DOVELAS CON SEPARACIÓN ENTRE 1m y 2m, PEGA ANCLAJES Y ACERO DE REFUERZO.		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

MAMPOSTERÍA EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4

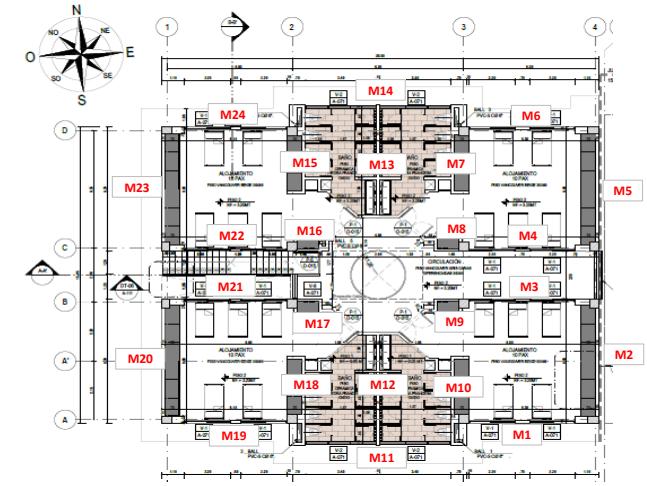

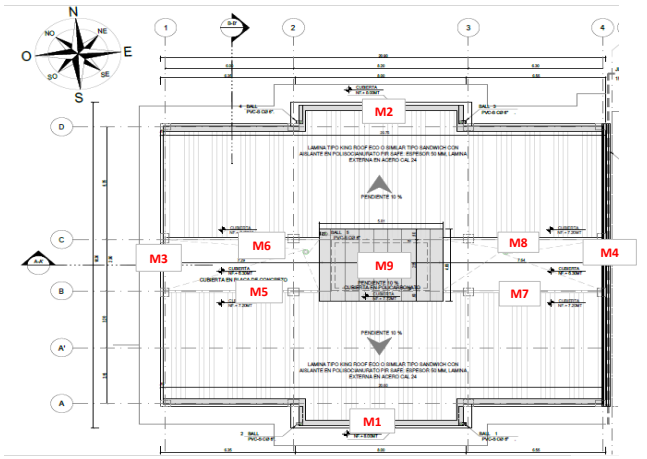





PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4							
SEGUNDO PISO							
MURO M1							
ENTRE A3-A4			5,7	2,7	15,39	1	15,39
BUITRÓN			0,65	2,7	1,76	1	1,76
DESCUENTO VENTANAS			2,2	1	2,2	-2	-4,4
DESCUENTO ALFAJÍA			2,2	0,15	0,33	-2	-0,66
DESCUENTO DINTEL			2,2	0,2	0,44	-2	-0,88
MURO M2							
ENTRE A4-B4			5,85	2,7	15,8	1	15,8
MURO M3							
ENTRE B3-B4			5,8	2,7	15,66	1	15,66
BUITRÓN			0,75	2,7	2,03	1	2,03
DESCUENTO VENTANAS			2,2	1	2,2	-2	-4,4
DESCUENTO VIGA CINTA			2,2	0,15	0,33	-2	-0,66
DESCUENTO DINTEL			2,2	0,2	0,44	-2	-0,88
MURO M4							
ENTRE C3-C4			5,8	2,7	15,66	1	15,66
BUITRÓN			0,75	2,7	2,03	1	2,03
DESCUENTO VENTANAS			2,2	1	2,2	-2	-4,4
DESCUENTO VIGA CINTA			2,2	0,15	0,33	-2	-0,66
DESCUENTO DINTEL			2,2	0,2	0,44	-2	-0,88
MURO M5							
ENTRE C4-D4			5,85	2,7	15,8	1	15,8
MURO M6							
ENTRE D3-D4			5,7	2,7	15,39	1	15,39
BUITRÓN			0,65	2,7	1,76	1	1,76
DESCUENTO VENTANAS			2,2	1	2,2	-2	-4,4
DESCUENTO ALFAJÍA			2,2	0,15	0,33	-2	-0,66
DESCUENTO DINTEL			2,2	0,2	0,44	-2	-0,88
MURO M7							
MURO COMODA X 3			4,5	2,45	11,03	1	11,03
POCETA EJE D3			2,61	2,45	6,39	1	6,39
MURO M8							
MURO COMODA X 1 EJE C3			4,36	2,45	10,68	1	10,68
DESCUENTO PUERTA P1			1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
MURO M9							
MURO COMODA X 1 EJE B3			4,36	2,45	10,68	1	10,68
DESCUENTO PUERTA P1			1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
MURO M10							
MURO COMODA X 3-POCETA EJE A3			4,5	2,45	11,03	1	11,03
POCETA EJE A3			2,61	2,45	6,39	1	6,39
MURO M11							
MURO LATERAL EJE A3 BUITRÓN			1,05	2,7	2,84	2	5,68
MRO ENTRE A3-A2			8,5	2,7	22,95	1	22,95
MURO LATERAL EJE A2 BUITRÓN			1,05	2,7	2,84	2	5,68
DESCUENTO VENTANAS			3,4	1	3,4	-2	-6,8
DESCUENTO ALFAJÍAS			3,4	0,15	0,51	-2	-1,02
DESCUENTO DINTELES			3,4	0,2	0,68	-2	-1,36
MURO M12							
MURO DIVISOR BATERIAS BAÑOS ENTRE A2-A3			5,81	2,7	15,69	1	15,69
MURO DIVISOR ENTRE LAVAMANOS-DUCHA			2,1	2,45	5,15	1	5,15
MURO DE CIERRE BAÑO			3,32	2,45	8,13	1	8,13
MURO M13							
MURO DIVISOR BATERIAS BAÑOS ENTRE D2-D3			5,81	2,7	15,69	1	15,69
MURO DIVISOR ENTRE LAVAMANOS-DUCHA			2,1	2,45	5,15	1	5,15
MURO DE CIERRE BAÑO			3,32	2,45	8,13	1	8,13
MURO M14							
MURO LATERAL EJE A3 BUITRÓN			1,05	2,7	2,84	2	5,68
MRO ENTRE D3-D2			8,5	2,7	22,95	1	22,95
MURO LATERAL EJE A2 BUITRÓN			1,05	2,7	2,84	2	5,68
DESCUENTO VENTANAS			3,4	1	3,4	-2	-6,8
DESCUENTO ALFAJÍAS			3,4	0,15	0,51	-2	-1,02
DESCUENTO DINTELES			3,4	0,2	0,68	-2	-1,36
MURO M15							
MURO COMODA X 3			4,5	2,45	11,03	1	11,03
POCETA EJE C3			2,61	2,45	6,39	1	6,39
MURO M16							
MURO COMODA X 1 EJE C2			7,37	2,45	18,06	1	18,06
DESCUENTO PUERTA P1			1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
DESCUENTO PUERTA P6			1,2	2,2	2,64	-1	-2,64
MURO M17							
MURO COMODA X 1 EJE B2			4,36	2,45	10,68	1	10,68
DESCUENTO PUERTA P1			1,5	2,2	3,3	-1	-3,3
MURO M18							
MURO COMODA X 3-POCETA EJE A2			4,5	2,45	11,03	1	11,03
POCETA EJE A2			2,61	2,45	6,39	1	6,39
NIVEL DE CUBIERTA							
MURO M1							
EJE A1-A4			12,4	0,6	7,44	1	7,44
			10,6	1,15	12,19	1	12,19
DESCUENTO COLUMNETAS H=,60			0,25	0,6	0,15	-4	-0,6
DESCUENTO COLUMNETAS H=1,15			0,25	1,15	0,29	-5	-1,45
MURO M2							
EJE D1-D4			12,4	0,6	7,44	1	7,44
			10,6	1,15	12,19	1	12,19
DESCUENTO COLUMNETAS H=,60			0,25	0,6	0,15	-4	-0,6
DESCUENTO COLUMNETAS H=1,15			0,25	1,15	0,29	-5	-1,45







MURO M3						
EJE A1-D1		15,65	0,9	14,09	1	14,09
DESCUENTO COLUMNETAS		0,25	0,9	0,23	-12	-2,76
MURO M4						
EJE A4-D4		15,65	0,9	14,09	1	14,09
DESCUENTO COLUMNETAS		0,25	0,9	0,23	-12	-2,76
MURO M5						
EJE B1-B2		7,89	0,9	7,1	1	7,1
DESCUENTO COLUMNETAS		0,25	0,9	0,23	-2	-0,46
MURO M6						
EJE C1-C2		7,89	0,9	7,1	1	7,1
DESCUENTO COLUMNETAS		0,25	0,9	0,23	-2	-0,46
MURO M7						
EJE B3-B4		8,09	0,9	7,28	1	7,28
DESCUENTO COLUMNETAS		0,25	0,9	0,23	-2	-0,46
MURO M8						
EJE C3-C4		8,09	0,9	7,28	1	7,28
DESCUENTO COLUMNETAS		0,25	0,9	0,23	-2	-0,46
MURO M9						
EJE B2-B3-C2-C3		4,05	1,35	5,47	1	5,47
		4,05	1,1	4,46	1	4,46
		2,55	1,23	3,14	2	6,28
MURO M10						
CUCHILLA S ENTRE A-B		6,3	0,65	2,05	2	4,1
CUCHILLA S ENTRE C-D		6,3	0,65	2,05	2	4,1
EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
PRIMER PISO						
MURO M23						
ENTRE C1-C2		5,85	2,70	15,8	1	15,8
		5,85	1,32	7,71	-1	-7,71
EDIFICIO 2 ENTRE 4EJES 5-11 PRIMER PISO						
MUROS EN ESCALERAS PISO 1 -M34		2,65	2,7	7,16	1	7,16
					TOTAL ACTA No 10	**414,06**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**414,06**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoria
Firma y Posfirma
José Alejandro Cabezas Rojas
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Arbeláez
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoria
Firma y Posfirma
EDUARDO A. ACEVEDO CATAÑO


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS

ÍTEM Nº	NP 04	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	COLUMNETA 0,12 x 0,25m EN CONCRETO F'C 3000 PSI		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			

EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1--4 NIVEL DE CUBIERTA

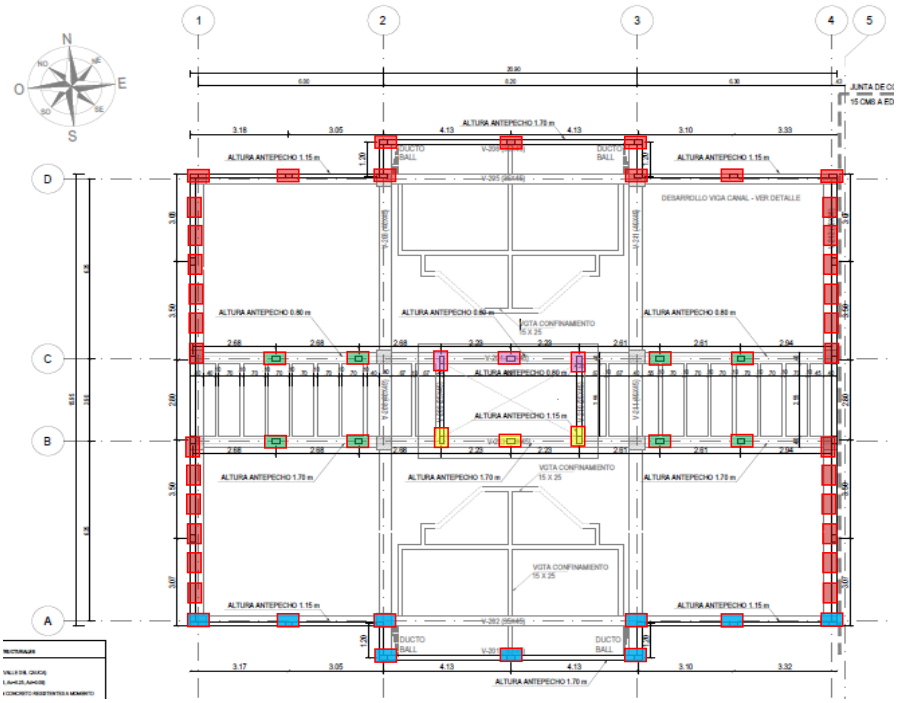






UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
EN CUBIERTA NIVEL 6,30						
ENTRE A1-A4			0,9	0,9	2	1,8
			0,6	0,6	2	1,2
			1,15	1,15	3	3,45
			1,45	1,45	2	2,9
ENTRE B1-B4			0,9	0,9	4	3,6
			1,3	1,3	3	3,9
ENTRE C1-C4			0,9	0,9	4	3,6
			1	1	3	3
ENTRE D1-D4			0,9	0,9	2	1,8
			0,6	0,6	2	1,2
			1,15	1,15	3	3,45
			1,45	1,45	2	2,9
ENTRE A1-D1			0,9	0,9	12	10,8
ENTRE A4-D4			0,9	0,9	12	10,8
EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
PRIMER PISO						
EN EJE A6			2,5	2,5	1	2,5
EN EJE A7			2,5	2,5	1	2,5
SENDO PISO						
EN EJE A6			2,85	2,85	1	2,85
EN EJE A7			2,85	2,85	1	2,85
EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJES D2-D3			1,1	1,1	3	3,3





EDIFICIO 1 ENTRE 1-4 NIVEL 3,15 SECTOR DE BAÑOS

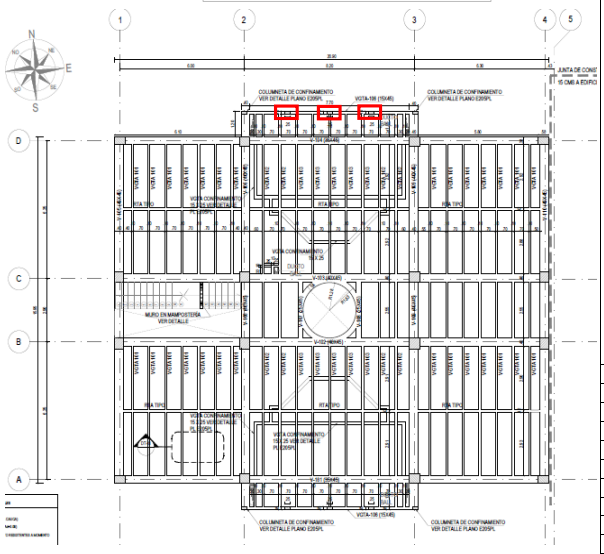





					TOTAL ACTA No 10	**68,40**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**68,40**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma




Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma


VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS
ÍTEM Nº	NP 05 — UND: ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,12 X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO
CORTE Nº:	10 — FECHA : 29/11/2024

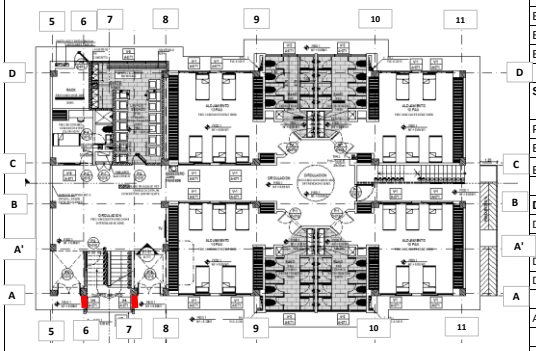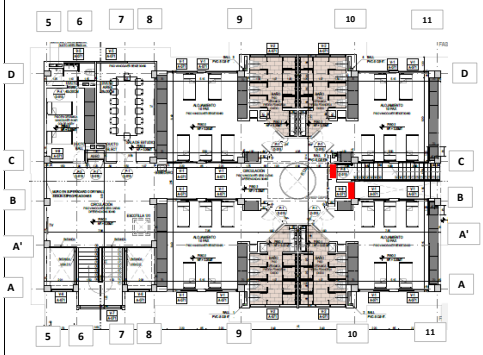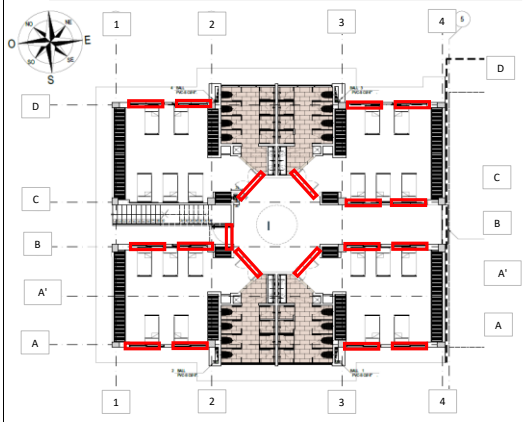PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
DINTELES NIVEL 0,00 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11							
	**EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11**						
	PRIMER PISO NIVEL 0,00						
	EN EJE A'6-A'7 ESCALERA		1,27		1,27	1	1,27
	EN EJE A6		1,27		1,27	1	1,27
	EN EJE A7		1,27		1,27	1	1,27
	SEGUNDO PISO NIVEL 3,15						
	PUERTA DE EMERENCIA ENTRE B10-C10		1,47		1,47	1	1,47
	EN VENTANA V8 ENTRE B10-C10		1,47		1,47	1	1,47
	EN BAÑO VIP		1,07		1,07	1	1,07
	DINTELES PUERTAS P1						
	DINTEL PUERTA P1 ALOJAMIENTO 1		0,12		0,12	1	0,12
	DINTEL PUERTA P1 ALOJAMIENTO 2		0,12		0,12	1	0,12
	DINTEL PUERTA P1 ALOJAMIENTO 3		0,12		0,12	1	0,12
	DINTEL PUERTA P1 ALOJAMIENTO 4		0,12		0,12	1	0,12
	ACCESO A LAVANDERÍA		0,07		0,07	1	0,07
	PRIMER PISO ENTRE C5-C8 INICIO DINTEL		0,135		0,135	1	0,14
DINTELES NIVEL 3,15 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11							
	**EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4**						
	PRIMER PISO NIVEL 0,00						
	ENTRE A1-A2		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE B1-B2		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE D1-D2		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE A2-A3		7,22		7,22	1	7,22
	ENTRE D2-D3		7,22		7,22	1	7,22
	ENTRE A3-A4		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE B3-B4		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE C3-C4		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE D3-D4		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE EJE B2-C2 EMERGENCIA		1,47		1,47	1	1,47
	ENTRE 2-3 B-C ACCESO ALOJAMIENTOS PUERTAS P1						
	ALOJAMIENTO 1		1,77		1,77	1	1,77
	ALOJAMIENTO 2		1,77		1,77	1	1,77
	ALOJAMIENTO 3		1,77		1,77	1	1,77
	ALOJAMIENTO 4		1,77		1,77	1	1,77
DINTELES NIVEL 0,00 EDIFICIO 1 ENTRE 1-4							
	**SEGUNDO PISO NIVEL 0,00**						
	ENTRE D3-D4		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE D1-D2		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE C1-C2		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE B1-B2		2,47		2,47	2	4,94
	EDIFICIO 1 ENTRE 1-4						
	Seundo piso						
	ENTRE A1-A2		2,47		2,47	1	2,47
	ENTRE A3-A4		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE B3-B4		2,47		2,47	2	4,94
	ENTRE C3-C4		2,47		2,47	2	4,94
							
DINTELES NIVEL 3,15 EDIFICIO 1 ENTRE 1-4							

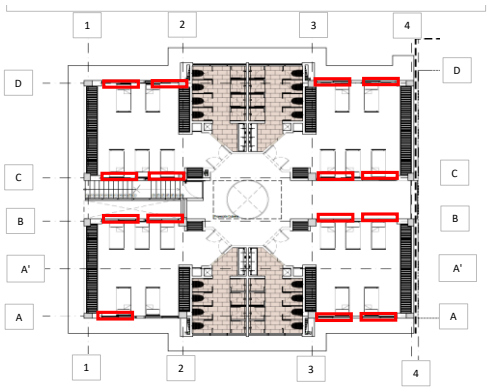









TOTAL ACTA No 10	103,13
TOTAL	103,13

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Villabrizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
EDUARDO ALFREDO CASTILLA S


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS


ÍTEM Nº	NP 06	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VIGUETA 0,12 x 0,25 EN CONCRETO F'C 3000 PSI		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			

EDIFICIO 1 ENTRE 1-4 NIVEL 0,00 SECTOR DE BAÑOS

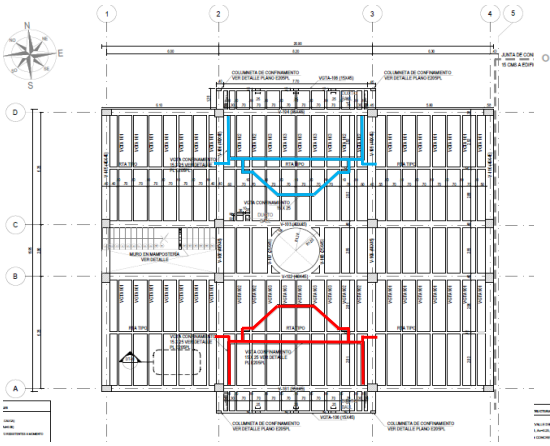

EDIFICIO 1 ENTRE 1-4 NIVEL 6,30 SECTOR DE

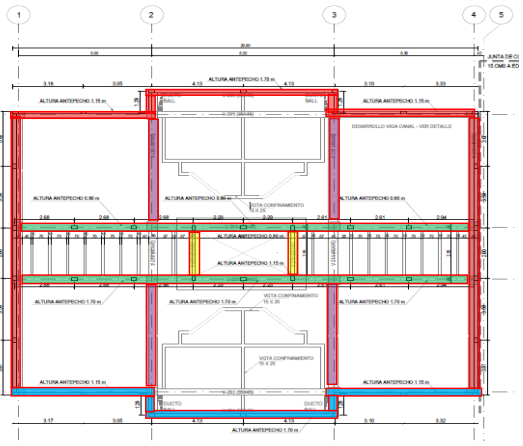





UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
PRIMER PISO						
BAÑOS EJE A-B2--3		23,03		23,03	1	23,03
BAÑOS EJE C-D2--3		23,03		23,03	1	23,03
CUBIERTA						
EJE A1-A4		23,27		23,27	1	23,27
EJE D1-D4		23,27		23,27	1	23,27
EJE B1-B4		20,76		20,76	1	20,76
EJE C1-C4		20,76		20,76	1	20,76
EJE B2-C2		2,78		2,78	1	2,78
EJE B3-C3		2,8		2,8	1	2,8
EJE A1-D1		15,65		15,65	1	15,65
EJE A4-D4		15,65		15,65	1	15,65
CUCHILLA ENTRE A2-B2		6,3		6,3	1	6,3
CUCHILLA ENTRE A3-B3		6,3		6,3	1	6,3
CUCHILLA ENTRE C2-D2		6,3		6,3	1	6,3
CUCHILLA ENTRE C3-D3		6,3		6,3	1	6,3
EDIFICIO 1 ENTRE 1-4						
SEGUNNDO PISO						
BAÑOS EJE C-D2--3		28,69		28,69	1	28,69
					TOTAL ACTA No 10	224,89
					TOTAL	224,89

Elaboró:.
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS

ÍTEM Nº	NP 08	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VENTANERIA EN ALUMINIO SISTEMA 7038 SEGÚN DISEÑO, VIDRIO CRUDO 5MM COLOR AUL LAKE, INCLUYE PERSIANA ESTRUCTURA EN ALUMINIO, PELICULA ESMERILADA, MARCO Y ANGEO EN FIBRA DE VIDRIO.		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

VENTANA TIPO PERSIANA PRIMER PISO NIVEL 0,00 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11

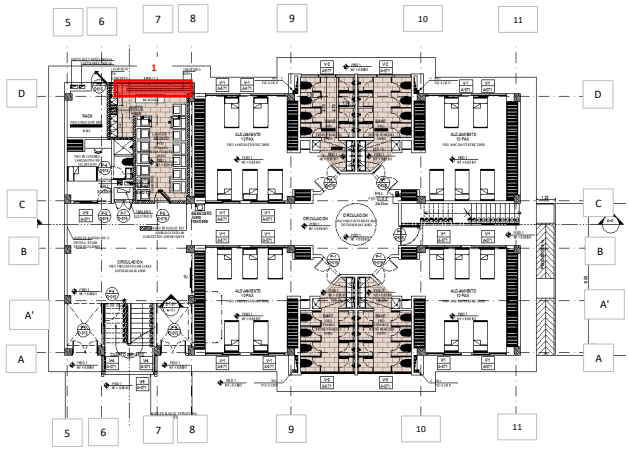







UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
PRIMER PISO						
AREA DE LAVANDERÍA		5,2	1	5,20	1	5,20
				TOTAL ACTA No 10		**5,20**
				TOTAL PRESENTE ACTA		**5,20**

Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoria
Firma y Posfirma
José Alejandro Cellizes Rojas
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoria
Firma y Posfirma
EDUARDO A. ALGER CAJIGAS


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS


ÍTEM Nº	NP 09	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VIGA CINTA 0,12 x 0,15 m EN CONCRETO F'C 3000 PSI		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			


VIGAS CINTAS NIVEL 0,00 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11

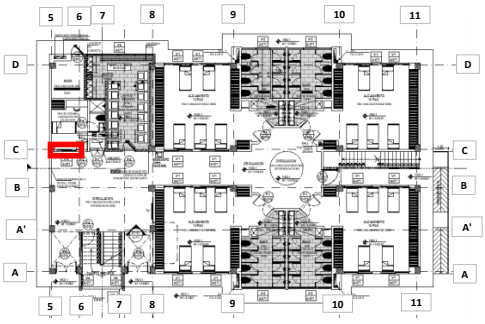

VIGAS CINTAS NIVEL 3,15 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11

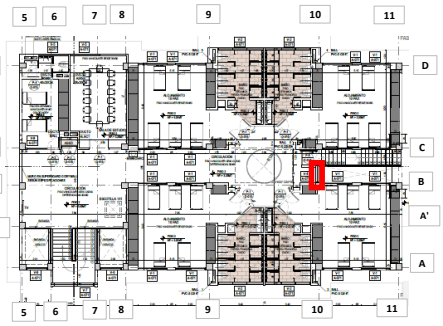

VIGA CINTA NIVEL 0,00 EDIFICIO 1 ENTRE 1-4

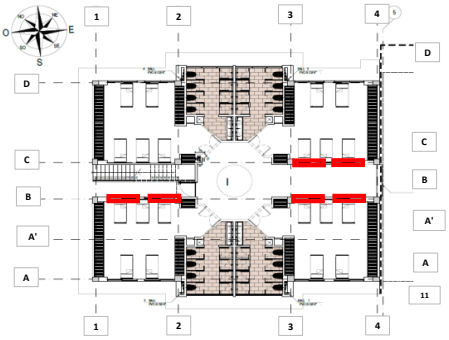

UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
EDIFICIO 2 ENTRE 5-11						
PRIMER PISO NIVEL 0,00						
EN ALOJAMIENTO VIP		1,5		1,5	1	1,5
SEGUNDO PISO						
EN SALIDA EMERGENCIA B10-C10		1,2		1,2	1	1,2
EDIFICIO 1 ENTRE 1-4						
PRIMER PISO NIVEL 0,00						
ENTRE EJE B1-B2		2,2		2,2	2	4,4
ENTRE EJE B3-B4		2,2		2,2	2	4,4
ENTRE EJE C3-C4		2,2		2,2	2	4,4
					TOTAL ACTA No 10	**15,90**
					TOTAL	**15,90**







Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

Revisó:
Arq. Jaime Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS


ÍTEM Nº	NP 13	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ALFAJÍA EN CONCRETO 3000 PSI DE DIMENSIONES (.15X.30X.05M) INCLUIDO ACERO DE REFUERZO, CORTA GOTERO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	10	FECHA :	29/11/2024

ALFAJIA NIVEL 0,00 EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11

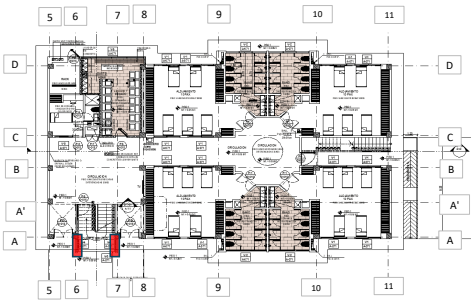




ALFAJIA NIVEL 3,15 EDIFICIO 2 ENTRE 5-11

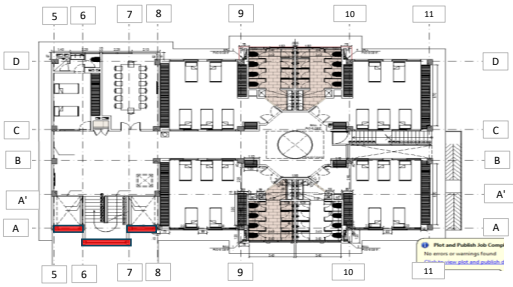

ALFAJIA NIVEL 0,00 EDIFICIO 1 ENTRE 1-4

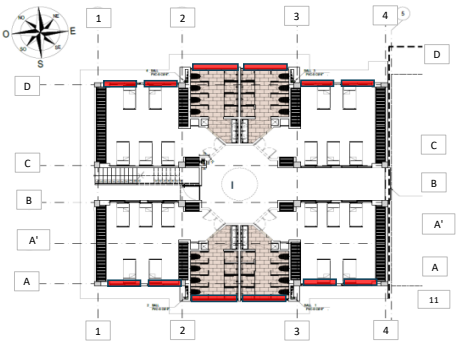

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11						
	NIVEL 0,00						
	EN PUNTO FIJO EN EJE A6		1		1,00	1	1,00
	EN PUNTO FIJO EN EJE A7		1		1,00	1	1,00
	NIVEL 3,15						
	EN PUNTO FIJO ENTRE A5-A6		1,6		1,60	1	1,60
	EN PUNTO FIJO ENTRE A6-A7		3		3,00	1	3,00
	EN PUNTO FIJO ENTRE A7-A8		1,6		1,60	1	1,60
	EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4						
	NIVEL 0,00						
	ENTRE EJE A1-A2		2,2		2,2	2	4,40
	ENTRE EJE A2-A3		3,4		3,40	2	6,80
	ENTRE EJE A3-A4		2,2		2,20	2	4,40
	ENTRE EJE D1-D2		2,2		2,2	2	4,40
	ENTRE EJE D2-D3		3,4		3,40	2	6,80
	ENTRE EJE D3-D4		2,2		2,20	2	4,40
					TOTAL ACTA No 10		**39,40**
					TOTAL PRESENTE ACTA		**39,40**







Elaboró::
Ing. Miguel Felipe Rios
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó:
Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
