1. **FECHA:** 28/05/2024
2. **SOLICITANTE:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3. **RADICADO:** N/A
4. **OBJETIVO GENERAL:** REPOSICION PARCIAL DE ANDENES – PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2022.
5. **LOCALIZACIÓN:** COMUNA 9 **BARRIO:** ASTURIAS
6.
7. **DIRECCIÓN:**

    - Costado norte de la Diagonal 105 iniciando en el Conjuntos Residencial La calleja N° 27-39 hasta encontrar la transversal 29B
    - Costado Sur de la diagonal 105 iniciando en la iglesia de los santos de los últimos (intención puente Provenza) hasta encontrar la 108ª volteando por la carrera 31 finalizando en la zona de parqueaderos del edificio con nomenclatura #29-50 (incluyendo estos)

8. **CORREGIMIENTO:** N/A **VEREDA:** N/A
9. **PROBLEMA O NECESIDAD:** VISITA OCULAR PARA INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS ANDENES EN LOS SECTORES REFERIDOS, PARA POSTERIORMENTE CUANTIFICAR LAS OBRAS, ACORDE CON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2022.
10. **PROPIEDAD DEL PREDIO:** ESPACIO PUBLICO
11. **ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:**

ADECUACIÓN DE ANDEN Y/O VADOS.

- Costado norte de la Diagonal 105 iniciando en el Conjuntos Residencial La calleja N° 27-39 hasta encontrar la transversal 29B

Ancho: 1.50 / 1.80 / 1.00
Largo: 160 m
Accesos vehiculares: 1
Tapas red acueducto: 1

Tapas red energía: 1
Tapas red alcantarillado: 1
Señalización: 2
Sumidero: 5
Arboles: 7

- Costado Sur de la diagonal 105 iniciando en la iglesia de los santos de los últimos (intención puente Provenza) hasta encontrar la 108ª volteando por la carrera 31 finalizando en la zona de parqueaderos del edificio con nomenclatura #29-50 (incluyendo estos)

Ancho: 1.80
Largo: 97.00
Accesos vehiculares: 6
Tapas red acueducto: 1
Tapas red alcantarillado: 2

12. PRIORIDAD RECOMENDADA

URGENTE [ ] **ALTA** [X] **MEDIA** [ ] **BAJA** [ ]

13. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA:

ACORDE CON LA VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR, SE DEBE PRESUPUESTAR EL VALOR DE LAS OBRAS PARA LAS ADECUACIONES DE LOS ANDENES Y/O VADOS, ACORDE CON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2022, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER CON LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL.

14. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE VISITA OCULAR Y TECNICA.

- Costado norte de la Diagonal 105 iniciando en el Conjuntos Residencial La calleja N° 27-39 hasta encontrar la transversal 29B



Ilustración 1



Ilustración 2

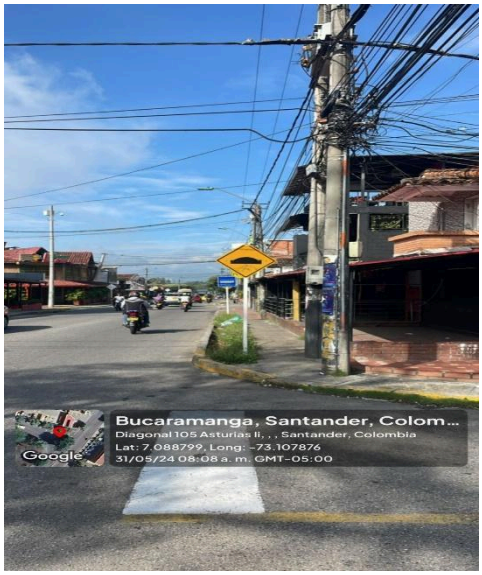


Ilustración 3



Ilustración 4

- Costado Sur de la diagonal 105 iniciando en la iglesia de los santos de los últimos (intención puente Provenza) hasta encontrar la 108ª volteando por la carrera 31 finalizando en la zona de parqueaderos del edificio con nomenclatura #29-50 (incluyendo estos)



Ilustración 1

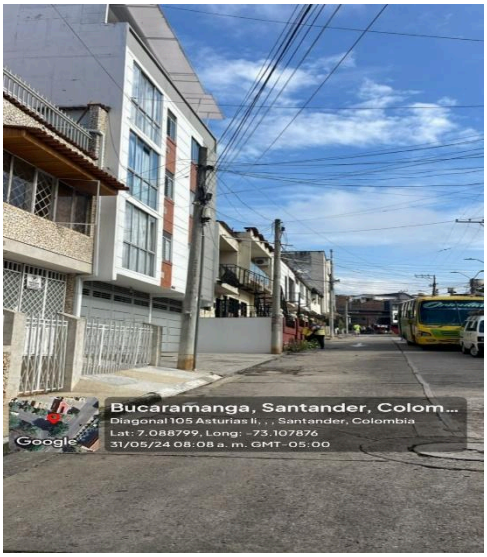


Ilustración 2



Ilustración 3




Ilustración 4

15. **ANALISIS DE VIABILIDAD:**


ES TECNICAMENTE VIABLE LA REPOSICION DEL ANDEN A LO LARGO DE LOS TRAYECTOS INDICADOS ANTERIORMENTE, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL POT, EL MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO (MEPB) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEMAS NORMAS, LEYES Y DECRETOS VIGENTES.

_____


MARIA ALEJANDRA GALÁN BARAJAS
Arquitecta
CPS Secretaría de Infraestructura
Alcaldía de Bucaramanga

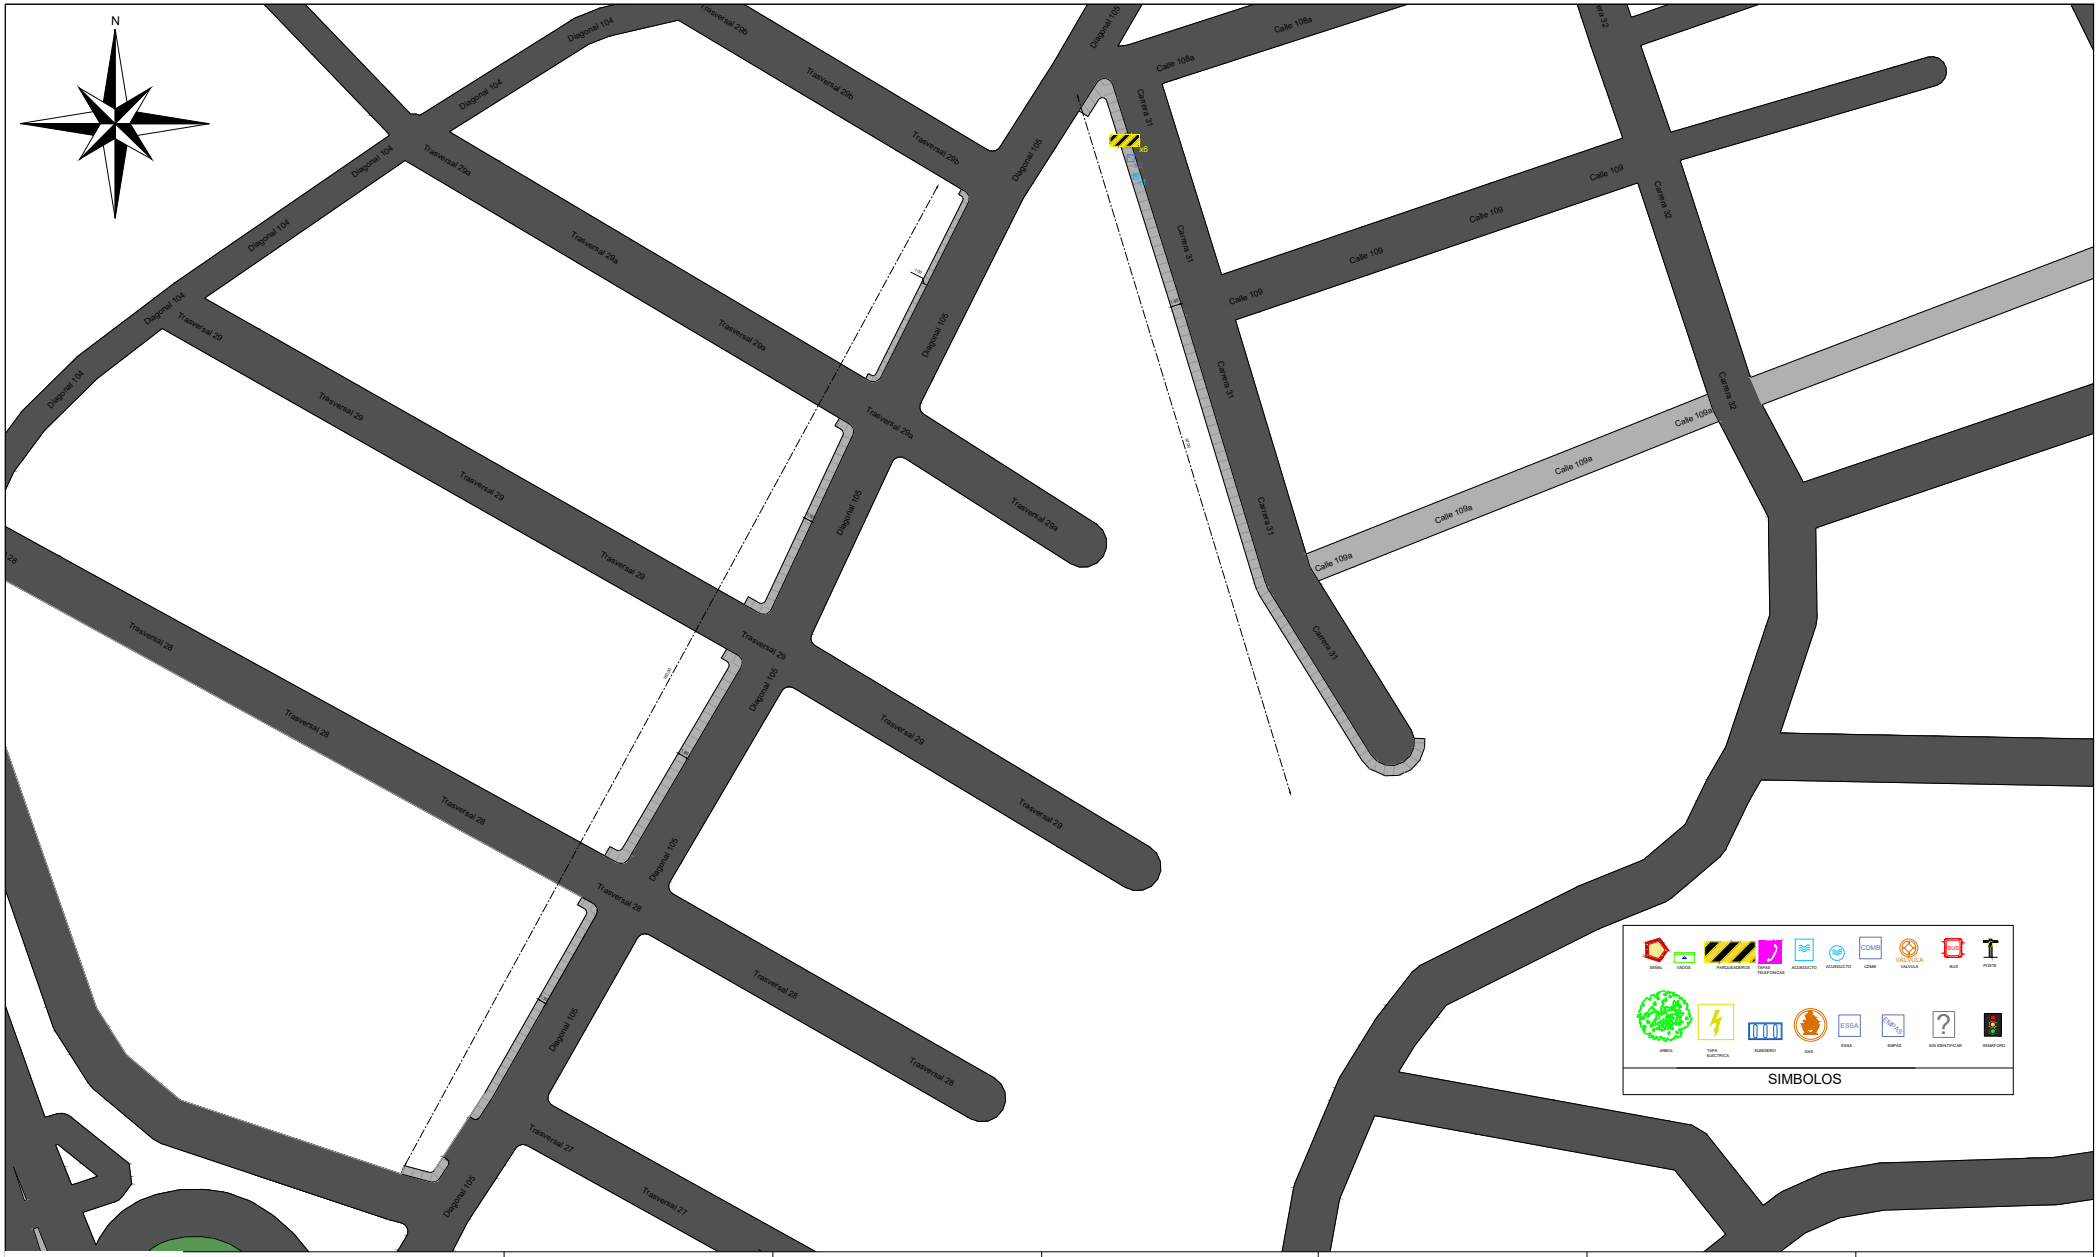

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Ivan Dario Muñoz Ing.	Hecho por: Andres Jaimes Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 28 de mayo 2024	Escala: 1:1	Localización: Barrio Asturias II	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..

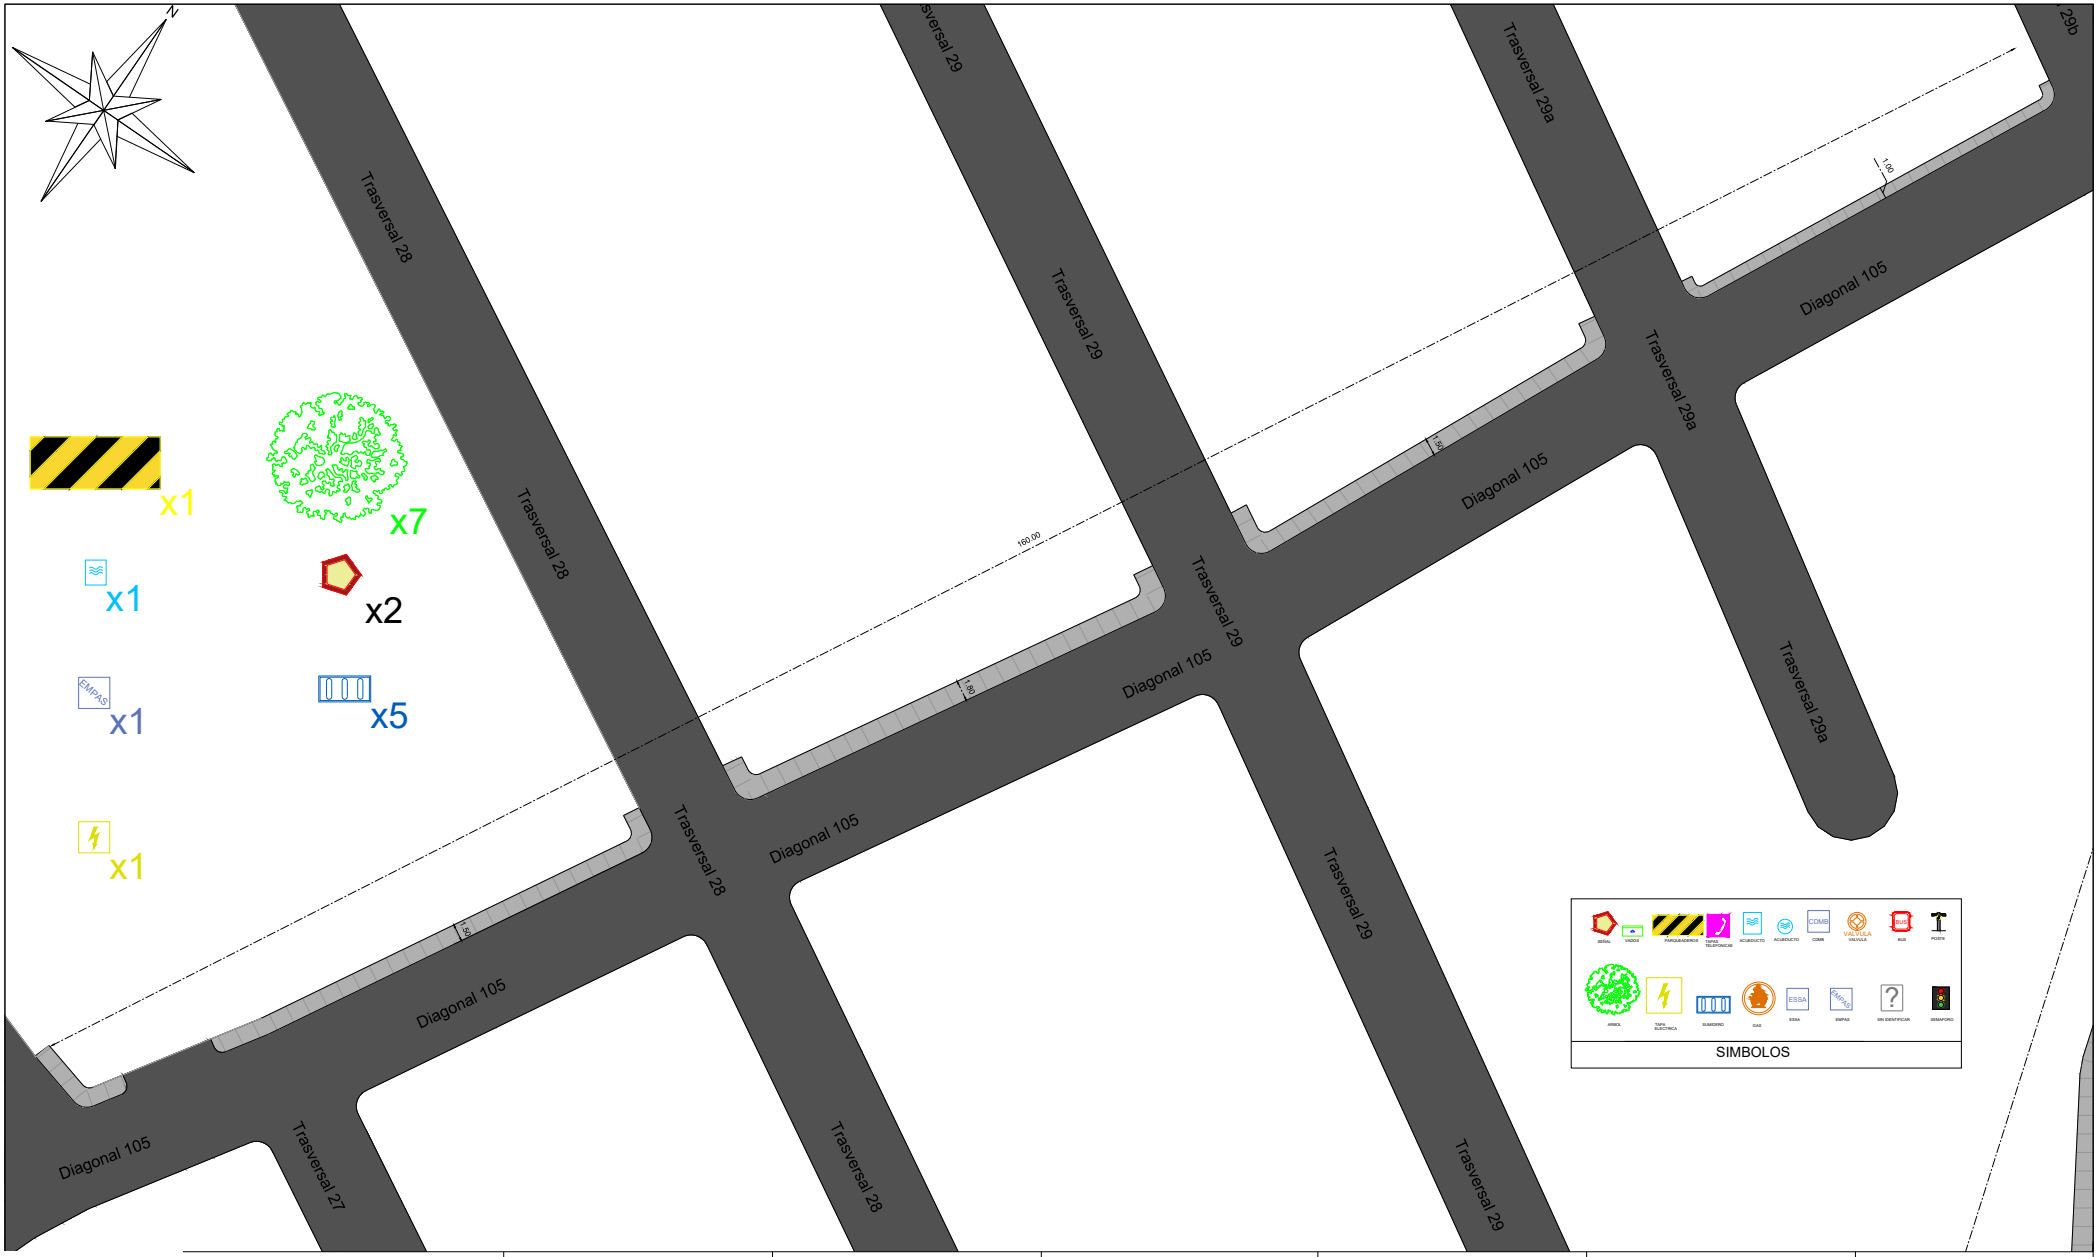

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Ivan Dario Muñoz Ing.	Hecho por: Andres Jaimes Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 28 de mayo 2024	Escala: 1:1	Localización: Barrios Asturias II	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..

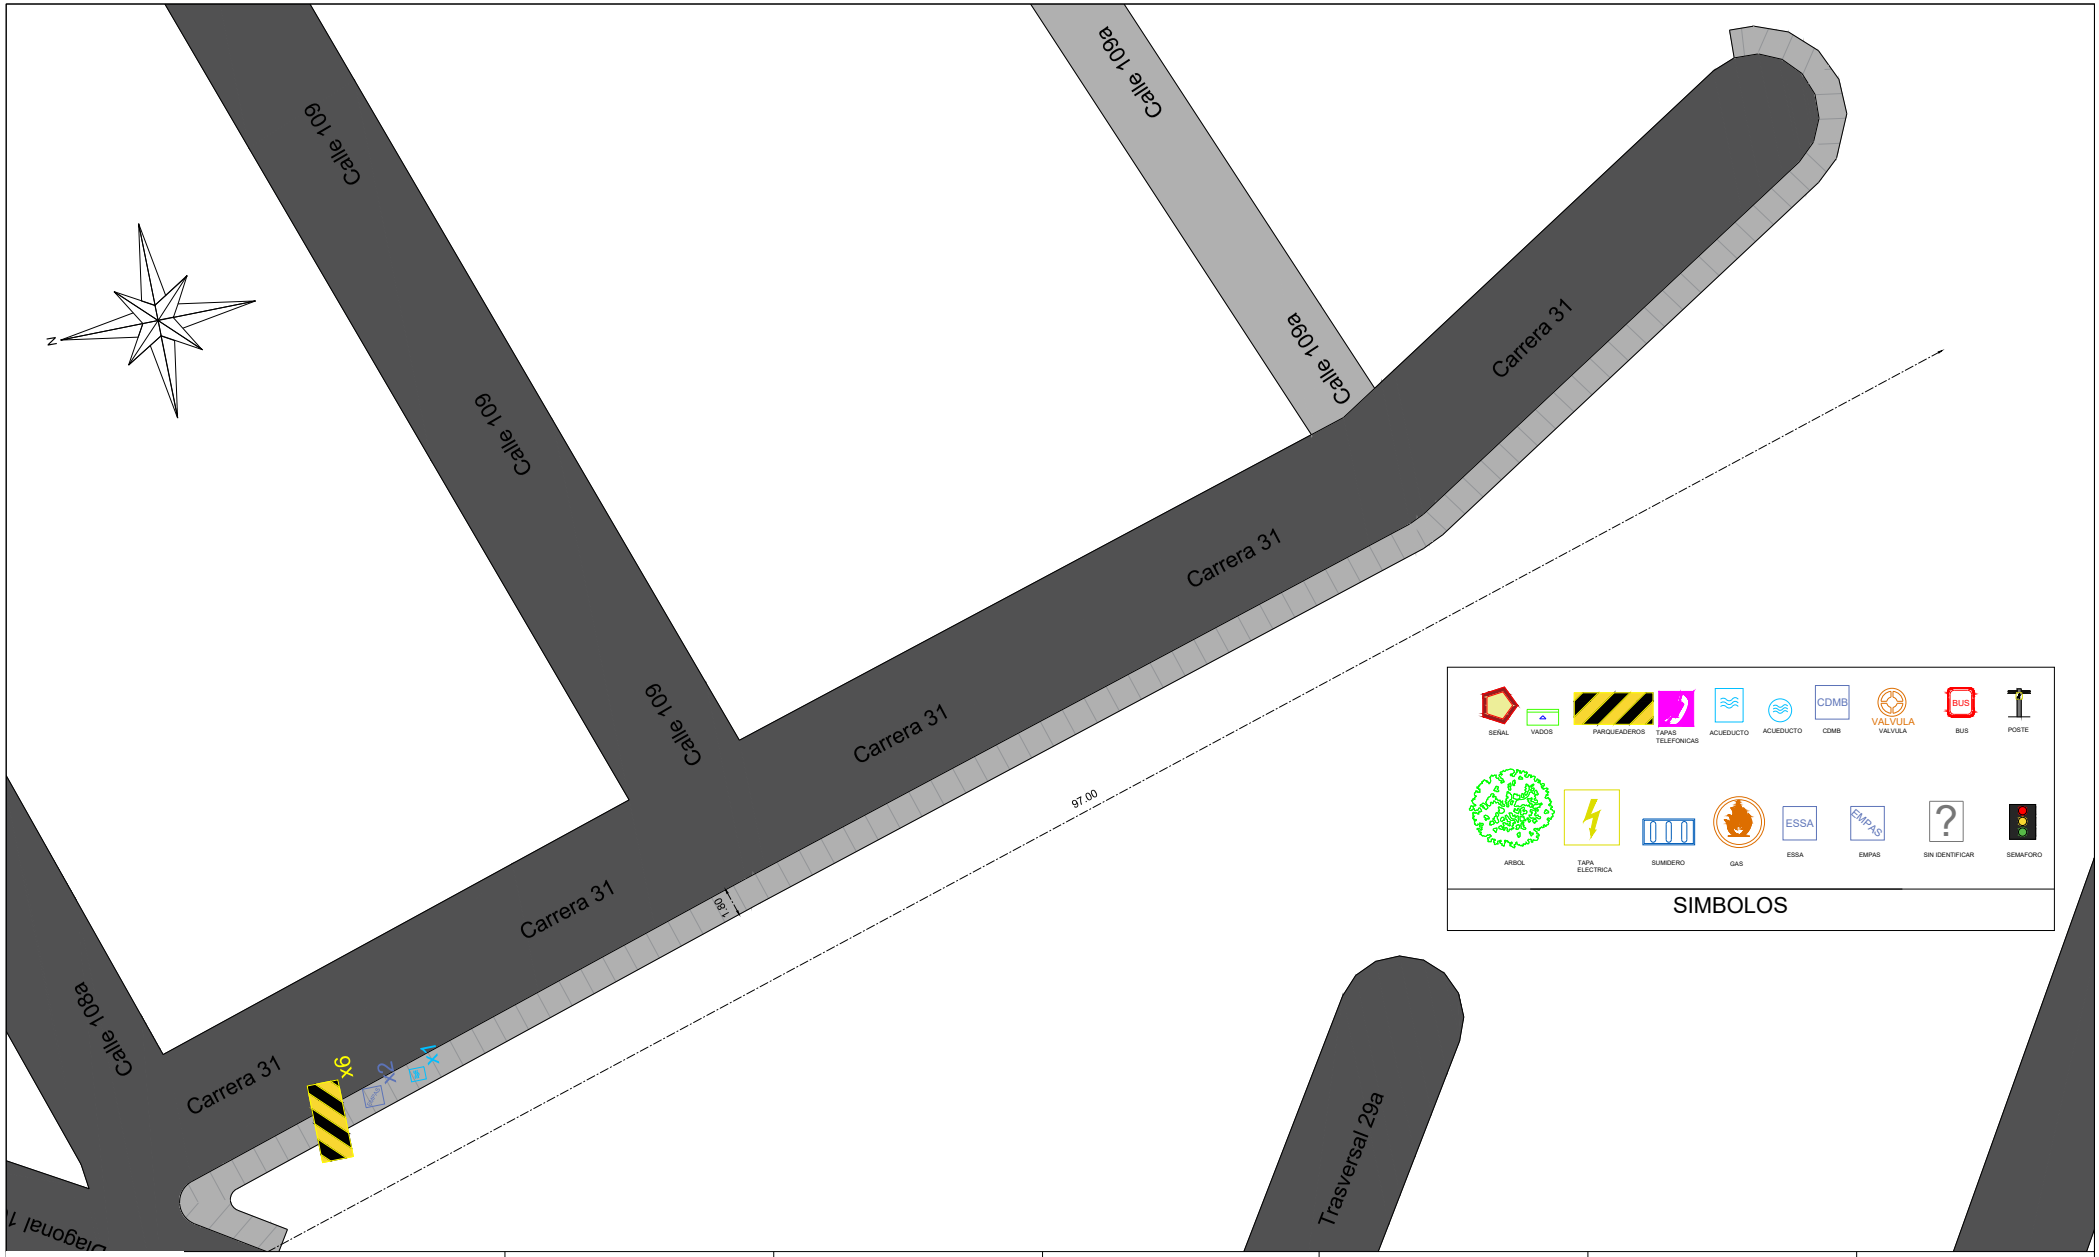

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Ivan Dario Muñoz Ing.	Hecho por: Andres Jaimes Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 28 de mayo 2024	Escala: 1:1	Localización: Barrios Asturias II	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..
