CONTRATO O CONVENIO No.	124-ARC-DISAN-DMBOG-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	13/11/2024
CONTRATISTA:	EQUIPOS CASABLANCA SAS
NIT:	900.469.101-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30/11/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	20/11/2024 al 30/11/2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESPECIALIZADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE VACUNACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, SUS SATELITES Y REGIONAL CENTRO.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	UNIDAD OFTALMOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo - Correctivo consistente en: limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento.	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080
2	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo interruptor de encendido	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080
3	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080

	deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio o reparación del mismo. Reemplazo interruptor de encendido				
4	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	$ 709.000	$ 134.710	$ 843.710
5	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	$ 668.000	$ 126.92	$ 843.710
6	CENTRIFUGA DE GRAN CAPACIDAD: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento	1	$ 608.000	$ 115.520	$ 723.520
7	VENTILADORMECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibración y cambio celdas	1	$ 731.000	$ 138.890	$ 869.890
8	VENTILADOR MECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibracion y cambio celdas	1	$ 731.000	$ 138.890	$ 869.890
9	OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL: Mantenimiento Preventivo-correctivo, acuerdo protocolo fabricante, verificación sistema eléctrico, ajustes, conexiones eléctricas de las mismas, voltaje de alimentación, estado caja amplificadora, auriculares, conexión pc, verificación tono burst, ce-chirp y click, verificación funcionamiento general	1	$ 1.434.000	$ 272.460	1.706.460
10	AUDIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo 02 Perrillas	1	$ 1.389.000	$ 263.910	$ 1.652.910
11	IMPEDANCIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del	1	$ 1.389.000	$ 263.910	$ 1.652.910

	fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento				
12	DOOPLER FETAL: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio batería	1	$ 405.000	$ 76.950	$ 481.950
13	EQUIPO DE ORGANO: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cabezal de otoscopio y oftamoscopio	1	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920
14	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cinta termica	1	$ 263.000	$ 49.970	$ 312.970
15	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
16	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
17	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja,	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390

	verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
18	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
19	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
20	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390
21	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390

22	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390
23	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
24	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
25	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
26	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310

	en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
27	U|NIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
28	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
29	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
30	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras,	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310

	cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
31	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
32	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
33	AUTOCLAVE DE 250 LITROS: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación de válvulas, limpieza sensores, limpieza calderín, verificación resistencias, acoples, empaques de alta temperatura, filtros, recambio filtro de agua, ajuste de acoples, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; o reparación del mismo. - Actualización software -Cmabio de repuestos menores, en caso de ser necesario - Empaques puertas - Reemplazo Filtros. - Verificación final de funcionamien	1	$ 5.690.000	$ 1.081.10	$6.771.100
34	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, inspección general, limpieza interna y externa, verificación	1	$ 1.073.000	$ 203.870	$1.276.870

	exasaustiva de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, pruebas de operatividad y funcionamiento. - Verificación final de funcionamiento. - Cambio de cinta termica				
35	LAVADORA TERMODESINFECTADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación puerta, cámara, bomba de lavado, brazos de lavado, sensor analógico de presión del circuito de lavado, sensores de rotación de los brazos de lavado, Condensador de vapores, bomba dosificadora química, filtros de los tanques, Intercambiador de calor agua de desague, Válvula enfriamiento desagüe, Impresora térmica integrada, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	1	$ 4.253.000	$ 808.070	$5.061.070
36	LAVADORA ULTRASÓNICA: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	1	$ 1.033.000	$ 196.270	$1.229.270
37	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los	1	$ 871.000	$ 196.270	$1.036.490

	accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos				
38	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de	1	$ 871.000	$ 165.490	$1.036.490

	refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos				
39	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de	1	$ 871.000	$ 165.490	$1.036.490

	acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitores de los equipos				
				VALOR TOTAL	**$71.627.290,00**

2.1. OBSERVACIONES

N/A.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 89.381.166,64
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 89.381.166,64

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 89.381.166,64

3.2. OBSERVACIONES

N/A.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	24324	26/06/2024	$89.381.166,64	30824	15/11/2024	$89.381.166,64

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	AHORROS	455000107496

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	10/12/2024
PLAZO DE DURACIÓN	30 Días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	10/12/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101455810
FECHA EXPEDICIÓN:	14/11/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	14/11/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2024	10/08/2025	$ 17.876.233,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/11/2024	10/08/2025	$ 17.876.233,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/11/2024	10/04/2028	$ 8.938.116,60

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	21-40-101243516
FECHA EXPEDICIÓN:	14/11/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	14/11/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13/11/2024	10/04/2025	$ 260.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	**$ 0,00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 89.381.166,64
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 71.627.290,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$71.627.290,00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

Al 30 de noviembre se encuentra tramitado un presupuesto de $71,627,290 con un saldo por ejecutar de $17,753.876,64 y un porcentaje de ejecución de 80,14%

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	UNIDAD OFTALMOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo - Correctivo consistente en: limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento.	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080
2	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo interruptor de encendido	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080
3	UNIDAD OTORRRINO: Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio o reparación	1	$ 932.000	$ 177.080	$ 1.109.080

	del mismo. Reemplazo interruptor de encendido				
4	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	$ 709.000	$ 134.710	$ 843.710
5	ELECTROBISTURI: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parámetros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo	1	$ 668.000	$ 126.92	$ 794.920
6	CENTRIFUGA DE GRAN CAPACIDAD: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento	1	$ 608.000	$ 115.520	$ 723.520
7	VENTILADORMECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibración y cambio celdas	1	$ 731.000	$ 138.890	$ 869.890
8	VENTILADOR MECANICO: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibracion y cambio celdas	1	$ 731.000	$ 138.890	$ 869.890
9	OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL: Mantenimiento Preventivo-correctivo, acuerdo protocolo fabricante, verificación sistema eléctrico, ajustes, conexiones eléctricas de las mismas, voltaje de alimentación, estado caja amplificadora, auriculares, conexión pc, verificación tono burst, ce-chirp y click, verificación funcionamiento general	1	$ 1.434.000	$ 272.460	1.706.460
10	AUDIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo 02 Perrillas	1	$ 1.389.000	$ 263.910	$ 1.652.910
11	IMPEDANCIOMETRO: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general,	1	$ 1.389.000	$ 263.910	$ 1.652.910

	verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento				
12	DOOPLER FETAL: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio batería	1	$ 405.000	$ 76.950	$ 481.950
13	EQUIPO DE ORGANO: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cabezal de otoscopio y oftamoscopio	1	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920
14	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cinta termica	1	$ 263.000	$ 49.970	$ 312.970
15	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
16	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
17	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390

	de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
18	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
19	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$ 1.286.390
20	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390
21	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390

22	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 1.081.000	$ 205.390	$1.286.390
23	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$ 2.795.310
24	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$ 2.795.310
25	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
26	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310

	en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
27	U|NIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
28	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
29	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
30	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras,	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310

	cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario				
31	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
32	UNIDAD ODONTOLÓGICA: Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	1	$ 2.349.000	$ 446.310	$2.795.310
33	AUTOCLAVE DE 250 LITROS: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación de válvulas, limpieza sensores, limpieza calderín, verificación resistencias, acoples, empaques de alta temperatura, filtros, recambio filtro de agua, ajuste de acoples, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; o reparación del mismo. - Actualización software -Cmabio de repuestos menores, en caso de ser necesario - Empaques puertas - Reemplazo Filtros. - Verificación final de funcionamien	1	$ 5.690.000	$ 1.081.10	$ 6.771.100
34	SELLADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, inspección general, limpieza interna y externa, verificación	1	$ 1.073.000	$ 203.870	$1.276.870

	exasaustiva de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, pruebas de operatividad y funcionamiento. - Verificación final de funcionamiento. - Cambio de cinta termica				
35	LAVADORA TERMODESINFECTADORA: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación puerta, cámara, bomba de lavado, brazos de lavado, sensor analógico de presión del circuito de lavado, sensores de rotación de los brazos de lavado, Condensador de vapores, bomba dosificadora química, filtros de los tanques, Intercambiador de calor agua de desague, Válvula enfriamiento desagüe, Impresora térmica integrada, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	1	$ 4.253.000	$ 808.070	$ 5.061.070
36	LAVADORA ULTRASÓNICA: Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	1	$ 1.033.000	$ 196.270	$ 1.229.270
37	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los	1	$ 871.000	$ 196.270	$ 1.036.490

	accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos				
38	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de	1	$ 871.000	$ 165.490	$ 1.036.490

	refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitore de los equipos				
39	REFIRGERADOR HORIZAONTAL: Mantenimiento preventivo a todo costo 02 visitas semestrales, incluye repuestos: · verificación, inspección del equipo limpieza y desinfección general. · limpieza y desinfeccion en todas sus partes internas y externas del equipo. · aplicación de lubricantes en empaques · deteccion de fugas en el equipo · cambio de pila en sistema de control de temperatura interno ·limpieza de unidad refrigerante, circuitos y condensador. · en caso de requerirse incluye cambio de: § filtros § ventilador § condensador § empaques § chapas § compresor § termostato § liquidos refrigerantes entre otros que hagan parte del buen funcionamiento equipo. § recarga o cambio de gas refrigerante. § verificacion de la instalacion electrica del equipo § realizar observaciones y recomendaciones por escrito en el informe del reporte del servicio tecnico. · verificación del condensador · verificación del funcionamiento de los accesorios · verificación de niveles de aceite · reporte del servicio tecnico realizado firmado por el coordinador de vacunación con nombre legible numero de identificacion y tel cel ular · mantenimiento a realizar por personal especializado · limpieza de serpertin. · apertura de sistema interno para verificación de comporesor, ventilador y sistema de control. · purga de humedad. · limpieza del compresor y sistema de control · verificación de cabina de refrigeración y camisa de	1	$ 871.000	$ 165.490	$ 1.036.490

	acumuladores de ser necesario. · verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. · verificación de correcto enlace de sistema rtmd, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario. · verificación y actualización si se requiere de plataforma vaclog.(sistema de monitores de los equipos				
				VALOR TOTAL	**$ 71.627.290,00**

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reciben a satisfacción los servicios anteriormente relacionados de acuerdo al contrato No. 124 ARC-DISAN-DMBOG-2024, en las instalaciones de Dispensario Médico Nivel II Bogotá, localidad de Puente Aranda, Barrio Salazar Gómez, Carrera 58 No. 9-67 Puente Aranda, satélites y Establecimientos de la regional centro el día 30 de noviembre de 2024.

12. APORTES PARAFISCALES

Aporto la planilla de parafiscales del mes de noviembre de 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha el contratista ha cumplido de acuerdo a lo pactado en el contrato No. 124 ARC-DISAN-DMBOG-2024.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El avance actual del contrato es de un 80,14%.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A.

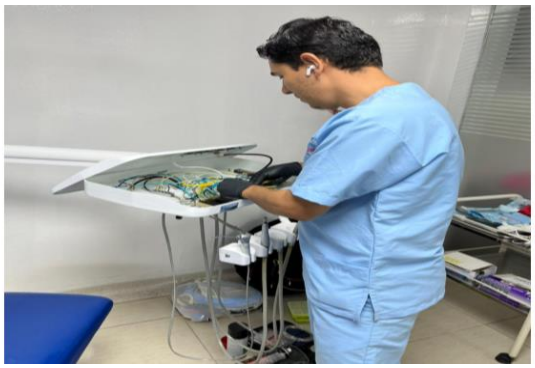
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

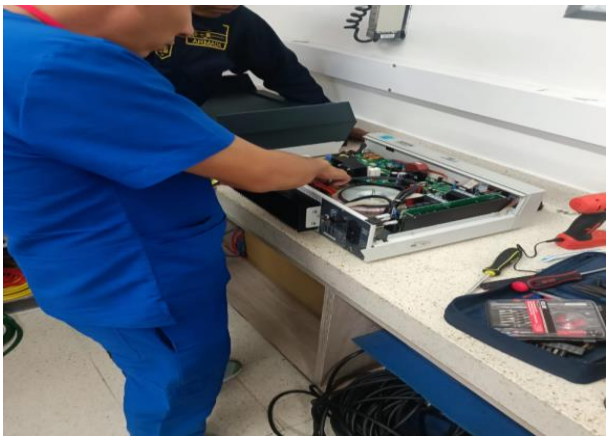
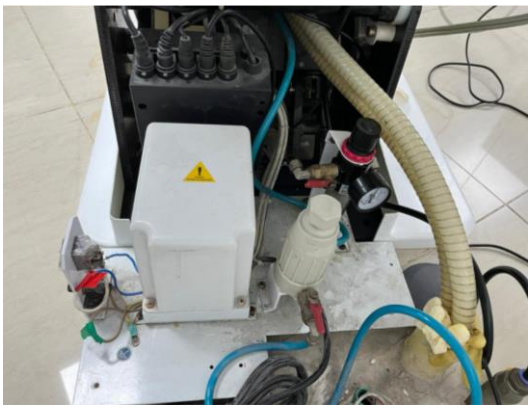
N/A.

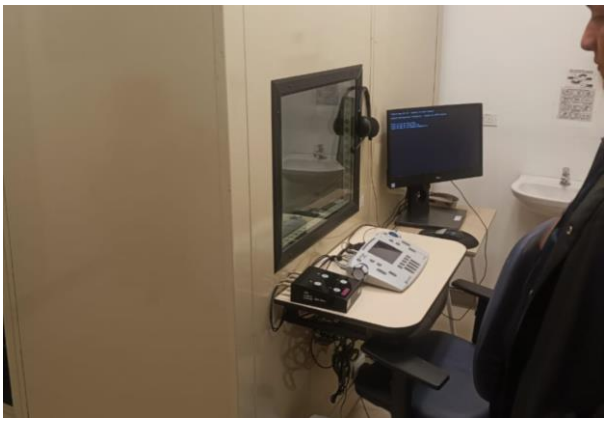
18. ANEXOS

- Lista de chequeo
- Acta satisfacción parcial
- Informe de supervisión
- Factura CB 702
- Certificado de pago y parafiscales a mes de noviembre 2024
- Rut Casablanca
- Certificado cuenta bancaria

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

	
MANTANIMIENTO UNIDAD ODONTOLOGICA.	DDOPLER FETAL
	
CENTRIGUGA	UNIDAD DE OFTALMOLOGIA
	
UNIDAD DE ODONTOLOGIA	UNIDAD DE OTORRINO

	
UNIDAD DE ODONTOLOGIA.	ELECTROBISTURI
	
VENTILADORES MCACNICOS	UNIDAD DE ODONTOLOGIA
	
AUTOCLAVE	LAVADORA ULTRASONICA

	
LAVADORA TERMODESINFECTADORA	UNIDAD DE ODONTOLOGIA
	
IMPEDANCIOMETRO, OTOEMISIONES ACUSTICAS Y AUDIOMETRO	CAMBIO DE CABEZAS EQUIPO DE ORGANOS

Suboficial Primero GOMEZ SUAREZ EDWIN FABIAN
Supervisor de Contrato No. 124-ARC-DISAN-DMBOG-2024
Jefe Sección Ingeniería Biomédica Dispensario Médico Nivel II Bogotá
